

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni**
2. Numărul și data contractului **Nr. 13, din 20 februarie \_2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Salcuta**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova, r-n Causeni, s. Salcuta**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului:
  - a) inițială- **2 870 729,90 lei**
  - b) finală- **2 930 850.38 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată- **la 20.02.2023**
  - b) efectiv realizată- **Obiectul s-a realizat pina pe data de 31.12.2023**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Obiectul s-a realizat in termen.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Proces Verbal №1, din data 26.03.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: acoperis din tabla amprentata tip tigla, sisteme de jgheaburi, sisteme de burlane, etc.

Data completării: **19.04.2024**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Rosivid Construct”**

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Obiectul achiziției: Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni	Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni	RM	RM	Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni	Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni	

Beneficiar: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Bacal Liliana În calitate de: primar

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele Cebotari Andrei: In calitate de director

Digitally signed by Bacal Liliana  
Date: 2023.03.01 13:21:31 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 2  
la contractul nr.33  
din "20\_" februarie 2023\_

### Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției <u>Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45211350-7	Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni	lucrari	1	2 392 274,92	2 870 729,90	2 392 274,92	2 870 729,90	31.12.2023	MD97TRPDAF311120A11056AC	
	<b>Total</b>					2 392 274,92	2 870 729,90			

Beneficiar: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Bacal Liliana În calitate de: primar

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele \_ Cebotari Andrei in calitate de director

Digitally signed by Bacal Liliana  
Date: 2023.03.01 13:29:16 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**CONTRACT Nr. 13**  
privind Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină  
Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni  
**I PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

Obiectul achiziției *Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni*  
Cod CPV: 45211350-7  
“20\_\_” februarie 2023

s. Salcuta  
(localitatea)

<b>Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
<p><b><u>SRL ROSIVID CONSTRUCT</u></b> , asociației, organizației) reprezentată prin director <b><u>Cebotari Andrei</u></b> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <b><u>statut</u></b>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p><b><u>Primaria satului Salcuta</u></b>, (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <b><u>primar Bacal Liliana</u></b>, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <b><u>Hotaririi Judecatii</u></b>, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> _____, (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni  
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

- b) Specificația de preț;
- c) *alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

## **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

*Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **2 870 729,90 lei( Doua milioane opt sute saptezeci mii sapte sutedouazeci si noua lei 90 bani )**

MD. *(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

*Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

- b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 10 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## **8. Rezoluțiunea**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de \_\_\_ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de \_\_\_ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de \_\_\_ zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de \_\_\_ zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de \_\_\_ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este o garanție în cuantum de \_5\_% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare garaa contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de \_5\_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de \_0,1\_% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_5\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește \_\_\_ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă,

Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2023

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.



**II. CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

<b>Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii SRL Rosivid Construct</b>	<b>Cumpărătorul/Beneficiarul</b>
Adresa poștală: MD2069 or. Chisinau str 27 martie 1918 nr 3 of 3a, Sediul: Chisinau str. Calea Iesilor 61/1	Adresa poștală: s. Salcuta, r. Causeni
Telefon: 069259421,	Telefon: 024341208
Cod fiscal: 1015600024953	Cod fiscal: 1007601003769
Banca: BC „VICTORIABANK” S.A.	Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Cod: VICBMD2X883	Cod: TREZMD2X
IBAN MD36VI022511100000078MDL	IBAN MD97TRPDAF311120A11056AC

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

<b>Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii</b>		<b>Cumpărătorul/Beneficiarul</b>	
Director	Cebotari Andrei	Primar	Liliana Bacal
Contabil	Todiras Zinaida	Contabil	Maria Ciomirtan

Digitally signed by Cebotari Andrei  
Date: 2023.03.01 22:23:08 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Bacal Liliana  
Date: 2023.03.01 13:29:44 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 26.03.2024

privind lucrarea **Reparația capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni**, executată la obiectul **cu nr. cadastral 2721114005.02** în cadrul contractului **nr. 13** din **20 februarie 2023** încheiat între **Primăria satului Sălcuța r. Căușeni**, și **SRL „Rosivid Construct”** cu sediul în **mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/1**, pentru lucrările de **Reparația capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional-Cantină Socială**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria satului Sălcuța la 30.03.2023, cu valabilitate până la 31.12.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.03.2024, fiind formată din:

<u>Bacal Liliana</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Ciomîrtan Maria</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Țigaie Petru</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Focșa Victor</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Rudenco Boris</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Bagrin Alexei</u>	_____
(numele, prenumele)	
<u>Tabacaru Alexei</u>	_____
(numele, prenumele)	

**3. Au mai participat la recepție:**

<u>Cebotari Andrei</u>	_____	<u>executant</u>	_____
(numele, prenumele)		(calitatea)	
<u>Tabac Vadim</u>	_____	<u>reprezentant ONDRL</u>	_____
(numele, prenumele)		(calitatea)	
<u>Cazacu Maxim</u>	_____	<u>reprezentant IGSU</u>	_____
(numele, prenumele)		(calitatea)	
<u>Dumitrașcu Roman</u>	_____	<u>reprezentant IGSU</u>	_____
(numele, prenumele)		(calitatea)	

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

---

---

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

---

---

---

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De receptionat terminarea obiectului in suma de 2 442 375,32**  
**(doua milioane patru sute patruzeci si doi de mii trei sute saptezeci**  
**si cinci lei, 32 b.) MD, inclusiv TVA 488 475,063 (patru sute opt zeci**  
**si opt de mii patru sute saptezeci si cinci lei, 063 b.) lei MD**

---

---

---

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2721114005.02, adresa poștală str. Pavel Creangă 24A, sat. Sălcuța, r-nul Căușeni, destinația construcție socială, compus din următoarele construcții lățime – 26,20 m, lungime – 8,50 m, suprafața la sol 247 mp, suprafața totală, 247 mp, numărul de etaje P, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 26 martie 2024, la Sălcuța, în 3 (trei) exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: Bacal Liliana

Membri: Ciomîrtan Maria

(numele, prenumele, semnătura)

Țigaie Petru

(numele, prenumele, semnătura)

Focșa Victor

(numele, prenumele, semnătura)

Rudenco Boris

(numele, prenumele, semnătura)

Bagrin Alexei

(numele, prenumele, semnătura)

Tabacaru Alexei

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

Digitally signed by Bacal Liliana

Date: 2024.03.26 18:11:13 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Ciomirtan Maria

Date: 2024.03.26 18:15:21 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Bagrin Alexei

Date: 2024.03.26 18:16:17 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Tabacaru Alexei

Date: 2024.03.26 18:28:42 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Rudenco Boris

Date: 2024.03.26 18:37:41 EET

Reason: MoldSign Signature


Location: Moldova

Digitally signed by Focșa Victor

Date: 2024.04.03 09:11:12 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea **Reparatia capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifunctional-Cantină Socială, din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni**,este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

***SRL „Rosivid Construct”***

" 26 " martie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Digitally signed by Cebotari Andrei  
Date: 2024.03.29 12:30:42 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

**Primăria satului Sălcuța**

" 26 " martie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Digitally signed by Bacal Liliana  
Date: 2024.03.26 18:12:23 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





### Lista lucrărilor care nu au fost executate

1. De revăzut tot pavajul, îndeosebi joncțiunea între borduri și pavele, canalele de evacuare a apelor.
2. De revăzut toată teracota, mai ales în blocurile sanitare, baie și bucatărie.
3. De verificat calitatea lucrărilor de finisare, tencuiala de finisaj și vopsea, plinta pentru podea.
4. De verificat și corectat conexiunile la boilere și articolele sanitare.
5. De ajustat cu documentația de proiect montarea gurilor căminelor de vizitare.
6. De executat finisarea joncțiunilor între structura peretelui și pervaz, între structura peretelui și acoperiș.
7. De conectat ventilatorul în sala de studii.
8. De ajustat mobilierul urban cu actele normative.
9. De asigurat accesibilitatea blocurilor sanitare pentru persoanele cu dizabilități.
10. De prezentat argumentarea scrisă a autorului de proiect cu referire la necesitatea sau lipsa necesității instalării paratrăsnetului la acoperiș.
11. De prezentat rapoartele încercărilor de laborator la betonare, inclusiv contractul de colaborare cu laboratorul care a efectuat aceste încercări.
12. De prezentat contractul de subantrepriză cu executantul lucrărilor de ventilare.
13. De efectuat ridicarea topografică de control la rețele.

EXECUTANTUL:

***SRL „Rosivid Construct”***

" 26 " martie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

**Primaria satului Sălcuța**

" 26 " martie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

Digitally signed by Bacal Liliana  
Date: 2024.03.26 18:13:33 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova







REPUBLICA MOLDOVA  
PRIMĂRIA SĂLCUȚA RAIONUL CĂUȘENI

MD 4323, s. Sălcuța, r-ul Căușeni str. Pavel Creangă 33, tel/fax 0.243.41.1.84 primaria.salcuta@apl.gov.md

nr. 48  
din „06” aprilie 2024

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria satului Sălcuța confirmă faptul că SRL „Rosivid Construct” a realizat în anul 2023 lucrările de reparație în cadrul contractului de antrepriză nr. 13 din 20 februarie 2023, încheiat între SRL „Rosivid Construct” și Primăria satului Sălcuța pentru **„Reparația capitală la clădirea existentă pentru amplasarea unui Centru Multifuncțional Cantină Socială din sat. Sălcuța, r-nul Căușeni”** în suma de 2 442 375,32 (doua milioane patru sute patruzeci și doi de mii trei sute șaptezeci și cinci lei, 32 bani), inclusiv TVA 488,063 (patru sute optzeci și opt de mii patru sute șaptezeci și cinci lei, 063 bani).

Lucrările contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate în conformitate cu normele în vigoare, în termenii stabiliți, la nivelul calității corespunzător cerințelor impuse. Datorită profesionalismului colaboratorilor săi, SRL „Rosivid Construct” a oferit întodeauna suportul calitativ în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții, în vederea îndeplinirii calitative și în termeni cât mai restrânși a lucrărilor încredințate.

Pe parcursul desfășurării contractelor, nu au avut loc accidente tehnice și nu au fost depistate neconformități față de normele de execuție.

În concluzie, recomandăm compania SRL “Rosivid Construct”, ca fiind un antreprenor profesionist și de încredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra și apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitate oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Primar

Digitally signed by Bacal Liliana  
Date: 2024.04.06 16:31:21 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Bacal Liliana



**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului

**1. Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

**2. Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA” IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

2. Numărul și data contractului **Nr. 50, din 06.iunie.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

**IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”,**

4. Adresa beneficiarului **R. Moldova,**  
**or. Drochia bd. N.Testemițanu, 4/1**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:

a) inițială- **877 604,16 lei**

b) finală-**902002,69 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată- **Pina la 15.12.2022**

b) efectiv realizată- **Obiectul s-a realizat pina pe data de 15.12.2022**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Obiectul s-a realizat in termen.**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Proces Verbal №1, din data 21.09.2022-(292 064.06 lei)**

**Proces Verbal №2, din data 15.12.2022-(609 938,63 lei)**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu au fost.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: acoperis din tabla amprentată tip debont, sisteme de jgheaburi, sisteme de burlane, lucrări de finisari, etc.

Data completării: **18.09.2024**

Semnat:

Nume: **Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Rosivid Construct”**

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL  
REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ  
PUBLICĂ

CENTRUL DE SĂNĂTATE  
DROCHIA  
"Anatolie Manziuc"



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ  
УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ  
ДРОКИЯ  
«Анатолий Манзюк»

MD - 5202, or. Drochia, bd N. Testemițeanu 4/1  
tel/fax. +373-252-2-27-88; 2-68-08  
e-mail: cs.drochia@ms.md

MD - 5202, or. Drochia, bd. N. Testemițeanu 4/1  
tel/fax. +373-252-2-27-88; 2-68-08  
e-mail: cs.drochia@ms.md

«13» 02 20 23 № 39



## POTENȚIALILOR PARTENERI AI COMPANIEI SRL ROSIVID CONSTRUCT

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Autoritatea contractantă **IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**, cu sediul în or. Drochia bd. N.Testemițanu, 4/1 tel/fax : 0 252 2-27-88 anticamera /2-68-08 șef CS, reprezentat prin Emilia Lopatenco, șefă CS, în calitate de Beneficiar, în cadrul contractului de antrepriză nr.50 din 06.06.2022, încheiat cu operatorul economic: **SRL Rosivid Construct**, cu sediul în or. Chișinău, str.27 martie 1918 nr. 3 of 3a, telefon: 0 69259421, IDNO 1015600024953 reprezentat prin administrator Cebotari Andrei în calitate de Antreprenor, obiectului căruia a reprezentat:

#### LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR:

1. Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”
2. Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA” IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

în valoare de 877 604,16 lei (opt sute șapte zeci și șapte mii șase sute patru lei 16 bani) MD, inclusiv 146 267,36 lei TVA, relatează următoarele:

- Lucrarile contractate cu antreprenorul nominalizat au fost executate in conformitate cu normele in vigoare, în corespundere cu devizurile aprobate, in termenii stabiliti, la nivelul calitatii corespunzator cerintelor impuse. Datorita profesionalismului colaboratorilor săi, SRL “Rosivid Construct” a oferit intodeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii, in vederea indeplinirii calitative si in termeni cit mai restrinsi a lucrarilor incredintate.
- Pe parcursul desfasurarii lucrărilor, nu au avut loc de accidente tehnice si nu au fost depistate neconformități cu normele de executie. Au fost executate calitativ lucrările contractate, în corespundere cu documentația aprobată, a caietului de sarcini și conlucrarea între Beneficiar și Antreprenor a fost foarte eficientă.

In concluzie, recomandăm compania SRL “Rosivid Construct”, ca fiind un antreprenor profesionist si de incredere pentru orice beneficiar, cu care va conlucra si apreciem serviciile sale de calitate si flexibilitate oferite, care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.




Șefă a IMSP Centrul de Sănătate  
Drochia „A. Manziuc”


Emilia Lopatenco


Comisia de recepție:


Președintele comisiei:


Membrii Comisiei:

  
\_\_\_\_\_  
LOPATENCO EMILIA

  
\_\_\_\_\_  
PASCARU ANA

  
\_\_\_\_\_  
DINA CABAC

  
\_\_\_\_\_  
CALPAGIU NINA

  
\_\_\_\_\_  
ROTARI VICTOR

Lucrarea "LUCRĂRI de reparație și renovare a birourilor Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL Rosivid Construct

„A.Manziuc”

CEBOTARI ANDREI

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

IMSP Centrul de Sănătate Drochia

LOPATENCO EMILIA

15 decembrie 2022

15 decembrie 2022



Re sp. tehnic



KALINOVSCII NICOLAE

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 02 din „, 15 decembrie 2022

Documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată,  
au lipsit sau sînt incomplete piesele

[Large handwritten signature in blue ink]

EXECUTANTUL:

SRL Rosivid Construct

Ce botari Andrei



INVESTITORUL:

IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

Emilia Lopatenco



Responsabil tehnic:


L.Ș. Kalinovski Nicolai



la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 02 din „ 15 decembrie 2022

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică care  
nu au fost executate**

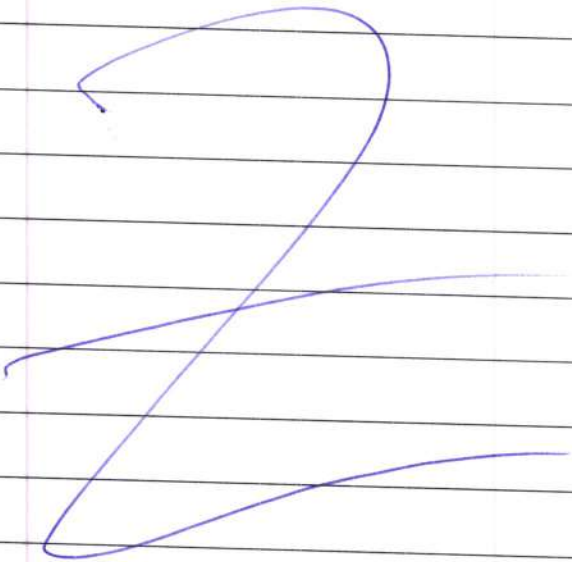

EXECUTANTUL:

**SRL Rosivid Construct**

**Cebotari Andrei**

  
15 decembrie 2022  
L.S.  


INVESTITORUL:

**IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

**Emilia Lopatenco**

  
15 decembrie 2022  
L.S.  


Responsabil tehnic:

L.S.

**Kalinovski Nicolai**




Drochia

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.50**  
**privind achiziția prin CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI**

„16” iunie 2022

or. Drochia  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1548731139378, Mtender din data 19.04.2022, între autoritatea contractantă:

**IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**, cu sediul în or. Drochia bd. N.Testemițanu, 4/1 tel/fax : 0 252 2-27-88 anticamera /2-68-08 șef CS, IDNO 1008600001156 reprezentat prin Emilia Lopatenco, șef CS, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și operatorul economic:

**SRL Rosivid Construct** , cu sediul în or. Chișinău, str.27 martie 1918 nr. 3 of 3a, telefon: 0 60259421, IDNO 1015600024953 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049664 din „21”08 2015, eliberată de Camera de licențiere, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții inginerești, reprezentat prin administrator Cebotari Andrei în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările **LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR:**

1. **Sectiei asistență cu medicamente și dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**
2. **Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA” IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de:

- **Lotul 1 - LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Sectiei asistență cu medicamente și dispozitive medicale – 3 luni calendaristice din data aprobării contractului și primirii ordonanței de începere a lucrărilor**
- **Lotul 2 - LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA” – 2 luni calendaristice din data aprobării contractului și primirii ordonanței de începere a lucrărilor**

și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform Anexa nr.10 la Documentația Standard și specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:



- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **2 (doi) ani din data recepției finale a lucrărilor (pentru fiecare din loturile contractate).**

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **877 604,16 lei (opt sute șapte zeci și șapte mii șase sute patru lei 16 bani) MD**, inclusiv **146 267,36 lei IVA lei MD**.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 01 din 21 septembrie 2022

privind lucrarea **LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA”a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

executată la obiectul: „ **LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA”a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”** este executat în cadrul contractului nr.50 din „06” iunie 2022, încheiat între IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc” și SRL Rosivid Construct pentru **LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR Cabinetului de sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA”a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Caietul de sarcini și Devizului-ofertă prezentat în modul prevăzut de Legislație, cu respectarea cerințelor tehnice în vigoare.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 21 septembrie 2022, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

LOPATENCO EMILIA - sef IMSP CS Drochia;

**Membrii Comisiei:**

PASCARU ANA

- șefă-adjunctă Direcție, șefă Secția construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia, reprezentantul Fondatorului;

DINA CABAC jurist IMSP CS Drochia

CALPAGIU NINA contabil IMSP CS Drochia

ROTARI VICTOR agent de aprovizionari IMSP CS Drochia

3. Au mai participat la recepție:

CEBOTARI ANDREI Antreprenor, director SRL Rosivid Construct

KALINOVSCII NICOLAE Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

*De recepționat terminarea lucrărilor*

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*De recepționat terminarea lucrărilor*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*De recepționat terminarea lucrărilor*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*De recepționat terminarea obiectului în sumă de 292 064,06 lei (două sute nouă zeci și două mii șase zeci și patru lei 06 bani) lei MD*

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 21 septembrie 2022 în 3 (trei) exemplare.

Comisia de receptie:

Președintele comisiei:

Membrii Comisiei:

  
\_\_\_\_\_  
LOPATENCO EMILIA

  
\_\_\_\_\_  
PASCARU ANA

  
\_\_\_\_\_  
DINA CABAC

  
\_\_\_\_\_  
CALPAGIU NINA

  
\_\_\_\_\_  
ROTARI VICTOR

Resp. tehnic   
\_\_\_\_\_  
KALINOVSCII NICOLAE

Lucrarea „**LUCRĂRI DE REPARAȚIE ȘI RENOVARE A BIROURILOR** Cabinetului de  
sănătate a reproducerii și planificării familiei „ANA”a IMSP Centrul de Sănătate Drochia  
„A.Manziuc”,  
este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
**SRL Rosivid Construct**  
**„A.Manziuc”**  
CEBOTARI ANDREI

  
\_\_\_\_\_  
„21” septembrie 2022  
  
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
S.R.L.  
IDNO 1015600024953

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
**IMSP Centrul de Sănătate Drochia**

LOPATENCO EMILIA

  
\_\_\_\_\_  
„21” septembrie 2022  
  
CENTRUL DE SANĂTATE DROCHIA  
ANATOLIE MANZIUC  
L.S.  
IDNO 1008600001158  
REPUBLICA MOLDOVA



la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din "21" septembrie 2022

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică care  
nu au fost executate**

A large blue scribble is present over the list of items, indicating that no items were recorded as unexecuted.

EXECUTANTUL:

**SRL Rosivid Construct**

**Cebotari Andrei**



INVESTITORUL:

**IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

**Emilia Lopatenco**



Responsabil tehnic:

**L.S. Kalinovski Nicolai**



la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din "21" septembrie 2022

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

EXECUTANTUL:

**SRL Rosivid Construct**

**Cebotari Andrei**



INVESTITORUL:

**IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”**

**Emilia Lopatenco**



Responsabil tehnic:

**L.Ș. Kalinovski Nicolai**



Investitor: IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 02 din 15 decembrie 2022

privind lucrarea *de reparație și renovare a birourilor Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”* executată la obiectul: *Secția asistență cu medicamente și dispozitive medicale a IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”* este executată în cadrul contractului nr.50 din „06” iunie 2022, încheiat între IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc” și SRL Rosivid Construct pentru *LUCRĂRI de reparație și renovare a birourilor Secției asistență cu medicamente și dispozitive medicale IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”*

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Caietul de sarcini și Devizului-ofertă prezentat în modul prevăzut de Legislație, cu respectarea cerințelor tehnice în vigoare.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 15 decembrie 2022, fiind formată din:

### **Președintele comisiei:**

LOPATENCO EMILIA – șefă a IMSP CS Drochia;

### **Membrii Comisiei:**

FASCARU ANA

- șefă-adjunctă Direcție, șefă Secția construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia, reprezentantul Fondatorului;

EINA CABAC juristă IMSP CS Drochia

CALPAGIU NINA contabilă IMSP CS Drochia

ROTARI VICTOR agent de aprovizionari IMSP CS Drochia

3. Au mai participat la recepție:

CEBOTARI ANDREI Antreprenor, director SRL Rosivid Construct

KALINOVSCHEI NICOLAE Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

*De recepționat terminarea lucrărilor*

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*De recepționat terminarea lucrărilor*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*De recepționat terminarea lucrărilor*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*De recepționat terminarea obiectului în sumă de 609 938,63 lei (șase sute nouă mii nouă sute trei zeci și opt lei 63 bani) lei MD*

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 15 decembrie 2022 în 3 (trei) exemplare.

## ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de \_\_\_\_\_ 2020 între **Primăria s. Sărata Nouă, r-nul Leova**, reprezentată de **Tatiana Gorgos, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Sărata Nouă, r-nul Leova**, reprezentată de **Maria Tanurcova, președinte** (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și **compania "ROSIVID CONSTRUCT" S.R.L.**, cu adresa: **mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918 nr.3 of. 3A**, reprezentată de **Cebotari Andrei, director** (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-12073-RO4, "Lucrari civile la gradinita de copii" din s. Sărata Nouă, r-nul Leova** (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **536 087,19 lei (cinci sute treizeci și șase mii optzeci și șapte lei 19 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

**În cele ce urmează Părțile au căzut de acord** privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
  - i. Acordul Contractual,
  - ii. Scrisoarea de acceptare,
  - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
  - iv. Condițiile speciale ale contractului,
  - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
  - vi. Specificațiile,
  - vii. Desenele tehnice,
  - viii. Devizul de cheltuieli,
  - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
  - x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.



4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:

  
Tatiana Gorgos, primar

Primăria s. Sărata Nouă, r-nul Leova  
Adresa: s. Sărata Nouă, r-nul Leova  
Tel. 068101666

Email

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:

  
Cebotari Andrei, director

Compania: "ROSIVID CONSTRUCT" S.R.L.  
Adresa: mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918 nr.3  
of. 3A  
Tel. 069259421

Email

Codul IBAN: MD240TRPDBAS1120A06678AC

Banca plătitoare: Trezoreria de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1007601004087


Codul IBAN: MD22 MD2224ASV40273557100

Banca beneficiară: BC „MOBIASBANCA-OTP GROUP SA

Codul băncii: MOBBMD22


Codul fiscal: 101560002495

Semnat de:

  
Maria Tanurcova, președinte

Agenția de Implementare a sub-proiectului  
din s. Sărata Nouă, r-nul Leova

În prezența:

  
Dl. Iurie Chiorescu, director,  
IP, Fondul de Investiții Sociale din Moldova



**Acord Adițional Nr. 1  
la contractul nr. IFB-W-12073-RO4  
semnat la 28 septembrie 2020**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Sărata Nouă, r-nul Leova, de comun cu compania de construcții "ROSIVID CONSTRUCT" S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 04 decembrie 2020**, privind modificarea devizului de lucru și extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12073-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4412 „**Lucrari civile la gradinita de copii**” din s. Sărata Nouă, r-nul Leova, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-12073-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrari civile la gradinita de copii**” din s. Sărata Nouă, r-nul Leova, după cum urmează:
  - Se exclud lucrări în sumă de **0,00 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **1 500,94 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **226 169,93 lei** – la prețuri curente;
  - Estimarea modificării totale: **(plus) 227 670,87 lei**, ce constituie 42,47 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 27 noiembrie 2020 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12073-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrari civile la gradinita de copii**” din s. Sărata Nouă, r-nul Leova, data finalizării lucrărilor considerînd-o **28 martie 2021**.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. Semnat la data de \_\_\_\_\_.



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

**Liiana Gorgos, Primar,**  
Primăria s. Sărata Nouă, r-nul Leova

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

**Maria Tanurcova, Președinte,**  
Agenția de Implementare a SP,  
s. Sărata Nouă, r-nul Leova

**CONTRACTOR:**



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

**Cebotari Andrei, Director,**  
"ROSIVID CONSTRUCT" S.R.L.


**IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.**

**Acord Adițional Nr. 2  
la contractul nr. IFB-W-12073-RO4  
semnat la 28 septembrie 2020**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Sărata Nouă, r-nul Leova, de comun cu compania de construcții "ROSIDVID CONSTRUCT" S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 26 martie 2021**, privind extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12073-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4412 „**Lucrari civile la gradinita de copii**” din s. Sărata Nouă, r-nul Leova, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12073-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrari civile la gradinita de copii**” din s. Sărata Nouă, r-nul Leova, data finalizării lucrărilor considerînd-o **15 mai 2021**.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnat la data de \_\_\_\_\_.

**BENEFICIAR:**


  
Tatiana Gorgos, Primar,  
Primăria s. Sărata Nouă, r-nul Leova



**CONTRACTOR:**

  
Cebotari Andrei, Director,  
"ROSIDVID CONSTRUCT" S.R.L.



  
Maria Tanurecova, Președinte,  
Agenția de Implementare a SP,  
s. Sărata Nouă, r-nul Leova



**IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.**

**Acord Adițional Nr. 3  
la contractul nr. IFB-W-12073-RO4  
semnat la 28 septembrie 2020**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din s. Sărata Nouă, r-nul Leova, de comun cu compania de construcții "ROSIVID CONSTRUCT" S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 14 mai 2021, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-12073-RO4 în cadrul implementării SP nr. 4412 „**Lucrări civile la gradinita de copii**” din s. Sărata Nouă, r-nul Leova, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-12073-RO4 în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la gradinita de copii**” din s. Sărata Nouă, r-nul Leova, după cum urmează:
  - Se exclud lucrări în sumă de **0,00 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **30 334,83 lei** – la prețuri inițiale;
  - Se includ lucrări în sumă de **0,00 lei** – la prețuri curente;
  - Estimarea modificării totale: (**plus**) **30 334,83 lei**, ce constituie 5,66 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 26 mai 2021 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de 14.05.2021.

**BENEFICIAR:**

Tatiana Gorgos, Primar,  
Primăria s. Sărata Nouă, r-nul Leova



**CONTRACTOR:**

Andrei Cebotari, Director,  
"ROSIVID CONSTRUCT" S.R.L.



Maria Tanurcova, Președinte,  
Agenția de Implementare a SP,  
s. Sărata Nouă, r-nul Leova

**IMPORTANT:** Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

*Conto.*  
**CEREREA DE EFECTUARE A PLATILOR (CEP)**

Conform RLE la SP Nr

4412 Sub-componentul 1.2

Contractul Nr	IFB-W-12073-RO4	din	28/09/2020
Cererea Nr	3	din	15/05/2021

**Contractorul** ROSIVID CONSTRUCT S.R.L.  
mun. Chisinau, str. 27 Martie 1918, of. 3A

**Cod fiscal** 1015600024953

**Rechizite** IBAN MD22MO2224ASV40279557100  
Banca: Mobiasbanca OTP Group

MOBBMD22

**Costul contractului**

Lei

**Date despre subproiect**

1. Costul initial al contractului	536087.19
2. Modificari in costul contractului (conform ordinelor de mod.)	258005.70
3. Costul contractului la data CEP (avunati 1+2)	794092.89

Agentia de implementare	
Denumirea SP 4412	Lucrari civile la gradinita de copii
Localitatea	Sărata Nouă Leova

**Certificarea lucrarilor executate**

5. Suma executata pe actele precedente	794089.42
6. Suma calculata pe act Lei	39704.47

**Date despre anexe si suplimente**

La contract - 3	La buget - 2
Nr 1 din 14/12/2020	Nr 1 din 27/11/2020
Nr 2 din 06/04/2021	Nr 2 din 26/05/2021
Nr 3 din 29/06/2021	

Avans platit, lei 0.00 raman neplatit 0.00

**DEDUCERI/ (pe act si cumulative, fara devauare)**

**Rambursari**

Pe act, Lei Cumul., Lei

9	Garantia de buna executie a contractului		
10	Penalitati pentru retinere (randul 17)		
11	Suma dupa deductii	39704.47	

**CALCULUL PLATILOR (fara devauare)**

Lei

13	Plata curenta		39704.47
13a	Cursul leului la data semnarii contractului		1.0000
13b	Suma 13 in valuta MDL la rata 13a		39704.47
		Cumulativ	Pe act
13d	ajustare avans valuta	0.00	0.00

**Verificari si coordonari**

Semnatura

Specia list MTLC

Sef D:MT

20	Suma care urmeaza a fi platita in MDL		39704.47
21	Cursul leului din data		0.0000
22	Plata curenta recalculata la cursul din data transferului		
25	Diferenta de curs 22 -- 13		
26a	Sursa FISM		0.00
26b	Suma ramasa a contributiei in bani		62846.93
	cod	sursa	procent
31	0		0.0000
32	0		0.0000
33	0		0.0000
34	0		0.0000
			total p/u verif
			0.00

Transfer bancar	numele	semnatura	data
Suma		0.00	
Casier	numele	semnatura	data
Dispozitia de Plata Nr		din	//

**Inregistrat de CDCT**

Tiparit la 05/07/2021 10:05:26 Aprobata la // ..

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 14-05-2021

privind lucrarea Lucrări civile la grădinița de copii executată în cadrul  
contractului nr. IFB-W-12073-R04 din 18.09 2020 încheiat între Primăria  
Sarai Nouă și AI pentru lucrările de reparație a Lucrări civile la grădinița de copii

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de Primăria  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ 2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu  
11.00 2020 fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Primarul Lorgas Tatiana

**Membrii Comisiei:**

Președintele AI Tanurcova Maria

Consultant FISM Piobanu Stanislav

Responsabil tehnic Antoniu Viitor

Contabilul Primăriei Cernenchi Valentina

3. Au mai participat la recepție:

Cebotari A director \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_ diriginte de șantier  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele Comisiei**

Primarul

*Georgos*

*Tatiana*

**Membrii Comisiei:**

Președintele AI

*Tarnucova*

*Maria*

Consultant FISM

*Ciobanu*

*Stanislav*

Responsabil tehnic

*Antoni*

*Victor*

Contabilul Primariei

*Coenenchi*

*Valentina*

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " \_\_\_\_\_ " este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.

De chibuit resturile, de scos brățara

  
Primarul  
Președintele Agenției  
Inspector Local

  
Grădinița de  
Copii  
Sponsabil Tehnic



Lista lucrărilor cuprinse în Documentatia Tehnică ce n-au fost executate.

---

*[Large handwritten signature in blue ink]*



Primarul

*[Handwritten signature in blue ink]*

Președintele Agenției



Inspector Local

*[Handwritten signature in blue ink]*



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

---

*[Large handwritten signature in blue ink]*

**Primarul**  
**Președintele Agenției**

**Inspector Local**

