



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45233141-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 04/02 - 02/344 privind achiziția prin licitație publică

"11" noiembrie 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1726127232889 din 03.10.2024, între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a, MD-2004, tel. 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, , reprezentată prin directorul executiv, **dl Ștefan POPA**, care acționează în baza ordinului nr. 288 din 04.12.2023, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **"Dromas-Cons" S.R.L** cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD2069, IDNO 1003600107905, reprezentată de administratorul, **dl Dacin Piotr**, în calitate de *Antreprenor* general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G50 Florești – Nicolaevca – Sîngerei km 32,70-41,00, amplasat teritorial în raionul Sîngerei**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, respectând prevederile actelor normative, standarde și prescripții tehnice din domeniul construcțiilor, precum și cu respectarea graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul contract.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate – **11 luni calendaristice** din momentul încheierii contractului, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Notificarea trebuie să fie avizată de către responsabilul tehnic. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare (remedierea obiectivelor) și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – **1 (unu) an** de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, constituie **36 645 292,37 (treizeci și șase milioane șase sute patruzeci și cinci mii două sute nouăzeci și doi lei, 37 bani) lei**, inclusiv **6 107 548,73 lei (șase milioane una sută șapte mii cinci sute patruzeci și opt lei, 73 bani) TVA**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate terminate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenii stabiliți în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.2. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.3. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.7. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.8. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.9. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

- 4.10. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.11. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.12. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.13. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.14. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.15. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar aceasta nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.16. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.17. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.18. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.19. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.20. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.21. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.22. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.23. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să adune și să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii, și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.
- 4.24. Antreprenorul general răspunde de îndeplinirea următoarei obligații principale referitoare la calitatea construcției: remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuție, cât și în termenul de garanție postrecepție de 1 an.

4.25. Antreprenorul general răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite în termenul de garanție postrecepție de 1 an, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție în vigoare la data realizării ei.

4.26. În cazul în care Antreprenorul general va fi vinovat de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa atât pe perioada de execuție, cât și în termenul de garanție postrecepție de 1 an.

4.27. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract de achiziție nu se supune ajustării valorii contractului.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul este obligat să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul, ori de câte ori astfel de lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în acest caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **1 (unu) an** de la data recepției la terminarea lucrărilor.

9.2. Perioada de garanție începe de la data la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va fixa data începerii recepției cantitative și calitative a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **recepția finală a lucrărilor**.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1.1. Antreprenorul va executa lucrările în limita mijloacelor financiare alocate anual.

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor-verbale de recepția a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.9.1. din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defectunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

3.6.3. Procesul - verbal de recepție finală a lucrărilor constituie dovada executării integrale a contractului de achiziție publică.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1.1. Antreprenorul are obligația de a efectua ridicarea topografică și elabora schița de proiect cu profile transversale și longitudinale a părții carosabile. Schița de proiect trebuie să fie elaborată de către un proiectant atestat. Profilele transversale și longitudinale a părții carosabile, vor fi vizate de către Beneficiar.

4.8.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin garanție bancară, valabilă pînă la executarea integrală a contractului, care include perioada de execuție a lucrărilor și perioada de garanție a lucrărilor.

4.8.2 Forma garanției de bună execuție a contractului poate fi înlocuită cu transfer pe contul autorității contractante, în același cuantum stipulat în pct. 4.10.1, cu acordul scris al beneficiarului.

4.9.1 Beneficiarul returnează garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului în termen de 21 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de recepție finală, dacă nu a ridicat pînă la acea dată pretenții asupra ei.

4.9.2 În cazul în care Beneficiarul a invocat pretenții asupra garanției de bună execuție, aceasta va fi returnată în același termen prevăzut în pct. 4.9.1 calculat din momentul soluționării pretențiilor pe cale amiabilă sau din data rămînerii definitive a hotărârii judecătorești.

4.28. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.29. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cît mai urgent, orice obstacol aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stînjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

4.30. Antreprenorul are obligația de a proteja lucrările executate pe toată perioada execuției lucrărilor. În cazul apariției degradărilor la lucrările executate anterior, Antreprenorul le va remedia din cont propriu.

4.31. Antreprenorul are deplina responsabilitate a organizării lucrărilor, conform metodologiei proprii de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.32. Antreprenorul are obligația de a prezenta Beneficiarului, la sfîrșitul fiecărei luni, graficul de plăți pentru luna viitoare, necesare execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.33. Antreprenorul are obligația de a procura și întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului la trafic.

4.34. În cazul în care se produc deteriorări ale infrastructurii rutiere conexe, care se află în proximitatea șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altor asemenea, Antreprenorul are obligația de a despăgubi proprietarul împotriva tuturor deteriorărilor atestate.

4.35. Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție a lucrărilor, inclusiv la cererea Beneficiarului va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție prezentate pe parcursul executării contractului, sunt parte integrantă a contractului.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la pct. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualele noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

6.3.3. Beneficiarul nu va recepționa și achita lucrările care au fost executate cu încălcarea pct.6.3.1, 6.3.2.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform proiectului de execuție, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor, Antreprenorul se obligă să organizeze și să asigure siguranța circulației rutiere pe segmentul de racordare a șantierului cu drumul public, în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și respectarea tuturor măsurilor de siguranță rutieră.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit termenului limită de execuție.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată spre achitare de Antreprenor.

10.9.5. În cazul rezoluțiunii contractului din motivele indicate în pct.12.2 lit.a) – g) din Contract, Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11.1. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contract și/sau documentele normative în vigoare, lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, precum și defectele calitative apărute din vina acestuia, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Operatorul economic a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 de zile, potrivit pct. 10.9.5. al Condițiilor Speciale ale Contractului.

g) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

2.7.d) constatarea prezentării garanției de bună execuție nu în forma cuantumului și/sau termenului prevăzut de autoritatea contractantă.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
13.3. Orice comunicare între părți, referitor la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele de contact oficiale ale părților.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

I.B. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucurei, 12a

e-mail: cancelaria@asd.md

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director executiv

Stefan POPA



Antreprenor general

S.R.L. „Dromas- Cons”

MD2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1

e-mail: dromascons.srl@gmail.com

c/f 1003600107905

c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100

OTP BANK S.A. Sucursala «Corporate»

c/b MOBBMD22

c/TVA 0604780


Director

Piotr DACIN





Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.11.04 14:09:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

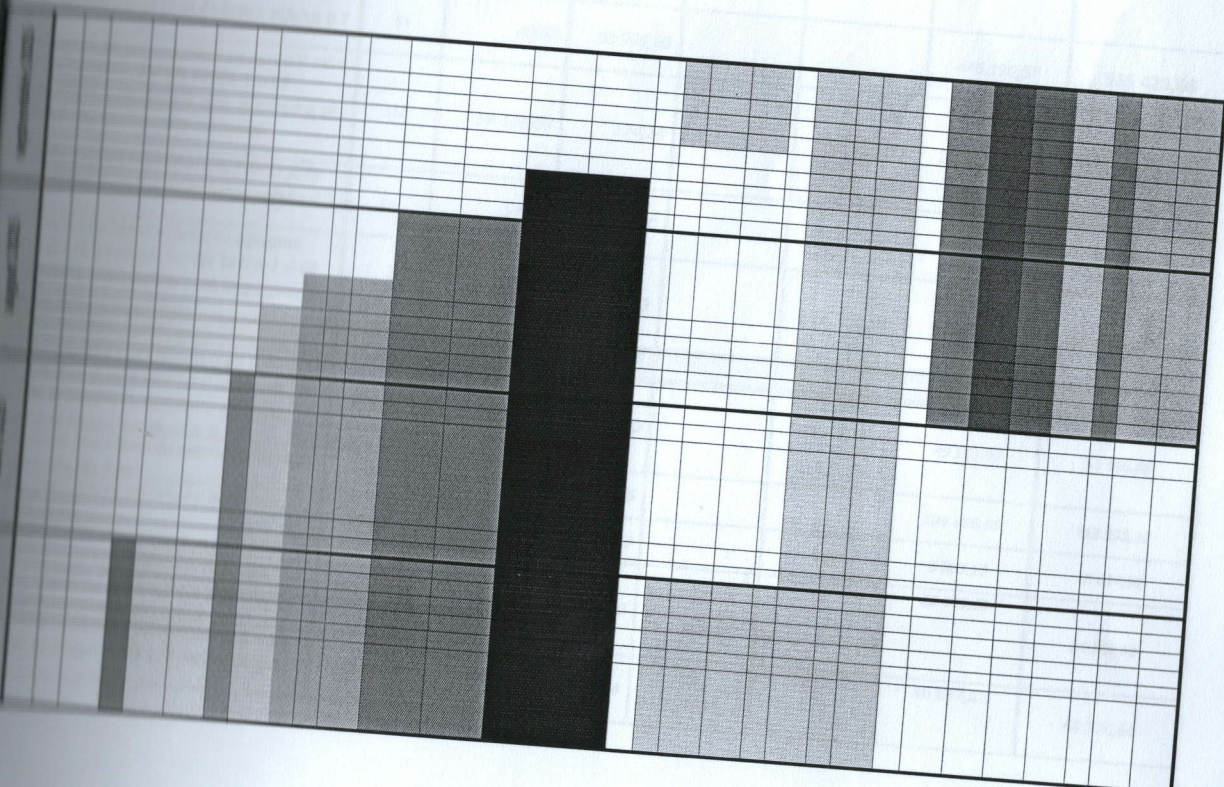

Fără TVA	Cu TVA
30 537 743,64	36 645 292,37

Contract nr. G50 Floresti-Nicolaevca-Sîngerei km 32,7-41,00, amplasat teritorial în raionul Sîngerei				Pret UM	Pret UM	Pret fără TVA	Pret cu TVA
	u.m.	Cantitate	Pret UM		man	directe	TOTAL
Capitolul 1. Construcția drumului							
1.1. Partea carosabila						36 428,70	43 714,44
Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	581,00	62,70			45 596,88	54 716,26
Incarcarea asfaltului frezat in auto (or Sîngerei Str Independentii)	100m3	46,48	981,00			181 260,00	217 512,00
Transportarea asfaltului frezati cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (se indica pretulla transport, pret material 0)	tn	6 042,00	30,00			24 309,04	29 170,85
Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	m3	4 648,00	5,23		194 518,80	2 547 528,13	3 057 033,76
Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=5cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)	100m2	581,00	4 384,73				
Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=58100m.p.: h=0,20 m: V=11620m.c.)	100m3	116,20	24 654,00		8 017,80	2 864 794,80	3 437 753,76
Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	1 743,00	61,20			106 671,60	128 005,92
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	581,00	71,25			41 396,25	49 675,50
Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint corespunzator	100m3	581,00	1 459,40			847 911,40	1 017 493,68
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	tn	40,67	10 971,00			446 190,57	535 428,68
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	58 100,00	174,24		209 160,00	10 123 344,00	12 148 012,80
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	tn	17,43	10 971,00			191 224,53	229 469,44
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2	58 100,00	158,73		174 300,00	9 222 213,00	11 066 655,60
1.2. Acostamente și rigole							
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren categoria II	100m3	55,00	893,80			49 159,00	58 990,80
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	tn	8 200,00	16,66			136 616,10	163 939,32
Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100m3	55,00	161,13		990	8 862,15	10 634,58
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren categoria II	100m3	32,00	893,80			28 601,60	34 321,92
Compactarea rambleului pamint de cot.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100m3	55,00	739,04			40 647,20	48 776,64

Nivelarea cu autogreder de pînă la 125 C.P. a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren	100m ²	166,00	71,25		11 827,50	14 193,00
Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 conform SM SR EN 12620+A1:2010)	m ²	16 600,00	43,47	49 780,41	721 594,69	865 913,63
1.3. Siguranță						
Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial	buc	36,00	848,82	2 765,45	30 557,45	36 668,94
Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră din tablă din oțel sau aluminiu pe un stîlp așezat pe plantă	buc	36,00	998,99	1 224,43	35 963,71	43 156,45
Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m ²	550,00	74,41	1 360,48	40 924,18	49 109,02
Stîlpi din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere, conținînd stîlp comălet	buc	240,00	151,18	9 403,20	36 283,20	43 539,84
Montarea parapetului metalic la drum	m	36,00	827,31	749,23	29 783,05	35 739,66
Instalarea armăturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	tn	0,43	22 808,23	992,54	9 807,54	11 769,05
Fundații monolite din beton B20 la edificii artificiale	m ³	12,00	2 256,73	3 621,29	27 080,73	32 496,88



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1726127232889
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 07/02-02/377 din 11.11.2024

“20” august 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, în persoana directorului adjunct, dl Roman GAVRILUȚA, care acționează în baza ordinului nr.125 din 07.07.2025 și SC „Dromas-Cons” S.R.L., reprezentat prin directorul, dl Piotr DACIN care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 07/02-02/377 din 11.11.2024 în vederea achiziționării „*Lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G50 Florești – Nicolaevca – Sîngerei km 32,70-41,00, amplasat teritorial în raionul Sîngerei*”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1726127232889-1 din 15.08.2025 a ședinței grupului de lucru al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „*Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată*”, subpunct 3.1. se completează cu următorul subpunct:

„3.1.1. Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 177 220,80 (*una sută șaptezeci și șapte mii două sute douăzeci lei, 80 bani*) lei, inclusiv TVA, conform devizelor din data de 03.07.2025, anexate la prezentul Acord Adițional”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

e-mail: cancelaria@andsa.md

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director adjunct

Roman GAVRILUȚA



Antreprenor general

S.R.L. „Dromas- Cons”

MD2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1

e-mail: dromascons.srl@gmail.com

c/f 1003600107905, TVA 0604780

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

BC „Moldindconbank” S.A., sucursala

„Ștefan cel Mare”

c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director

Piotr DACIN





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1726127232889
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr. 07/02-02/377 din 11.11.2024

“ 08 ” decembrie 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Ștefan POPA, care acționează în baza statutului și SC „Dromas-Cons” și S.R.L., reprezentat prin directorul, dl Piotr DACIN care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 07/02-02/377 din 11.11.2024 în vederea achiziționării „Lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G50 Florești – Nicolaevca – Sîngerei km 32,70-41,00, amplasat teritorial în raionul Sîngerei”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1726127232889-2 din 01.12.2025 a ședinței grupului de lucru al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, modificat anterior prin acordul adițional nr. 1 din 20.08.2025, se completează cu următorul subpunct:

„3.1.2. Valoarea lucrărilor excluse constituie 37 893,60 (treizeci și șapte de mii opt sute nouăzeci și trei lei, 60 bani) lei, inclusiv TVA, conform devizelor din data de 01.12.2025, anexate la prezentul Acord Adițional”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

Beneficiar

S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

e-mail: cancelaria@andsa.md
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Ștefan POPA



Antreprenor general

S.R.L. „Dromas- Cons”
MD2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1

e-mail: dromascons.srl@gmail.com
c/f 1003600107905, TVA 0604780
c/ IBAN MD84ML000000002251034166
BC „Moldindconbank” S.A., sucursala „Ștefan cel Mare”
c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director
Piotr DACIN



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.91 din 12.12.2025

Obiectivul „Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere a drumului G50 – Florești – Nicolaevca – Sîngerei, km 32,7-41,00, amplasat teritorial în raionul Sîngerei, este executat în cadrul contractului nr.07/02-02/377 din 11 noiembrie 2024, fiind finanțat din contul mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.328 din 06.06.2025.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcini executat de către beneficiar.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 12.12.2025, fiind formată din:

Președinte: Dumitru CALIN - șef direcție siguranță și întreținerea construcției rutiere S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Membri:

Artur CIOBANU - șef direcție tehnică și calitate, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Serghei MANTUC - șef serviciu recepție lucrări rutiere S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Petru CANIBOLOȚCHI - șef serviciu supraveghere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Grigore PARVAN - șef serviciu siguranța rutieră, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Artur IAZINSCHII - consultant serviciul drumuri, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Gheorghe PLEȘCA - diriginte de șantier, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;

Igor POPUȘOI - șef sector Sîngerei, S.A. „Drumuri Bălți”;

Serghei JURAVET - director, S.A. „Drumuri Bălți”;

3. La recepția finală au mai participat:
executantul:

Piotr DACIN - director, S.R.L. „Dromas - Cons”;

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Lucrările de reparație a îmbrăcăminții rutiere executate pe sectorul dat au fost executate cu scopul ajustării elementelor geometrice ale drumului la categoria tehnică a drumurilor regionale. Programul de lucrări executate este conform Anexei nr. 1 a H.G. nr.328 din 06.06.2025.

Pe sectorul de drum menționat s-au executat următoarele lucrări principale:

- 1) Scarificarea și profilarea drumului existent;
- 2) Adăugarea materialului nou, reciclarea stratului din piatră spartă cu ciment.
- 3) Amenajarea stratului de egalizare din mixtură asfaltică H med – 5 cm.
- 4) Amenajarea stratului de uzură din mixtură asfaltică H – 4 cm.
- 5) Asigurarea siguranței circulației rutiere.

5. Valoarea obiectivului este de **36 784 549,20 lei**.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

Recepționarea obiectivului cu obiecții.

7. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Prezența obiecțiilor în timpul recepției la terminarea lucrărilor, și anume:

- 1) Terasamentul rambleului are panta inversă și nu permite evacuarea eficientă a apelor pluviale de pe partea carosabilă;
- 2) Pe unele segmente acostamentele consolidate din piatră spartă sunt cu pantă inversă și afânate;
- 3) Prezența fisurilor longitudinale pe suprafața îmbrăcămintei rutiere;
- 4) Lipsește etichetarea indicatoarelor rutiere, conform standardelor EN;
- 5) Neconcordanță de aplicare a marcajului rutier în ansamblu cu indicatoarele rutiere.

8. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Înlăturarea obiecțiilor în termen de 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor și anume următoarele obiecții:

- 1) Profilarea și compactarea terasamentului;
- 2) Profilarea și compactarea acostamentelor din piatră spartă;
- 3) Colmatarea fisurilor de pe suprafața părții carosabile și monitorizarea apariției fisurilor noi în perioada de garanție;
- 4) Etichetare indicatoarelor rutiere conform standardelor EN;
- 5) De înlăturat neconcordanță de aplicare a marcajului rutier în ansamblu cu indicatoarele rutiere.

După înlăturarea neconformităților va fi întocmită procesul verbal de înlăturare a neconformităților, va fi semnat de către dirigintele de șantier și depus în cancelaria S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file , a fost încheiat la data de 12.12.2025 într-un exemplar semnat digital.

Comisia de recepție:

Președinte: Dumitru CALIN
nr. 1261 din 23.02.2023

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2025.12.22 15:31:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Specialiști atestați:

Artur CIOBANU
nr. 1553 din 16.08.2024

Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2025.12.22 15:04:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Serghei MANȚUC
nr. 1502 din 17.09.2021 (RT)

Digitally signed by Manțuc Serghei
Date: 2025.12.22 15:03:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Caniboloțchi Petru
Date: 2025.12.22 11:01:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru CANIBOLOȚCHI

nr.0254 din 10.12.2025

Digitally signed by Iazinschii Artur
Date: 2025.12.22 11:08:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Artur IAZINSCHII

nr.0168 din 21.08.2025

Digitally signed by Popușoi Igor
Date: 2025.12.22 14:19:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Igor POPUȘOI

nr. 1533 din 10.12.2021(RT)

Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2025.12.22 13:15:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Grigore PARVAN

Digitally signed by Pleșca Gheorghe
Date: 2025.12.22 14:15:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Gheorghe PLEȘCA

nr.1231 din 23.12.2022

Digitally signed by Juraveț Serghei
Date: 2025.12.22 14:38:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Serghei JURAVEȚ

10. Construcția este:

Transmisă:

Executant: Piotr DACIN

2025

Primită:

Investitor:

2025

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2025.12.23 08:26:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Digitally signed by Popa Ștefan
Date: 2026.01.02 08:43:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)
