

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Renovare a sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți frontiera cu Ucraina (inclusiv renovarea pod PC 9+10,10)”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11 din 26 mai 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Agentia de Dezvoltare Regională Nord**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Balti**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
e) inițiala (la data semnării contractului)	39 528 722	
f) finala (la data finalizării contractului)	40 835 564	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (31 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **-15 decembrie 2016**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **-Nr. 41 din 18 octombrie 2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 28.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

Digitally signed by Odovenco Dorin
Date: 2020.04.09 17:37:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Odovenco Dorin
Date: 2020.03.02 18:25:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Odovenco Dorin
Date: 2020.03.18 16:40:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.41 din „18” octombrie 2017

Privind lucrarea ”Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni- Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina”, efectuată în baza contractului de antrepriză Nr.11 din 26 mai 2014 încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord și S.R.L. „Nouconst” pentru efectuarea lucrărilor de reparație a îmbracamintei rutiere.

Lucrarile au fost executate în baza autorizației de construire nr.020 din 23.06.2014, eliberată de Consiliul Raional Briceni.

**1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 11.00- 15.00:
„18” octombrie 2017**

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Mihail GNATIUC - Președintele Raionului Briceni.

Membrii Comisiei:

Constantin BÂNDIU - Director interimar ADR Nord, șef SMP;
Ghenadie PLEȘCA - Arhitect șef raionul Briceni
Mihai MUNTEAN - Șeful Secției Construcții CR Briceni, manager de proiect;
Dumitru DROPCA - Consultant, Administrația de Stat a Drumurilor, Direcția supraveghere tehnică.

3. Invitați la ședința Comisiei:

Vladimir HAN - Autorul de proiect SRL „CARAHAN DESIGN”;
Marin SIRBU - Director SRL “Nouconst”;
Andrei RUSNAC - Responsabil tehnic, IS ”SABOS”;
Dinu BARALIUC - Șeful inspectoratului ecologic Briceni;
Ion SURUCEANU - Șeful Centrului Sanatate Publică Briceni;
Gheorghe BORDEI - Șeful Serviciului Situații Excepționale Briceni;
Visarion ROȘCA - Inspector de Stat în Construcții;
Valeriu COSTAȘ - Șef, Politia Rutiera Briceni.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15 decembrie 2016;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia Utilizatorului: (Nu) (Da);

- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15 decembrie 2016 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 10 luni.
7) valoarea obiectului este de 40.835.563,74 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a receptiona obiectul "Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni- Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina"

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul "Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni- Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina", de a fi recepționat.

7. Prezentul proces-verbal, cu un total de 2 file (inclusiv 2 anexe), a fost încheiat astăzi, 18^o octombrie 2017 în 6 exemplare.

Presedintele Comisiei:

Mihail GNATIUC - Președintele Raionului Briceni.

Membrii Comisiei:

Constantin BANDIU - Director interimar ADR Nord, șef SMP;

Ghenadie PLEȘCA - Arhitect șef r-nul Briceni;

Mihai MUNTEANU - Șeful Secției Construcții CR Briceni;

Dumitru DROPCA - Consultant, Administrația de Stat a Drumurilor,
Direcția supraveghere tehnică

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se propune să fie recepționată finală



(funcția, numele, prenumele)




L.Ș.

nr. 329 din 08.11.2017



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11 privind achiziția prin Licitație Publică

“26” mai 2014

mun. Balți

1. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/00904 din 19 mai 2014, între:

Agencia de Dezvoltare Regională Nord, cu sediul în mun. Balți, piața Vasile Alecsandri 8, telefon 231 61980, fax 231 61980, e-mail: office@adrnord.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000267, reprezentat prin director **Ion BODRUG**, numit în continuare **Co-Investitor**,

S.R.L. “Nouconst”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 94, cod fiscal 1005600012120, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr. 039255 din 15 aprilie 2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 15 aprilie 2010, **prelungită până la 15 aprilie 2015**, reprezentat prin **Marin SIRBU**, director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, și

Consiliul Raional Briceni, prin reprezentantul legal doamna **Efimia BANDALAC**, Președinte al raionului Briceni (în continuare – Beneficiar, proprietarul bunurilor obținute în rezultatul finalizării lucrărilor).

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de **Renovare a sectorului de drum L-20 Briceni_Grimăncăuți frontiera cu Ucraina**, Cod CPV: 45233142-6.

2.2. Antreprenorul general se obligă să execute lucrările, Co-Investitorul se obligă a achita costul lor, iar Beneficiarul proiectului – Consiliul Raional Briceni se obligă a primi lucrările finite, după semnarea procesului verbal de recepție finală.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 (opt) luni calendaristice de la semnarea contractului, înregistrarea contractului la AAP și primirea ordinului de începere a execuției.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau Co-Investitor;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului și/sau a Co-Investitorului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul și/sau Co-Investitorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Co-Investitor.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul și Co-Investitorul, că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, se va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 39 528 722,60 lei (treizeci și nouă de milioane cinci sute douăzeci și opt mii șapte sute douăzeci și doi lei 60 bani), inclusiv TVA.

Autoritatea contractantă, va plăti un avans în marime de 10% din valoarea ofertei, direct proporțional cu mijloacele alocărilor pentru anul respectiv, în termen de 15 zile lucrătoare din momentul înregistrării prezentului contract la AAP.

4.2. Achitățile vor fi efectuate de Co-Investitor, în limitele alocărilor anuale, în baza facturilor fiscale și proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor anexate la facturi, conform sumei lucrărilor executate, în termen de 30 zile de la data semnării fiecărei facturi fiscale de Co-Investitor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-Investitor. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului și a expirat termenul de garanție.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Co-

Investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract, inclusiv lucrările efectuate de subantreprenor.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Antreprenorul General răspunde în fața Co-investitorului și/sau Beneficiarului, pentru calitatea și termenii de executare a lucrărilor efectuate de subantreprenori.

5.4. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului și/sau a Co-Investitorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general, co-investitorului și ale beneficiarului.

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar sau Co-Investitor la dispoziția Antreprenorului general, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în domeniul construcțiilor. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea. Antreprenorul General își asumă responsabilitatea deplină în fața Co-Investitorului pentru termenii și calitatea lucrărilor efectuate de subantreprenori.

6.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

6.4. Dacă Co-Investitorul sau Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Co-Investitorul prin scrisori, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.5. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, în termenele și condițiile din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.6. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.7. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să formeze garanția de bună execuție, în cuantum de 5 (cinci) % din valoarea contractului atribuit.

6.8. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar și Co-investitor este prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile parțiale, având ca scop alocarea la un cont Bancar special a unei sume egale cu 5 (cinci) % din suma contractului. Antreprenorul are obligația de a deschide contul special pentru garanția de bună execuție la dispoziția Co-investitorului, la o bancă

agreată de ambele părți.

6.9. Retinerile succesive se efectuează de către Co-investitor, care pe parcursul executării contractului retine din sumele datorate și convenite până la sumele stabilite drept garanție de asigurare a executării contractului în documentele de licitație și contractul de achiziție publică de lucrări.

6.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Co-Investitorului, către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

6.11. Antreprenorul general trebuie să asigure deschiderea contului bancar pentru garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-Investitorul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.12. Co-Investitorul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție după recepția finală, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele părții aflate în litigiu sau prejudiciului cauzat.

6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.15. Beneficiarul și Co-Investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Co-Investitor sau Beneficiar drept confidentiale.

6.16. Beneficiarul sau Co-Investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-Investitorului sau Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Co-Investitorului sau Beneficiarului sânt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.

6.18. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Co-Investitor sau Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze neîntârziat Co-Investitorul sau Beneficiarul cu privire la crorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.19. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.20. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

6.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul sau Co-Investitorul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 6.16., Beneficiarul și Co-Investitorul pot opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări.

punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.23. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină caile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.24. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. Forta de muncă

7.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Proiectantul, Co-Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Co-Investitor.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Co-Investitor sau Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

8.4. Co-Investitorul sau Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sânt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-Investitorului sau a Beneficiarului și va refăce această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar sau Co-Investitor, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
b) caile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-Investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-Investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului general.

Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-Investitorul. De asemenea, el răspunde în fața Co-Investitorului și Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-Investitorului sau a Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările vor începe în decurs de până la 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 36 (treizeci și șase) luni calendaristice.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Co-Investitor sau Beneficiar.

9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

10. Răspunderea părților

10.1. Părțile contractante răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părți în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.4. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-Investitor. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-Investitor sau Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.6. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa Antreprenorului general, acesta va plăti Co-Investitorului penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,1 % din valoarea lucrărilor executate tardiv pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.

10.7. Beneficiarul sau Co-Investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general.

11. Soluționarea litigiilor

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită sau, în cazul în care nu a fost dovedită culpabilitatea, de partea care a cerut efectuarea acestora.

11.2 Litigiile care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, urmează a fi soluționate de instanța de judecată competentă, conform prevederilor legale.

12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul sau Co-Investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul sau Co-Investitorul, poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 30 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul sau Co-Investitorul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul și Co-Investitorul vor întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după efectuarea recepției finale, iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 12.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7. După rezilierea contractului, Co-Investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse

anexate:

- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar și/sau Co-Investitor, care vor emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract, fiind valabil până la expirarea perioadei de garanție prevăzută în punctul 9.1 și 9.2. din prezentul contract.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

CO-INVESTITOR

Agencia de Dezvoltare Regională Nord
MD-3200, mun. Bălți, piața V. Alecsandri, 8.
cont de decontare
Nr. 222480115
BC Victoriabank SA
Cod Nr. VICBMD2X740
cod fiscal 1009601000267

ANTREPRENOR

SRL "Nouconst"
MD-2059, mun. Chișinău str. Petricani 94
cont de decontare
Nr. 2251679079
banca BC "Moldova-Agroindbank" fil. 10
Chișinău, cod. AGRNMD2X437
cod fiscal 1005600012120
Cod TVA: 0605333

Director
Ion BODRUG


L.S.

Director
Marin SÎRBU


L.S.

Beneficiar: Consiliul Raional Briceni

Președinte
Efimia BANDALAC


L.S.

Contrasemnat:

S. Bazatin 

C. Bândiu 

D. Gudumac 

I. Iliev 

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești – Nicolaevca – Sîngerei, km 6 - 10”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11-18/385 din 13 septembrie 2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițiala (la data semnării contractului)	21 356 411,73	
b) finală (la data finalizării contractului)	21 114 068,10	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (21 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **- iunie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor –**Nr. 7 din 30 iulie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 28.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

Aprob.

02.10.2018

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 7 din 30 iulie 2018

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești – Nicolaevca – Sîngerei, km 6÷10, executate în cadrul contractelor nr.11-18/385 din 13.09.2016, nr. 11-18/24 din 11.01.2018 și a acordurilor adiționale nr.1 din 13.12.2016, nr. 2 din 11.01.2018, nr. 3 din 10.05.2018 și nr. 1 din 07.06.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Nouconst” or. Chișinău antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 din 21.09.2016 eliberată de Președintele Raionului Florești cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 69 din 06 iulie 2018 și-a desfășurat activitatea astăzi LUNI 30 IULIE 2018 fiind formată din:
 - a.) Președinte Iu.Pașa - director adjunct, Î.S. „ASD”
 - b.) membri: R.Rogovei - șef, direcția infrastructură de transport a MEI
V.Cotrută - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
I.Grosu - șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD”
I.Alexa - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
V.Cegurean - șef, secție construcții, gospodărie comunală și drumuri a Consiliului Raional Florești
A.Dosca - Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
V.Moraru - director, S.A. „Drumuri – Soroca”
F.Turcan - S.A. „Drumuri – Soroca” sector Florești
3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executant M.Sîrbu - director comercial, S.R.L. „Nouconst”
 - b.) proiectant S.Bejan - director, S.R.L. „Astral - Proiect”
 - c.) responsabil tehnic A.Iazinschii - consultant, Î.S. „ASD”
4. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție CU rezerve și poate fi dată în folosință.
 - a.) Lucrările de reparație au fost executate de către S.R.L. „Nouconst”
 - b.) Documentația de proiect a fost elaborată de către S.R.L. „Astral - Proiect”
 - c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii: începutul lucrărilor octombrie 2016 sfârșitul lucrărilor iunie 2018
5. Anexele la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor :
 - a.) Situația lucrărilor executate – cartea tehnică.
 - b.) Constatările comisiei de recepție:
6. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:
 - 1) Lungimea drumului 3600 m.l. (km 6+300 ÷ km 9+900).
 - 2) Lățimea platformei drumului – 9,0 m.
 - 3) Lățimea părții carosabile - 7,0 m (2 x 3,5 m),
 - 4) Lățimea acostamentelor 2 x 1,0 m, consolidate cu piatra spartă H - 10 cm.

Construcția sistemul rutier: strat din nisip H – 10 cm, strat din piatră spartă H – 25 cm, strat din beton vibrocilindrat Btb -3,6 H – 14 cm, strat din beton asfaltic Tip B MII ȘMBG – II/2,3 H – 4 cm.
Podete tubulare: 3 buc - Ø – 1000mm, PC 66+400; PC 76+900; PC 84+116.
1 buc - Ø – 600mm, PC 85+ 959. Canal de scurgere a apelor pluviale L – 2453 m.l.
Drumuri de acces – 8 buc. PC 77+758 dreapta, PC 77+766 stînga, PC 85+882 dreapta, PC 85+959 stînga, PC 91+275 dreapta, PC 92+751 stînga, PC 98+360 dreapta, PC 98+366 stînga.
Indicatoare rutiere – 17 buc., marcaj rutier 1069 m², stîlpi de ghidare - 150 buc.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **26,9 mln. lei, inclusiv LCM – 25,9 mln. lei.**

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a drumului menționat constituie – **22 358 775, 39 lei, inclusiv LCM – 21 114 068, 10 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.**

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea **CU obiectul a recepției.**

11. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, **astăzi, 30 iulie 2018 în 6 exemplare.**

Comisia de recepție:

Președinte Iu. Pașa

membri: R. Rogovei

V. Cotruță

I. Grosu

I. Alexa

V. Cegurean

A. Dosca

V. Moraru

invitați: F. Turcan

M. Sîrbu

S. Bejan

A. Iazinschii

12. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se propune spre recepție la finalizarea lucrărilor ca fiind corect executată în conformitate cu proiectul și planurile indicate

2018

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

13. Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești – Nicolaevca – Sîngerei, km 6+10, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Agenției pentru Supraveghere Tehnică, este recepționată.

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL

S.R.L. „Nouconst”

2018

M. Sîrbu

PRIMITĂ - INVESTITORUL

I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2018

V. Cotruță

Lista cheltuielilor

Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul G50
(R18) Florești - Nicolaevca - Sîngerei, km 6-10

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriza LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr. 11-18/385 din 13.09.2016 2017 2018 Contract nr. 11-18/24 din 11.01.18 2018	21 114 068,10 20 279 005,46 814 459,20 20 603,44
2	Intreținerea beneficiarului 2017 (2,68%) 2018 (2,14%)	561 347,69 543 477,35 17 870,34
3	Lucrări de proiectare S.R.L. "Astral-Proiect" Contract nr. 11-19/302 din 30.10.2013 2013 Contract nr. 11-19/219 din 20.05.2016 2016	570 607,60 474 607,60 96 000,00
4	Expertiza proiectelor Î.S. "SSVEPC" Contract nr. 0675-05-14 din 08.05.2014 2014 Contract nr. 0181-06-16 din 06.06.2016 2016	49 752,00 34 800,00 14 952,00
5	Monitorizare proiectelor S.R.L. "Astral-Proiect" Contract nr. 09/2016 din 21.09.2016 11-19/401 din 30.09.2016	63 000,00 63 000,00
	TOTAL:	22 358 775,39

Deviz: 26,9 mln.lei
incl. LCM 25,9 mln.lei

Inceputul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

octombrie 2016
iunie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco

SITUAȚIA
constatărilor comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
privind „Reparatia îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești – Nicolaevca – Sîngerei, km 6 ÷ 10”

Denumirea și adresa (km și PC)

1. Executarea rosturilor de dilatare comprimare ale betonului vibrocilindric la PC 7+500 și PC 7+570
2. Reinstalarea stâlpilor de ghidare conform proiectului.

Președintele comisiei

Iu. Pașa

Membru:

R. Rogovei

V. Cotruță

I. Grosu

I. Alexa

V. Cegurean

A. Dosca


V. Moraru

F. Turcan

M. Sirbu

S. Bejan

A. Iazinschii

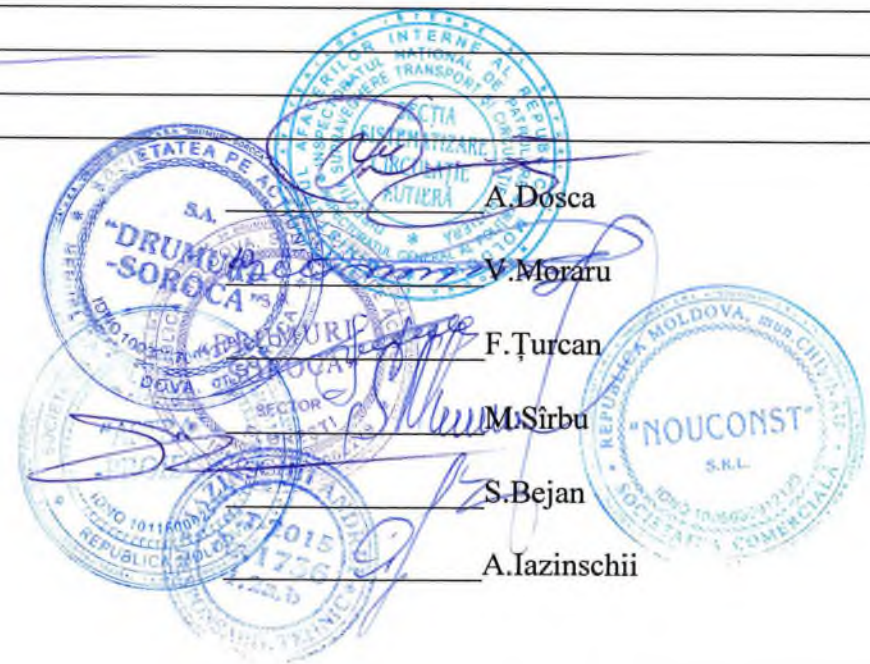



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/385 privind achiziția prin Licitație Publică

"13" 09 2016

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 16/02048 din 23.08.2016, între I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef interimar dl Veaceslav Telesman în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Nouconst" cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 94, tel/fax. 022317638, email: office@nouconst.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, licența de activitate seria A MMII nr. 045463 din 15.04.2015 valabilă pînă la 14.04.2020, pentru genurile construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări, reprezentată de directorul general dl Sîrbu Marin în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești-Nicolaevca-Sîngerei, km 6-10**, Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni de la înregistrarea contractului la AAP**, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **21 356 411,73 (douăzeci și unu milioane trei sute cincizeci și șase mii patru sute unsprezece lei, 73 bani) inclusiv TVA .**
- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3). Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru a.2016 sunt alocate 12 234 086,48 (douăsprezece milioane două sute treizeci și patru mii optzeci și șase lei, 48 bani) inclusiv TVA.
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune în quantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în quantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în

zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului

general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5%

din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **30 martie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "13" septembrie 2016.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
TREZMD2X
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "Nouconst"
MD 2059 mun. Chișinău, str. Petricani 94
c/f 1005600012120
c/ IBAN MD68AG000000002251679079
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.,
filiala nr. 10 Chișinău
c/b AGRNMD2X
c/TVA 0605333

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Manager-șef interimar
Veaceslav Teleman



"Antreprenor general"

Director general
Marin Sirbu



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Căușeni”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11-18/206 din 18 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
m) inițiala (la data semnării contractului)	55 136 006,12	
n) finală (la data finalizării contractului)	55 115 717,80	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt.**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (6 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **- octombrie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – **Nr. 33 din 4 ianuarie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 28.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Glodeni”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11-18/173 din 02 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
i) inițială (la data semnării contractului)	38 894 449,82	
j) finală (la data finalizării contractului)	38 866 616,06	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (6 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **- decembrie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – **Nr. 35 din 28 ianuarie 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 28.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Edineț”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11-18/162 din 27 aprilie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
k) inițiala (la data semnării contractului)	39 925 057,91	
l) finală (la data finalizării contractului)	39 918 384,00	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt.**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (6 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **- octombrie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – **Nr. 14 din 8 noiembrie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 28.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Cahul”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11-18/174 din 03 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
g) inițiala (la data semnării contractului)	51 262 700,84	
h) finală (la data finalizării contractului)	51 204 748,34	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (6 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **-octombrie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – **Nr. 19 din 19 noiembrie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 28.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Digitally signed by Odovenco Dorin
Date: 2019.05.28 17:46:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



No 16/A/I/05-18.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/174 privind achiziția prin Licitatie Publică

03 mai 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01171 din 23.04.2018, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.C., „Nouconst” S.R.L. cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentată de directorul dl Marin Sîrbu în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cahul**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

- necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
 - 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **51 262 700,84 (cincizeci și unu milioane două sute șazeci și două mii șapte sute lei, 84 bani) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi înștiințat de transferul efectuat,

- precum și de destinația lui.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
 - 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
 - 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
 - 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
 - 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
 - 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
 - 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
 - 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
 - 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu

prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "13" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TT Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.C. "Nouconst" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Petricani 94

c/f 1005600012120

c/IBAN MD68AG000000002251679079

BC „Moldova-Agroindbank” S.A.,

fil.10 Chișinău, c/b AGRNMD2X437

c/TVA 0605333

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general
Gheorghe CURMEI

"Antreprenor general"

Director
Marin SÎRBU



Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 19 din 19 noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Cahul, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Cahul, executate în cadrul contractului nr.11-18/174 din 03.05.2018 și acordurilor aditionale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Nouconst” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-19 noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu.Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S.Mantuc* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
A.Morgoci - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
A.Taragan - *șef, direcție construcții, drumuri și dezvoltare teritorială al Consiliului Raional Cahul*
N.Bocicovar - *director S.A. „Drumuri Cahul”*
C.Nărea - *S.A. „Drumuri Cahul” sector Cahul*
M.Sîrbu - *director S.R.L. „Nouconst”*
V.Moruz - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
Primar - *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Nouconst”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor octombrie 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=15 cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=12 cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=5,0 cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea H=4,0 cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=18cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=5,0 cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **52,99 mln. lei, inclusiv LCM - 51,52 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **52 063 150,99 lei, inclusiv LCM - 51 204 448,34 lei,** care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat în perioada **15-19 noiembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte: **H. Pașa**

Membri: **S. Mantuc**

A. Morgoci

C. Nărea

A. Taragan

M. Sîrbu

N. Bocicovar

V. Moruz



r-ul Cahul

Primar or.Cahul – N.Dandiș

Primar s.Burlăceni – S.Gardari

Primar s.Alexanderefeld – L.Arnautov

Primar s. Burlacu – M.Munteanu

Primar s.Alexandru Ioan Cuza – N.Cafandjoglu

Primar s.Chioselia Mare, inclusiv s. Frumușica – S.Cealicu

Primar s.Andrușul de jos – Gh.Pralea

Primar s.Cișlița Prut – V.Enciu

Primar s. Băutul Moldovenesc – L.Tabac

Primar s.Colibași – I.Dolganțuc

Primar s.Andrușul de Sus – S.Ciobanu

Primar s.Crihana Veeche – R.Cucereanu

Primar s. Băuța Moldoveni – E.Enachi

Primar s.Cucoara, inclusiv s. Chircani – A. Harea

Primar s.Borceag – I.Capiță

Primar s.Doina, inclusiv s. Rumeanțev – V.Eliseev

Primar s.Brînză – L.Catera

Primar s.Găvănoasa, s. Vladimirovca, s. Nicolaevca – V.Ivanov

Primar s.Bucuria – L.Dermenis

Primar s.Giurgulești – T.Gălățeanu

Primar s.Huluboara – V.Oboroș

Primar s.Pelinei – N.Munteanu

Primar s. Iujnoe – Gh.Focșa

Primar s.Roșu – N.Savilencu

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 19 din 19 noiembrie 2018,

r-ul Cahul

Primar s. Larga Nouă, inclusiv s. Larga
Veche – T. Maidan

Primar s. Slobozia Mare – V. Carastan

Primar s. Lebedenco, inclusiv s. Ursoaia
– A. Bondari

Primar s. Vărăchia de Salcie – M. Vrabie

Primar s. Lucești – C. Cotroaia

Primar s. Tătărești – D. Mihai

Primar s. Manta, inclusiv s. Pașcani
– V. Hîncu

Primar s. Vadul lui Isac – I. Iorga

Primar s. Lopățica – V. Stoianov

Primar s. Valeni – S. Știrbeț

Primar s. Moscovei, inclusiv s. Trifeștii Noi
– N. Bucișvar

Primar s. Zirnești, inclusiv s. Paicu – N. Beju

Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice
amplasate teritorial în raionul Cahul

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriza LCM S.R.L. "Nouconst" Contract nr.11-18/174 din 03.05.18 2018	51 204 748,34 51 204 748,34
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	783 432,65 783 432,65
3	Întocmirea devizului ASD, iunie 2018	74 970,00 74 970,00
	TOTAL:	52 063 150,99

Deviz: 52,99 mln.lei
incl. LCM 51,52 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
octombrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco





Digitally signed by Odovenco Dorin
Date: 2019.05.28 17:45:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/2018
privind achiziția prin Licitatie Publică No 24/A/I/05-18
"18" mai 2018 mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01692 din 15.05.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.C.,,Nouconst" S.R.L. cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentată de directorul executiv dl Vadim Scorobogatco în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Căuşeni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **55 136 006,12 (cincizeci și cinci milioane una sută treizeci și șase mii șase lei, 12 bani) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi înștiințat de transferul efectuat,

precum și de destinația lui.

- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreprinderii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu

prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"
Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"
S.C."Nouconst" S.R.L.
mun. Chișinău, str. Petricani 94
c/f 1005600012120
c/IBAN MD68AG000000002251679079
BC „Moldova-Agroindbank”S.A.,
fil.10 Chișinău, c/b AGRNMD2X437
c/TVA 0605333

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"
Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"
Director executiv
Vadim SCOROBGATCO





Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”

Г.П. „Государственная
Администрация
Автомобильных Дорог”

str. Bucuriei, 12 A, MD-2004, Chișinău
tel.: 74-05-70, 74-08-03 fax.: 22-22-80

ул. Букурией, 12 А, МД -2004, Кишинэу
тел.: 74-05-70, 74-08-03 факс: 22-22-80

18.05.2018 Nr. 09-04/2508

Către: **S.C., Nouconst, S.R.L.**

În atenția: Domnului Marin SÎRBU, Director,

Subiect: Instrucțiuni pentru începerea lucrărilor

Referință: Contract nr. 11-13/200 din 18.05 2018

Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Căușeni.

Stimate Domnule Director,

În conformitate cu sub - clauza 3.1 a Contractului nr. 11-13/200 din 18.05 2018, **Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Căușeni**, prin prezenta sunteți instruiți să **începeți** lucrările pentru reparația drumurilor M-(drumuri expres), R-(drumuri republicane), G-(drumuri regionale).

Data de începere a lucrărilor menționate este” 04” 11 iunie 2018.

Termenul de execuție a contractului este de **4** luni, calculat de la data începerii lucrărilor.

Solicităm să începeți executarea Lucrărilor îndată ce este rezonabil și să continuați lucrările cu promptitudine și fără întârzieri.

Director general

Gheorghe CURMEI

Primit 18.05.2018

(ordinul a fost primit: data, numele, semnătura și ștampila)



10.01.2019

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 33 din 04 Ianuarie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Căușeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Căușeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/206 din 18.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, nr.3 din 09.11.2018 încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Nouconst” antreprenor or. Chișinău

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 28.12.2018 - 04.01 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu.Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S.Manțuc* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
- A.Morgoci* - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
- D.Afanasii* - *șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Căușeni*
- A.Cijicenco* - *director S.A. „Drumuri Căușeni”*
- V.Aftenii* - *S.A. „Drumuri Căușeni” sector Căușeni*
- N.Vidrașcu* - *S.A. „Drumuri Căușeni” sector Căinari*
- V.Scorobogatco* - *director executiv S.R.L. „Nouconst”*
- V.Coliban* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
- S.Pînzari* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
- Primar* *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Nouconst”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *Mai* 2018 sfârșitul lucrărilor *Decembrie* 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminteii rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **56,83 mln. lei, inclusiv LCM - 55,24 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **56047168,28 lei, inclusiv LCM - 55115717,80 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat în perioada **28.12.2018 - 04.01.2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte Iu.Pașa

Membri: S.Manțuc

A.Morgoci

V.Aftenii

D.Afanasii



V.Scorobogateo

A.Cijicenco

V.Coliban

N.Vidrașcu

S.Pinzari

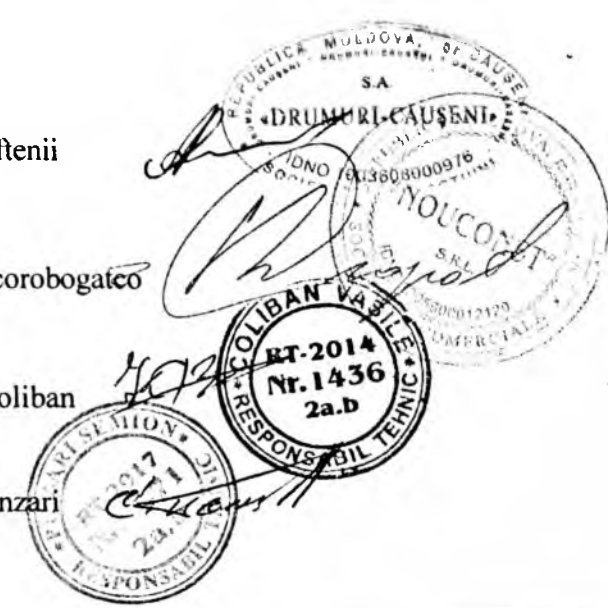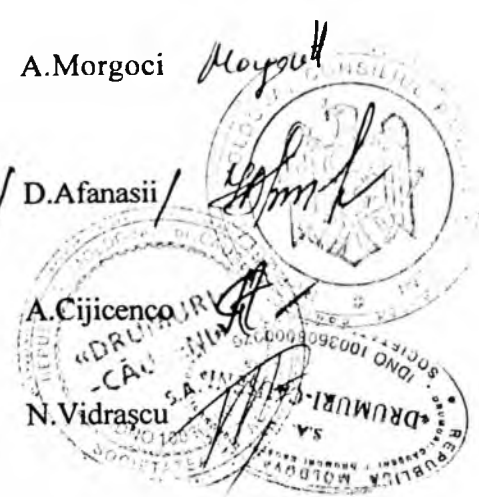

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 33 din 04 Ianuarie 2019,

r-ul Căușeni

Primar or.Căușeni – G.Repeșciuc

Primar s.Ștefănești – A.Iepure

Primar or.Căinari – M.Ghelan

Primar s.Opăci – G.Terțiu

Primar s.Bacceaia inclusiv
s.Tricoiești – S.Tribirba

Primar s.Pevomari inclusiv
s.Constantinovești – G.Șuruci

Primar s.Baimaclia inclusiv
s.Surchiceni – A.Doibani

Primar s.Plopiș – Ștefănești
s.Bărcănești – Ștefănești

Primar s.Chircăiești – G.Cușan

Primar s.Săiși – V.Musteață

Primar s.Ciuflești – S.Pirlog

Primar s.Sălcuța – I.Novac

Primar s.Chircăieștii Noi – V.Cantoză

Primar s.Taraclia – V.Cucereavii

Primar s.Cîrnățeni – O.Savca

Primar s.Panărați – C.Berlinschi

Primar s.Cîrnățenii Noi inclusiv
s.Sălcuța Nouă – P.Antoniuc

Primar s.Tănătarii Noi
s.Ștefănești – V.Ștefănești






Primar s.Copanca – A.Cuțar

Primar s.Tocuz – A.Țurcan

Primar s.Coșcalia – F.Ișanu

Primar s.Ucrainca inclusiv
s.Zviozdocița – I.Crivor

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 33 din 04 Ianuarie 2019

- Primar s. Fîrlădeni inclusiv s. Fîrlădenii Noi  Primar s. Fîrlădenii Noi *G. G. G.*
- Primar s. Grădinița inclusiv s. Leuntea  Primar s. Grădinița inclusiv s. Leuntea *A. Vlas*
- Primar s. Grigorievca - T. Ivanova 
- Primar s. Ursoaia - E. Marjinean  Primar s. Ursoaia - E. Marjinean *E. Marjinean*
- Primar s. Zaim - I. Veste  Primar s. Zaim - I. Veste *I. Veste*

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-l. Causei, s. Sălcuța
la obiectul C48040 - Căminari - Sălcuța R26 km 90,45 ÷ 92,05 (selectiv) s. Sălcuța

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<u>separat persistă pe loc de construcție desorganizarea betonului asfaltic (compoziția betonului asfaltic nu este omogenă) pe suprafețele selective</u>


Președinte Iu.Pașa

Membri: S.Manțuc V.Aftenii

A.Morgoci V.Scorobogato (antreprenor)

D.Afanasii V.Coliban

A.Cijicenco I.Novac

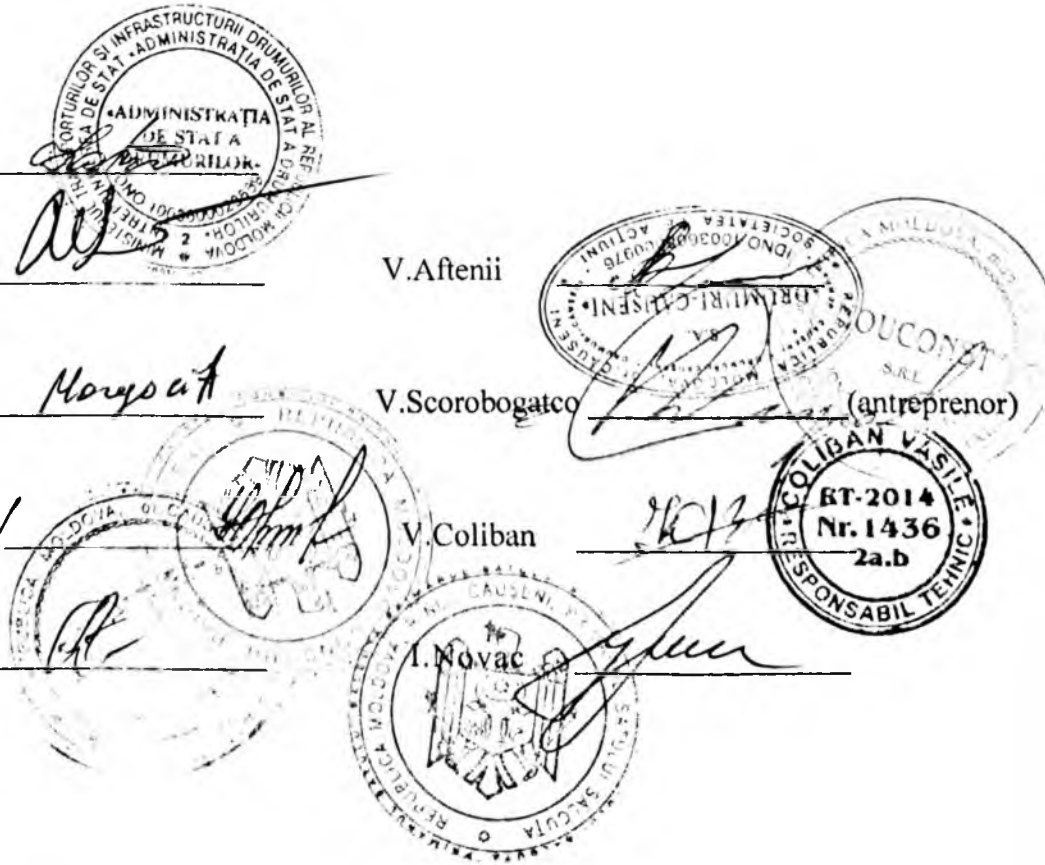



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate



Nr. 33 din 4 Ianuarie 2019



SITUAȚIA


neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în s. Săiț 2-ul Căusenii



Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Reparația unor străzi din localitatea Săiț km 0+000 - 1+500 Tip I
	Pe unele secțiuni de drum au apărut degradări structurale pe partea carosabilă cu îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă
	


Președinte Ia. Pasa 

Membri: S.Manțuc  V.Aftenii 

A.Morgoci  V.Scorobogato  (antreprenor)

/ D.Afanasii / 

A.Cijicenco  V.Musteafa 





la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate




Nr. 33 din 4 Ianuarie 2019




SITUAȚIA




neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în or. l. Căușeni, or. Căinarii
la obiectul Repararea unor străzi din localitatea Căinarii 1=17 km




Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Degradări structurale a suprafețelor de rulare pe lungimea tronsoanelor, selectiv

Președinte Iu.Pașa  

Membri: S.Manțuc  V.Aftenii  

A.Morgoci  V.Scorobogato  (antreprenor) 

D.Afanasii  V.Coliban  

A.Cijicenco  M.Cholan  

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 33 din 4 Iunie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-l. Causeni, s. Perromoaise
la obiectul C410C2004 - Zolotivca-Perromoaise-Răzeni-113km 29,4-30,25 (selectiv) Perromoaise

Nr. d'o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Fișuri longitudinale și transversale pe lungimea tronsonului selectiv

Președinte Iu.Pașa



Membri: S.Manțuc

V.Aftenii



A.Morgoci

Morgoci

V.Scorobogato

(D.Afanasii

Afanasii

V.Coliban

Coliban

A.Cijicenco



V.Curuci


Curuci



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
Nr. 33 din 4 Ianuarie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în S. Tănățari r.p. Căușeni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<u>Reparația unor străzi din localitatea Tănățari km 0+000 - 0+990 Tip I</u>
	<u>Pe unele sectoare de drum au apărut degradări structurale pe partea carosabilă cu îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă</u>
	

Președinte Iu.Pașa

Membri: S.Manțuc

A.Morgoci

/ D.Afanasii /


A.Cijicenco

V.Aftenii

V.Scorobogato

S.Furziari

C. Beș



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 33 din 4 Ianuarie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în S. Baccalia și Causeni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Reparația unor străzi din localitatea Baccalia km 0+000 - 1+200 Tip - I
	Pe unele sectoare de drum au apărut degradări structurale pe partea carosabilă cu îmbrăcăminte rutieră din piatră spartă

Președinte Iu.Pașa



Membri: S.Manțuc

V.Aftenii




A.Morgoci

Morgoci

V.Scorobogato



/ D.Afanasii /



S. P. Causeni

A.Cijicenco



S. Tibirna, Treleanz



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Renovarea invelisului străzii Ștefan Cel Mare și Sfânt (de la str. M. Viteazul până la podul peste r. Răut) în mun. Bălți”**
2. Numărul și data contractului: **nr. 147 din 01 noiembrie 2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primăria mun. Bălți**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Bălți str. Independenței 1**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
c) inițiala (la data semnării contractului)	11 197 540,92	
d) finala (la data finalizării contractului)	10 476 525,47	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (6 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **- octombrie 2018**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – **Nr. 12 din 25.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 28.02.2020

Semnat: _____

Nume: Vadim ScorobogatcoFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

INVESTITOR – PRIMĂRIA M.BĂLȚI

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 12 din 25.10.2018

Privind lucrarea «**Renovarea învelișului străzii**»
executată la obiectul « **Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut) în mun.Bălți** »
în cadrul contractului nr. 147 din 01.11.2017 încheiat între primăria m.Bălți și SRL «Nouconst»
pentru lucrările de **renovarea învelișului străzii**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 217, eliberată de primărie la 01.11.2017, cu valabilitate pînă la 01.11.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **11.10.2018 - 25.10.2018**, fiind formată din: Presedintele comisiei: d-l Șmulchi G.L. – vice-primar al m.Bălți

Membrii comisiei:

1. d-l Zincovschi V.I. - șeful DGC al primăriei
2. d-l Budarețchi V.D. – comisar principal SSCR a SST și AR al IP Bălți
3. d-l Coadă V.M. - șef al DAC al primăriei
4. d-na Bragari L.I. – director al ÎM DCC CU m.Bălți
5. d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat
6. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat
7. d-na Barîșpoli M.A. – responsabil tehnic atestat.

3. Au mai participat la recepție:

d-na Mironova T. – inginer-șef al proiectului INCP «Urbanproiect»
d-l Scorobogato V.A. - director executiv al SRL «Nouconst»
d-l Hmarnîi Iu.N. - directorul DRCD
d-na Zubenina I.V. – director ÎM Regia «Apă-Canal»
d-l I. Golberg - director «Glorin Ingering» SRL
d-l Ciumaș - șeful Direcției AE
d-l V.Chișlari - șeful Centrului de Sănătate Publică

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul «Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut) în mun.Bălți»

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
obiectul «Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut) în mun.Bălți» este finalizat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
receptionat obiectul «Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul pînă podul peste r.Răut) în mun.Bălți».

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții, suprafața la sol _____, suprafața totală învelirea drumului cu beton asfaltic 20367,0 m.p., numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _1_ file și _3_ anexe numerotate, cu un total de _4_ fie, a fost cheiat astăzi 25.10.2018 la _____ în _____ 6 _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele d-l Șmulschi G.L.

8. Membri:

d-l Zincovschi V.I.

d-l Budarețchi V.D.

d-l Coadă V.M.

d-na Bragari L.I.

d-na Rusnac N.S.

d-l Loris I.V.

d-na Barîșpoli M.A.



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se propune spre recepție la terminarea lucrărilor
cu toate deciziile comisiei de recepție.
Supt. principal Direcție SCED V. Stoianu

10. Lucrarea «Renovarea învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M.Viteazul pînă la podul peste r.Răut) în mun.Bălți» este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL «Nouconst»

" 25 " 10 2018

L.Ș.




(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: primăria m.Bălți

" 25 " 10 2018

L.Ș.



(semnătura)

No. 49 din 08.04.2019.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

1. La trecerile pietonale de la intersecția str. Ștefan cel Mare cu str. Mihail Viteazul lipsesc indicatoarele rutiere 5.50.1 și 5.50.32 «Trecere pentru pietoni» (total 8 buc.). Marcajul pietonal 1.14.1 urmează a fi renovat.
2. La accesul în zona rezidențială blocului locativ cu nr. 19 lipsește marcajul 1.1.1 și 1.13.
3. La trecerile pietonale de la intersecția str. Ștefan cel Mare cu str. 1 Mai lipsesc indicatoarele rutiere 5.50.1 și 5.50.2 «Trecere pentru pietoni» (total 8 buc.). Marcajul pietonal 1.14.1 urmează a fi renovat.
4. La stația pentru autovehiculele de ruă din str. Ștefan cel Mare, 5 lipsește indicatorul rutier 5.6.1 «Stație pentru autovehiculele de ruă», marcajul 1.17.1 urmează a fi strămutat și aplicat la stație, vis-a-vis de pavilionul de așteptare.
5. La accesul către CC «Fidesco» lipsește marcajul 1.1.1 și 1.13.
6. La accesul în zona rezidențială blocului locativ cu nr. 3 și 5 capacele fântinilor rețelelor ingineresti urmează a fi ridicate la nivelul părții carosabile.
7. La trecerea pietonală din preajma CC «Fidesco» lipsește indicatorul 1.21 «Copii».
8. Reșota sistemului de evacuare a apelor pluviale din preajma casei nr. 1/stînga este deteriorat, urmează a fi schimbat.
9. La stația pentru autovehiculele de ruă din str. Ștefan cel Mare, 1 lipsește indicatorul rutier 5.6.1 «Stație pentru autovehiculele de ruă», și marcajul 1.17.1 care urmează a fi aplicat, vis-a-vis de pavilionul de așteptare.
10. Indicatoarele rutiere 5.15, 2.3 și 1.8 urmează a fi strămutate din parcare.
11. La accesul către stația de alimentare cu combustibil lipsește marcajul 1.1.1 și 1.13.
12. La trecerea pietonală dirijată prin semafor, amplasată în nemijlocita apropiere de sensul giratoriu lipsește indicatorul rutier 5.50.2 «Trecere pentru pietoni» (total 1 buc.), cele existente nu sunt instalate corespunzător.
13. La intersecția cu sens giratoriu a str. Ștefan cel Mare cu str. N. Iorga, parțial, pe segmente dreapta/stînga lipsesc delimitările (parapetele de siguranță).
14. Pe tronsonul cuprins între str. N. Iorga și str. Strii pe stînga lipsește marcajul 1.19, urmează a fi aplicat conform proiectului.
15. Pe tronsonul cuprins între str. N. Iorga și podul peste râul Răut, pe toată lungimea pe stînga lipsește trotuarul destinat circulației pietonilor, iar la accesul către restaurantul Vispas și ieșirea de la stația de alimentare cu combustibil lipsește marcajul 1.3 prevăzut în proiect.

16. La stația pentru autovehiculele de rură din str. Ștefan cel Mare, 2 pe dreapta lipsește indicatorul rutier 3.2 «Circulația interzisă » concomitent cu panoul adițional 6.6.4, urmează a fi instalat conform proiectului.

17. Toate accesele la partea carosabilă de pe trotuar, în deosebi la trecerile pietonale să fie amenajate cu pante pentru circulația liberă a persoanelor cu dizabilități.

Larisa Bragari

Nadejda Rusnac



[Handwritten signature]

Directorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU



ACHIZIȚII PUBLICE



Nº 96/A/I/11-17

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 147 privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 01 ” noiembrie 2017

mun. Bălți

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/03417 din data 19.10.2017, între

Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Independenței, 1, telefon: 0 231 2 45 21, fax: 0 231 2 45 21, e-mail: primaria@beltsy.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 42059 din “ 02 ” iulie 2015, reprezentat prin Primar interimar Leonid Babii, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SC “NOUCONST” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 94, telefon: 0 22 317638, fax: 0 22 31 76 38, e-mail: office@nouconst.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0024071 din “ 14 ” martie 2005, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 045463 seria A MMII din “ 15 ” aprilie 2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la “ 14 ” aprilie 2020, pentru genurile de activitate **construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări**, reprezentat prin Administrator Marin Sîrbu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de “ Renovarea învelisului străzii Ștefan cel Mare și Sfânt (de la str. M. Viteazul până la podul peste r. Răut) în mun. Bălți ”,

Cod CPV: 45233251-3, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate **constituie pentru a.2017 – până la data de 18 decembrie, a.2018 – 2 (două) luni**. Lucrările vor începe după 10 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție, conform graficului de executare a lucrărilor (Formularul F3.5 la prezentul contract).

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

- Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

11 197 540 lei 92 bani (inclusiv TVA)

(unsprezece milioane una sută nouăzeci și șapte mii cinci sute patruzeci lei 92 bani),

inclusiv: anul 2017- 6 571 080 lei; anul 2018- 4 626 460,92 lei.


- 4.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, după prezentarea facturii fiscale și procesului verbal de primire – predare a lucrărilor, conform pct. 7.10 a prezentului contract, și anume: **în anul 2017- pînă la data de 24 decembrie**; în anul 2018- în termen de 30 zile.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata pentru lucrările executate se va efectua Beneficiar Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală, și în cazul lipsei obiecțiilor din partea Beneficiarului.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, inclusiv ajustarea periodică a valorii contractului, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice, inclusiv Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.



6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.


7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este alte forme în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit, conform pct. 7.10 a prezentului contract.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, **sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 15 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 15 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.**

- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.




- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a



2

provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție, conform graficului de executare a lucrărilor și anume: **pentru a.2017 – până la data de 18 decembrie, a.2018 – 2 (două) luni.** (Formularul F3.5 la prezentul contract).

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract de achiziție este de **3 (trei)** ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 15 % din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 %

din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,01 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,1 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul

general.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“ 01 ” noiembrie 2017**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR ”: SC “NOUCONST” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 94
Tel./Fax: 0 22 31 76 38, 069121223
Denumirea BC „Moldova-Agroindbank” S.A.
Băncii: fil.10, Chișinău
Cod Bancar: AGRNMD2X437
Cod IBAN: MD68AG000000002251679079
Cod fiscal: 1005600012120/ TVA 0605333



“ BENEFICIAR ”: Primăria mun. Bălți

Adresa: mun. Bălți, str. Independenței 1
Tel./Fax: 0 231 2 45 21
Denumirea MF Trezoreria Teritorială de
Băncii: Stat
Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB
Cod fiscal: 1007601003161

16. Semnăturile părților


“ ANTREPRENOR ”:

Administrator


M. Sirbu
L.Ș.


“ BENEFICIAR ”:

Primar interimar al
mun. Bălți


L. Babii
L.Ș.

Contabil – șef M. Zaslavscaia J. Zaslavscaia

Coordonat:

Șef Direcția Juridică V. Balan V. Balan

Șef DGC V. Zincovski V. Zincovski

Director ÎM DCC comanditar unic L. Bragari L. Bragari



ACHIZIȚII PUBLICE

No 99/A/I/12-18



ACORD ADIȚIONAL nr.3 la contractul nr. 147 din "01" noiembrie 2017 2017-0000002372 din 05.02.2018

Prezentul acord este semnat astăzi " 28 " noiembrie 2018, între Primăria mun. Bălți, în persoana dlui Nicolai Grigorișin și SC "Nouconst" SRL, în persoana dlui Vadim Scorobogatco, în scopul modificării Contractului nr. 147 din " 01 " noiembrie 2017 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei mun. Bălți nr. 17/03417 din " 23 " noiembrie 2018.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma inițială a contractului a constituit 11 197 540 lei 92 bani (Unsprezece milioane una sută nouăzeci și șapte mii cinci sute patruzeci lei 92 bani), inclusiv: a.2017-393 904,98 lei; a.2018-10 803 635,94 lei.
2. Suma se micșorează cu 721 015 lei 44 bani (Șapte sute douăzeci și una mii cincisprezece lei 44 bani).
3. Suma contractului după modificare va constitui 10 476 525 lei 48 bani (Zece milioane patru sute șaptezeci și șase mii cinci sute douăzeci și cinci lei 48 bani), inclusiv: a.2017- 393 904,98 lei ; a.2018-10 082 620,50 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

ANTREPRENOR GENERAL

Director V. Scorobogatco

L.Ș.

BENEFICIAR



Primar
al mun. Bălți

N. Grigorișin

L.Ș.

Contabil-șef J. Zaslavscaia

Coordonat:
Șef Direcția Juridică V. Balan

Șef DGC V. Zincovschi

*Director
Juridic
S. B. 2018*
