



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/434 privind achiziția prin licitație deschisă

12 noiembrie 2019

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1570086675024-EV-1570088340589** din **27.10.2019**, între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.A."Lusmecon"** cu sediul în mun. Chişinău, str.Uzinelor 205/1, tel. 022473382, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaş în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a drumului M1 Frontieră cu România-Leuşeni-Chişinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 71,00-81,00** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **octombrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

012/2019

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **46 542 461,74 (patruzeci și șase milioane cinci sute patruzeci și două mii patru sute șaiszeci și unu lei, 74 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans pînă la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10. În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.

D. D. D.

- 6.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16. Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona

respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 6.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiere și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

Handwritten signature or mark

- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

D. D. D. D.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.

Original

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

S.A. "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842

c/ IBAN MD53AG000022517010131321

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr.06-14/437 din 12.11.2019.

“15” mai 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**, în persoana directorului general interimar, dl.Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.A.,Lusmecon**, în persoana directorul dl Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/437 din 12.11.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km71,00-81,00".

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți, ca rezultat al faptului că în procesul de execuție a lucrărilor de frezare s-a depistat că adâncimea casetelor este mai mare decât cea prevăzută în proiect, în mediu cu 3 cm. Astfel pentru suplinirea casetelor este necesară majorarea volumului de beton asfaltic pentru toată suprafața. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. "Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată" subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 3 397 161,50 (trei milioane trei sute nouăzeci și șapte mii una sută șaiszeci și unu lei, 50 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la mărirea valorii contractului.

"Beneficiar"

Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP

"Antreprenor general"

S.A.,Lusmecon

or.Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/ IBAN MD53AG000022517010131321
B.C."Moldova Agroindbank"S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ

Copie



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr.06-14/437 din 12.11.2019.

“ 16 ” iulie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și S.A., „Lusmecon”, în persoana directorului dl. Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/437 din 12.11.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km71,00-81,00”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. 12 din 16.07.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse constituie 2 331 041,11 (două milioane trei sute treizeci și una mii patruzeci și unu lei, 11 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

”Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOPI



”Antreprenor general”

S.A., „Lusmecon”

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/ IBAN MD53AG000022517010131321
B.C.”Moldova Agroindbank” S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3 la contractul nr.06-14/437 din 12.11.2019.

“ 22 ” octombrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și S.A., „Lusmecon”, în persoana directorului dl. Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/437 din 12.11.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km71,00-81,00”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.27 din 09.10.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor excluse constituie 1 506 841,00 (un milion cinci sute șase mii opt sute patruzeci și unu lei) cu TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

”Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău bugetul de stat
c/TVA 0503300

Director general interimar
Veaceslav POTOP



”Antreprenor general”

S.A., „Lusmecon”

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/ IBAN MD53AG000022517010131321
B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ



Aprob.



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 48 din 16 Octombrie 2020

Privind lucrările de reparație a drumului „M1 frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 71,00 – 81,00”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/437 din 12 noiembrie 2019 și acordurilor adiționale AA nr.1 din 25.05.2020, AA nr.2 din 16.07.2020, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 239 din 6 octombrie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 12 - 16 Octombrie 2020 fiind formată din:

Președinte:	Iu. Pașa	- director adjunct, Î.S. „ASD”
membri:	R. Rogovei	- șef, direcția infrastructură de transport a MEI
	V. Cotruță	- șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
	P. Triboi	- șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD”
	I. Grosu	- șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD”
	I. Alexa	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
	P. Spînu	- șef, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
	Ș. Caunov	- director S.A. „Drumuri Ialoveni”
	V. Corabieru	- S.A. „Drumuri Ialoveni”, sector Ialoveni

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant A. Ghilaș – director, S.A. „Lusmecon”
- b) proiectant V. Lujanschii – inginer șef proiect, S.A. „Intexnauca”
- c) responsabil tehnic T. Vartolomei – specialist principal, Î.S. „ASD”

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu fără rezerve și poate fi dată în folosință

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezența neconformităților la obiect.
(anexa nr 3)

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

- a.) Lucrarea a fost executată de către S.A. „Lusmecon”
b.) Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de către S.A. „Intexnauca”
c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **noiembrie 2019** sfârșitul lucrărilor **septembrie 2020**

7. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

Lungimea tronsonului – 10 000 m.l, a) lățimea platformei drumului b – 11.0 m.l, b) lățimea părții carosabile b – 7.0 m.l, c) lățimea acostamentelor consolidate cu piatră spartă b – 1,5 m, h – 0, 15 m.

Construcția sistemului rutier :

- a) Frezarea casetelor a părții carosabile din ambele părți cu h med – 8 cm și o lățime de 1,2 m – 2,2 m, L – 9244 m.l., strat de beton asfaltic SKBg – II, hmed – 8 cm, S – 30444 m²;
b) Strat de bază din beton asfaltic SKPg – I, h – 6 cm, S – 73560 m²;
c) Strat de uzură din beton asfaltic SMBg – II, h – 4 cm, S – 73560 m²;
d) Reparația podeștelor tubulare D – 1 m – 5 bucăți.

8. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 59, 46 mln. lei, inclusiv LCM – 57, 13 mln. lei.

9. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – 52 319 008, 42 lei, inclusiv LCM – 50 763 808, 07 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

10. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

11. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi Vineri
16 octombrie 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte





membri:



R. Rogovei




V. Cotruță




P. Triboi



I. Grosu



I. Alexa

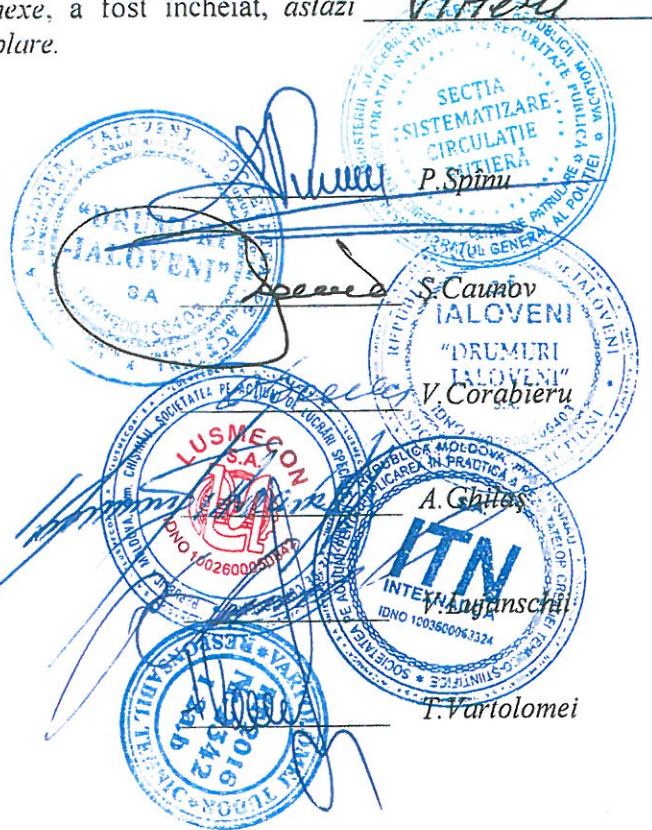

12. Reparația drumului „M1 frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina. km 71,00 – 81,00”, în baza recomandărilor comisiei este

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.A. „Lusmecon”

Octombrie 2020

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Octombrie 2020

V. Cotruță

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 48 din 16 octombrie

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	<p>Infrângerea și ocuparea pietrișului pe acostamente Drumul M.I. KM 41+00 - KM 81+00 lucrările menționate nu s-au executat de întreprinderea de exploatarea a drumurilor</p>

Președinte Iu. Pașa

Membri: R. Rogovei

V. Cotruță

P. Triboi

I. Grosu

I. Alexa

P. Spînu



V. Corabieru

A. Ghilag

V. Lujanschi

T. Vartolomei
