

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești**
2. Numărul și data contractului **Nr.88 din 29.12.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Cornești, r-nul Ungheni**
4. Adresa beneficiarului **or. Cornești, r-nul Ungheni**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **35 479 886,00 lei**
  - b) finală (la data finalizării contractului) **32 227 474,55 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **15 luni**
  - b) efectiv realizată **20 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. din 04.10.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gaina Cristina**

Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Foremcons”**



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 88

privind achiziția prin Licitație Publică

29 decembrie 2016

or. Cornești, r-l Ungheni

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Licitație Publică nr. 634/16** din data **9 decembrie 2016**, între **Primăria or. Cornești, r-l Ungheni** telefon 0236-61-236, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601003183 reprezentat prin doamna **Primar Vera Buga**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **Foremcons SRL**, cu sediul în **mun. Chișinău, bd. Dacia 40/2**, telefon/fax: **0-22-73-83-18**, e-mail: **foremcons@mail.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **0013302** din **26.01.2005**, autorizat pentru activitatea în construcții: **licența A MMII nr.036803 din 28 mai 2010** eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin domnul **Director Axentii Dumitru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornești.**

Cod CPV: **45247130-0** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **15 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **35 479 886,00 lei (inclusiv TVA)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5.1. Ajustarea valorii contractului de achiziții publice, încheiat pe un termen mai mare de un an, se efectuează reieșind din rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

a) pentru inflație:

$$V_a = [ (V_1 - V_2) \times \frac{R_i}{12} \text{cN}\lambda \text{ \%} ] + V_3;$$

b) pentru deflație:

$$V_a = V_3 - \left[ (V_1 - V_2) \times \frac{R_d}{12} \cdot N_\lambda \% \right],$$

unde:

$V_a$  – valoarea actualizată a contractului;

$V_1$  – valoarea totală a contractului;

$V_2$  – valoarea executată a contractului;

$V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului și valoarea executată a contractului ( $V_3 = V_1 - V_2$ );

$R_i$  – rata inflației pentru anul precedent ajustării;

$R_d$  – rata deflației pentru anul precedent ajustării;

$N_\lambda$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

5.2. Ajustarea valorii contractului de achiziții publice de lucrări nu va schimba prețurile unitare din devizul-ofertă. Valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în devizul-ofertă și în procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate, înainte de Taxa pe Valoarea Adăugată.

## 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză. Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale,

- Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
  - 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
  - 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
  - 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 1 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 1 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
  - 7.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
  - 7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
  - 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
  - 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
  - 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
  - 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind că prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
  - 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
  - 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
  - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă**

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise**

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
  - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **10 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remediilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.



### 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 iulie 2018.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**“ BENEFICIAR ”:** Primăria or. Cornești

Adresa: **or. Cornești, r-nul Ungheni**

Tel./Fax: **0236-61-236**

Denumirea **Ministerul Finanțelor,**

Băncii: **Trezoreria de Stat**

Adresa **or. Ungheni**

Băncii: **TREZMD2X**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cod

IBAN: \_\_\_\_\_

Cod fiscal: **1007601003183**

**“ ANTREPRENOR ”:** Foremcons SRL

Adresa: **Mun. Chișinău, bd. Dacia 40/2**

Tel./Fax: **022-73-83-18**

Denumirea **BC „Moldinconbank” SA,**

Băncii: **fil. Ciocana**

Adresa **Mun. Chișinău, bd. Mircea**

Băncii: **cel Bătrîn 30**

Cod Bancar: **MOLDMD2X349**

Cod IBAN: **MD61ML00000000225124**

IBAN: **978**

Cod fiscal: **1005600001878**

## 16. Semnăturile părților

**“ BENEFICIAR ”:**



**“ ANTREPRENOR ”:**





# ACHIZIȚII PUBLICE



## ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr.88 din 29 decembrie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi 13 mai 2018, în or. Cornești, între Primăria orașului Cornești raionul Ungheni, în persoana doamnei primar Buga Vera și SRL „Foremcons”, în persoana domnului director Dumitru Axentii în scopul modificării Contractului Nr.88 din 29 decembrie 2015 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Trezoreria Teritorială cu nr.2017.0000000579 din 25.01.2017.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al primăriei orașului Cornești raionul Ungheni Cod CPV:45247130-0, Nr. 2017.0000000579 din 25 ianuarie 2017.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifică prevederile pct. 14.5. din contractul de antrepriză nr.88 din 29 decembrie 2016, astfel, termenul de valabilitate a contractului este pînă la 31.07.2020.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC ”:



“ AUTORITATE CONTRACTANT ”:



nr. procedurii 634/16  
nr. intrării 202 003929  
nr. doc. 1-93/18

ObjID 519408  
CPV 45247130  
JANO 1005600001878



# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr.2

la contractul Nr. 88 din "29,, decembrie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi "24,, februarie 2020, între Primaria or. Cornești, în persoana domnului primar Vera Buga și SRL Foremcons, în persoana domnului director Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr. 88 din "29,, decembrie 2016 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 1-20/17 din 03.01.2017, înregistrat de către Trezoreria Teritorială cu nr 2017-0000000579 din 25.01.2017

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 24 februarie 2020

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifica prevederile pct. 4.1. din contractul de antrepriza nr. 88 din 29 decembrie 2016, astfel valoarea contractului constituie **36 818 132,15** lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Primaria or. Cornesti la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":

L.S.



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



Nr. proced. 634/16  
nr. intrare 202003989  
nr. doc 1-94/18

DBIJD 619409  
CPV. 45247130-0  
IDNO 1005600001878



# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr.3

la contractul Nr. 88 din "29," decembrie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi "24," februarie 2020, între Primaria or. Cornești, în persoana domnului primar Vera Buga și SRL Foremcons, în persoana domnului director Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr. 88 din "29," decembrie 2016 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 1-20/17 din 03.01.2017, înregistrat de către Trezoreria Teritorială cu nr 2017-0000000579 din 25.01.2017

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 24 februarie 2020

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifica prevederile pct 14.5. din contractul de antrepriza nr. 88 din 29 decembrie 2016, astfel termenul de valabilitate a contractului este de pînă la 31 iulie 2022

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Primaria or. Cornești la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC ”:



“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:



## ACORD ADIȚIONAL Nr.4

la contractul Nr 88 din „29” decembrie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi ”14., aprilie 2022, între Primaria or. Cornesti, în persoana d-nei primar – Buga Vera și SRL Foremcons, în persoana domnului director Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr 88 din „29” decembrie 2016 numit în continuare Contract) semnat în urma desfasurarii procedurii de achizitie publica nr.1-20/17 din 03.01.2017.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru nr 3 din 14.04.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifica prevederile pct. 4.1. din contractul de antrepriza nr. 88 din 29 decembrie 2016, astfel valoarea contractului constituie 37 536 979.93 lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



## ACORD ADIȚIONAL Nr.5

la contractul Nr 88 din „29” decembrie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi „26,, aprilie 2022, între Primaria or. Cornesti, în persoana d-nei primar – Buga Vera și SRL Foremcons, în persoana domnului director Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr 88 din „29” decembrie 2016 numit în continuare Contract) semnat in urma desfasurarii procedurii de achizitie publica nr.1-20/17 din 03.01.2017.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru nr 4 din 26.04.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifica prevederile pct 14.5. din contractul de antrepriza nr. 88 din 29 decembrie 2016, astfel termenul de valabilitate a contractului este de pina la **31 iulie 2023**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



## ACORD ADIȚIONAL Nr.6

la contractul Nr 2017-0000000579 din „25” ianuarie 2017

Prezentul acord este semnat astăzi ”29, august 2022, între Primaria or. Cornesti, în persoana d-nei primar – Buga Vera și SRL Foremcons, în persoana domnului director Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr 2017-0000000579 din „25” ianuarie 2017 (numit în continuare Contract) semnat în urma desfasurarii procedurii de achizitie publica nr.1-20/17 din 03.01.2017.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru nr 5 din 29 august 2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifica prevederile pct. 4.1. din contractul de antrepriza nr. 2017-0000000579 din „25” ianuarie 2017, din motivul excluderii stației de tratare a apei cu suma de 5 309 505.38 din contract, astfel valoarea contractului după modificare constituind 32 227474.55 lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Axentii Dumitru  
Date: 2022.08.29 16:31:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Buga Vera  
Date: 2022.08.29 15:59:00 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Ciuntu Iuliana  
Date: 2022.09.26 15:33:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





## ACORD ADIȚIONAL Nr.7

la contractul Nr **88** din „29” decembrie 2016 (nr trez. 2017-0000000579 din 25.01.2017)

Prezentul acord este semnat astăzi ”03,,noiembrie 2022, între **Primaria or. Cornesti**, în persoana d-nei primar – **Buga Vera** și **SRL Foremcons**, în persoana domnului director **Axentii Dumitru**, în scopul modificării Contractului Nr **88** din „29” decembrie 2016(nr trez. 2017-0000000579 din 25.01.2017) numit în continuare Contract) semnat în urma desfasurarii procedurii de achizitie publica nr.1-20/17 din 03.01.2017.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru nr 6 din 03.11.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se modifică prevederile punctului 7.10 .din contractul de antrepriza nr. 88 din 29 decembrie 2016(nr trez. 2017-0000000579 din 25.01.2017), astfel autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile de la data semnării procesului-verbal la terminarea lucrărilor.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Axentii Dumitru  
Date: 2022.11.03 09:22:56 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Buga Vera  
Date: 2022.11.03 09:05:22 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## PROCES – VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

din 04.10.2022

privind lucrarea Lucrari de constructie a sistemului de apeduct, canalizare si epurare a or. Cornești și sat. Romanovca r-nul Ungheni

executată la obiectivul din or. Cornești, r-nul Ungheni

în cadrul contractului nr. 88 Din 29 decembrie 2016

încheiat între „Foremcons” SRL și Primăria or. Cornești, r-nul Ungheni

pentru lucrările de Lucrari de constructie a sistemului de apeduct, canalizare si epurare a or. Cornești și sat. Romanovca r-nul Ungheni

în baza autorizației de construcție №01 din 17.03.2017

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03-04 octombrie 2022 fiind formată din:

Buga Vera – primarul or. Cornești

Gheceanu Maria – administrator Î.M. “Regia Apă - Canal”

Livandovschi Vasile – specialist

Manole Luminița – contabil șef

Popa Serghei – consilier

Moraru Artur – consilier

Vasiliev Piotr – consilier

Baciu Valentin – consilier

Roșca Sergiu – șef adjunct direcție S.E.

Frunze Petru – responsabil tehnic- utilaj

Pleșca Grigore – responsabil tehnic – apeduct

Burungiu Mihai - Specialist atestat in domeniu

Guțan Veaceslav - Specialist atestat in domeniu

2. Au mai participat

Axentii Dumitru – director „Foremcons” SRL.

Mocanu Dumitru – diriginte lucrări specializate

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – recepționarea lucrărilor în valoarea de 32 227 474,55 lei (treizeci și două de milioane două sute douăzeci și șapte mii patru sute șaptezeci și patru lei ,55 bani)

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive, recepționarea lucrărilor în valoarea de (32 227 474,55 lei )

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea lucrărilor

7. Prezentul proces-verbal conține 5 file , cu un total de 5 exemplare.

7.1 Descrierea obiectivului recomandat spre recepție: Rețea de apeduct d50÷200mm – 20 178 m, rețea canalizare d160÷200mm – 8 075 m, camine d1,0÷2,0m – 274 buc, construcția unui rezervor de apa in volum de 1000m<sup>3</sup>, stația de epurare a apelor uzate cu debit 300m<sup>3</sup>/zi – 1 buc, stație de pompare, amenajarea teritoriu rezervor de apă, amenajarea teritoriu stație de epurare.

8. Concluzia Agenției pentru Supravegherea Tehnică :

Lucrarea : Lucrari de constructie a sistemului de apeduct, canalizare si epurare a or. Cornesti și sat. Romanovca r-nul Ungheni



Buga Vera 

Gheceanu Maria 

Livandovschi Vasile 

Popa Serghei 

Moraru Artur 

Manoli Luminita 

Vasiliev Piotr 

Roșca Sergiu 

Frunze Petru  

Pleşca Grigore  

Burungiu Mihai  

Guțan Veaceslav  

Baciu Valentin 

*Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor. Până la recepția finalizată de efectuat controlul și costul volumelor lucrărilor executate.*  
11.10.2022. N. Moroș

  
Nicolae MOROI  
Șef Direcție

TRANSMISĂ:

Executantul:

"Foremcons" SRL



PRIMITĂ

INVESTITORUL:

Primăria or. Cornesti, r-nul Ungheni



## Anexă

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului **Lucrari de constructie a sistemului de apeduct, canalizare si epurare a or. Cornești și sat. Romanovca r-nul Ungheni** a fost finalizat.

**Lista anexă nr.1.** Din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

A large area of the document is covered by a blue scribble, indicating that the list of missing or incomplete items is not provided.

Președintele comisiei



Buga Vera

Lista-anexă nr.2. Lucrări care nu au fost executate


- 1 Căminul de golire a rezervorului de 1000 m<sup>3</sup> de schimbat capacul din fontă
- 2 Căminul de distribuire a apei către satul Romanovca la platforma A. - de curățat și de instalat scara de acces
- 3 De amenajat teritoriul la platforme A și B (de cosit)
- 4 De reparat terosementul în locurile oșerate de pământ în urma ploilor în s Romanovca
- 5 Canalul de evacuare a apei atmosferice la ȘB de curățat
- 6 De reparat scurgerea embrăcăminteii din beton (terosementul)
- 7 De întocmit proces verbal cu privire la citirea instrucțiunii tehnice la exploatarea și funcționarea ictileului Biotel 300 din partea antreprenorului

Președintele comisiei



Buga Vera

**Lista-anexă nr.3. Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului**

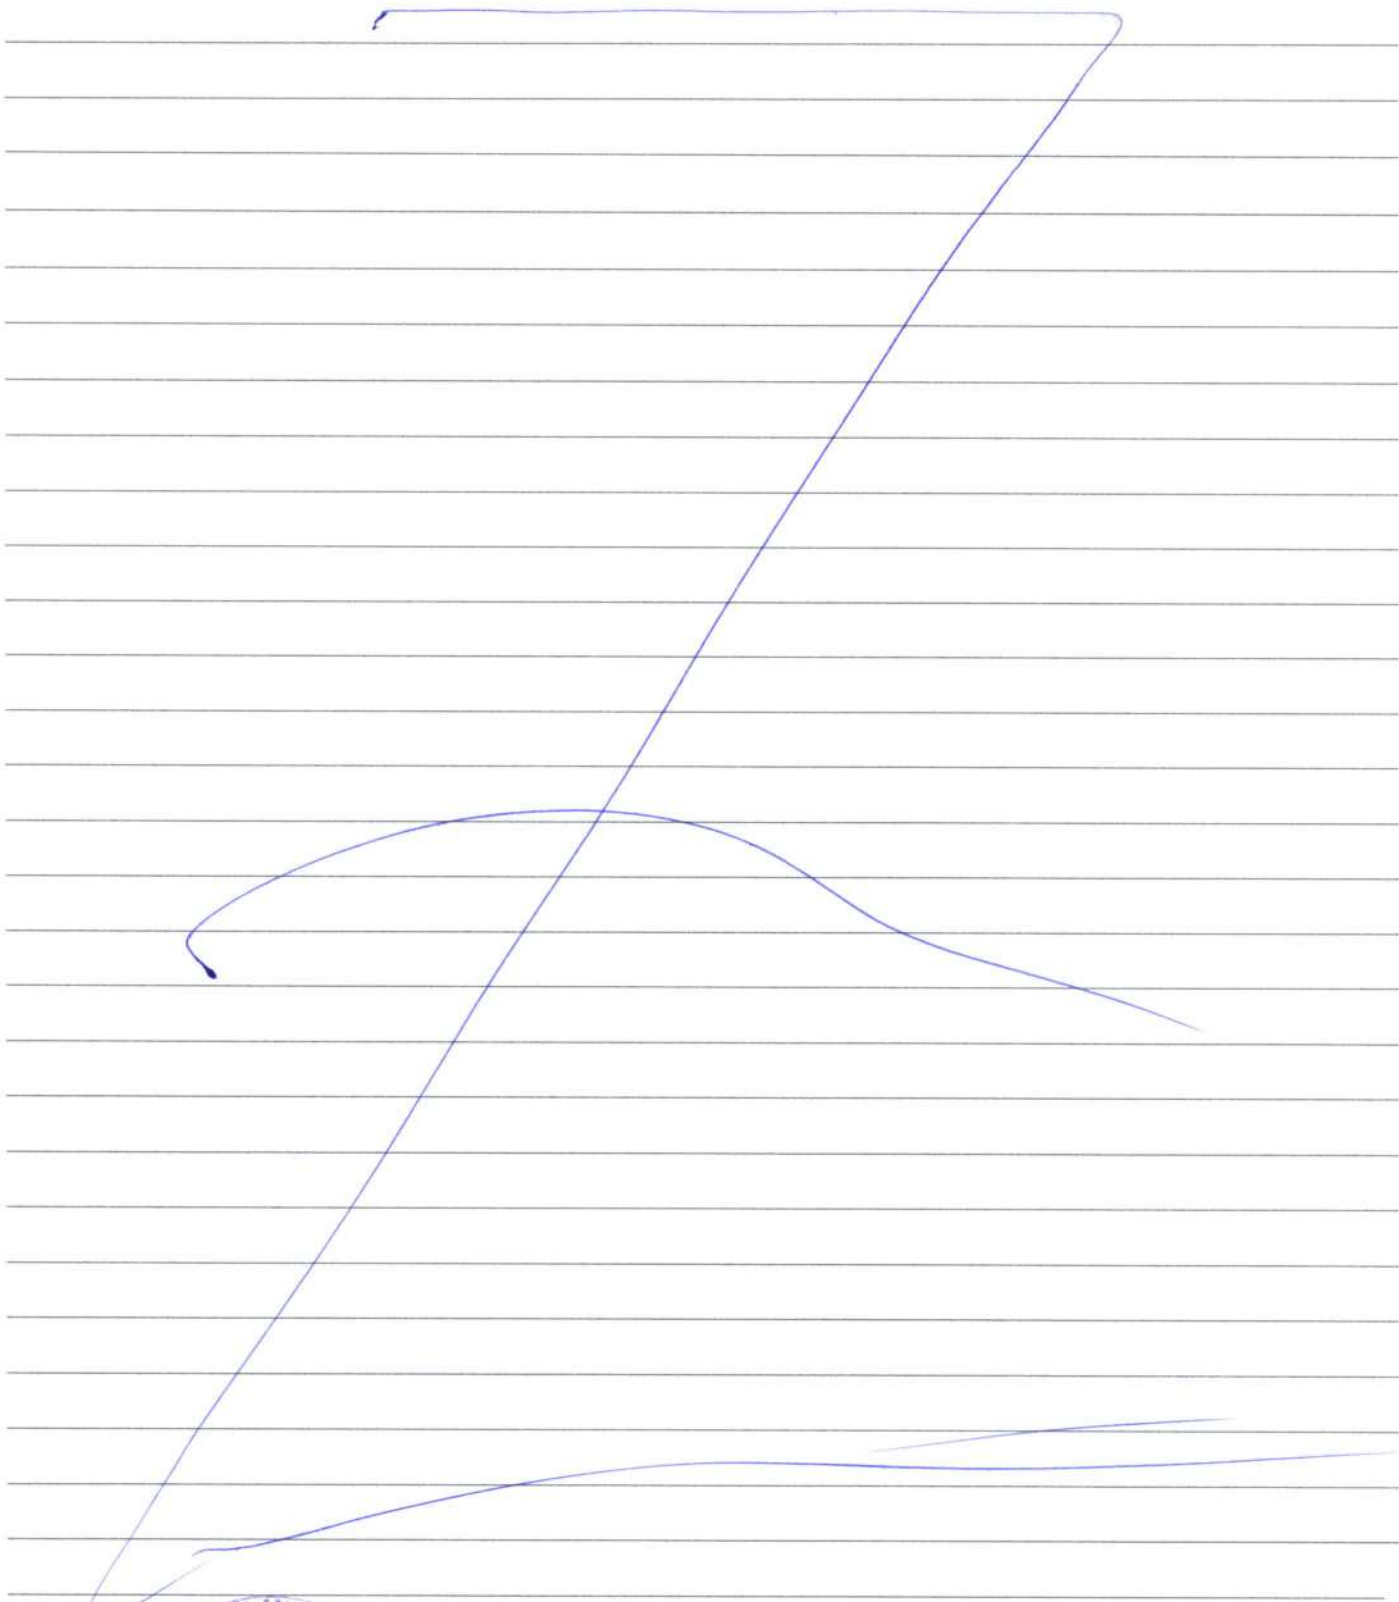

**Președintele comisiei**

**Buga Vera**



Republica Moldova, Raionul Ungheni

Consiliul orașenesc Cornești

MD 3608, orașul Cornești str. Gavriil Musicescu - 45,

tel/fax (236) 61 2-44; 61 2-02; tel. (236).61 2 -36

orasul.cornesti@gmail.com



Nr. 283

din 29.11.2022

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria or. Cornești confirmă faptul că S.C. „Foremcons” SRL a executat **„Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare localiza în orașul Cornești și satul Romanovca, raionul Ungheni”** în baza autorizației de construcție nr. 01 din 17.03.2017

Colaborarea cu S.C. „Foremcons” SRL a început în anul 2017, conform contractului de antrepriză nr 88, iar în perioada de execuție a lucrărilor personalul de conducere a dat dovadă de profesionalism, flexibilitate și receptivitate în rezolvarea oricărei probleme apărute.

Firma S.C. „Foremcons” SRL și-a onorat angajamentele în parametrii optimi, iar serviciile prestate s-au ridicat la standardele impuse conform legislației în vigoare.

Pe parcursul colaborării, d-nul Axentii Dumitru a demonstrat capacități deosebite de management a echipelor din subordine, putere de muncă, rezistență la efort și condiții de stres, dând dovadă de viziune și dinamism.

APL aduce sincere mulțumiri echipei SC „Foremcons” SRL pentru munca executată și recomandă cu încredere S.C. „Foremcons” SRL având convingerea că apelând la serviciile acestui prestator veți câștiga un colaborator profesionist, devotat și extrem de capabil, indiferent de mărimea și complexitatea lucrărilor.

Pentru orice detalii suplimentare ne puteți contacta pe e-mail:  
**orasul.cornesti@gmail.com.**

Cu respect

Primar de Cornești



Vera Buga
