

„02” aprilie 2024

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „IALOVENI GAZ”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului Mihail BRAGA, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „ANDRONIX-DIN”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana directorului Emilian MARGINĂ, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrări de construcție-montare la obiectul **”Gazificarea sectorului particular PRG 1, 2, 3 din s. Lozova, r-nul Strășeni”**, și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect și a graficului de executare a lucrărilor stabilit de către părți (anexat la prezentul Contract), respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările utilizând materialele proprii.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările de construcție-montare stabilite în pct.1.1. până la **30 iulie 2024 și darea obiectelor în exploatare este de până la 25 august 2024.**

### 2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Valoarea totală a lucrărilor de construcție-montare descrise în pct. 1.1 constituie **1 831 638, 41 lei (un milion opt sute treizeci și una mii șase sute treizeci și opt lei, 41 bani) inclusiv TVA** (conform ofertei depuse la achiziționarea serviciilor, în procesul efecuirii achiziției de valoare mică).

2.2. Achitarea se va efectua în termen de 90 zile după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare, după prezentarea documentației executiv tehnice în volum deplin, a semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale și a ridicării topografice a rețelelor de gaze exterioare construite, în format electronic și pe suport de hârtie (scara 1:500).

2.3. Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.4. „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

### 3. DURATA CONTRACTULUI

3.1 Acțiunea Contractului începe la data semnării și **este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a tuturor obligațiilor și condițiilor contractuale de către ambele „Părți”, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la pct. 1.4. al Contractului.**

3.2 Până la începerea lucrărilor „Beneficiarul” se obligă să transmită „Antreprenorului” Documentația tehnică de execuție.

3.3 Finalizarea lucrărilor de construcție-montare se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

### 4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1. „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările de construcție-montare executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și

# ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Post Reglare a Gazelor cu regulator de presiune tip FRG/2MB Dn 25 - 2 reglatoare

" 05 " 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în  
r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer sef SRL "IALOVENI GAZ"

Vidrasco Ivan  
(numele, prenumele, funcția)

Organizatia de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău

Cucimenco Marina  
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: \_\_\_\_\_

Vrîncean Anton  
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector

Madan Ioana  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN"

Margină Emilian  
(numele, prenumele, funcția)

## A STABILIT:

1. Antreprenorul general: SRL "Andronix-Din" or. Chișinău

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a Postului de Reglare a Gazelor cu  
regulator de presiune, tip FRG/2MB Dn 25 - 2 reg.;

(genurile de lucrări)

2. Organizațiile subantreprenorii n-au participat

(denumirea organizației)

au efectuat \_\_\_\_\_

\* \* \*

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 09.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an  
(luna ,anul) (luna ,anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat ,în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentație: actul de recepție, fisa tehnica, proiectul de executie a lucrarilor, certificatele de calitate si conformitate a tevii si a utilajului, legitimitatia sudorului.

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " " 2024 an.

Președintele comisiei

Vidrasco Ivan

Organizatia de proiectare  
SRL "LUXGAZ"

Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică


Vrîncean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică

Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului

Margină Emilian

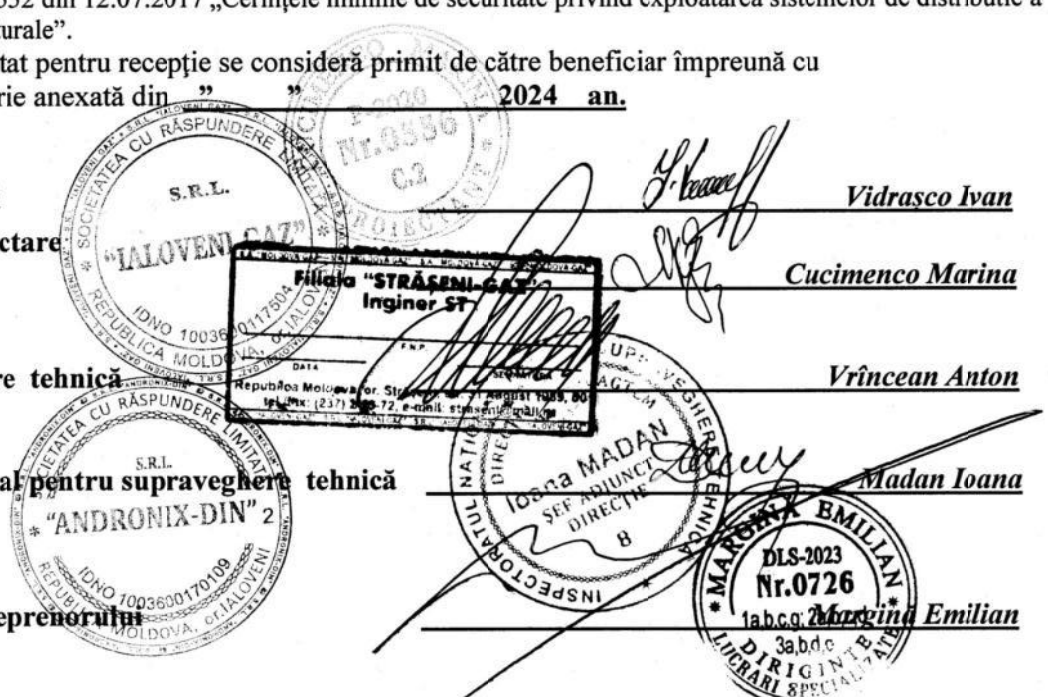

ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

" 05" 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 3.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ"

Vidrasco Ivan

(numele, prenumele, funcția)

Organizatia de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chisinau

Cucimenco Marina

(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică:

Vrincean Anton

(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector

Madan Ioana

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chisinau

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune joasă: Teavă PE 100 SDR 17,6 subterană: Ø-75x4,3 mm L- 224,0 m.l.;

Ø-63x3,6 mm L- 542,0 m.l.;

Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 386,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 631,0 m.l.;

Ø-32x3,0 mm L- 562,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-76x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø-25x2,8 mm L- 12,0 m.l.;

Ø-20x2,8 mm L- 116,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii

\*\*\*

(denumirea organizației)

au efectuat

\*\*\*

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chisinau

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 05.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 3.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 2024 an.

Președintele comisiei

Vidrasco Ivan

Organizatia de proiectare SRL "LUXGAZ"

Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică


Vrincean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică

Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului

Margină Emilian

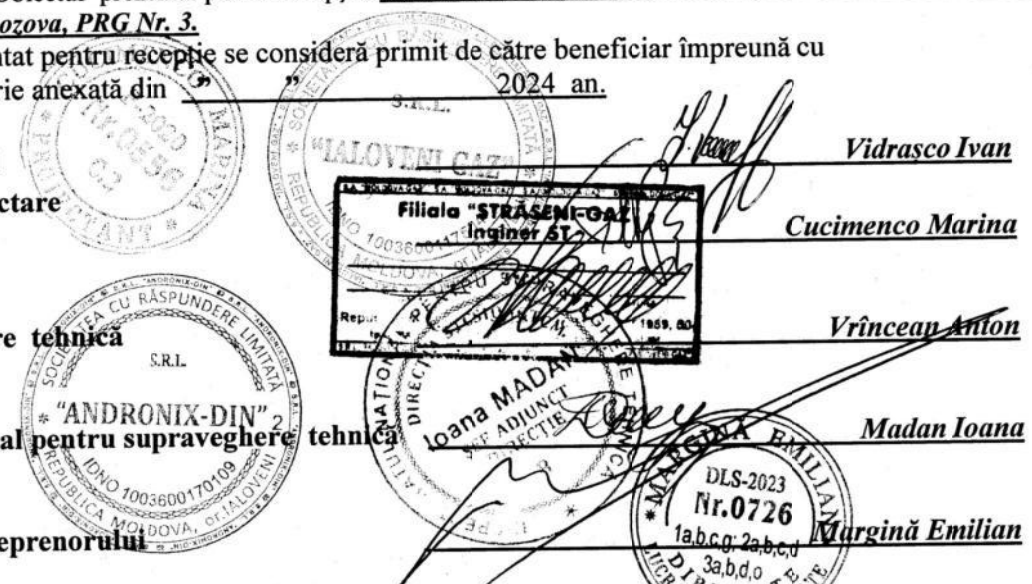

ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

„ 05” 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrasco Ivan

(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău Cucimenco Marina

(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Vrincean Anton

(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău

(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de

presiune joasă: Teavă PE 100 SDR 17,6 subterană: Ø-63x3,6 mm L- 247,0 m.l.;

Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 285,0 m.l.; Ø-40x3,7 mm L- 389,0 m.l.;

Ø-32x3,0 mm L- 392,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-57x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø-25x2,8 mm L- 4,0 m.l.;

Ø-20x2,8 mm L- 71,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii \*\*\*

(denumirea organizației)

au efectuat \*\*\*

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 05.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din ” ” 2024 an.

Președintele comisiei Vidrasco Ivan

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică Vrincean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului Margină Emilian



ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

"05" 11 2024 an

r-nul Strășeni

Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1; PRG Nr. 3.  
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Inginer șef SRL "IALOVENI GAZ" Vidrașco Ivan  
(numele, prenumele, funcția)

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" or. Chișinău Cucimenco Marina  
(numele, prenumele, funcția)

Inginer supraveghere tehnică: Vrîncean Anton  
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" Margină Emilian  
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul: S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău  
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune medie: Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-50x4,6 mm L- 1621,0 m.l.;

Ø-40x3,7 mm L- 7,0 m.l.;

Teavă din oțel aeriană: Ø-32x3,0 mm L- 4,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii \*\*\*  
(denumirea organizației)

au efectuat \*\*\*  
(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 27/2021 elaborat "LUXGAZ" S.R.L or. Chișinău  
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:  
începutul lucrărilor 08.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an  
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”. Obiectul prezentat pentru recepție: Alimentarea cu gaze naturale a caselor particulare amplasate în r-nul Strășeni, sat. Lozova, PRG Nr. 1; PRG Nr. 3.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " " 2024 an.

Președintele comisiei Vidrașco Ivan

Organizația de proiectare SRL "LUXGAZ" Cucimenco Marina

Inginer supraveghere tehnică Vrîncean Anton

Inspectoratul National pentru supraveghere tehnică Madan Ioana

Reprezentantul antreprenorului Margină Emilian



# ACT

## De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

” 3 ” 03 2023 an

or. Chișinău

### Alimentarea cu gaze naturale a blocului locativ amplasat pe str. Cojocarilor, 20/C, mun. Chișinău.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului

Director SRL "CITY BUILDING"

Torgai Grigore

(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului

SRL "ANDRONIX-DIN"

Lupașco Ilie

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, Ing. Sup. tehnică gaze S.R.L. "Chișinău - Gaz" Scutaru Valeriu

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Director S.R.L. "Andronix Din"

Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

### A STABILIT

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău

{denumirea organizației}

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului interior de presiune joasă:

#### Fatadă:

Teavă de oțel aeriană: Ø - 89x3,0 mm L- 1,0 m.l.; Ø - 76x3,5 mm L- 21,0 m.l.;

Ø - 57x3,5 mm L- 59,0 m.l.; Ø - 40x3,5 mm L- 14,0 m.l.; Ø - 32x3,0 mm L- 13,0 m.l.;

#### Interior:

Teavă de oțel montată la interior: Ø - 57x3,5 mm L- 4,0 m.l.; Ø - 40x3,5 mm L- 9,0 m.l.;

Ø - 32x3,0 mm L- 39,0 m.l.; Ø - 25x2,8 mm L- 20,0 m.l.; Ø - 20x2,8 mm L- 201,0 m.l.;

Ø - 15x2,8 mm L- 19,0 m.l.; Aragaz Ar-4-24 unit; Cazan Q=24 kw-27 buc;

Contor G 4-T-27 unit;

Adresa: or. Chisinau, str. Cojocarilor nr. 22, ap. 4a.

#### Se anulează:

Teavă de oțel subterană: Ø - 57 mm L- 6,0 m.l.;

Teavă de oțel aeriană: Ø - 32 mm L- 20,0 m.l.;

#### Se montează:

Teavă de oțel aeriană: Ø - 32x3,0 mm L- 21,0 m.l.;

{caracteristica succesivă a obiectului-lungimea, presiunea, tipului utilajului montat}

2. Organizațiile subantreprenorii

\*\*\*

(denumirea organizației)

au efectuat

\*\*\*

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 018-01/22-AGE/AGI elaborat „Andronix-Din”, S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 11.2022 an finalizarea lucrărilor 11.2022 an.

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

56

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în volum deplin în conformitate cu proiectul și prevederile cerințelor minime
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din " 3 " 03 2023 an.

Președintele comisiei



Torgai Grigore

Specialist principal al proiectului  
SRL "Andronix-Din"

Lupasco Ilie

Reprezentantul organizației de exploatare



Scutaru Valeriu

Reprezentantul antreprenorului general



Margină Emilian

# ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare  
Nodul de evidență a Gazelor cu cu contor tip CGR G250

„20” 07 2023

or. Chișinău

Alimentarea cu gaze naturale a Centralei Termice amplasată în or. Chișinău,  
str. Calea Basarabiei nr. 36/4, nr. cad. 0100117.829.05.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei Director: SRL "CARMEZ PROCESSING" Melnic Radion  
(numele, prenumele, funcția)

Spezialist principal al proiectului SRL "Andronix-Din" or. Chișinău Lupasco Ilie  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, Ing. Sup. tehnică gaze S.R.L. "Chișinău - Gaz" Scutaru Valeriu  
(numele, prenumele, funcția)

Agenția pentru supraveghere tehnică Inspector Demiscan Ruslan  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Inginer S.R.L. "Andrinix-Din" Margină Emilian  
(numele, prenumele, funcția)

## A STABILIT:

1. Antreprenorul general: SRL "ANDRONIX-DIN"  
a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a Nodului de Evidență existent cu  
contor tip CGRG 250 Nr.330581; Corector electronic – CIIГ-741 nr. 1919;

(genurile de lucrări)

2. Organizațiile subantreprenorii n-au participat  
(denumirea organizației)  
au efectuat \*\*\*

3. Proiectul nr. № 045-03/23 AGE.1/NE elaborat SRL "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău  
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:  
începutul lucrărilor 05.2023 finalizarea lucrărilor 05.2023  
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în volum deplin în conformitate cu proiectul și prevederile cerințe minime.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "20" 07 2023 an.

Președintele comisiei

Specialist principal al proiectului  
SRL "Andronix-Din"

Reprezentantul organizației de exploatare

Agenția pentru supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general

Melnic Radion

Lupasco Ilie

Scutaru Valeriu

Demiscan Ruslan

Margină Emilian

37

# ACT

## De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

"03" 09 2024 an

or. Chișinău

### Alimentarea cu gaze naturale a imobilului reconstruit și edificarea unui obiectiv comercial și de depozitare din or. Chișinău, str. Otovasca nr. 26, nr. cad. 0100307.979.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei Administrator: SRL "BOMI-SERVIS" Caziuc Dmitri  
(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului SRL "Andronix-Din" or. Chișinău Lupasco Ilie  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „TEHNOGAZOTERM”  
Inginer supraveghere tehnică: Ungureanu Igor  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, S.R.L. "Chișinău - Gaz" Scutaru Valeriu  
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul național pentru supraveghere tehnică Inspector Madan Ioana  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Inginer S.R.L. "Andrinix-Din" Margină Emilian  
(numele, prenumele, funcția)

### A STABILIT:

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău  
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului aerian de presiune medie:

Teavă din oțel aeriană: Ø-40x3,5 mm L-1,5 m.l.;

Se anulează: Teavă din oțel aeriană: Ø-108x3,5 mm L-12,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii \*\*\*  
(denumirea organizației)  
au efectuat \*\*\*  
(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 162-08/23-AGE elaborat "Andronix-Din, S.R.L or. Chișinău"  
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:  
inceputul lucrărilor 01.2024 an finalizarea lucrărilor 01.2024 an  
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în volum deplin în conformitate cu proiectul și prevederile cerințe minime.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "03" 09 2024

Președintele comisiei



Specialist principal al proiectului  
SRL "Andronix-Din"

Reprezentantul organizației  
SRL „TEHNOGAZOTERM”

Reprezentantul organizației de exploatare

Agencia pentru supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general



51

# ACT

De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin

"21" 11 lucrări de construcție-montare

2024 an

or. Chișinău

Alimentarea cu gaze naturale a blocurilor locative amplasate în  
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 15/A; 15/B; 15/C.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei

Administrator: SRL "Braus Imobiliare"

Tirchi Grigore

(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului

SRL "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău

Lupasco Ilie

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, Ing. Sup. tehnică gaze S.R.L. "Chișinău - Gaz"

Grosu Vasile

(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul național pentru supraveghere tehnică

Inspector

Caraman Pavel

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator: S.R.L. "ANDRONIX-DIN"

Margina Emilian

(numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău

(denumirea organizației)

**a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran de presiune medie:**

**Teavă din oțel subterană: Ø-76x3,5 mm L- 3,5 m.l.;**

**Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-75x6,8 mm L- 64,0 m.l.;**

**Teavă din oțel aeriană: Ø-76x3,5 mm L- 17,0 m.l.;**

2. Organizațiile subantreprenorii

\*\*\*

(denumirea organizației)

au efectuat

\*\*\*

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 200-06/21-AGE elaborat S.R.L. "ANDRONIX-DIN" or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 08.2024 an finalizarea lucrărilor 09.2024 an

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executivă)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE


1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în volum deplin în conformitate cu proiectul și prevederile cerințe minime.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din "21" XI 2024 an

Președintele comisiei

Tirchi Grigore

Specialist principal al proiectului  
S.R.L. "ANDRONIX-DIN"



Lupasco Ilie

Reprezentantul organizației de exploatare



Grosu Vasile



Reprezentantul antreprenorului general



# ACT

## De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

” 2 ” 05 2024 an

or. Chișinău

### Alimentarea cu gaze naturale a blocului locativ amplasat în or. Chișinău, str. Ioana Radu nr. 27/7. (Bloc 7).

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului

SC "INAMSTRO" SRL

Panfili Serghei  
(numele, prenumele, funcția)

Spezialist principal al proiectului

SRL "Andronix-Din" or. Chișinău

Lupașco Ilie

Reprezentantul organizației de exploatare, Ing. Sup. tehnică gaze S.R.L. "Chișinău -Gaz" Scutaru Valeriu  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator S.R.L. "Andrinix-Din" Margină Emilian  
(numele, prenumele, funcția)

### A STABILIT

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău  
(denumirea organizației)

**a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului interior de presiune joasă:**

**Fațadă: Teavă de oțel aeriană: Ø - 159x3,5 mm L- 2,0 m.l.; Ø - 133x3,5 mm L- 11,0 m.l.; Ø - 108x3,5 mm L- 90,0 m.l.; Ø - 89x3,5 mm L- 42,0 m.l.; Ø - 76x3,5 mm L- 20,0 m.l.; Ø - 57x3,5 mm L- 110,0 m.l.;**

**Interior: Teavă de oțel aeriană: Ø - 57x3,5 mm L- 221,0 m.l.; Ø - 40x3,5 mm L- 185,0 m.l.; Ø - 32x3,0 mm L- 58,0 m.l.; Ø - 25x2,8 mm L- 50,0 m.l.; Ø - 20x2,8 mm L- 732,0 m.l.; Ø - 15x2,8 mm L- 318,0 m.l.;**

**Aragaz Ar-4-179 unit; Contor G4-T-179 unit; Cazan Q=24 kw-179 buc.**

(caracteristica succesivă a obiectului-lungimea, presiunea, tipului utilajului montat)

2. Organizațiile subantreprenorii \_\_\_\_\_  
\*\*\*  
(denumirea organizației)

au efectuat \_\_\_\_\_  
\*\*\*  
(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 420-10/20-7 AGE/AGI elaborat „Andronix-Din”, S.R.L or. Chișinău  
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:  
începutul lucrărilor 04.2023 an finalizarea lucrărilor 05.2023 an.  
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017, Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din \_\_\_\_\_ 05 2024 an.

Președintele comisiei  
SC "INAMSTRO" SRL

Panfili Serghei

Specialist principal al proiectului  
SRL "Andronix-Din"

Lupașco Ilie

Reprezentantul organizației de exploatare

Scutaru Valeriu

Reprezentantul antreprenorului general

Margină Emilian

# ACT

## De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

"17" 12 2024 an

or. Chișinău

Alimentarea cu gaze naturale a blocului locativ amplasat în mun. Chișinău, str. Constantin Stere nr. 16 nr. cad. 0100517.129.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului

SC "INAMSTRO" SRL

Panfil Serghei

(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului SRL "Andronix-Din" or. Chișinău

Lupașco Ilie

Reprezentantul organizației de exploatare, Ing. Sup. tehnică gaze S.R.L. "Chișinău -Gaz"

Grosu Vasile

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Administrator S.R.L. "Andronix-Din"

Margină Emilian

(numele, prenumele, funcția)

### A STABILIT:

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău

(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran și aerian de presiune joasă:

Teavă PE 100 SDR 17,6 subterană: Ø-110x6,3 mm L-20,0 m.l.; Ø-90x5,2 mm L-42,0 m.l.; Ø-75x4,3 mm L-8,0 m.l.;

Teavă PE 100 SDR11 subterană: Ø-63x5,8 mm L-34,0 m.l.;

Teavă din oțel subterană: Ø-108x3,5 mm L- 3,0 m.l.; Ø-89x3,5 mm L- 1,5 m.l.;

Ø-57x3,5 mm L- 6,0 m.l.;

Fațadă:

Teavă din oțel aeriană: Ø-108x3,5 mm L-42,0 m.l.; Ø-89x3,5 mm L-68,0 m.l.;

Ø-76x3,5mm L-31,0 m.l.; Ø-57x3,5 mm L-258,0 m.l.;

2. Organizațiile subantreprenorii

\*\*\*

(denumirea organizației)

au efectuat

\*\*\*

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 073-03/22-AGE elaborat "ANDRONIX-DIN" S.R.L or. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 04.2023 an finalizarea lucrărilor 05.2023 an

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate conform proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în volum deplin în conformitate cu proiectul și prevederile cerințe minime.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "17" 12 2024 an

Președintele comisiei  
SC "INAMSTRO" SRL

Panfil Serghei

Specialist principal al proiectului  
SRL "Andronix-Din"



Reprezentantul antreprenorului Ing. Sup. Tehnică Gaze S.R.L. "Chișinău -Gaz"

Lupașco Ilie

Nr. 0726

1a,b,c,g; 2a,b,c,d

Reprezentantul organizației de exploatare



Grosu Vasile

# ACT

## De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

„ 03 XI 2025 an or. Chișinău

Complex polifuncțional (producere, administrativ, depozitare, comert) cu parcare subterana pe terenul cu nr. cad. 0100114.120 situat în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Sarmizegetusa nr. 90, Etapa I.  
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei, SA "JLC" Belan Elena  
(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului SRL "Andronix-DIN" or. Chișinău Lupasco Ilie  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „TEHNOGAZOTERM”  
Diriginte: Ungureanu Igor  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, Grosu Vasile  
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul național pentru supraveghere tehnică Inspector  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Responsabil tehnic S.R.L. "Andronix-Din" Malic Elisei  
(numele, prenumele, funcția)

### A STABILIT;

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău  
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului aerian de presiune medie: Teavă din oțel aeriană: Ø - 57x3,5 mm L- 60,0 m.l.;  
(caracteristica succesivă a obiectului - lungimea, presiunea, tipului utilajului montat)

2. Organizațiile subantreprenorii \*\*\*  
(denumirea organizației)  
au efectuat \*\*\*  
(genurile de lucrări)

3. Proiect nr. 065-03/25- AGE elaborat „ANDRONIX-DIN” SRL or. Chișinău  
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:  
începutul lucrărilor 09.2025. finalizarea lucrărilor 09.2025.  
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executării)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în volum deplin în conformitate cu proiectul și prevederile cerințe minime

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „ 03 XI 2025 an

Președintele comisiei Belan Elena

Specialist principal al proiectului SRL "ANDRONIX-DIN" Lupasco Ilie

Reprezentantul organizației SRL „TEHNOGAZOTERM” Ungureanu Igor

Reprezentantul organizației de exploatare Grosu Vasile

Inspectoratul național pentru supraveghere tehnică Malic Elisei

Responsabil tehnic Malic Elisei



# ACT

## De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

"01" 04 2025 an

or. Chișinău

**Reamplasarea gazoductelor subterane d= 63 mm si aeriene d= 57 mm de presiune joasă care au nimerit în zona ge construcție din mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Ghidighici nr. 1/2,**

**nr. cad. 0100518.337**

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: "Anturaj Nou" SRL

Sumchin Anatolie

(numele, prenumele, funcția)

Specealist principal al proiectului SRL "Andronix-Din" mun. Chișinău

Lupasco Ilie

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „TEHNOGAZOTERM”

Diriginte: \_\_\_\_\_

Ungureanu Igor

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare: \_\_\_\_\_

Cobîzchi Oleg

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Responsabil tehnic S.R.L. "Andronix-Din"

Malic Elisei

(numele, prenumele, funcția)

### A STABILIT:

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău

(denumirea organizației)

**A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran si aerian de presiune joasă:**

Adresa: mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Ghidighici nr.1/2 Contor G 25.

**Teavă PE 100 SDR11 subterană: Ø-63x5,8 mm L- 32,5 m.l;**

**Teavă din oțel subterană: Ø-57x3,5 mm L- 1,5 m.l;**

**Teavă din oțel aeriană: Ø-57x3,5 mm L- 17,0 m.l;**

Se anulează:

Teavă PE 100 SDR11 subterană: Ø-63 mm L- 36,0 m.l;

Adresa: mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Ghidighici nr. 1/1 Contor G 10.

**Teavă PE 100 SDR11 subterană: Ø-63x5,8 mm L- 32,5 m.l;**

**Teavă din oțel subterană: Ø-57x3,5 mm L- 1,5 m.l;**

**Teavă din oțel aeriană: Ø-57x3,5 mm L- 23,0 m.l;**

Se anulează:

Teavă PE 100 SDR11 subterană: Ø-63 mm L- 50,0 m.l;

2. Organizațiile subantreprenorii \_\_\_\_\_

\*\*\*

(denumirea organizației)

au efectuat \_\_\_\_\_

\*\*\*

(genurile de lucrări)

3. Proiectul nr. 066-03/25-AGE elaborat "Andronix-Din" S.R.L mun. Chișinău

(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 05.2025 an finalizarea lucrărilor 05.2025 an

(luna anul)

(luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executorie)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

83

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se considera primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „09/11/2025” 2025 an.

Președintele comisiei

*Sumchin Anatolie*

Specialist principal al proiectului  
SRL „Andronix-Din”

*Lupasco Ilie*

Diriginta  
SRL „TEHNOGAZOTERM”

*Ungureanu Igor*

Reprezentantul organizației de exploatare

*Cobîzchi Oleg*

Responsabil tehnic

*Malic Elisei*



# ACT

## De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

„ 25 ” 07 2025 an

or. Chișinău

Alimentarea cu gaze naturale a încăperilor nelocative amplasate în mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Brâncuși nr. 3, nr. cad. 0100110.269.  
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei, SA "MELODIA" Plugariov Victor  
(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului SRL "Metan-K" or. Chișinău Sipitca Ion  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „TEHNOGAZOTERM”  
Diriginte: Ungureanu Igor  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, Scutaru Valeriu  
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul național pentru supraveghere tehnică Inspector  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Responsabil tehnic S.R.L. "Andronix-Din" Malic Elisei  
(numele, prenumele, funcția)

### A STABILIT;

1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău  
(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului aerian de presiune

ioasă: Înainte de NE: Teavă din oțel aeriană: Ø - 76x3,5 mm L- 10,0 m.l.;

Reamplasare NE încorporat cu contor DKZ G -100 Nr: 0015687-1 buc.

(caracteristica succesivă a obiectului - lungimea, presiunea, tipului utilajului montat)

2. Organizațiile subantreprenorii \*\*\*  
(denumirea organizației)

au efectuat \*\*\*  
(genurile de lucrări)

3. Proiect nr. 030125- AGE elaborat „METAN-K” SRL or. Chișinău  
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:  
începutul lucrărilor 07.2025, finalizarea lucrărilor 07.2025  
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executării)

\*\*\*

(tipurile de încercări)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în valoare deplin în conformitate cu proiectul și prevederile cerințe minime

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „ 25 ” 07 2025 an.

Președintele comisiei Plugariov Victor


Specialist principal al proiectului Sipitca Ion  
SRL "Metan-K"

Reprezentantul organizației Ungureanu Igor  
SRL "TEHNOGAZOTERM"

Reprezentantul organizației de exploatare Scutaru Valeriu

Inspectoratul național pentru supraveghere tehnică nu participă

Responsabil tehnic Malic Elisei



42

# ACT

## De recepție a obiectului sistemului de alimentare cu gaze finisat prin lucrări de construcție-montare

"18" 11 2025 an

or. Chișinău

**Reamplasarea rețelei de gaze naturale supraterane de presiune medie D= 57 mm de pe teritoriul imobilului cu destinație de producere situat pe adresa mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Calea Basarabiei nr. 34/A nr. cad. 0100117.846.**  
(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: SA "Renserv Plus" **Tetelea Valeriu**  
(numele, prenumele, funcția)

Spezialist principal al proiectului SRL "Andronix-Din" or. Chișinău **Lupașco Ilie**  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „TEHNOGAZOTERM”  
Diriginte de șantier: Ungureanu Igor  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare: Scutaru Valeriu  
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul național pentru supraveghere tehnică Inspector  
(numele, prenumele, funcția)

Responsabil tehnic S.R.L. "Andronix-Din" **Malic Elisei**  
(numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

**1. Antreprenorul general: S.R.L. "Andronix-Din" or. Chișinău**  
(denumirea organizației)

**A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a gazoductului subteran și aerian de presiune medie:**

**Teavă PE 100 SDR 11 subterană: Ø-40x3,7 mm L-202,0 m.l.;**

**Teavă din oțel subterană: Ø-32x3,0 mm L- 1,5 m.l.;**

**Teavă din oțel aeriană: Ø-32x3,0 mm L- 98,5 m.l.;**

Anulare:

**Teavă din oțel aeriană: Ø-57x3,5 mm L- 337,0 m.l.;**

2. Organizațiile subantreprenorii \_\_\_\_\_ **\*\*\***  
(denumirea organizației)  
au efectuat \_\_\_\_\_ **\*\*\***  
(genurile de lucrări)
3. Proiectul nr. 036-02/25-AGE elaborat „Andronix-Din, S.R.L or. Chișinău  
(denumirea organizației)
4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:  
începutul lucrărilor 10.2025 an finalizarea lucrărilor 10.2025 an  
(luna anul) (luna anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea aspectului exterior al obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executivă)

**\*\*\***

(tipurile de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din "18" 11 2025

Președintele comisiei

*Tetelea Valeriu*

Specialist principal al proiectului  
SRL "Andronix-Din"

*Lupasco Ilie*

Reprezentantul organizației  
SRL „TEHNOGAZOTERM”

*Ungureanu Igor*


Reprezentantul organizației de exploatare

*Scutaru Valeriu*

Inspectoratul național pentru supraveghere tehnică

Reprezentantul antreprenorului general

*Malic Elisei*



# ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare  
Post Reglare a Gazelor cu regulator de presiune tip PΠΓ-50-B-2 reglatoare  
încorporat cu NE cu contor G 160

01 03 2025

or. Chișinău

Alimentarea cu gaze naturale a Secției de producere, amplasată în mun. Chișinău,  
sect. Ciocana, str. Lunca Bâcului nr. 35, nr. cad. 0100302.901.

(denumirea și adresa obiectului)

Comisia de recepție în următoarea componență:

Președintele comisiei: Administrator: SRL "Arvi Invest" Musteață Alexandru  
(numele, prenumele, funcția)

Specialist principal al proiectului SRL "Andronix-Din" or. Chișinău Lupasco Ilie  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației SRL „TEHNOGAZOTERM”  
Inginer supraveghere tehnică: Ungureanu Igor  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare: Scutaru Valeriu  
(numele, prenumele, funcția)

Inspectoratul national pentru supraveghere tehnică Inspector  
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului Responsabil S.R.L. "Andronix-Din" Margină Emilian  
(numele, prenumele, funcția)

## A STABILIT:

1. Antreprenorul general: SRL "Andronix-Din" or. Chișinău  
(denumirea organizației)

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj a Postului de Reglare a Gazelor cu  
regulator de presiune, tip PΠΓ-50-B - 2 reg.;

și NE încorporat cu contor FMR G 160 nr. R000008740;

Corector MacBAT 5 Nr: 1007849038.

(genurile de lucrări)

2. Organizațiile subantreprenorii n-au participat  
(denumirea organizației)  
au efectuat \*\*\*

3. Proiectul nr. 136-05/22-AGE.1 elaborat "Andronix-Din", S.R.L or. Chișinău  
(denumirea organizației)

4. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 02.2025 an finalizarea lucrărilor 02.2025 an  
(luna, anul) (luna, anul)

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată conformitate cu cerințe minime de securitate privind  
exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural a efectuat examinarea aspectului exterior al  
obiectului, a determinat corespunderea lucrărilor de montare efectuate proiectului, a efectuat, în caz de  
necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentație: actul de recepție, fișa tehnică,  
proiectul de execuție a lucrărilor, certificatele de calitate și conformitate a tevii și a utilajului, legitimitatea  
sudurului.

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de montare au fost executate în volum deplin în conformitate cu proiectul, Hotărârea Guvernului  
Republicii Moldova nr. 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a  
gazelor combustibile naturale”.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu  
documentația executorie anexată din "01" 03 2025 an.

Președintele comisiei

Musteață Alexandru

Specialist principal al proiectului  
SRL "Andronix-Din"

Lupasco Ilie

Reprezentantul organizației  
SRL „TEHNOGAZOTERM”

Ungureanu Igor

Reprezentantul organizației de exploatare

Scutaru Valeriu

INPST

Ruslan  
DEMISCAN  
ȘEF DIRECȚIE

Reprezentantul antreprenorului general

Margină Emilian
