

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni**

2. Numărul și data contractului: 119 din 11 octombrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Nisporeni

4. Adresa beneficiarului: or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, nr. 55

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **3 647 530,00 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **4 193 128,00 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 3 luni;

b) efectiv realizată: 19 luni;

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 01 din 23.05.2024

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2026.07.14 09:13:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Semnat: _____

Nume: **Guțanu Pavel**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Nisprofcon” SRL**

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 119
privind achiziția prin Licitatie deschisă

„11” octombrie 2022

Nisporeni

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21062709 din data de 02.09.2022, între:

Primăria or. Nisporeni, cu sediul în or. Nisporeni str. Alexandru cel Bun, 55, telefon: 0(264)2-35-45 , fax: 0(264)2-33-38, IDNO: 1007601006737, reprezentat prin **primar, Robu Grigorii**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **S.C. „Nisprofcon” S.R.L** , cu sediul în or. Nisporeni, str.Sfântul Petru, nr.1, telefon: 0 (264) 24 500, fax: 0 (264) 24 500, IDNO: 1003609010608 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Seria: AMMII, nr. 037044 din „04” aprilie 2006, eliberată de Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Guțanu Pavel**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de **144 luni calendaristice**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 3 647 530,00 lei MD, (trei milioane șas sute patru xeci și șapte mii cinci sute treizeci lei, 00 bani) inclusiv TVA: 607 921,67 lei MD. (șase sute șapte mii nouă sute două zeci și unu lei, 67 bani)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte **garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5%** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. **Perioada de garanție pentru lucrări este de 144 luni calendaristice.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL S.C. „Nisprofcon” S.R.L.

Adresa poștală: or. Nisporeni, str. Sfântul Petru, nr. 1

Telefon: 0 (264) 24 500

Cod fiscal: 1003609010608

Banca: B.C. “Victoriabank” S.A., Suc. Nr. 4,
Nisporeni

Cod: VICBMD2X806

IBAN: MD054VI222400004100125MDL

BENEFICIARUL PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Adresa poștală: 6401, str. Alexandru cel Bun,
55, or. Nisporeni

Telefon: 0(264)2-35-45

Cod fiscal: 1007601006737

Banca: MF-TR Centru Nisporeni

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD09TRPDBI319210A12683AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 119
Din „11” octombrie 2022

PROPUNEREA TEHNICĂ

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni	45400000-1	Conform Caietului de sarcini, Documentației standart și Anunțului de participare publicat.	Conform Caietului de sarcini, Documentației standart și Anunțului de participare publicat.	Conform Caietului de sarcini, Documentației standart și Anunțului de participare publicat.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 119
Din „11” octombrie 2022

PROPUNEREA FINANCIARĂ


Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	U/m	Cant	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni	45400000- 1	unit	1	3647530,00	3647530,00	3 luni
	TOTAL					3647530,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR




BENEFICIAR




INVESTITOR: Primăria or. Nisporeni

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 23 mai 2024

Privind lucrarea "Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni" în cadrul contractului nr. 119 din 11 octombrie 2022 încheiat între Primăria or. Nisporeni și SC "Nisprofcon" SRL pentru efectuarea lucrărilor de "Reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 12 din 14 aprilie 2022, eliberată de Primăria or. Nisporeni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.05.2024 ora 11:00, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Negel Dan – primar al or. Nisporeni

Membrii comisiei:

Lazăr Evghenia – director Casa Națională or. Nisporeni

Cozulea Stanislav - consilier orășenesc

Ungureanu Adrian – consilier orășenesc

Lefter Grigore – specialist Primăria or. Nisporeni

Spatar Viorica – responsabil tehnic

Nogai Ianuș – specialist atestat în construcții

3. Au mai participat la recepție:

Munteanu Gheorghe – reprezentant ONDRL

Pîrcălab Ghenadie – director general interimar AIRM

Guțanu Pavel – director SC "Nisprofcon" SRL

Crîșmari Luca – reprezentant IPM Nisporeni

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexată nr. 1.
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea lucrărilor "Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

1. **Lucrările de construcție au fost terminate complet.**

2. **Documentația tehnică de execuție este completă.**

3. **Obiectul este pregătit pentru exploatare conform destinației.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor "Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni"

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 6001211.088.01, adresa poștală or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, nr. 3, destinația construcție nelocativă, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol 574,6m², suprafața totală, _____, numărul de etaje 2.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 23 mai 2024, ora 11:00.
9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

Comisia de receptie: Digitally signed by Negel Dan
Date: 2024.06.04 09:58:58 EEST
Președintele comisiei: Reason: MoldSign Signature
Negel Dan Location: Moldova



Membrii comisiei:

Lazăr Evghenia

Cozulea Stanislav

Digitally signed by Cozulea Stanislav
Date: 2024.05.24 22:46:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ungureanu Adrian

Digitally signed by Ungureanu Adrian
Date: 2024.05.27 10:07:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lefter Grigore

Digitally signed by Lefter Grigore
Date: 2024.05.24 11:54:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Spatar Viorica

Digitally signed by Spatar Viorica
Date: 2024.05.24 11:01:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nogai Ianuș

Digitally signed by Nogai Ianuș
Date: 2024.05.27 11:16:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:
SC "NISPROFCON" SRL
Guțanu Pavel

«23» mai 2024

L.Ș.



Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.06.04 09:40:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PRIMITĂ:
INVESTITOR:
Primăria or. Nisporeni
Negel Dan

«23» mai 2024

L.Ș.



Digitally signed by Negel Dan
Date: 2024.06.04 09:56:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Se acceptă
semnarea olografă
și semnătura mobilă
pentru semnarea
proceselor verbale
03.06.24
D. Negel

Primarului orașului Nisporeni

Domnul Dan Negel


Demers

Domnule primar, în calitatea Dumneavoastră de Președinte al comisiei de recepție privind lucrarea „Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din orașul Nisporeni,, , solicit să îmi acceptați semnătura mobilă pentru a semna procesul verbal online și semnătura olografă pentru a semna varianta printată a procesului verbal.


3 iunie 2024

Director

Casa Națională Nisporeni

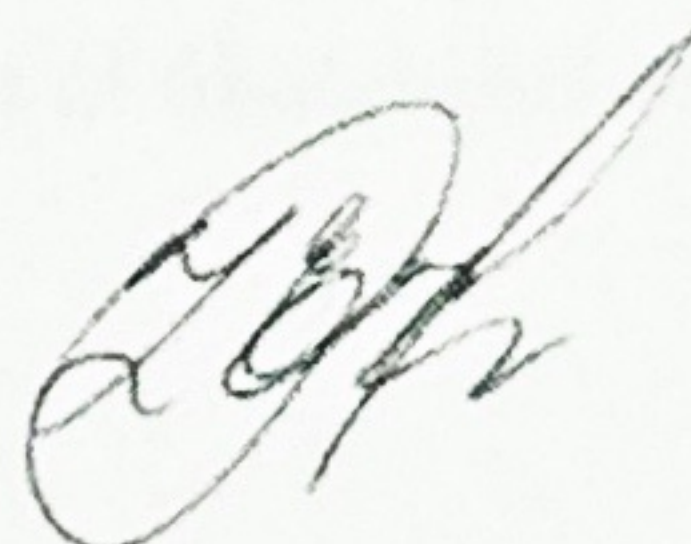

Lazăr Eugenia

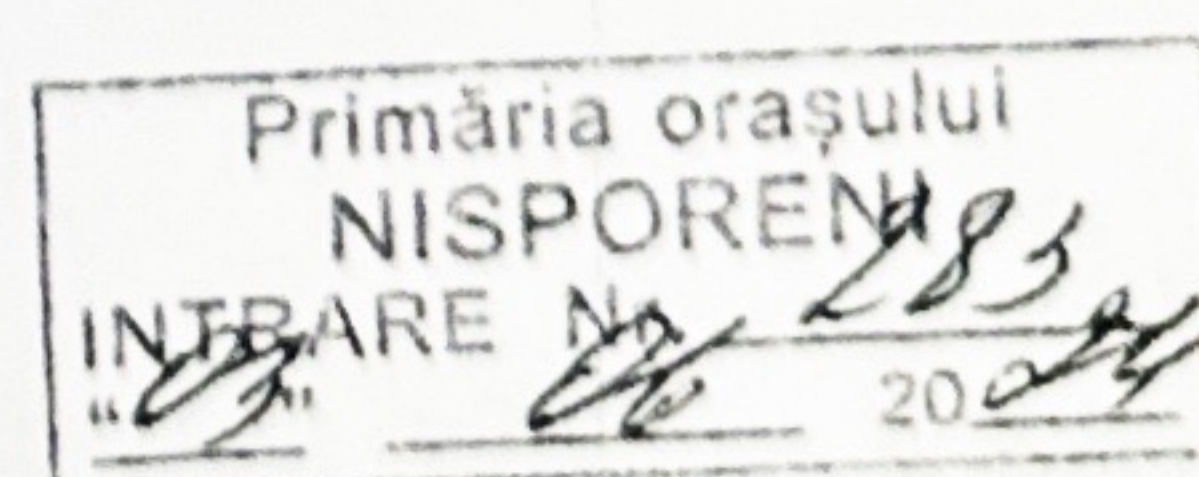

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni

Documentația de proiect al obiectului este completă

Președintele comisiei

Negel Dan

Responsabil tehnic

Spatar Viorica



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni

Obiecții nu sunt

Președintele comisiei

Negel Dan

Responsabil tehnic

Spatar Viorica



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni

Lucrările au fost executate cu respectarea prevederilor proiectului

Președintele comisiei

Negel Dan

Responsabil tehnic

Spatar Viorica



ACORD ADIȚIONAL Nr.119/2

la contractul Nr. 119 din "11,,octombrie 2022

Înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr: 2022-0000000850, la data de: 25.10.2022

Prezentul acord este semnat astăzi "29,, mai 2023, între Primăria or. Nisporeni, în persoana primarului, d-lui Robu Grigorii și S.C." Nisprofcon" S.R.L., în persoana d-lui Guțanu Pavel, în scopul modificării Contractului Nr. 119 din "11" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21062709 din: 02.09.2022.


Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.05/23 din 29.05.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Termen de execuție a lucrărilor: 31.12.2023

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Autoritatea Contractantă la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

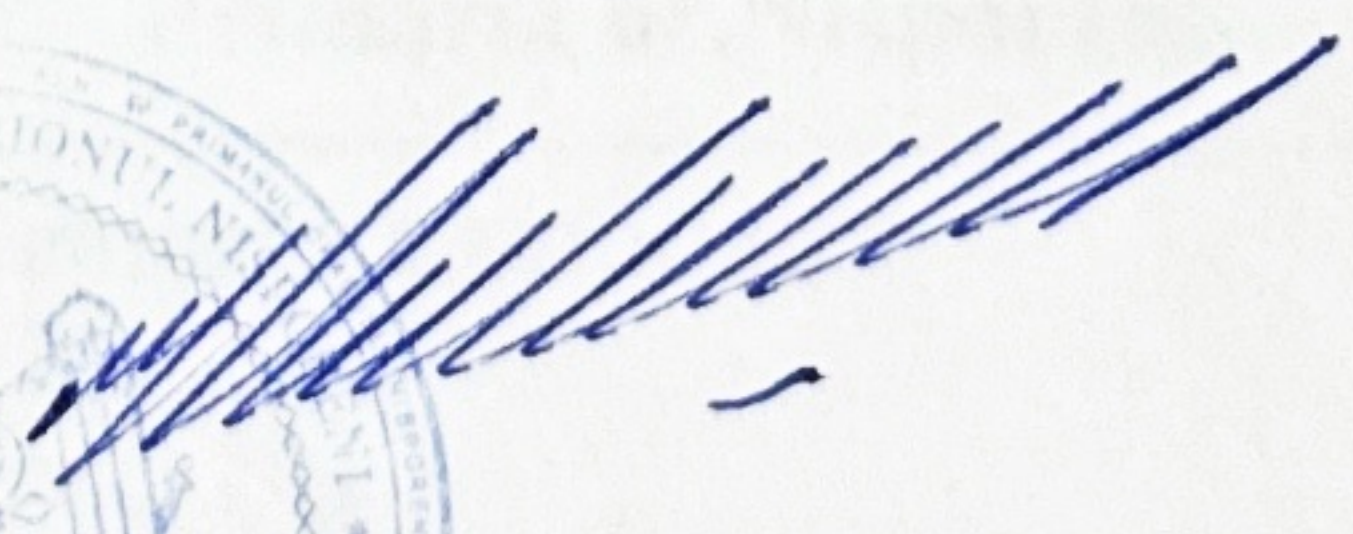Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
S.C. „Nisprofcon” S.R.L	Primăria or.Nisporeni
Semnătura autorizată: Digitally signed by Guțanu Pavel Date: 2023.05.30 08:24:22 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 	Semnătura autorizată: L.Ș. 

ACORD ADIȚIONAL Nr.119/5

la contractul Nr. 119 din "11,,octombrie 2022

Înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr: 2022-0000000850, la data de: 25.10.2022

Prezentul acord este semnat astăzi "01,, martie 2024, între Primăria or. Nisporeni, în persoana primarului, d-lui Negel Dan și S.C." Nisprofcon" S.R.L., în persoana d-lui Guțanu Pavel, în scopul modificării Contractului Nr. 119 din "11" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21062709 din: 02.09.2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.19/24 din 01.03.2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.


Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Suma inclusiv TVA Înainte modificării	Suma inclusiv TVA Valoarea modificării	Suma inclusiv TVA După modificare
4 181 686,00 lei	+11 442,00 lei	4 193 128,00 lei

Devizele se anexează

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Autoritatea Contractantă la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
S.C. „Nisprofcon” S.R.L	Primăria or.Nisporeni
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:

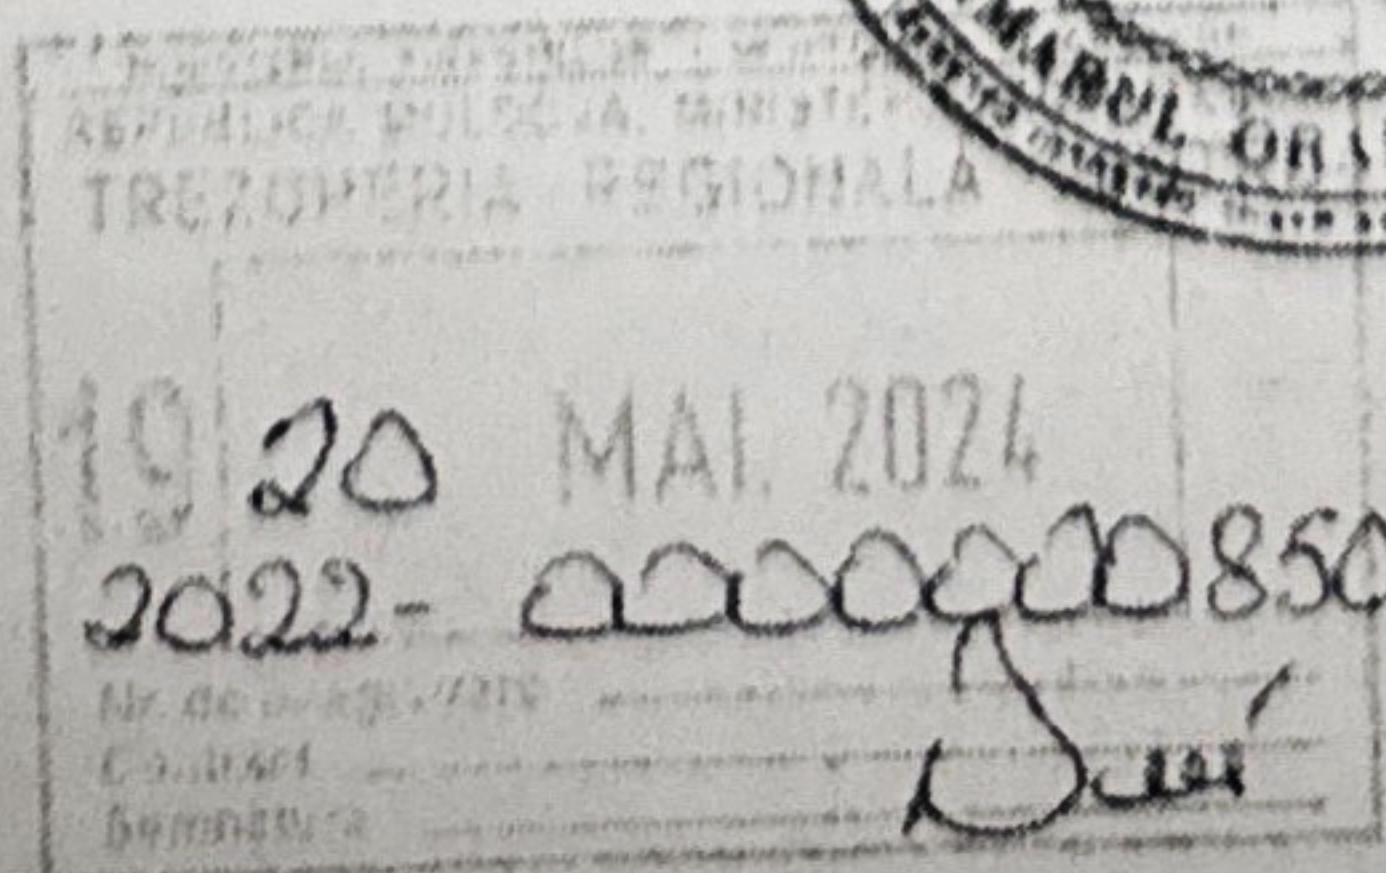

ACORD ADIȚIONAL Nr.01/1

la contractul Nr. 119 din "11,,octombrie 2022

Înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr: 2022-0000000850, la data de: 25.10.2022

Prezentul acord este semnat astăzi "29,, decembrie 2022, între Primăria or. Nisporeni, în persoana primarului, d-lui Robu Grigorii și S.C." Nisprofcon" S.R.L., în persoana d-lui Guțanu Pavel, în scopul modificării Contractului Nr. 119 din "11" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21062709 din: 02.09.2022.



Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.13/22 din 29.12.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Termen de execuție a lucrărilor: 31.05.2023

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Autoritatea Contractantă la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

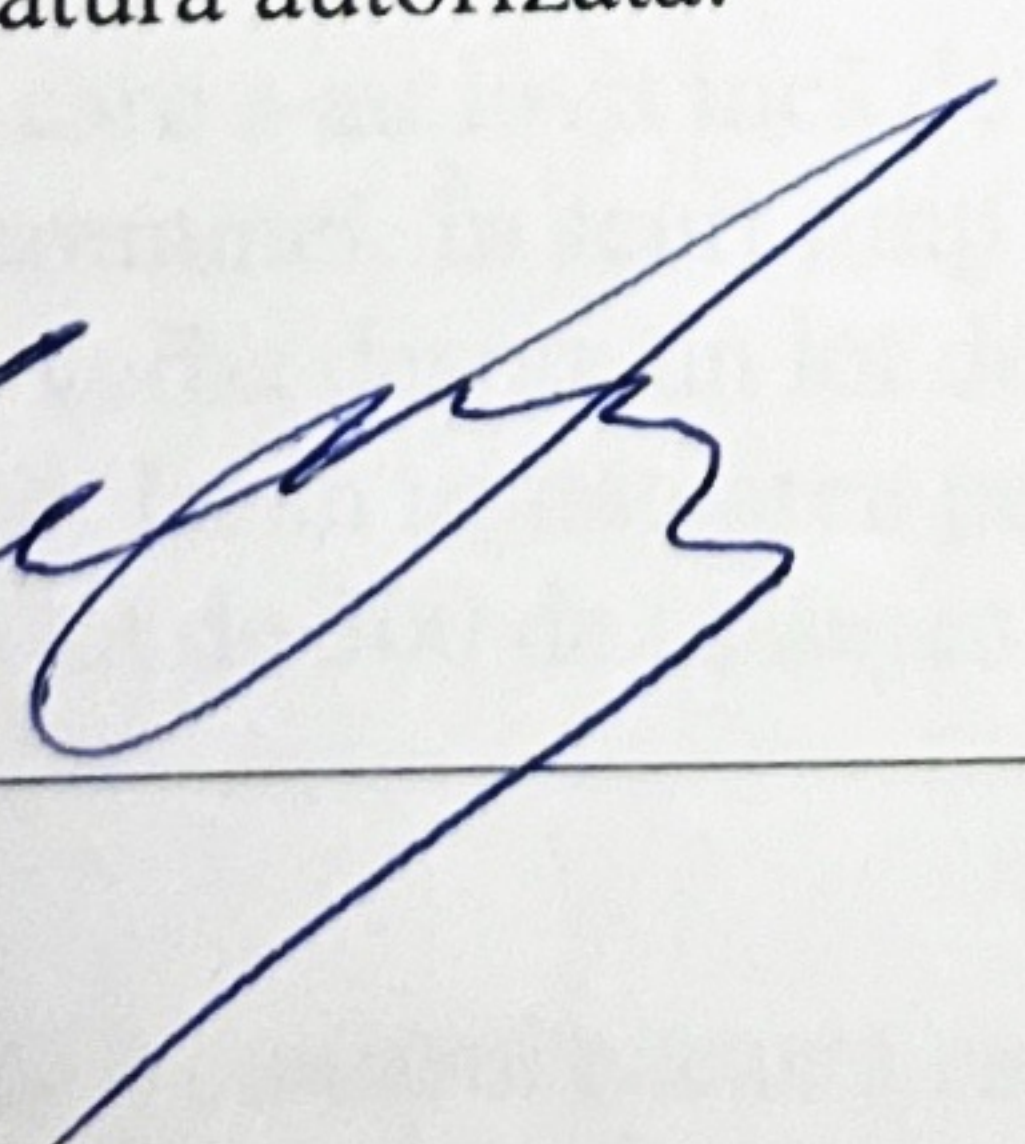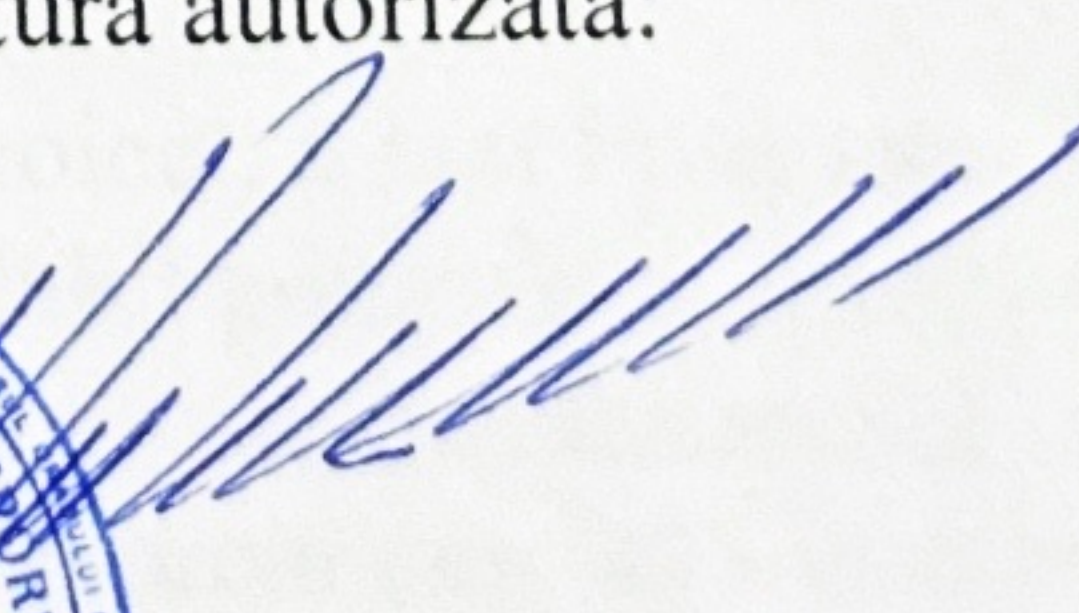Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
S.C. „Nisprofcon” S.R.L.	Primăria or.Nisporeni
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 



ACORD ADIȚIONAL Nr.119/4

la contractul Nr. 119 din "11,,octombrie 2022

Înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr: 2022-0000000850, la data de: 25.10.2022

Prezentul acord este semnat astăzi "24,, noiembrie 2023, între Primăria or. Nisporeni, în persoana primarului, d-lui Robu Grigorii și S.C." Nisprofcon" S.R.L., în persoana d-lui Guțanu Pavel, în scopul modificării Contractului Nr. 119 din "11" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21062709 din: 02.09.2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.15/23 din 24.11.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la data de 30.04.2024

Primăria or. Nisporeni, își asumă achitarea integrală a sumei contractuale restante, până la expirarea termenului de valabilitate a contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Autoritatea Contractantă la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
S.C. „Nisprofcon” S.R.L	Primăria or.Nisporeni
Semnătura autorizată: Digitally signed by Guțanu Pavel Date: 2023.11.24 11:34:58 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova L.Ș.	Semnătura autorizată: Digitally signed by Robu Grigorii Date: 2023.11.24 10:13:38 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova L.Ș.

ACORD ADIȚIONAL Nr.119/3

la contractul Nr. 119 din "11, octombrie 2022

Înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr: 2022-0000000850, la data de: 25.10.2022

Prezentul acord este semnat astăzi "07,, iulie 2023, între Primăria or. Nisporeni, în persoana primarului, d-lui Robu Grigorii și S.C." Nisprofcon" S.R.L., în persoana d-lui Guțanu Pavel, în scopul modificării Contractului Nr. 119 din "11" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21062709 din: 02.09.2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.07/23 din 07.07.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Majorarea contractului cu: +534 156,00 lei;
- Suma contractului după majorare: 4 181 686,00 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Autoritatea Contractantă la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
S.C. „Nisprofcon” S.R.L	Primăria or.Nisporeni
Semnătura autorizată: Digitally signed by Guțanu Pavel Date: 2023.07.07 13:35:09 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova L.Ș. 	Semnătura autorizată: Digitally signed by Robu Grigorii Date: 2023.07.07 11:23:25 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova L.Ș. 



REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI NISPORENI
Alexandru cel Bun nr.55 , 6401 Nisporeni, Republica Moldova
Tel. +37326423242, email: primaria.nisporeni@apl.gov.md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Avem deosebita plăcere de a oferi această recomandare antreprenorului S.R.L. „NISPROFCON”, cu care avem o frumoasă relație de colaborare în domeniul construcției, bazându-ne pe faptul că pe parcursul anilor, a dat dovadă de un înalt grad de seriozitate și profesionalism în derularea tuturor contractelor încheiate.

Acordăm o atenție remarcabilă obiectului: „Lucrări de reconstrucție a Casei Naționale din or. Nisporeni”, care a fost realizat fără abateri și dificultăți, antreprenorul fiind mereu deschis nevoilor și cerințelor noastre, îndeplinind eficient și rapid toate solicitările, și demonstrând în totalitate caracterul profesional pe toată durata colaborării noastre.

Susținem faptul că atât calitatea superioară a materialelor folosite, cât și promptitudinea executării lucrărilor, recomandă această întreprindere drept un partener de încredere și ale cărui servicii și lucrări, stabilesc standarde de calitate ridicate.

S.R.L. „NISPROFCON”, prin abilitățile angajaților săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre legate de domeniul său de activitate.

În concluzie, recomandăm compania S.R.L. „NISPROFCON”, ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice instituție cu care va relaționa, garantând onorarea tuturor obligațiilor și un raport preț-calitate foarte bun, care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.

Primarul or.Nisporeni
Dan NEGEL

Digitally signed by Negel Dan
Date: 2024.08.07 11:29:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Executor: Valicov Ecaterina,
nr. de contact: 067710858, e-mail: ecaterina.valicov@gmail.com

Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr.91 din 29.05.2014 Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>
