



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 14/03
на строительство офисного центра
от 15 мая 2017 года

„Bears Group” SRL, IDNO 1016600026138, в лице администратора Tcaci Roman, IDNP 0951312545018, который действует на основании Устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и

„Eurostil Construct” SRL, в лице директора Щербина А.П. действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемое "Генподрядчик" с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре применяются следующие определения:

Бизнес-центр – объект №118/16 «Бизнес-центр, коммерческий центр, паркинг по ул. Когылничану 2а», мун. Кишинэу с внешними и внутренними инженерными сетями, с выполненным благоустройством и озеленением,.

Объект – незавершенное строение **Бизнес-центра** и/или строительство **Бизнес-центра** в зависимости от вида строительных работ.

Рабочий проект – проектная документация, в том числе 2 комплекта рабочих чертежей марки АР, КЖ, ОВК, ВК, ТМ, ВГС и НГС и далее, выданная за подписью Заказчика «В производство работ», за подписью Проектной Организации и Экспертизы Проекта, на основании которых будет строиться «Объект».

Исполнительная документация – проектная документация, разрешения, выданные государственными органами, которые позволяют выполнение строительных работ а также комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество установленного оборудования и примененных при производстве работ материалов, конструкций и деталей, акты об освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

Работы – комплекс работ по строительству каркаса здания с заполнением, кровли, фасадов и инженерных внутренних и наружных систем (отопление, вентиляция, водопровод и канализация) будущего Жилого комплекса

Строительная площадка - земельный участок, переданный Заказчиком по акту Генподрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего договора. Границы стройплощадки Объекта обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с планом, находящимся по ул. Бернардацци и Пыркэлаб, мун. Кишинев. План-

Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Tcaci R.



Подрядчик:
„Eurostil Construct”

Директор Щербина А.



схема Строительной площадки, актуальная на дату заключения Договора прилагается к настоящему Договору;

Временные сооружения - временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке для выполнения работ;

Скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ;
МДЛ – официальная валюта Республики Молдова

Евро - официальная валюта Европейского союза;

Доллар США - официальная валюта Соединенных Штатов Америки;

Сумма Актов - сумма, подлежащая к оплате на основании ежемесячных Актов приемки выполненных работ;

Средний официальный обменный курс – Курс Евро относительно МДЛ установленный Национальным Банком Молдовы в среднем за один календарный месяц;

Официальный обменный курс - Курс евро относительно МДЛ установленный Национальным Банком Молдовы, на день оплаты ежемесячных Актов приемки выполненных работ;

Курсовая разница – разница между Средним официальным обменным курсом на момент выписки налоговой накладной и Средним официальным обменным курсом на момент оплаты.

Детальная Смета – определено в п. 3.1.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. **ЗАКАЗЧИК** поручает, а Генподрядчик обязуется выполнить на свой риск поставку оборудования, материалов, комплектующих, вспомогательных и сопутствующих материалов, произвести строительные-монтажные и отделочные работы в том числе работы по установке и запуску систем вентиляции, отопления, водопровода и канализации, газ, наружных инженерных сетей в соответствии с условиями Договора, графиками проведения работ и проектной документацией, разрешениями, выданными государственными органами, которые позволяют выполнение строительных-монтажных работ, включая дополнительные работы, письменно согласованные сторонами определено в нём не упомянутые, но необходимые для полного сооружения и качественного выполнения данного этапа строительных работ. Полное выполнение строительных-монтажных работ отражается в акте приемки, который подписывается сторонами и в котором устанавливаются порядок, условия и сроки устранения выявленных недостатков и отступлений.

2.2. Генподрядчик обязуется за свой риск выполнить вышеуказанные работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы согласно условиям Договора, осуществлять контроль и технический надзор за проведением Работ, своевременно обеспечивать Генподрядчика проектной и другой необходимой сопутствующей документацией для ведения строительных

Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Тсасі R.



Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щері



работ. Все авторские права относительно Объекта и проектной документации являются собственностью Заказчика.

III. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость Строительных работ определяется Приложениями к Договору, стоимости работ, а также фактической стоимости материалов на момент заключения договора. («Детальная Смета»).

3.1.1 Изменения объемов работ в Смету могут вноситься при изменении объемов или появлением дополнительных работ. Также изменения **стоимости** стройматериалов **указанные** в Смете могут быть внесены в случае увеличения или уменьшения цен на стройматериалы, без изменения объемов работ по заявлению одной Стороны с согласия другой Стороны путем подписания соглашений о внесении изменений в настоящий Договор. Подача заявления о приведении условий договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами не является основанием для отказа в исполнении обязательства. Оплата Работ осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в **главе III Договора**.

3.3. Заказчик, согласно Графику финансирования производит оплату 25% стоимости утвержденного приложения.

Оплата за выполненные Работы производится в МДЛ путем перечислением Генподрядчику 70% сумм каждого Акта на основании ежемесячных Актов приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) дней с момента их подписания.

Оплата оставшихся 5% стоимости каждого ежемесячного Акта производится через 12 месяцев с момента его подписания.

3.3.1 Ежемесячный Акт приемки выполненных строительных работ рассматривается Заказчиком в течение 7 календарных дней с момента его получения от Генподрядчика. В случае своего несогласия принять работы, Заказчик обязуется в тот же срок представить Генподрядчику свои претензии, изложенные в письменной форме. Если в течение этого времени Заказчик не подпишет Акт приемки выполненных Генподрядчиком Работ и не предъявит письменных претензий, то Работы по акту будут считаться принятым Заказчиком и подлежащими к оплате Генподрядчику. Заказчик, принявший работу без оговорок, сохраняет при этом права против подрядчика в случае обнаружения скрытых недостатков.

3.4. Форма оплаты по данному договору устанавливается в виде прямого банковского перевода на расчетный счет Генподрядчика. По дополнительной договоренности сторон оплаты могут производиться на счета субподрядных организаций на основании договоров о принятии долга (цессии).

IV. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

4.1. Строительные и инженерные Работы предусмотренные данным Договором, выполняются Генподрядчиком в соответствии с утвержденным графиком, указанным в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, при этом конечный срок завершения Строительных Работ предусмотренные данным Договором не должен превышать 3 лет , с момента начала Строительных Работ .

Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Тсасі R.



Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.



V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Генподрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить Работы своими и/или привлеченными силами и сдать выполненные работы Заказчику в срок и в соответствии с условиями Договора, при условии, что Заказчик выполнил договорные обязательства, обуславливающие завершение строительных работ Генподрядчиком.

5.1.2. Поставить на Строительную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение на строительной площадке. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне вместе с актом выполненных работ. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

5.1.3. Согласовать и Соорудить на территории строительной площадки необходимые Временные сооружения и подключения согласно утвержденного ПОС и предоставить Заказчику Акты по данным сооружениям для последующей оплаты

5.1.4. Генподрядчик несет ответственность за способы производства работ (в том числе и за охрану здоровья и безопасность труда) в полной мере собственными средствами, информирует работников Заказчика о профессиональных рисках, а также действиях и мерах защиты и предупреждениях, все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП – III – 4 – 80 * „Техника безопасности в строительстве”, а также установить освещение необходимое выполнению работ Генподрядчиком, согласно проектной документации. Затраты по электро-водоснабжению и охране строительной площадки несет Генподрядчик,

5.1.5. Генподрядчик обязуется нанимать для выполнения работ квалифицированный персонал, имеющий необходимые допуски и разрешения на производство работ, в соответствии с действующим законодательством РМ. Ответственность за найм, подготовку персонала, а также выполнение персоналом требований техники безопасности на Строительной площадке, а также при проведении строительных работ несет исключительно Генподрядчик.

5.1.6. В 2-недельный срок со дня завершения и передачи Заказчику выполненных Строительных работ освободить Строительную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ в рабочее время на территорию Строительной площадки третьих лиц – потенциальных покупателей квартир в Жилом комплексе, в сопровождении представителя Заказчика.

5.1.8. Согласовывать с Заказчиком применение любых материалов до их использования, а также необходимость заключения договоров подряда с субподрядными организациями по необходимости .

5.1.9. Обеспечить разраб

гласования Исполнительной

Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Тсасі Г



Подрядчик:
«Eurostil Constru

Директор Щерб.



5.1.10. Получить от Заказчика всю информацию и / или документы, необходимые для надлежащего исполнения своих обязанностей. В любом случае Генподрядчик не может претендовать на незнание информации и / или документов, необходимых для выполнения работ, чтобы оправдать недостатки или нарушения.

5.1.11. Генподрядчик настоящим гарантирует, что у него имеются все необходимые лицензии и разрешения на проведение Работ, оговоренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством РМ, а также Генподрядчик будет поддерживать все необходимые лицензии в действии на всем протяжении срока действия настоящего Договора.

5.1.12. Генподрядчик несет ответственность за любые убытки, понесенные Заказчиком, как следствие вины Генподрядчика в ходе выполнения Строительных работ, в том числе за убытки в результате приостановления и/или просрочки, и за вины Генподрядчика, выполнения Работ убытки в результате причинения ущерба общему или частному имуществу третьих лиц (тротуары, конструкции, линии электропередач, инженерные сети), убытки от исков третьих лиц в связи с действиями Генподрядчика.

5.1.13. Информировать письменно Заказчика в срок не более 5 (пяти) календарных дней в случае наступления изменений в способности Генподрядчика выполнять свои обязанности по Договору (например, но не ограничиваясь лишением Генподрядчика лицензий, начало процедуры несостоятельности, др. случаи).

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Заключать договоры субподряда на выполнение отдельных видов работ по Договору. При этом Генподрядчик гарантирует Заказчику высокое качество работ, проводимых субподрядчиками и несет ответственность за данные работы в той же мере, как если бы работы осуществлялись непосредственно Генподрядчиком.

5.2.2. Отказаться от исполнения указаний Заказчика по изменениям в проекте и замене материалов в случае, если при их исполнении может возникнуть угроза прочности и годности выполняемых работ Отказ должен быть письменно мотивирован.

5.2.3. Выполнить Строительные работы досрочно.

5.2.4. Требовать у Заказчика полную оплату выполненных работ.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать Генподрядчику на период выполнения Работ разрешения, выданные государственными органами, которые позволяют выполнение строительных работ Строительную площадку. С момента передачи Строительной площадки Генподрядчику, последний несет ответственность за сохранность имущества Заказчика и третьих лиц, находящегося на Строительной площадке.

6.1.2. Произвести приёмку и своевременную оплату работ, выполненных Генподрядчиком согласно положений настоящего Договора или возможных дополнительных соглашений.

6.1.3. Согласовать и подписать Форму № 3 «Акт приемки выполненных работ» в течение 7-ми рабочих дней после предоставления ее Генподрядчиком (за исключением п.6.2.2.).

Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Тсасі К.



Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.



6.1.4. Назначить ответственное лицо, компетентное проводить технический надзор и контроль проведения Строительных работ и сообщить его Ф.И.О. и координаты Генподрядчику письменно в срок не позднее даты передачи Генподрядчику Строительной Площадки. В случае необходимости провести замену такого ответственного лица и незамедлительно сообщить об этом Генподрядчику.

6.1.5 Передать Генподрядчику точку подключения воды и электричества с необходимым количеством электрической мощности для выполнения работ на строительной площадке и произвести оплату за потраченную электроэнергию и воду.

6.1.6 – обеспечить за свой счет охрану объекта . Если охрана объекта ведется Генподрядчиком, то возместить ему затраты по данному разделу.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. В любое время осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объемов, стоимости, качества работ и строительных материалов; при этом представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения. Генподрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

6.2.2. Отказаться от приемки выполненных работ с недостатками, предоставив Генподрядчику обоснованные возражения, и потребовать устранения недостатков выполненных работ или замены некачественных материалов за счет Генподрядчика.

6.2.3. Заказчик имеет право увеличивать или уменьшать объемы работ, подлежащие выполнению Генподрядчиком. В таком случае Стороны подпишут дополнительные соглашения к настоящему Договору и изменят соответствующие сроки выполнения Работ. В случае обращения Заказчика к Генподрядчику с письмом о внесении изменений в объемы выполняемых работ, Генподрядчик обязуется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, от даты получения письменного обращения Заказчика, предоставить специалиста, провести переговоры и ответить письменно Заказчику на требование об изменении объемов работ.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Генподрядчик обеспечивает порядок ведения работ и подписывает законченные этапы на Объекте в органах государственного надзора (гос строй инспекция) и несет ответственность за его соблюдение в соответствии с законодательством

7.2. Генподрядчик обеспечивает соблюдение общего порядка на Строительной площадке, принимая во внимание положения п.6.1.1. настоящего Договора.

7.3. Генподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к исходным геодезическим точкам, линиям и уровням, а также за правильность положения высотных отметок, размеров и соответствие разбивочных осей. Если в процессе выполнения работ обнаружатся ошибки в произведенных разбивочных и геодезических работах, то Генподрядчик по согласованию с Заказчиком вносит соответствующие исправления за свой счет.

7.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения если осуществляет Генподрядчик, то Заказчик обязан принять эти затраты к оплате ежемесячно.

Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Тсасі R.



Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.



7.5. Готовность принимаемых конструкций и строительных работ подтверждается подписанием Заказчиком и Генподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ при условии их согласования инспекцией Госнадзора.

7.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Генподрядчиком, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок устранить недостатки этих работ с обеспечением их надлежащего качества. Генподрядчик обязуется устранить все дефекты и недостатки, обнаруженные представителями Заказчика и/или Государственной Приемной комиссии на Объекте, в срок указанный Сторонами в Акте согласования недостатков.

7.7. В случае ненадлежащего устранения недостатков или в случае просрочки их устранения или их не устранения Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф предусмотренный настоящим договором.

7.8. Генподрядчик содержит в чистоте и осуществляет периодическую уборку Строительной площадки и, в том числе возможный ремонт и уборку примыкающей к ней уличной полосы, если они повреждаются при производстве Строительных работ

7.9. С момента начала работ и до их завершения Генподрядчик ведет журнал производства работ. В журнале отражается весь ход производства работ, факты и обстоятельства, имеющие значение в отношениях между Заказчиком и Генподрядчиком (дата начала и окончания работ, поступления оборудования и оказания услуг, принятия работ, проведения испытаний, информация о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выходом из строя строительной техники, и другие факторы, влияющие на окончательный срок завершения строительства).

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Генподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Генподрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

VIII. ОХРАНА И РИСКИ

8.1. Генподрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком выполненных работ

8.2. Риск случайной гибели, повреждения или ухудшения Жилого комплекса переходит на Заказчика с момента, когда Генподрядчик передал Заказчику по акту выполненные работы.


IX. ПРИЕМКА РАБОТЫ

9.1. После завершения работы Заказчик обязан принять работу в порядке, в месте и в срок, установленные договором.

9.2. Генподрядчик за 5(пять) дней до начала приемки работ передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком. Генподрядчик должен письменно подтвердить Заказчику, что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Тсасі-1



Подрядчик:
«Eurostil Con

Директор Щ



9.3. Заказчик обязуется создать комиссию для приемки выполненных строительных работ по требованию Генподрядчика в срок не более 3(трех) рабочих дней со дня подачи заявки Генподрядчиком.

X. ГАРАНТИИ

10.1. Генподрядчик гарантирует:

- а) Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, установленные Договором;
- в) Качество выполнения Строительных работ осуществляется в соответствии с проектной документацией, требованиями действующего законодательства РМ и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- г) Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям;
- д) Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

10.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта, кровли, материалов и работ устанавливается на срок предусмотренный законом, со дня подписания сторонами акта о приемке работ, но в любом случае сроки эксплуатации Объекта не могут быть менее сроков, указанных в действующих строительных нормах и правилах (СНиП), а в случае оборудования сроки эксплуатации не могут быть менее сроков указанных в Сертификатах выданных заводами производителями.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, не позволяющие продолжить строительство Жилого комплекса или его конструктивных частей до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Генподрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом подписанным Генподрядчиком и Заказчиком. Если обнаружатся недостатки, связанные с нарушениями правил эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, то Генподрядчик не несет ответственность за данные дефекты

10.4. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и недоделок их освидетельствование осуществляется органами Государственной строительной инспекции или другой экспертной организации, выбранной сторонами.

10.5. В течение гарантийного срока, Заказчик предъявляет претензии на обнаруженные недостатки и недоделки в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) дней после их обнаружения. В свою очередь Генподрядчик обязуется рассмотреть в течение пяти (5) календарных дней полученную претензию и предоставить Заказчику в письменной форме ответ с указанием порядка и сроков устранения недостатков. В случае отсутствия от Генподрядчика в указанный срок, ответа о порядке и сроках устранения недостатков, Заказчик вправе считать, что указанные в претензии недостатки являются обоснованными и подлежат устранению на условиях установленных настоящим договором.

Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Тсасі R.



Подрядчик:
«Eurostil Constru

Директор Щерб.



XI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Генподрядчиком и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

11.2. Заказчик вправе требовать досрочного расторжения договора в следующих случаях:

11.2.1. Несоблюдение Генподрядчиком графика производства работ по его вине, когда общий срок выполнения Строительных работ увеличивается более чем на 2 (два) месяца;

11.2.2. Нарушение Генподрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного действующими строительными нормами и правилами;

11.2.3. По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором либо действующим законодательством РМ.

11.3. Генподрядчик вправе требовать досрочного расторжения договора в следующих случаях:

11.3.1. Приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 3 (три) месяца;

11.3.2. Просрочки Заказчиком очередных платежей при условии соблюдения процедуры, указанной в Главе III более чем на 2 (два) месяца после уведомления Заказчика Генподрядчиком о накоплении данной задолженности и о намерении расторгнуть Договор;

11.3.3. По другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором либо действующим законодательством РМ.

11.4. При расторжении договора незавершенное строительство передается Заказчику в месячный срок с момента указанного в п. 11.5 данного Договора, который в свою очередь оплачивает Генподрядчику стоимость всех выполненных работ в течение 20-ти банковских дней, с момента указанного в п. 11.5 данного Договора.

11.5. О досрочном расторжении Договора иницилирующая сторона письменно уведомляет другую сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) дней.

11.6. Заказчик оплатит Генподрядчику за фактически осуществленные работы и услуги за минусом претензий Заказчика по Главам XII, если они возникнут. Разногласия между Сторонами решаются согласно положениям Главы XIII.

XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона несет ответственность, предусмотренную Договором и действующим законодательством Республики Молдова.

12.2. За нарушение сроков оплаты со стороны Заказчика Генподрядчик вправе требовать уплаты пени. Пеня уплачивается в размере:

- За первые 10 (десять) календарных дней просрочки оплаты - пеня не считается и не оплачивается;
- За каждый следующий день просрочки оплаты 0,1% в день от суммы просроченной задолженности;

Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Тсасі R.



Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.



войнами и другими государственными незаконным действиями или бездействиями, забастовки, законы или положения, а также любые иные события, которые напрямую оказывают влияния на исполнение настоящего Договора. Сторона, оказавшаяся под воздействием Форс-Мажора, должна приемлемым способом уведомить другую Сторону о таких препятствиях и их влияние на свою способность к выполнению.

14.2. Следующие обстоятельства не являются форс-мажорными: нормативные требования и ограничения в отношении одной Стороны, недостаток активов у одной Стороны для осуществления текущих обязательств, неспособность одной стороны использовать свои банковские счета, неспособность или задержка с любой стороны получить соответствующие разрешения и т.д., необходимые для целей настоящего Договора.

14.3. Существование и природа форс-мажорных обстоятельств должны быть официально подтверждены письменным свидетельством, выданным Торгово-Промышленной Палатой Республики Молдова, если природа форс-мажорных обстоятельств позволяет дать такое подтверждение.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Генподрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Строительных работ или их консервации.

XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

15.2. Все изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон. Все приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

15.3. Подрядчик не имеет права продать или передать рабочую документацию на строительство Жилого комплекса или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15.4. Если после завершения работ по договору на Строительной площадке остается принадлежащее Генподрядчику имущество, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до даты освобождения им Строительной площадки.

15.5. Все письма, уведомления, претензии направляются сторонами либо заказной почтой по юридическому адресу, указанному в Договоре, либо вручаются секретарю принимающей стороны под роспись.

15.6. Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов: расчетного счёта, юридического или почтового адреса, администратора и т.д., а также об аресте банковских счетов или других обременениях/запретах, влияющих на исполнение Договора. В случае возникновения убытков, связанных с не уведомлением (несвоевременным уведомлением) о вышеперечисленных изменениях, их возмещение производится за счет стороны, допустившей данное нарушение.

15.7. Каждая Сторона гарантирует друг другу, что они и их сотрудники, работники, советники и другие представители будут хранить в строгой тайне текст Договора, а также все данные и сведения, полученные от другой Стороны в связи с настоящим Договором. и обязуются не

Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Тсасі R



11 -

Подрядчик:
«Eurostil Const

Директор Щєr



разглашать и не позволять указанным лицам разглашать конфиденциальную информацию иным лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны; кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

15.8. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства, в частности ст.946-969 Гражданского кодекса.

15.9. Настоящий договор заключен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

“Bears Group” srl
Moldova, Chisinau, str.Miron Costin,
11/2 кв.10.
Cod fiscal – 1016600026138.
IBAN MD25VI022241700000308
Filiala nr.17, BC “Victoriabank” SA
m. Chişinău,

ГЕНПОДРЯДЧИК:

“Eurostil Construct” srl
Moldova, Chisinau, str.Mitropolit Gurie
Grosu,16 кв.28.
Cod fiscal – 1010600001209.
C/d 225122029,
Filiala Premium, BC “Moldindconbank” SA
m. Chişinău,
MOLDMD2X320
Cod TVA 0207625


Директор Тсаци Роман




Директор Щербина Анжела



Заказчик:
„Bears Group” SRL

Директор Тсаци R.



Подрядчик:
«Eurostil Construct» S.R.L.

Директор Щербина А.



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 15/0819 G

6

м. Кишинэу

«15» Августа 2019 года

фирма "Eurostil Construct" SRL, именуемая в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Щербина А.П., действующего на основании Устава предприятия с одной стороны, и фирма "Bears Group" SRL, IDNO 1016600026138 именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице администратора Ткач Р. с другой стороны, подписали настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

1.1. Генподрядчик обязуется произвести работы, указанные в пункте 1.2 и Приложениях к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего договора.

1.2. В соответствии с настоящим договором Генподрядчик осуществляет изготовление и установку изделий из натурального камня, указанных в Приложениях к настоящему договору.

1.3. Генподрядчик выполняет работы, указанные в пункте 1.2. и в Приложениях к настоящему договору из своего материала, утвержденного Заказчиком согласно Приложениям к настоящему договору.

2. СУММА НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора определяется Приложениями к данному договору. В стоимость настоящего договора входит: стоимость работы, изделий из натурального камня, доставки, установки изделий, согласно Приложениям к данному договору.

2.2. Оплата работ, указанных в пункте 1.2. и Приложениях к настоящему договору, производится Заказчиком в безналичном порядке, в соответствии с законодательством Республики Молдова.

2.3. При безналичном расчете Заказчик перечисляет необходимые денежные суммы на банковский счет Генподрядчика, указанный в реквизитах настоящего договора.

2.4. Сроки оплаты устанавливаются сторонами в Приложениях к настоящему договору.

2.5. За несоблюдение Заказчиком сроков выплаты, а также за необоснованное непринятие товара в срок, начисляется пеня в размере 0.05% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки выплаты.

2.6. За несоблюдение Генподрядчиком сроков выполнения работ, начисляется пеня в размере 0.05% от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки выполнения.

2.7. За срыв контракта по вине Заказчика, Заказчик выплачивает Генподрядчику сумму равную 50% от суммы контракта указанную в Приложениях к данному договору.

2.8. Заказчик производит оплату в молдавских леях по курсу Национального банка Молдовы на день платежа.

3. ПРИЕМ-СДАЧА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. При установке изделия стороны подписывают промежуточный Акт сдачи-приемки 50% выполненных работ и окончательный Акт сдачи-приемки работ.

3.2. Генподрядчик сообщает представителю Заказчика о том, что заказ выполнен письменной форме или по email. Заказчик подписывает Акт выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента уведомления Генподрядчиком. В случае, если отправленный Генподрядчиком Заказчику Акт выполненных работ и (или) Промежуточный Акт выполненных работ им не подписан, не оспорен на протяжении 5 рабочих дней с момента его подтвержденного получения Заказчиком, он считается им принятый без изменений и подлежит оплате в полном объеме. Недостатки и претензии со стороны Заказчика к выполненным работам со стороны Генподрядчика. устанавливаются в момент подписания Акта выполненных работ. Если данные претензии основываются на погрешности происшедшие по вине Генподрядчика, Генподрядчик должен за свой счет исправить данные погрешности, нарекания, которые действительно является погрешностью со стороны Генподрядчика.

3.3. Не считаются Погрешностями происшедшие по вине Генподрядчика, все возможные природные несоответствия, установленные в Приложениях к Настоящему договору, о которых Заказчик был письменно предупрежден согласно Спецификации и Протоколу согласования заявки материала и вспомогательных средств – Приложения к данному договору.

3.4. Датой завершения работ по настоящему договору считается дата подписания сторонами Акта выполненных работ.

3.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 календарных года с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. Одновременно с подписанием Акта выполненных работ стороны подписывают Гарантийный талон на выполненные работы и материалы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, виновная в нарушении условий настоящего договора, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

4.2. Применение штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по настоящему договору.

4.3. Размеры готовых изделий будет зависеть от размеров блоков и слайбов (сырья) Limestone.

4.4. Заказчик обязан обеспечить Генподрядчика всеми надлежащими условиями для монтажа изделия, а именно:

- обеспечить фронт работ для начала монтажа изделий.
- освободить места монтажа изделий от всех лишних предметов, структурно не связанных с изготовленным изделием,
- обеспечить доступ к воде и электричеству на объекте. Сумму за потребленную воду и электричество на объекте несет Заказчик.
- обеспечить место для хранения готовой продукции и строительных материалов на время выполнения всего объема работ. За целостность и сохранность готовой продукции и строительных материалов отвечает Заказчик.
- обеспечить место для хранения инструментов монтажной бригады Генподрядчика. За сохранность инструментов отвечает Заказчик.
- обеспечить техническое помещение для монтажной бригады Генподрядчика (четыре человека) на время выполнения всего объема работ.

В случае необеспечения вышеуказанных условий, в течение 2 дней с момента уведомления Генподрядчиком о том, что заказ, а именно изделия из натурального камня, выполнен и готов к монтажу, согласно п. 3.2. настоящего договора, Генподрядчик не несет ответственности за неисполнение работ в установленный срок, а так же срок выполнения всех работ согласно Приложениям считается приостановленным на время устранения Заказчиком своих недочетов в предоставлении надлежащих условий для монтажа.

4.5. В случае не полной оплаты Заказчиком работы или ее части, Исполнитель имеет право на безоговорочный демонтаж не оплаченных материалов, изделий и оборудования. Демонтаж материалов, изделий и оборудование, а также их транспортировку на склад Генподрядчика происходит за счет Заказчика по расценкам Генподрядчика.

4.6. В случае не оплаты материалов и работ в срок, согласно Приложениям к данному договору, Генподрядчик не несет ответственности за неисполнение работ в установленный срок, а так же срок выполнения всех работ согласно Приложениям считается приостановленным на время оплаты Заказчиком обязанностей по контракту.

4.7. **Обязанности Генподрядчика:**

- начать выполнение Работ после подписания и оплаты настоящего Договора и качественно выполнить их надлежащий срок;
- при выполнении Работ соблюдать все технические нормы, установленные действующим законодательством, нормы техники безопасности, по охране окружающей среды и т.д.;
- соблюдать чистоту и порядок на месте выполнения Работ и на прилегающих участках;
- немедленно известить заказчика о любых обстоятельствах, которые затрудняют или приостанавливают выполнение Работ;
- использовать только высококачественные материалы, необходимые для выполнения Работ, которые соответствуют установленным стандартам;
- немедленно устранить любые недостатки выполненных Работ, согласно условиям договора;
- известить Заказчика об окончании Работ;
- сдать Заказчику качественно выполненные Работы, на основании Акта выполненных работ, подписанного надлежащим образом представителями обеих Сторон;
- нести полную материальную ответственность, а также иную ответственность перед третьими лицами, в случае если при совершении виновных действий Генподрядчиком или работниками Генподрядчика, был нанесен какой-либо ущерб жизни, здоровью или имуществу третьих лиц;
- соблюдать другие обязанности, установленные настоящим Договором.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предотвратить или избежать, включая: объявленную или фактическую войну, землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, а также действия государственных органов власти.

5.2. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой территории, на которой разразились обстоятельства форс-мажора, является достоверным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна уведомить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение условий настоящего договора, в течение пяти дней после возникновения обстоятельств форс-мажора. В противном случае, данная сторона лишается права в дальнейшем ссылаться на обстоятельства форс-мажора.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении шести последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, целесообразность дальнейшего исполнения настоящего договора определяется сторонами дополнительно.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора между сторонами или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров посредством обмена письмами, факсами, телеграммами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий, они подлежат рассмотрению в компетентной судебной инстанции Республики Молдова.

6.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны рассматриваться сторонами в течение 30 дней с момента получения претензии.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

7.2. Условия настоящего договора имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть изменены, дополнены и уточнены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, подписанного полномочными представителями сторон.

7.3. Все дополнения и изменения настоящего договора вступают в силу с момента подписания полномочными представителями сторон.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Дальнейшие переговоры по поводу исполнения настоящего договора осуществляется лично, либо в письменном виде по факсу или почте.

8.2. Все уведомления, направленные сторонами друг другу, в соответствии с настоящим договором, могут посылаться по телефаксу, электронной почтой или заказной почтовой корреспонденцией и считаются полученными на следующий рабочий день после отправки в случае телефакса и электронной почты, а в случае заказных почтовых отправлений - по дате почтового штемпеля получения на конверте.

8.3. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

8.4. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Все экземпляры настоящего договора обладают одинаковой юридической силой.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Фирма «Bears Group» S.R.L.
Moldova, m.Chisinau, str. Miron Costin 11/2 ap.6
c/d 1016600026138
cod TVA _____
IBAN MD25VI022241700000308

BC «Victoriabank» SA fil.№17



ГЕНПОДРЯДЧИК

«Eurostil Construct » SRL _
Moldova, Chisinau, str.Mitropolit Gurie Grosu,17
C/f 1010600001209 Cod TVA 0207625
c/d IBAN MD47ML000000000225122029
Filiala Premium Chişinău,
BC «Moldindconbank» SA,
Cod bancar MOLDM2X320

Щербина А.П./



INVESTITORI:

Firma „AWK REAL ESTATE” S.R.L. cota-parte 95,0%

Firma „BEARS GROUP” S.R.L. cota-parte 5,0%

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1-06 din 23.06.2023

Obiectul: obiectivul cu functii comosate (oficii, spatii comerciale, prestări servicii) cu parcare auto subterană, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 0100208.150 din mun. Chișinău, sect. Centru, str. Kogălniceanu 2a

Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor nr. 328-c/17 din 16.08.2017, nr. 177-c/20 din 23.06.2020

1. Comisia de recepție finală fiind formată din:
„AWK REAL ESTATE” S.R.L.
„BEARS GROUP” S.R.L., (în persoana administratorului: Ecaci Roman, investitor

(numele, prenumele, calitatea)

Cotofană Alexandru, responsabil tehnic, certificat seria 2021-RT, nr. 0926 din 12.02.2021

(numele, prenumele, calitatea)

Iurașco Valeriu, diriginte de șantier, certificat seria 2020-DS, nr. 0753 din 06.02.2020

(numele, prenumele, calitatea)

Telipiz Gheorghe, proiectant, certificat seria 2020-P, nr. 0681 din 15.12.2020

(numele, prenumele, calitatea)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală au fost înlăturate;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat pînă în prezent;

7) valoarea obiectului este de 125 000 000 lei (din surse financiare proprii);

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: obiectivul Construcție cu funcții comosate (oficii, spatii comerciale, prestări servicii) cu parcare auto subterană, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 0100208.150 din mun. Chișinău, sect. Centru, str. Kogălniceanu, 2a - spre RECEPȚIE FINALĂ

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Autorizației de construire nr. 328-c/17 din 16.08.2017 și nr. 177-c/20 din 23.06.2020, și altă documentație prezentată.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Construcție cu funcții comosate (oficii, spatii comerciale, prestări servicii) cu parcare auto subterană, amplasată pe terenul cu nr. cadastral 0100208.150 din mun. Chișinău, sect. Centru, str. Kogălniceanu, 2a - spre RECEPȚIE FINALĂ.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

○ Obiectul cu nr. cadastral **0100208.150.04** adresa poștală **din mun. Chișinău, sect. Centru, str. Kogălniceanu, 2a** destinația **Construcție cu funcții comosate (oficii, spații comerciale, prestări servicii) cu parcare auto subterană lit. 9B-04**, cu suprafața la sol **654,9 m.p.**, suprafața totală interioară **4460,3 m.p.** numărul de etaje **9(S+P+6E+ET)**, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. **0407-1/2023** din **07.04.2023**, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **18** anexe numerotate, cu un total de **20** file, a fost încheiat astăzi la **23.06.2023**

Comisia de recepție finală :

Președinte:



(semnătura)



„AWK REAL ESTATE” S.R.L.

Teaci Roman



(semnătura)



„BEARS GROUP” S.R.L.

Teaci Roman

Membri, Specialiști:

(semnătura)



Iurasco Valeriu

(numele, prenumele)

(semnătura)



Cotofană Alexandru

(numele, prenumele)

(semnătura)



Telipiz Gheoghe

(numele, prenumele)

CERTIFICAT DESPRE REZULTATELE INSPECTĂRII BUNULUI IMOBIL

(pentru clădiri nelocative)

Nr. 0407-1/2023 din 07.04.2023

Ca urmare a cererii adresate de către Societatea cu Răspundere Limitată BEARS GROUP
(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)
specialistul Zara Gheorghe a efectuat inspectarea și măsurarea bunului imobil și a constatat

(numele, prenumele)

următoarele:

1. Beneficiar/cota parte: S. R. L. BEARS GROUP - 5,0 % , S. R. L. AWK REAL ESTATE - 95,0 %

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

2. Adresa bunului imobil mun. Chișinău, sect. Centru str. Mihail Kogălniceanu, 2a

3. Numarul cadastral al terenului: 0100208.150

4. Construcția /reconstrucția efectuată în temeiul: Autorizației de construire nr. 328-c/17 din 16.08.2017, privind
executarea lucrărilor de construire a unui obiectiv cu funcții comasate, (oficii, spații comerciale, prestări servicii),

cu parcare auto subterană, cu nivelul de înălțime S+P+6E. Autorizației de construire nr. 177-c/20 din 23.06.2020, privind
finalizarea obiectivului cu funcții comasate, (oficii, spații comerciale, prestări servicii), cu parcare auto subterană,

cu nivelul de înălțime S+P+6E

(denumirea obiectivului înscris în autorizația de construire)

5. Descrierea clădirilor nelocative:

| N/o | Denumirea indicatorului | Indicii |
|-----|--|---------------------------------|
| 1 | Numărul cadastral | 0100208.150.04 |
| 2 | Litera | 9B |
| 3 | Modul de folosință | Construcție cu funcții comasate |
| 4 | Volumul de construcție, m3 | 19355 |
| 5 | Numărul de nivele | 9(S+P+6E+ET) |
| | inclusiv: subsol | 1 |
| | demisol | - |
| | parter | 1 |
| | etaj : 2-7 | 6 |
| | etaj tehnic | 1 |
| 6 | Suprafața la sol a clădirii, m2 | 654,9 |
| 7 | Suprafața totală interioară a clădirii, m2 | 4460,3 |

6. Descrierea clădirilor accesorii:

| Numărul cadastral | Numarul | Modul de folosință | Suprafața la sol | Mențiuni |
|-------------------|---------|--------------------|------------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

7. Mențiuni: În realitate și conform documentației de proiect aprobat de către DGAURF a CMC ,
regimul de înălțime constituie 9(S+P+6E+ET) .

Anexă: planul geometric, planul reprezentării părților componente ale clădirilor, fișa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de
teren și clădiri accesorii, planul de nivel, fișa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală, anexa la planul clădirii.

Executantul lucrărilor:

Verificat:



Zara Gheorghe, inginer cadastral

(numele, prenumele și funcția)

Zara Gheorghe, administrator



(numele, prenumele și funcția)

"PROGEOCAD" S.R.L.

PLANUL GEOMETRIC AL BUNULUI IMOBIL perfectat în cadrul lucrării cadastrale la nivel de clădiri

Număr cadastral 0100208.150

Adresa bunului imobil: mun. Chișinău, sect. Centru str. Mihail Kogălniceanu, 2a

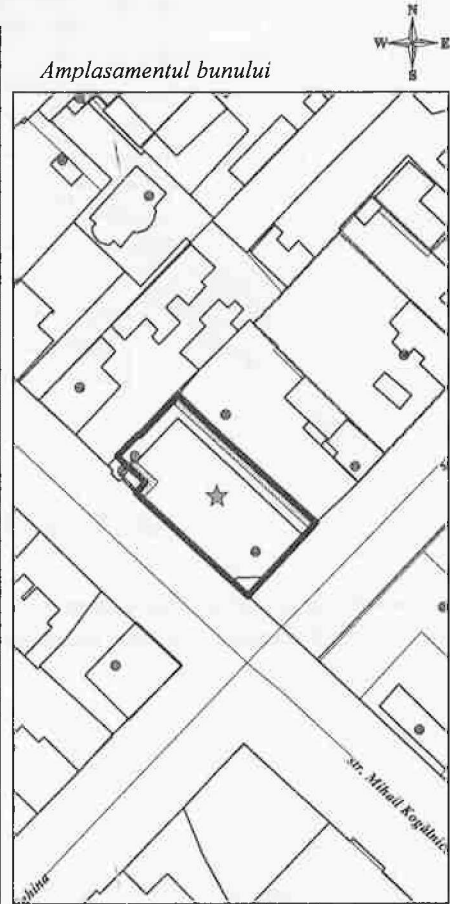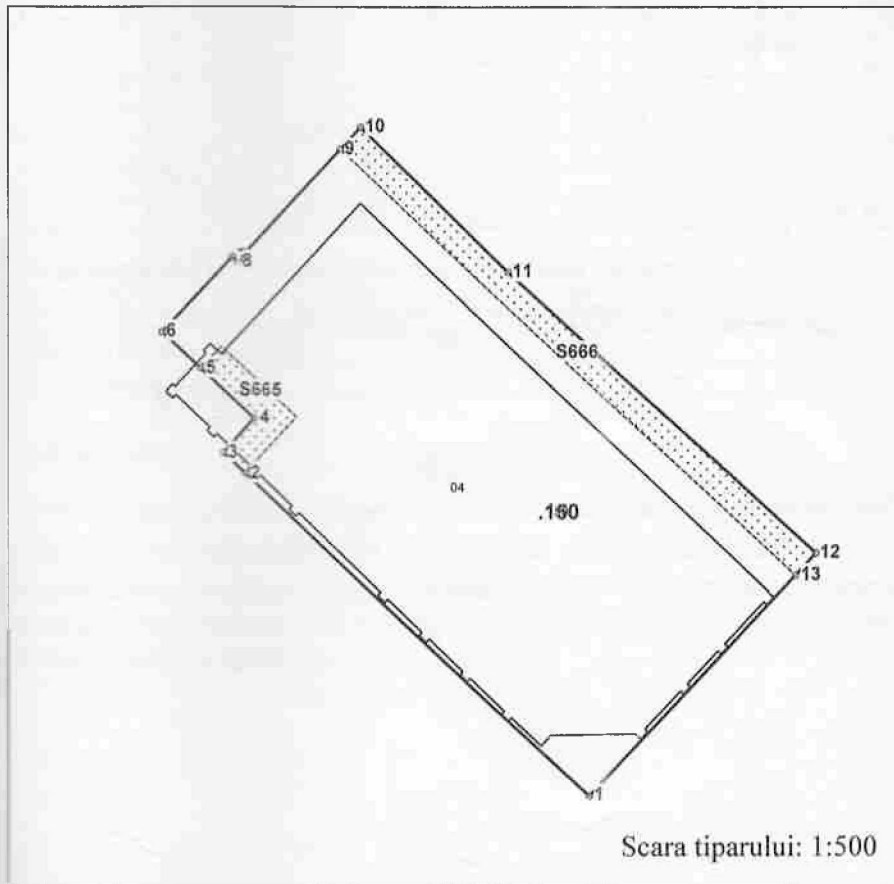

Caracteristicile tehnice generale ale bunului imobil

| Nr | Tipul bunului | Mod de folosinta | Suprafata |
|----------------|---------------|------------------------------|------------|
| 0100208.150 | Teren | pentru constructii | 0.088 ha |
| 0100208.150.04 | constructie | Constructie cu functii comas | 654.9 m.p. |

Coordonat DGAURF a CMC



Data perfectării planului geometric 07.04.2023

Executant Zara Gheorghe
(numele, prenumele, semnatura)

Verificat/Conducătorul întreprinderii: Zara Gheorghe
(numele, prenumele)

Sistemul de coordonate: MR 99**Catalogul de coordonate si parametrii hotarului**

| Punctul | Coordonata_X | Coordonata_Y | Tipul_punctului | Hotarul | Distanta | Tipul_hotarului |
|---------|--------------|--------------|-----------------|---------|----------|-----------------|
| 1 | 233 191,0908 | 208 410,7479 | general | 1-2 | 31,32 | general |
| 2 | 233 169,0749 | 208 431,9891 | general | 2-3 | 2,00 | general |
| 3 | 233 166,6081 | 208 433,3490 | general | 3-4 | 3,08 | general |
| 4 | 233 169,6910 | 208 435,6320 | general | 4-5 | 4,93 | general |
| 5 | 233 165,0629 | 208 438,9780 | general | 5-6 | 3,49 | general |
| 6 | 233 162,5038 | 208 441,3459 | general | 6-7 | 6,81 | general |
| 7 | 233 167,2142 | 208 446,2619 | general | 7-8 | 0,43 | general |
| 8 | 233 167,5398 | 208 445,9789 | general | 8-9 | 10,12 | general |
| 9 | 233 174,4702 | 208 453,3510 | general | 9-10 | 2,00 | general |
| 10 | 233 175,8402 | 208 454,8090 | general | 10-11 | 13,70 | general |
| 11 | 233 185,7051 | 208 445,3001 | general | 11-12 | 27,52 | general |
| 12 | 233 206,0444 | 208 426,7643 | general | 12-13 | 2,00 | general |
| 13 | 233 204,6792 | 208 425,3010 | general | 13-1 | 19,91 | general |

Informație despre Arenda/Servitute constituite pe teren

| Nr | Denumirea | Suprafata_ha | Teren_dominant | Tipul |
|------|-----------|--------------|----------------|-------|
| S665 | Servitute | 0,0020 | | alte |
| S666 | Servitute | 0,0077 | | alte |

Mențiuni:

Constructia 0100208.150.04 continua pe terenul adiacente cu nr. cad. 0100208.203 si servitutea S665, aplicata pe terenul cu nr. cad. 0100208.150

Hotarele generale ale terenului sunt hotarele stabilite in cadrul lucrarilor de Intocmire a documentatiei cadastrale in vederea inregistrarii primare, fara coordonarea acestora cu titularii de drepturi asupra terenurilor adiacente. Suprafata terenului determinata in procesul stabilirii hotarelor generale se considera aproximativa.

Sistemul de coordonate: MR 99**Catalogul de coordonate si parametrii hotarului**

| Punctul | Coordonata_X | Coordonata_Y | Tipul_punctului | Hotarul | Distanța | Tipul_hotarului |
|---------|--------------|--------------|-----------------|---------|----------|-----------------|
| 1 | 233 191,0908 | 208 410,7479 | general | 1-2 | 31,32 | general |
| 2 | 233 169,0749 | 208 431,9891 | general | 2-3 | 2,00 | general |
| 3 | 233 166,6981 | 208 433,3490 | general | 3-4 | 3,08 | general |
| 4 | 233 169,6910 | 208 435,6320 | general | 4-5 | 4,93 | general |
| 5 | 233 165,0629 | 208 438,9780 | general | 5-6 | 3,49 | general |
| 6 | 233 162,5038 | 208 441,3459 | general | 6-7 | 6,81 | general |
| 7 | 233 167,2142 | 208 446,2619 | general | 7-8 | 0,43 | general |
| 8 | 233 167,5398 | 208 445,9789 | general | 8-9 | 10,12 | general |
| 9 | 233 174,4702 | 208 453,3510 | general | 9-10 | 2,00 | general |
| 10 | 233 175,8402 | 208 454,8090 | general | 10-11 | 13,70 | general |
| 11 | 233 185,7051 | 208 445,3001 | general | 11-12 | 27,52 | general |
| 12 | 233 206,0444 | 208 426,7643 | general | 12-13 | 2,00 | general |
| 13 | 233 204,6752 | 208 425,3010 | general | 13-1 | 19,91 | general |


Informație despre Arenda/Servitute constituite pe teren

| Nr | Denumirea | Suprafata_ha | Teren_dominant | Tipul |
|------|-----------|--------------|----------------|-------|
| S665 | Servitute | 0,0020 | | alte |
| S666 | Servitute | 0,0077 | | alte |

Mențiuni:

Construcția 0100208.150.04 continuă pe terenul adiacente cu nr. cad. 0100208.203 și servitutea S665, aplicată pe terenul cu nr. cad. 0100208.150

Hotarele generale ale terenului sunt hotarele stabilite în cadrul lucrărilor de întocmire a documentației cadastrale în vederea înregistrării primare, fără coordonarea acestora cu titularii de drepturi asupra terenurilor adiacente. Suprafața terenului determinată în procesul stabilirii hotarelor generale se consideră aproximativă.

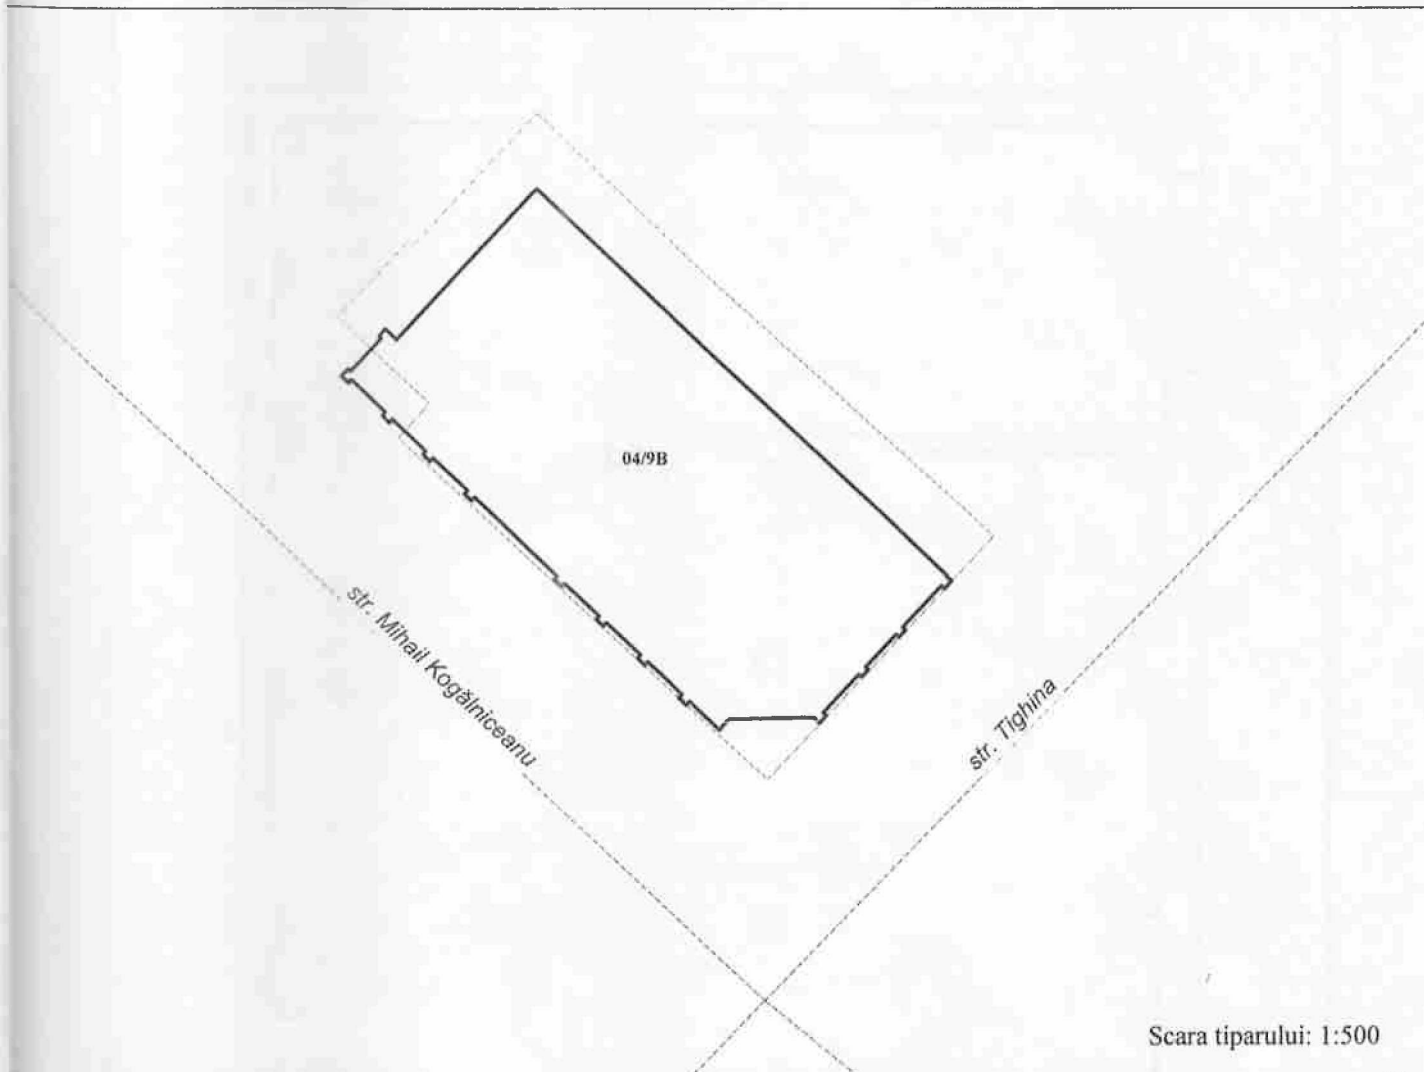"PROGEOCAD" S.R.L.**PLANUL REPREZENTĂRII PĂRȚILOR COMPONENTE ALE CLĂDIRILOR**Numărul cadastral al terenului 0100208.150Adresa bunului imobil: mun. Chișinău, sect. Centru str. Mihail Kogălniceanu, 2a**Caracteristicile:****Suprafata la sol(m.p.):**

| cadastral | Liter | Constructia | Componentul | Supr_mp | NrCadastral | Suprafata |
|------------|-------|-------------------|-------------------|---------|----------------|-----------|
| 208.150.04 | 9B | Constr.principala | Partea principala | 654,9 | 0100208.150.04 | 654,9 |

Autorizatiei de construire nr. 328-c/17 din 16.08.2017, s-au permis executarea lucrărilor de construire a unui obiectiv cu functii comasate, spatii comerciale, prestări servicii, cu parcare auto subterană cu nivelul de înălțime S+P+6E.
 Autorizatiei de construire nr. 177-c/20 din 23.06.2020, s-au permis executarea lucrărilor, pentru finalizarea obiectivului cu functii comasate, spatii comerciale, prestări servicii, cu parcare auto subterană cu nivelul de înălțime S+P+6E. În realitate si conform documentatiei de proiect studiul către DGAURF a CMC, regimul de înălțime constituie 9(S+P+6E+ET).

Data întocmirii planului : 07.04.2021Executantul lucrărilor: Zara GheorgheVerificat/Conducătorul întreprinderii: Zara Gheorghe

"PROGEOCAD" S.R.L.

(Denumirea întreprinderii care a executat lucrarea)

Fișa rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de clădire principală

II. DATE GENERALE DESPRE CLĂDIRIRE

| | | | |
|--|--|----------------------------|------------|
| 1. Numărul cadastral: | 0100208.150.04 | 2. Litera: | 9B-04 |
| 3. Adresa clădirii: | mun. Chișinău, sect. Centru str. Mihail Kogălniceanu, 2a | | |
| 4. Modul de folosință: | Construcție cu funcții comasate | | |
| 5. Nr. nivelelor: | 9(S+P+6E+ET) | 6. Nr. scărilor: | |
| 7. Nr. încăperilor izolate locative: | | 8. Nr. camerelor locative: | |
| 9. Nr. încăperilor izolate nelocative: | | 10. Suprafața la sol: | 654,9 m.p. |

II. DESCRIEREA GENERALĂ A CLĂDIRII

| Lit. | Componenta | Nr. de nivele | Metoda de calcul a suprafeței exterioare | Suprafața exterioară (m ²) | Înălțimea (m) | Volum (m ³) | Anul construcției | Mențiuni |
|------|---------------------------|---------------|--|--|---------------|-------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9B | subsol | 9 | calcul conform program specializat(inventory 11) | 638,9 | 3,30 | 2108 | neid. | |
| | partea principală(parter) | | calcul conform program specializat(inventory 11) | 654,9 | 4,20 | 2751 | | |
| | nivel : 2(etaj) | | calcul conform program specializat(inventory 11) | 659,7 | 3,60 | 2375 | | |
| | nivel : 3(etaj) | | calcul conform program specializat(inventory 11) | 699,2 | 3,60 | 2517 | | |
| | nivel : 4(etaj) | | calcul conform program specializat(inventory 11) | 685,9 | 3,60 | 2469 | | |
| | nivel : 5(etaj) | | calcul conform program specializat(inventory 11) | 669,2 | 3,60 | 2409 | | |
| | nivel : 6(etaj) | | calcul conform program specializat(inventory 11) | 624,9 | 3,60 | 2250 | | |
| | nivel : 7(etaj) | | calcul conform program specializat(inventory 11) | 573,4 | 3,60 | 2064 | | |
| | nivel : 8(etaj tehnic) | | calcul conform program specializat(inventory 11) | 105,6 | 3,90 | 412 | | |
| | terasă(nivel : 8(ET)) | | calcul conform program specializat(inventory 11) | 467,8 | | | | |
| | balcoane | | calcul conform program specializat(inventory 11) | 147,1 | | | | |

DESCRIEREA TEHNICĂ A PĂRȚILOR CLĂDIRII lit. 9B(Subsol)

| Denumirea elementelor constructive | Descriere a elementelor constructive | Ponderea elementului, % | Cota de prezență a elementului de la 0 până la 1,0 | Ponderea elementului în clădire, % (conform cotei de prezență) col3*col4 | Uzura fizică a elementului,% | Ponderea uzurii elementului în clădire. (col.5*col.6) |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | fundatii | beton armat | | | | |
| planșeu | portanți | beton armat | | | | |
| | despărțitori | BCA/carămidă | | | | |
| | pod | beton armat | | | | |
| | între etaje | beton armat | | | | |
| | acoperiș | - | | | | |
| pardoseala | etaj 1 | ciment | | | | |
| | alte etaje | - | | | | |
| goluri | ferestre | - | | | | |
| | uși | metal | | | | |
| fimisai | interior | tencuit | | | | |
| | exterior | - | | | | |
| | alte lucrări | sunt | | | | |
| | | total | | | | |

Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)=

A executat:

Zara Gheorghe

07.04.2023

(numele, prenumele)

(data)

A verificat:

Zara Gheorghe

07.04.2023

(numele, prenumele, LS)

(data)

Stins (data)

(numele, prenumele, semnătura inginerului cadastral)



DESCRIEREA TEHNICĂ A PĂRȚILOR CLĂDIRII lit. 9B(Parter)

| Denumirea elementelor construcției | Descriere a elementelor constructive | Ponderea elementului, % | Cota de prezență a elementului de la 0 pînă la 1,0 | Ponderea elementului în clădire, % (conform cotei de prezență) col3*col4 | Uzura fizică a elementului,% | Pondere uzurii elementului în clădire, % (col.5*col6) |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| fundatii | - | | | | | |
| pereti | portanți | piloni din beton armat/BCA | | | | |
| | despărțitori | BCA/carămidă | | | | |
| plaseu | pod | beton armat | | | | |
| | între etaje | beton armat | | | | |
| pardoseala | acoperiș | combinat | | | | |
| | etaj I | ciment | | | | |
| | alte etaje | - | | | | |
| goluri | ferestre | termopan | | | | |
| | uși | termopan | | | | |
| finisaj | interior | finisat | | | | |
| | exterior | finisat | | | | |
| alte lucrări | sunt | | | | | |
| | total | | | | | |
| Uzura fizică a construcției =(col.7)*100/(col.5)= | | | | | | |

DESCRIEREA TEHNICĂ A PĂRȚILOR CLĂDIRII lit. 9B (nivel : 2-7)

| Denumirea elementelor construcției | Descriere a elementelor constructive | Pondere elementului, % | Cota de prezență a elementului de la 0 pînă la 1,0 | Pondere elementului în clădire, % (conform cotei de prezență) col3*col4 | Uzura fizică a elementului,% | Pondere uzurii elementului în clădire, % (col.5*col.6) |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| fundament | - | | | | | |
| pereti | de rezistență | piloni din beton armat/termopan | | | | |
| | despărțitori | BCA/carămidă/termopan | | | | |
| plaseu | pod | - | | | | |
| | între etaje | beton armat | | | | |
| pardoseala | acoperiș | - | | | | |
| | etaj I | teracotă | | | | |
| | alte etaje | teracotă | | | | |
| goluri | ferestre | termopan | | | | |
| | uși | termopan | | | | |
| finisaj | interior | finisat | | | | |
| | exterior | finisat | | | | |
| alte lucrări | sunt | | | | | |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= | | | | | | |

DESCRIEREA TEHNICĂ A PĂRȚILOR CLĂDIRII lit. 9B (ET)

| Denumirea elementelor | Descriere a elementelor constructive | Pondere elementului, % (conform indicilor comasați a cons. tin) | Procentul de prezență a elementului | Pondere elementului în clădire, % (conform cotei de prezență) | Uzura fizică a elementului,% | Pondere uzurii elementului în clădire, % (col.5*col.6) |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| fundament | - | | | | | |
| pereti | de rezistență | BCA | | | | |
| | despărțitori | BCA | | | | |
| plaseu | pod | beton armat | | | | |
| | între etaje | - | | | | |
| pardoseala | acoperiș | - | | | | |
| | etaj I | - | | | | |
| | alte etaje | teracotă | | | | |
| goluri | ferestre | termopan | | | | |
| | uși | termopan | | | | |
| finisaj | interior | finisat | | | | |
| | exterior | finisat | | | | |
| alte lucrări | sunt | | | | | |
| Uzura fizică a clădirii =(col.7)*100/(col.5)= | | | | | | |

"PROGEOCAD" S.R.L.
ANEXA LA PLANUL CLĂDIRII



| Numărul poștal al clădirii: | | nr. 2/a | | A executat | | Zara Gheorghie | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--------------------------|---|------------------------------------|--------------|---|---|--------------|---|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| Denumirea străzii: | | str. Mihail Kogălniceanu | | A verificat | | Zara Gheorghie | | | | | | | | |
| Comuna(satul)/sectorul: | | sect. Centru | | | | | | | | | | | | |
| Raionul/Municipiul: | | mun. Chișinău | | | | | | | | | | | | |
| Nr. cadastral al clădirii: | | 0100208.150.04 | | | | | | | | | | | | |
| Data înlocuirii/actualizării | Nr. scării | Nr. nivelului | Nr. poștal al apartamentului/ încăperii ne/locative | Nr. cadastral la nivel de încăpere | Nr. încăperi | Destinația încăperilor: cameră de locuit, baie, coridor, bucatărie, WC ș.a. | de menire socială | | Suprafața pe perimetru în m ² (în m ²) | | | | | |
| | | | | | | | suprafața încăperilor comune: hol, scări, coridor, etc. | Total | prestări servicii | de servicii | administrativă | suprafața de depozitare | suprafața auxiliara a încăperii | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 07.04.2023 | | -1S | | | 1 | culuar de trecere | | 79,8 | | | | | | 79,8 |
| | | | | | 2 | încăpere tehnică | | 5,0 | | | | | | 5,0 |
| | | | | | 3 | încăpere tehnică | | 79,0 | | | | | | 79,0 |
| | | | | | 4 | parcaj auto | | 368,2 | | | | | | 368,2 |
| | | | | | 5 | coridor | | 2,7 | | | | | | 2,7 |
| | | | | | 6 | încăpere auxiliară | | 16,5 | | | | | | 16,5 |
| | | | | | 7 | încăpere auxiliară | | 3,5 | | | | | | 3,5 |
| | | | | | 8 | încăpere tehnică | | 4,8 | | | | | | 4,8 |
| | | | | | | TOTAL | | 559,5 | | | | | | 559,5 |
| | 1P | | | | 1 | tambur | | 7,6 | | | | | | 7,6 |
| | | | | | 2 | tambur | | 3,2 | | | | | | 3,2 |
| | | | | | 3 | tambur | | 3,5 | | | | | | 3,5 |
| | | | | | 4 | hol | | 87,5 | | | | | | 87,5 |
| | | | | | 5 | sală de ședințe | | 53,9 | | | 53,9 | | | |
| | | | | | 6 | sală de ședințe | | 58,9 | | | 58,9 | | | |
| | | | | | 7 | sală de ședințe | | 23,1 | | | 23,1 | | | |
| | | | | | 8 | grup sanitar | | 2,1 | | | | | | 2,1 |
| | | | | | 9 | grup sanitar | | 1,9 | | | | | | 1,9 |
| | | | | | 10 | coridor | | 3,9 | | | | | | 3,9 |
| | | | | | 11 | casa scării | | 7,6 | | | | | | 7,6 |
| | | | | | 12 | casa ascensorului | | 4,0 | | | | | | 4,0 |
| | | | | | 13 | casa ascensorului | | 5,3 | | | | | | 5,3 |
| | | | | | 14 | încăpere pentru pază | | 4,3 | | | | | | 4,3 |
| | | | | | 15 | garderobă | | 1,7 | | | | | | 1,7 |
| | | | | | 16 | grup sanitar | | 2,7 | | | | | | 2,7 |
| | | | | | 17 | garderobă | | 4,3 | | | | | | 4,3 |
| | | | | | 18 | duș | | 1,9 | | | | | | 1,9 |
| | | | | | 19 | grup sanitar | | 2,0 | | | | | | 2,0 |
| | | | | | 20 | încăpere auxiliară | | 1,8 | | | | | | 1,8 |
| | | | | | 21 | coridor | | 8,3 | | | | | | 8,3 |
| | | | | | 22 | coridor | | 2,2 | | | | | | 2,2 |
| | | | | | 23 | spălătorie | | 11,5 | | | | | | 11,5 |
| | | | | | 24 | coridor | | 2,0 | | | | | | 2,0 |
| | | | | | 25 | încăpere tehnică | | 12,4 | | | | | | 12,4 |
| | | | | | 26 | grup sanitar | | 2,9 | | | | | | 2,9 |
| | | | | | 27 | grup sanitar | | 4,0 | | | | | | 4,0 |
| | | | | | 28 | sală prestări servicii | | 81,4 | 81,4 | | | | | |
| | | | | | 29 | sală prestări servicii | | 34,6 | 34,6 | | | | | |
| | | | | | 30 | sală de producere | | 19,6 | | | | | | 19,6 |
| | | | | | 31 | depozit | | 5,5 | | | | | | 5,5 |
| | | | | | 32 | cameră de ventilare | | 26,5 | | | | | | 26,5 |
| | | | | | 33 | coridor-scară | | 4,5 | | | | | | 4,5 |
| | | | | | 34 | sală prestări servicii | | 7,9 | 7,9 | | | | | |
| | | | | | 35 | casa scării | | 15,4 | | | | | | 15,4 |
| | | | | | | TOTAL | | 519,9 | 123,9 | | 135,9 | | | 260,1 |
| | 2E | | | | 1 | holul ascensorului | | 25,0 | | | | | | 25,0 |
| | | | | | 2 | hol | | 34,0 | | | | | | 34,0 |
| | | | | | 3 | coridor | | 4,0 | | | | | | 4,0 |
| | | | | | 4 | grup sanitar | | 11,2 | | | | | | 11,2 |
| | | | | | 5 | grup sanitar | | 12,9 | | | | | | 12,9 |
| | | | | | 6 | cameră de odihnă | | 27,5 | | | | | | 27,5 |
| | | | | | 7 | oficiu | | 26,8 | | | 26,8 | | | |
| | | | | | 8 | oficiu | | 12,5 | | | 12,5 | | | |
| | | | | | 9 | oficiu | | 21,8 | | | 21,8 | | | |
| | | | | | 10 | oficiu | | 275,5 | | | 275,5 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|----|--------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | | | 11 | sufragerie | 34,2 | | | 34,2 |
| | | | 12 | hol | 13,6 | | | 13,6 |
| | | | 13 | lavoar | 7,2 | | | 7,2 |
| | | | 14 | grup sanitar | 6,8 | | | 6,8 |
| | | | 15 | grup sanitar | 5,8 | | | 5,8 |
| | | | | TOTAL | 518,8 | | 336,6 | 182,2 |
| | 3E | | 1 | holul ascensorului | 24,9 | | | 24,9 |
| | | | 2 | hol | 32,1 | | | 32,1 |
| | | | 3 | coridor | 4,0 | | | 4,0 |
| | | | 4 | grup sanitar | 11,0 | | | 11,0 |
| | | | 5 | grup sanitar | 12,9 | | | 12,9 |
| | | | 6 | cameră de odihnă | 48,7 | | | 48,7 |
| | | | 7 | vestiar | 14,6 | | | 14,6 |
| | | | 8 | oficiu | 33,5 | | 33,5 | |
| | | | 9 | încăpere tehnică | 1,2 | | | 1,2 |
| | | | 10 | oficiu | 41,9 | | 41,9 | |
| | | | 11 | oficiu | 279,3 | | 279,3 | |
| | | | 12 | balcon (k=0.30) | 1,4 | | | 1,4 |
| | | | 13 | sufragerie | 42,4 | | | 42,4 |
| | | | 14 | hol | 13,6 | | | 13,6 |
| | | | 15 | lavoar | 7,2 | | | 7,2 |
| | | | 16 | grup sanitar | 6,9 | | | 6,9 |
| | | | 17 | grup sanitar | 5,7 | | | 5,7 |
| | | | 18 | balcon (k=0.30) | 0,4 | | | 0,4 |
| | | | | TOTAL | 581,7 | | 354,7 | 227,0 |
| | 4E | | 1 | holul ascensorului | 24,9 | | | 24,9 |
| | | | 2 | hol | 50,7 | | | 50,7 |
| | | | 3 | coridor | 4,0 | | | 4,0 |
| | | | 4 | grup sanitar | 11,0 | | | 11,0 |
| | | | 5 | grup sanitar | 12,9 | | | 12,9 |
| | | | 6 | oficiu | 70,6 | | 70,6 | |
| | | | 7 | balcon (k=0.30) | 1,4 | | | 1,4 |
| | | | 8 | încăpere tehnică | 13,4 | | | 13,4 |
| | | | 9 | încăpere tehnică | 6,0 | | | 6,0 |
| | | | 10 | oficiu | 20,1 | | 20,1 | |
| | | | 11 | cameră de odihnă | 26,8 | | | 26,8 |
| | | | 12 | oficiu | 245,4 | | 245,4 | |
| | | | 13 | balcon (k=0.30) | 1,1 | | | 1,1 |
| | | | 14 | sufragerie | 42,2 | | | 42,2 |
| | | | 15 | hol | 13,6 | | | 13,6 |
| | | | 16 | lavoar | 7,2 | | | 7,2 |
| | | | 17 | grup sanitar | 6,8 | | | 6,8 |
| | | | 18 | grup sanitar | 5,7 | | | 5,7 |
| | | | 19 | balcon (k=0.30) | 0,4 | | | 0,4 |
| | | | | TOTAL | 564,2 | | 336,1 | 228,1 |
| | 5E | | 1 | holul ascensorului | 24,9 | | | 24,9 |
| | | | 2 | hol | 34,0 | | | 34,0 |
| | | | 3 | coridor | 3,9 | | | 3,9 |
| | | | 4 | grup sanitar | 31,2 | | | 31,2 |
| | | | 5 | vestiar | 30,9 | | | 30,9 |
| | | | 6 | balcon (k=0.30) | 0,8 | | | 0,8 |
| | | | 7 | cameră de odihnă | 47,3 | | | 47,3 |
| | | | 8 | oficiu | 19,1 | | 19,1 | |
| | | | 9 | balcon (k=0.30) | 0,6 | | | 0,6 |
| | | | 10 | oficiu | 284,6 | | 284,6 | |
| | | | 11 | balcon (k=0.30) | 1,1 | | | 1,1 |
| | | | 12 | sufragerie | 42,0 | | | 42,0 |
| | | | 13 | hol | 13,6 | | | 13,6 |
| | | | 14 | lavoar | 7,3 | | | 7,3 |
| | | | 15 | grup sanitar | 6,2 | | | 6,2 |
| | | | 16 | grup sanitar | 6,4 | | | 6,4 |
| | | | 17 | balcon (k=0.30) | 0,4 | | | 0,4 |
| | | | | TOTAL | 554,3 | | 303,7 | 250,6 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 6E | 1 | holul ascensorului | 24,9 | | 24,9 |
| | 2 | hol | 30,4 | | 30,4 |
| | 3 | coridor | 4,0 | | 4,0 |
| | 4 | grup sanitar | 31,4 | | 31,4 |
| | 5 | oficiu | 23,7 | 23,7 | |
| | 6 | oficiu | 29,4 | 29,4 | |
| | 7 | vestiar | 25,1 | | 25,1 |
| | 8 | încăpere tehnică | 1,2 | | 1,2 |
| | 9 | oficiu | 35,0 | 35,0 | |
| | 10 | oficiu | 69,0 | 69,0 | |
| | 11 | balcon (k=0.30) | 7,4 | | 7,4 |
| | 12 | oficiu | 153,4 | 153,4 | |
| | 13 | balcon (k=0.30) | 1,9 | | 1,9 |
| | 14 | sufragerie | 40,1 | | 40,1 |
| | 15 | hol | 15,5 | | 15,5 |
| | 16 | lavoar | 7,1 | | 7,1 |
| | 17 | grup sanitar | 6,7 | | 6,7 |
| | 18 | grup sanitar | 5,7 | | 5,7 |
| | 19 | balcon (k=0.30) | 0,4 | | 0,4 |
| | | TOTAL | 512,3 | 310,5 | 201,8 |
| 7E | 1 | holul ascensorului | 23,9 | | 23,9 |
| | 2 | hol | 37,1 | | 37,1 |
| | 3 | lavoar | 2,6 | | 2,6 |
| | 4 | grup sanitar | 6,4 | | 6,4 |
| | 5 | grup sanitar | 4,8 | | 4,8 |
| | 6 | oficiu | 80,3 | 80,3 | |
| | 7 | balcon (k=0.30) | 3,6 | | 3,6 |
| | 8 | oficiu | 16,8 | 16,8 | |
| | 9 | balcon (k=0.30) | 2,9 | | 2,9 |
| | 10 | oficiu | 43,9 | 43,9 | |
| | 11 | oficiu | 32,3 | 32,3 | |
| | 12 | oficiu | 45,0 | 45,0 | |
| | 13 | balcon (k=0.30) | 3,1 | | 3,1 |
| | 14 | oficiu | 49,0 | 49,0 | |
| | 15 | hol | 36,3 | | 36,3 |
| | 16 | oficiu | 17,5 | 17,5 | |
| | 17 | oficiu | 17,3 | 17,3 | |
| | 18 | balcon (k=0.30) | 1,3 | | 1,3 |
| | 19 | oficiu | 27,5 | 27,5 | |
| | 20 | grup sanitar | 6,7 | | 6,7 |
| | 21 | lavoar | 3,4 | | 3,4 |
| | 22 | grup sanitar | 6,1 | | 6,1 |
| | 23 | balcon (k=0.30) | 0,4 | | 0,4 |
| | | TOTAL | 468,2 | 329,6 | 138,6 |
| 8ET | 1 | holul ascensorului | 8,3 | | 8,3 |
| | 2 | cazangerie | 50,5 | | 50,5 |
| | 3 | terasă (k=0.30) | 122,6 | | 122,6 |
| | | TOTAL | 181,4 | | 181,4 |
| | | Total lit. 9B-04 | 4460,3 | 123,9 | 2107,1 |
| | | | | | 2229,3 |

ricii) cu
hisinău,

e/20 din

uate și a

e;
ui sînt în

obiectivul
are auto
ău, sect.

zatiei de
mentatie

comosate
erenul cu
la - spre

“BEARS GROUP” S.R.L.

MD - 2068, mun. Chişinău, str.Miron Costin 11/2 of. 10
codul fiscal 1016600026138 cod TVA

Email: bearsgroupsrl@gmail.com, tel. 069355119, tel/fax 0-22-920-917

Scrisoare de recomandare

Îmi exprim aprecierea fata de colaborarea companiei noastre S.R.L.”BEARS GROUP” cu compania S.R.L.”Eurostil Construct” in calitate de Antreprenor General in baza Contractelor nr. 14/03 din 15.05.2017 si nr.15/0819G ce tine de constructia obiectivului “Centrul de business, Centrul comercial cu parcare subterana din str, Kogălniceanu 2a, Mun. Chisinau,

Proiect elaborate de catre compania A.R.D SRL, arhitect principal al Proiectului DL, Gheorge Telipiz

Lucrarile de constructie au cuprins urmatoarele compartimente:

- Executarea constructiilor de sprijin din piloti forati pentru groapa de fundatie , zidului de sprijin, lucrarilor de drenaj.
- Structura de rezistenta a cladirii cu regim de inaltime S+P+8 etaje
- Confectionare si montarea constructiilor metalice pe acoperis, lucrari de consolidare
- Executarea si instalarea vitraliilor (fasada cortina structurala din aluminiu, producator al sistemelor din aluminiu SCHUECO Germania
- Fasade ventilate cu material compozit TIP “Etalbond” si cu piatra naturala
- Acoperi si terase executate cu membrane bituminoase si PVC
- Finisari interioare conform proiectului de design elaborate de compania ucraineana “LINEASTUDIO”
-
- Amenajarea teritoriului

Retele Ingineresti interioare

- Apeduct , canalizare, canalizare pluviala, incalzire, casangerie, ventilare, conditionare
- Retele electrice si iluminat interior
- Retele de curenti slabi interioare (sistemului de semnalizare de paza automata, automatizarea stingerii incendiului, computer, telefon, Sistema de control si video)
-

Retele Ingineresti exterioare

- Sistema de drenaj
- Apeduct si canalizare , canalizare pluviala
- Retele electice exterioare
- Retele exterioare de gazificare a cladirii

Valoarea lucrarilor executate constituie 117.115.171,27 lei inclusiv TVA 20-%, care sunt indeplinite conform proiectului si cerintelor normativelor in constructie, respectind sistemul calitatii in constructie.

Compania s-a deosebit prin profesionalism, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitarile noastre.

În concluzie, recomandam compania S.R.L. ”Eurostil Construct” in calitate de Antreprenor General, ca fiind o companie profesionista si de incredere pentru orice companie cu care va colabora si apreciez serviciile lor de calitate si flexibilitatea solutiilor oferite, fapt ce o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Cu respect,
Administratorul “BEARS GROUP” S.R.L.



Tcaci Roman

АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2023
между Eurostil Construct SRL
и Bears Group SRL

Мы, нижеподписавшиеся, Eurostil Construct SRL, с одной стороны, и Bears Group SRL, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по

| По данным Eurostil Construct SRL, лев. | | | | По данным Bears Group SRL, лев. | | | |
|--|--|--------------|--------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит |
| 1 | Сальдо на 01.01.2017 | | | | | | |
| 1 | Оплата (Выписка № 131 от 19 Iunie 2017) | | 100 000,00 | 1 | Оплата (Выписка № 131 от 19 Iunie 2017) | 100 000,00 | |
| 2 | Продажа (Оказание услуг № LB0860010 от 31 Iulie 2017) | 409 280,11 | | 2 | Продажа (Оказание услуг № LB0860010 от 31 Iulie 2017) | | 409 280,11 |
| 3 | Продажа (Оказание услуг № LB0860031 от 31 August 2017) | 873 246,76 | | 3 | Продажа (Оказание услуг № LB0860031 от 31 August 2017) | | 873 246,76 |
| 4 | Оплата (Выписка № 215 от 14 Septembrie 2017) | | 210 000,00 | 4 | Оплата (Выписка № 215 от 14 Septembrie 2017) | 210 000,00 | |
| 5 | Продажа (Оказание услуг № LB0860045 от 29 Septembrie 2017) | 376 587,59 | | 5 | Продажа (Оказание услуг № LB0860045 от 29 Septembrie 2017) | | 376 587,59 |
| 6 | Продажа (Оказание услуг № LB0860063 от 31 Octombrie 2017) | 1 907 537,19 | | 6 | Продажа (Оказание услуг № LB0860063 от 31 Octombrie 2017) | | 1 907 537,19 |
| 7 | Продажа (Оказание услуг № LB0860068 от 16 Noiembrie 2017) | 284 470,70 | | 7 | Продажа (Оказание услуг № LB0860068 от 16 Noiembrie 2017) | | 284 470,70 |
| 8 | Оплата (Выписка № 297 от 28 Noiembrie 2017) | | 594 000,00 | 8 | Оплата (Выписка № 297 от 28 Noiembrie 2017) | 594 000,00 | |
| 9 | Оплата (Выписка № 298 от 29 Noiembrie 2017) | | 858 875,60 | 9 | Оплата (Выписка № 298 от 29 Noiembrie 2017) | 858 875,60 | |
| 10 | Продажа (Оказание услуг № LB0860077 от 30 Noiembrie 2017) | 578 612,77 | | 10 | Продажа (Оказание услуг № LB0860077 от 30 Noiembrie 2017) | | 578 612,77 |
| 11 | Оплата (Выписка № 302 от 01 Decembrie 2017) | | 123 246,76 | 11 | Оплата (Выписка № 302 от 01 Decembrie 2017) | 123 246,76 | |
| 12 | Оплата (Выписка № 311 от 13 Decembrie 2017) | | 1 708 000,00 | 12 | Оплата (Выписка № 311 от 13 Decembrie 2017) | 1 708 000,00 | |
| 13 | Оплата (Выписка № 312 от 14 Decembrie 2017) | | 608 612,77 | 13 | Оплата (Выписка № 312 от 14 Decembrie 2017) | 608 612,77 | |
| 14 | Оплата (Выписка № 318 от 20 Decembrie 2017) | | 227 000,00 | 14 | Оплата (Выписка № 318 от 20 Decembrie 2017) | 227 000,00 | |
| 15 | Продажа (Оказание услуг № LB0860097 от 29 Decembrie 2017) | 914 848,74 | | 15 | Продажа (Оказание услуг № LB0860097 от 29 Decembrie 2017) | | 914 848,74 |
| 16 | Оплата (Выписка № 15 от 29 Ianuarie 2018) | | 914 848,74 | 16 | Оплата (Выписка № 15 от 29 Ianuarie 2018) | 914 848,74 | |
| 17 | Продажа (Оказание услуг № LB0860111 от 31 Ianuarie 2018) | 930 802,60 | | 17 | Продажа (Оказание услуг № LB0860111 от 31 Ianuarie 2018) | | 930 802,60 |
| 18 | Оплата (Выписка № 24 от 14 Februarie 2018) | | 930 802,60 | 18 | Оплата (Выписка № 24 от 14 Februarie 2018) | 930 802,60 | |
| 19 | Продажа (Оказание услуг № LB0860121 от 28 Februarie 2018) | 292 132,96 | | 19 | Продажа (Оказание услуг № LB0860121 от 28 Februarie 2018) | | 292 132,96 |
| 20 | Оплата (Выписка № 48 от 14 Martie 2018) | | 292 132,96 | 20 | Оплата (Выписка № 48 от 14 Martie 2018) | 292 132,96 | |
| 21 | Продажа (Оказание услуг № LB0860129 от 30 Martie 2018) | 1 232 039,94 | | 21 | Продажа (Оказание услуг № LB0860129 от 30 Martie 2018) | | 1 232 039,94 |
| 22 | Оплата (Выписка № 63 от 04 Aprilie 2018) | | 1 232 039,94 | 22 | Оплата (Выписка № 63 от 04 Aprilie 2018) | 1 232 039,94 | |
| 23 | Продажа (Оказание услуг № LB0860137 от 30 Aprilie 2018) | 1 697 001,76 | | 23 | Продажа (Оказание услуг № LB0860137 от 30 Aprilie 2018) | | 1 697 001,76 |
| 24 | Оплата (Выписка № 102 от 22 Mai 2018) | | 207 001,76 | 24 | Оплата (Выписка № 102 от 22 Mai 2018) | 207 001,76 | |
| 25 | Продажа (Оказание услуг № IM0336589 от 31 Mai 2018) | 1 050 400,61 | | 25 | Продажа (Оказание услуг № IM0336589 от 31 Mai 2018) | | 1 050 400,61 |
| 26 | Оплата (Выписка № 117 от 07 Iunie 2018) | | 2 540 400,60 | 26 | Оплата (Выписка № 117 от 07 Iunie 2018) | 2 540 400,60 | |
| 27 | Продажа (Оказание услуг № IM0519404 от 30 Iunie 2018) | 1 524 159,17 | | 27 | Продажа (Оказание услуг № IM0519404 от 30 Iunie 2018) | | 1 524 159,17 |
| 28 | Оплата (Выписка № 152 от 13 Iulie 2018) | | 1 524 159,17 | 28 | Оплата (Выписка № 152 от 13 Iulie 2018) | 1 524 159,17 | |
| 29 | Продажа (Оказание услуг № IM0519431 от 31 Iulie 2018) | 1 266 867,01 | | 29 | Продажа (Оказание услуг № IM0519431 от 31 Iulie 2018) | | 1 266 867,01 |
| 30 | Оплата (Выписка № 182 от 13 August 2018) | | 400 000,00 | 30 | Оплата (Выписка № 182 от 13 August 2018) | 400 000,00 | |
| 31 | Оплата (Выписка № 195 от 24 August 2018) | | 866 867,01 | 31 | Оплата (Выписка № 195 от 24 August 2018) | 866 867,01 | |
| 32 | Продажа (Оказание услуг № EUJ000750365 от 30 August 2018) | 482 591,76 | | 32 | Продажа (Оказание услуг № EUJ000750365 от 30 August 2018) | | 482 591,76 |
| 33 | Оплата (Выписка № 203 от 03 Septembrie 2018) | | 1 353 254,00 | 33 | Оплата (Выписка № 203 от 03 Septembrie 2018) | 1 353 254,00 | |
| 34 | Оплата (Выписка № 221 от 14 Septembrie 2018) | | 1 827 441,41 | 34 | Оплата (Выписка № 221 от 14 Septembrie 2018) | 1 827 441,41 | |

| По данным Eurostil Construct SRL, лев. | | | | По данным Bears Group SRL, лев. | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит |
| 35 | Оплата (Выписка № 246 от 08 Octombrie 2018) | | 1 949 970,00 | 35 | Оплата (Выписка № 246 от 08 Octombrie 2018) | 1 949 970,00 | |
| 36 | Продажа (Оказание услуг № IM0766142 от 31 Octombrie 2018) | 3 244 304,26 | | 36 | Продажа (Оказание услуг № IM0766142 от 31 Octombrie 2018) | | 3 244 304,26 |
| 37 | Возврат средств (Выписка № 267 от 31 Octombrie 2018) | 2 541 445,54 | | 37 | Возврат средств (Выписка № 267 от 31 Octombrie 2018) | | 2 541 445,54 |
| 38 | Оплата (Выписка № 267 от 31 Octombrie 2018) | | 2 541 445,54 | 38 | Оплата (Выписка № 267 от 31 Octombrie 2018) | 2 541 445,54 | |
| 39 | Оплата (Выписка № 269 от 01 Noiembrie 2018) | | 2 555 573,45 | 39 | Оплата (Выписка № 269 от 01 Noiembrie 2018) | 2 555 573,45 | |
| 40 | Оплата (Выписка № 287 от 21 Noiembrie 2018) | | 2 282 576,75 | 40 | Оплата (Выписка № 287 от 21 Noiembrie 2018) | 2 282 576,75 | |
| 41 | Продажа (Оказание услуг № IM1180506 от 30 Noiembrie 2018) | 4 132 826,31 | | 41 | Продажа (Оказание услуг № IM1180506 от 30 Noiembrie 2018) | | 4 132 826,31 |
| 42 | Продажа (Оказание услуг № IM1180555 от 22 Ianuarie 2019) | 3 434 519,67 | | 42 | Продажа (Оказание услуг № IM1180555 от 22 Ianuarie 2019) | | 3 434 519,67 |
| 43 | Продажа (Оказание услуг № IM1180562 от 31 Ianuarie 2019) | 77 985,23 | | 43 | Продажа (Оказание услуг № IM1180562 от 31 Ianuarie 2019) | | 77 985,23 |
| 44 | Оплата (Выписка № 44 от 20 Februarie 2019) | | 1 700 040,58 | 44 | Оплата (Выписка № 44 от 20 Februarie 2019) | 1 700 040,58 | |
| 45 | Оплата (Выписка № 45 от 21 Februarie 2019) | | 77 985,23 | 45 | Оплата (Выписка № 45 от 21 Februarie 2019) | 77 985,23 | |
| 46 | Продажа (Оказание услуг № IM1180578 от 28 Februarie 2019) | 114 995,94 | | 46 | Продажа (Оказание услуг № IM1180578 от 28 Februarie 2019) | | 114 995,94 |
| 47 | Оплата (Выписка № 63 от 15 Martie 2019) | | 64 995,94 | 47 | Оплата (Выписка № 63 от 15 Martie 2019) | 64 995,94 | |
| 48 | Продажа (Оказание услуг № IM1180582 от 21 Martie 2019) | 3 676 369,76 | | 48 | Продажа (Оказание услуг № IM1180582 от 21 Martie 2019) | | 3 676 369,76 |
| 49 | Оплата (Выписка № 70 от 26 Martie 2019) | | 2 084 750,97 | 49 | Оплата (Выписка № 70 от 26 Martie 2019) | 2 084 750,97 | |
| 50 | Продажа (Оказание услуг № IM1180588 от 29 Martie 2019) | 171 428,63 | | 50 | Продажа (Оказание услуг № IM1180588 от 29 Martie 2019) | | 171 428,63 |
| 51 | Оплата (Выписка № 104 от 25 Aprilie 2019) | | 2 475 990,00 | 51 | Оплата (Выписка № 104 от 25 Aprilie 2019) | 2 475 990,00 | |
| 52 | Продажа (Оказание услуг № AAG0050963 от 30 Aprilie 2019) | 177 677,41 | | 52 | Продажа (Оказание услуг № AAG0050963 от 30 Aprilie 2019) | | 177 677,41 |
| 53 | Оплата (Выписка № 117 от 17 Mai 2019) | | 18 487,50 | 53 | Оплата (Выписка № 117 от 17 Mai 2019) | 18 487,50 | |
| 54 | Продажа (Оказание услуг № AAG0050987 от 17 Iunie 2019) | 3 625 358,12 | | 54 | Продажа (Оказание услуг № AAG0050987 от 17 Iunie 2019) | | 3 625 358,12 |
| 55 | Продажа (Оказание услуг № AAG0051002 от 28 Iunie 2019) | 744 772,51 | | 55 | Продажа (Оказание услуг № AAG0051002 от 28 Iunie 2019) | | 744 772,51 |
| 56 | Оплата (Выписка № 161 от 03 Iulie 2019) | | 1 400 000,00 | 56 | Оплата (Выписка № 161 от 03 Iulie 2019) | 1 400 000,00 | |
| 57 | Оплата (Выписка № 186 от 24 Iulie 2019) | | 1 848 700,00 | 57 | Оплата (Выписка № 186 от 24 Iulie 2019) | 1 848 700,00 | |
| 58 | Оплата (Выписка № 212 от 16 August 2019) | | 1 840 621,28 | 58 | Оплата (Выписка № 212 от 16 August 2019) | 1 840 621,28 | |
| 59 | Продажа (Оказание услуг № IM1563537 от 21 August 2019) | 1 614 718,18 | | 59 | Продажа (Оказание услуг № IM1563537 от 21 August 2019) | | 1 614 718,18 |
| 60 | Продажа (Оказание услуг № IM1563536 от 21 August 2019) | 36 975,00 | | 60 | Продажа (Оказание услуг № IM1563536 от 21 August 2019) | | 36 975,00 |
| 61 | Оплата (Выписка № 217 от 22 August 2019) | | 18 487,50 | 61 | Оплата (Выписка № 217 от 22 August 2019) | 18 487,50 | |
| 62 | Продажа (Оказание услуг № IM1563552 от 30 August 2019) | 357 618,27 | | 62 | Продажа (Оказание услуг № IM1563552 от 30 August 2019) | | 357 618,27 |
| 63 | Оплата (Выписка № 237 от 18 Septembrie 2019) | | 1 609 000,00 | 63 | Оплата (Выписка № 237 от 18 Septembrie 2019) | 1 609 000,00 | |
| 64 | Оплата (Выписка № 265 от 21 Octombrie 2019) | | 1 263 791,86 | 64 | Оплата (Выписка № 265 от 21 Octombrie 2019) | 1 263 791,86 | |
| 65 | Продажа (Оказание услуг № IM1930601 от 31 Octombrie 2019) | 606 223,04 | | 65 | Продажа (Оказание услуг № IM1930601 от 31 Octombrie 2019) | | 606 223,04 |
| 66 | Оплата (Выписка № 282 от 06 Noiembrie 2019) | | 1 333 481,72 | 66 | Оплата (Выписка № 282 от 06 Noiembrie 2019) | 1 333 481,72 | |
| 67 | Продажа (Оказание услуг № IM1930621 от 29 Noiembrie 2019) | 1 154 738,01 | | 67 | Продажа (Оказание услуг № IM1930621 от 29 Noiembrie 2019) | | 1 154 738,01 |
| 68 | Продажа (Оказание услуг № IM1930622 от 29 Noiembrie 2019) | 258 171,92 | | 68 | Продажа (Оказание услуг № IM1930622 от 29 Noiembrie 2019) | | 258 171,92 |
| 69 | Оплата (Выписка № 312 от 04 Decembrie 2019) | | 1 247 450,49 | 69 | Оплата (Выписка № 312 от 04 Decembrie 2019) | 1 247 450,49 | |
| 70 | Продажа (Оказание услуг № IM1930641 от 30 Decembrie 2019) | 340 156,39 | | 70 | Продажа (Оказание услуг № IM1930641 от 30 Decembrie 2019) | | 340 156,39 |
| 71 | Оплата (Выписка № 25 от 30 Ianuarie 2020) | | 996 788,86 | 71 | Оплата (Выписка № 25 от 30 Ianuarie 2020) | 996 788,86 | |
| 72 | Продажа (Оказание услуг № IM1930659 от 31 Ianuarie 2020) | 1 176 040,42 | | 72 | Продажа (Оказание услуг № IM1930659 от 31 Ianuarie 2020) | | 1 176 040,42 |
| 73 | Оплата (Выписка № 49 от 20 Februarie 2020) | | 2 608 320,96 | 73 | Оплата (Выписка № 49 от 20 Februarie 2020) | 2 608 320,96 | |

| По данным Eurostil Construct SRL, лев. | | | | По данным Bears Group SRL, лев. | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит |
| 74 | Продажа (Оказание услуг № IM1930670 от 28 Februarie 2020) | 439 239,96 | | 74 | Продажа (Оказание услуг № IM1930670 от 28 Februarie 2020) | | 439 239,96 |
| 75 | Оплата (Выписка № 56 от 02 Martie 2020) | | 1 362 207,00 | 75 | Оплата (Выписка № 56 от 02 Martie 2020) | 1 362 207,00 | |
| 76 | Продажа (Оказание услуг № IM1930694 от 16 Aprilie 2020) | 485 946,02 | | 76 | Продажа (Оказание услуг № IM1930694 от 16 Aprilie 2020) | | 485 946,02 |
| 77 | Оплата (Выписка № 116 от 17 Aprilie 2020) | | 485 946,02 | 77 | Оплата (Выписка № 116 от 17 Aprilie 2020) | 485 946,02 | |
| 78 | Продажа (Оказание услуг № IM2273404 от 30 Aprilie 2020) | 1 733 839,73 | | 78 | Продажа (Оказание услуг № IM2273404 от 30 Aprilie 2020) | | 1 733 839,73 |
| 79 | Оплата (Выписка № 144 от 14 Mai 2020) | | 866 920,00 | 79 | Оплата (Выписка № 144 от 14 Mai 2020) | 866 920,00 | |
| 80 | Продажа (Оказание услуг № IM2273434 от 30 Iunie 2020) | 686 468,21 | | 80 | Продажа (Оказание услуг № IM2273434 от 30 Iunie 2020) | | 686 468,21 |
| 81 | Продажа (Оказание услуг № IM2273436 от 30 Iunie 2020) | 911 957,51 | | 81 | Продажа (Оказание услуг № IM2273436 от 30 Iunie 2020) | | 911 957,51 |
| 82 | Оплата (Выписка № 211 от 15 Iulie 2020) | | 408 938,03 | 82 | Оплата (Выписка № 211 от 15 Iulie 2020) | 408 938,03 | |
| 83 | Продажа (Оказание услуг № IM2273444 от 31 Iulie 2020) | 759 847,49 | | 83 | Продажа (Оказание услуг № IM2273444 от 31 Iulie 2020) | | 759 847,49 |
| 84 | Оплата (Выписка № 237 от 11 August 2020) | | 379 924,00 | 84 | Оплата (Выписка № 237 от 11 August 2020) | 379 924,00 | |
| 85 | Продажа (Оказание услуг № IM2273452 от 28 August 2020) | 391 250,40 | | 85 | Продажа (Оказание услуг № IM2273452 от 28 August 2020) | | 391 250,40 |
| 86 | Оплата (Выписка № 270 от 24 Septembrie 2020) | | 200 000,00 | 86 | Оплата (Выписка № 270 от 24 Septembrie 2020) | 200 000,00 | |
| 87 | Продажа (Оказание услуг № IM2273472 от 30 Octombrie 2020) | 1 915 050,97 | | 87 | Продажа (Оказание услуг № IM2273472 от 30 Octombrie 2020) | | 1 915 050,97 |
| 88 | Продажа (Оказание услуг № IM2273481 от 20 Noiembrie 2020) | 1 950 306,31 | | 88 | Продажа (Оказание услуг № IM2273481 от 20 Noiembrie 2020) | | 1 950 306,31 |
| 89 | Оплата (Выписка № 328 от 20 Noiembrie 2020) | | 514 524,00 | 89 | Оплата (Выписка № 328 от 20 Noiembrie 2020) | 514 524,00 | |
| 90 | Оплата (Выписка № 334 от 27 Noiembrie 2020) | | 978 638,33 | 90 | Оплата (Выписка № 334 от 27 Noiembrie 2020) | 978 638,33 | |
| 91 | Продажа (Оказание услуг № IM2273493 от 30 Noiembrie 2020) | 1 539 362,07 | | 91 | Продажа (Оказание услуг № IM2273493 от 30 Noiembrie 2020) | | 1 539 362,07 |
| 92 | Продажа (Оказание услуг № IM2685632 от 29 Ianuarie 2021) | 562 537,37 | | 92 | Продажа (Оказание услуг № IM2685632 от 29 Ianuarie 2021) | | 562 537,37 |
| 93 | Продажа (Оказание услуг № IM2685633 от 29 Ianuarie 2021) | 1 021 832,72 | | 93 | Продажа (Оказание услуг № IM2685633 от 29 Ianuarie 2021) | | 1 021 832,72 |
| 94 | Оплата (Выписка № 28 от 08 Februarie 2021) | | 400 000,00 | 94 | Оплата (Выписка № 28 от 08 Februarie 2021) | 400 000,00 | |
| 95 | Оплата (Выписка № 78 от 26 Martie 2021) | | 211 529,00 | 95 | Оплата (Выписка № 78 от 26 Martie 2021) | 211 529,00 | |
| 96 | Оплата (Выписка № 89 от 05 Aprilie 2021) | | 234 148,20 | 96 | Оплата (Выписка № 89 от 05 Aprilie 2021) | 234 148,20 | |
| 97 | Оплата (Выписка № 91 от 07 Aprilie 2021) | | 425 360,00 | 97 | Оплата (Выписка № 91 от 07 Aprilie 2021) | 425 360,00 | |
| 98 | Оплата (Выписка № 95 от 09 Aprilie 2021) | | 213 163,00 | 98 | Оплата (Выписка № 95 от 09 Aprilie 2021) | 213 163,00 | |
| 99 | Продажа (Оказание услуг № IM2703049 от 12 Aprilie 2021) | 431 690,82 | | 99 | Продажа (Оказание услуг № IM2703049 от 12 Aprilie 2021) | | 431 690,82 |
| 100 | Продажа (Оказание услуг № IM2703050 от 12 Aprilie 2021) | 1 250 793,92 | | 100 | Продажа (Оказание услуг № IM2703050 от 12 Aprilie 2021) | | 1 250 793,92 |
| 101 | Продажа (Оказание услуг № IM2703051 от 12 Aprilie 2021) | 405 811,09 | | 101 | Продажа (Оказание услуг № IM2703051 от 12 Aprilie 2021) | | 405 811,09 |
| 102 | Продажа (Оказание услуг № IM2703052 от 12 Aprilie 2021) | 360 098,97 | | 102 | Продажа (Оказание услуг № IM2703052 от 12 Aprilie 2021) | | 360 098,97 |
| 103 | Продажа (Оказание услуг № IM2703053 от 12 Aprilie 2021) | 120 194,08 | | 103 | Продажа (Оказание услуг № IM2703053 от 12 Aprilie 2021) | | 120 194,08 |
| 104 | Оплата (Выписка № 96 от 12 Aprilie 2021) | | 298 414,20 | 104 | Оплата (Выписка № 96 от 12 Aprilie 2021) | 298 414,20 | |
| 105 | Оплата (Выписка № 100 от 16 Aprilie 2021) | | 320 709,00 | 105 | Оплата (Выписка № 100 от 16 Aprilie 2021) | 320 709,00 | |
| 106 | Оплата (Выписка № 119 от 07 Mai 2021) | | 537 095,00 | 106 | Оплата (Выписка № 119 от 07 Mai 2021) | 537 095,00 | |
| 107 | Оплата (Выписка № 128 от 17 Mai 2021) | | 429 450,00 | 107 | Оплата (Выписка № 128 от 17 Mai 2021) | 429 450,00 | |
| 108 | Оплата (Выписка № 134 от 21 Mai 2021) | | 1 514 604,00 | 108 | Оплата (Выписка № 134 от 21 Mai 2021) | 1 514 604,00 | |
| 109 | Продажа (Оказание услуг № IM2703066 от 31 Mai 2021) | 642 904,66 | | 109 | Продажа (Оказание услуг № IM2703066 от 31 Mai 2021) | | 642 904,66 |
| 110 | Оплата (Выписка № 145 от 01 Iunie 2021) | | 751 271,50 | 110 | Оплата (Выписка № 145 от 01 Iunie 2021) | 751 271,50 | |
| 111 | Оплата (Выписка № 150 от 08 Iunie 2021) | | 851 755,20 | 111 | Оплата (Выписка № 150 от 08 Iunie 2021) | 851 755,20 | |
| 112 | Продажа (Оказание услуг № IM2703076 от 18 Iunie 2021) | 727 900,69 | | 112 | Продажа (Оказание услуг № IM2703076 от 18 Iunie 2021) | | 727 900,69 |

| По данным Eurostil Construct SRL, лев. | | | | По данным Bears Group SRL, лев. | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит |
| 113 | Продажа (Оказание услуг № IM2703077 от 18 Iunie 2021) | 492 713,00 | | 113 | Продажа (Оказание услуг № IM2703077 от 18 Iunie 2021) | | 492 713,00 |
| 114 | Оплата (Выписка № 167 от 23 Iunie 2021) | | 100 000,00 | 114 | Оплата (Выписка № 167 от 23 Iunie 2021) | 100 000,00 | |
| 115 | Продажа (Оказание услуг № IM2703099 от 31 Iulie 2021) | 257 846,29 | | 115 | Продажа (Оказание услуг № IM2703099 от 31 Iulie 2021) | | 257 846,29 |
| 116 | Продажа (Оказание услуг № IM2703105 от 26 August 2021) | 637 635,89 | | 116 | Продажа (Оказание услуг № IM2703105 от 26 August 2021) | | 637 635,89 |
| 117 | Продажа (Оказание услуг № IM3053417 от 30 Septembrie 2021) | 285 589,06 | | 117 | Продажа (Оказание услуг № IM3053417 от 30 Septembrie 2021) | | 285 589,06 |
| 118 | Продажа (Оказание услуг № IM3053418 от 30 Septembrie 2021) | 270 102,95 | | 118 | Продажа (Оказание услуг № IM3053418 от 30 Septembrie 2021) | | 270 102,95 |
| 119 | Продажа (Оказание услуг № IM3053419 от 30 Septembrie 2021) | 571 677,13 | | 119 | Продажа (Оказание услуг № IM3053419 от 30 Septembrie 2021) | | 571 677,13 |
| 120 | Оплата (Выписка № 288 от 06 Octombrie 2021) | | 28 560,25 | 120 | Оплата (Выписка № 288 от 06 Octombrie 2021) | 28 560,25 | |
| 121 | Продажа (Оказание услуг № IM3053424 от 18 Octombrie 2021) | 241 044,21 | | 121 | Продажа (Оказание услуг № IM3053424 от 18 Octombrie 2021) | | 241 044,21 |
| 122 | Продажа (Оказание услуг № IM3305424 от 23 Decembrie 2021) | 584 272,39 | | 122 | Продажа (Оказание услуг № IM3305424 от 23 Decembrie 2021) | | 584 272,39 |
| 123 | Продажа (Оказание услуг № IM3305450 от 28 Februarie 2022) | 934 248,24 | | 123 | Продажа (Оказание услуг № IM3305450 от 28 Februarie 2022) | | 934 248,24 |
| 124 | Продажа (Оказание услуг № IM3305493 от 31 Martie 2022) | 976 321,74 | | 124 | Продажа (Оказание услуг № IM3305493 от 31 Martie 2022) | | 976 321,74 |
| 125 | Оплата (Выписка № 108 от 14 Aprilie 2022) | | 4 399 219,50 | 125 | Оплата (Выписка № 108 от 14 Aprilie 2022) | 4 399 219,50 | |
| 126 | Оплата (Выписка № 109 от 15 Aprilie 2022) | | 2 382 106,02 | 126 | Оплата (Выписка № 109 от 15 Aprilie 2022) | 2 382 106,02 | |
| 127 | Продажа (Оказание услуг № IM3513498 от 20 Aprilie 2022) | 276 888,82 | | 127 | Продажа (Оказание услуг № IM3513498 от 20 Aprilie 2022) | | 276 888,82 |
| 128 | Продажа (Оказание услуг № IM3513499 от 20 Aprilie 2022) | 193 462,65 | | 128 | Продажа (Оказание услуг № IM3513499 от 20 Aprilie 2022) | | 193 462,65 |
| 129 | Оплата (Выписка № 114 от 20 Aprilie 2022) | | 1 155 229,34 | 129 | Оплата (Выписка № 114 от 20 Aprilie 2022) | 1 155 229,34 | |
| 130 | Продажа (Расходная ТМЦ № IM3513468 от 21 Aprilie 2022) | 1 983 453,15 | | 130 | Продажа (Расходная ТМЦ № IM3513468 от 21 Aprilie 2022) | | 1 983 453,15 |
| 131 | Оплата (Выписка № 133 от 13 Mai 2022) | | 4 993 090,00 | 131 | Оплата (Выписка № 133 от 13 Mai 2022) | 4 993 090,00 | |
| 132 | Оплата (Выписка № 161 от 08 Iunie 2022) | | 914 729,08 | 132 | Оплата (Выписка № 161 от 08 Iunie 2022) | 914 729,08 | |
| 133 | Продажа (Оказание услуг № IM3542346 от 29 Iunie 2022) | 58 492,72 | | 133 | Продажа (Оказание услуг № IM3542346 от 29 Iunie 2022) | | 58 492,72 |
| 134 | Оплата (Выписка № 194 от 01 Iulie 2022) | | 286 567,50 | 134 | Оплата (Выписка № 194 от 01 Iulie 2022) | 286 567,50 | |
| 135 | Оплата (Выписка № 195 от 04 Iulie 2022) | | 58 492,72 | 135 | Оплата (Выписка № 195 от 04 Iulie 2022) | 58 492,72 | |
| 136 | Оплата (Выписка № 208 от 18 Iulie 2022) | | 1 000 000,00 | 136 | Оплата (Выписка № 208 от 18 Iulie 2022) | 1 000 000,00 | |
| 137 | Оплата (Выписка № 210 от 20 Iulie 2022) | | 3 904 224,80 | 137 | Оплата (Выписка № 210 от 20 Iulie 2022) | 3 904 224,80 | |
| 138 | Продажа (Оказание услуг № IM3542367 от 25 Iulie 2022) | 1 159 669,13 | | 138 | Продажа (Оказание услуг № IM3542367 от 25 Iulie 2022) | | 1 159 669,13 |
| 139 | Оплата (Выписка № 215 от 26 Iulie 2022) | | 159 669,13 | 139 | Оплата (Выписка № 215 от 26 Iulie 2022) | 159 669,13 | |
| 140 | Продажа (Оказание услуг № IM3542373 от 29 Iulie 2022) | 672 163,69 | | 140 | Продажа (Оказание услуг № IM3542373 от 29 Iulie 2022) | | 672 163,69 |
| 141 | Оплата (Выписка № 223 от 02 August 2022) | | 2 044 869,37 | 141 | Оплата (Выписка № 223 от 02 August 2022) | 2 044 869,37 | |
| 142 | Оплата (Выписка № 227 от 08 August 2022) | | 968 780,04 | 142 | Оплата (Выписка № 227 от 08 August 2022) | 968 780,04 | |
| 143 | Продажа (Оказание услуг № IM3542381 от 15 August 2022) | 296 616,35 | | 143 | Продажа (Оказание услуг № IM3542381 от 15 August 2022) | | 296 616,35 |
| 144 | Продажа (Оказание услуг № IM3542395 от 31 August 2022) | 1 014 897,72 | | 144 | Продажа (Оказание услуг № IM3542395 от 31 August 2022) | | 1 014 897,72 |
| 145 | Оплата (Выписка № 249 от 01 Septembrie 2022) | | 1 016 460,27 | 145 | Оплата (Выписка № 249 от 01 Septembrie 2022) | 1 016 460,27 | |
| 146 | Оплата (Выписка № 266 от 14 Septembrie 2022) | | 700 000,00 | 146 | Оплата (Выписка № 266 от 14 Septembrie 2022) | 700 000,00 | |
| 147 | Оплата (Выписка № 275 от 20 Septembrie 2022) | | 2 469 242,31 | 147 | Оплата (Выписка № 275 от 20 Septembrie 2022) | 2 469 242,31 | |
| 148 | Продажа (Оказание услуг № AAR0996132 от 23 Septembrie 2022) | 376 535,12 | | 148 | Продажа (Оказание услуг № AAR0996132 от 23 Septembrie 2022) | | 376 535,12 |
| 149 | Оплата (Выписка № 282 от 27 Septembrie 2022) | | 376 535,12 | 149 | Оплата (Выписка № 282 от 27 Septembrie 2022) | 376 535,12 | |
| 150 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457169 от 30 Septembrie 2022) | 101 702,00 | | 150 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457169 от 30 Septembrie 2022) | | 101 702,00 |
| 151 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457170 от 30 Septembrie 2022) | 393 941,10 | | 151 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457170 от 30 Septembrie 2022) | | 393 941,10 |

| По данным Eurostil Construct SRL, лев. | | | | По данным Bears Group SRL, лев. | | | |
|--|--|--------------|--------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит |
| 152 | Оплата (Выписка № 299 от 13 Octombrie 2022) | | 101 702,00 | 152 | Оплата (Выписка № 299 от 13 Octombrie 2022) | 101 702,00 | |
| 153 | Оплата (Выписка № 301 от 17 Octombrie 2022) | | 3 864 737,86 | 153 | Оплата (Выписка № 301 от 17 Octombrie 2022) | 3 864 737,86 | |
| 154 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457178 от 27 Octombrie 2022) | 2 272 455,99 | | 154 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457178 от 27 Octombrie 2022) | | 2 272 455,99 |
| 155 | Оплата (Выписка № 312 от 27 Octombrie 2022) | | 2 313 603,75 | 155 | Оплата (Выписка № 312 от 27 Octombrie 2022) | 2 313 603,75 | |
| 156 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457184 от 31 Octombrie 2022) | 565 565,89 | | 156 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457184 от 31 Octombrie 2022) | | 565 565,89 |
| 157 | Оплата (Выписка № 323 от 07 Noiembrie 2022) | | 534 188,97 | 157 | Оплата (Выписка № 323 от 07 Noiembrie 2022) | 534 188,97 | |
| 158 | Оплата (Выписка № 330 от 11 Noiembrie 2022) | | 565 565,89 | 158 | Оплата (Выписка № 330 от 11 Noiembrie 2022) | 565 565,89 | |
| 159 | Оплата (Выписка № 354 от 05 Decembrie 2022) | | 34 858,11 | 159 | Оплата (Выписка № 354 от 05 Decembrie 2022) | 34 858,11 | |
| 160 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457230 от 05 Decembrie 2022) | 34 858,11 | | 160 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457230 от 05 Decembrie 2022) | | 34 858,11 |
| 161 | Оплата (Выписка № 369 от 19 Decembrie 2022) | | 34 858,11 | 161 | Оплата (Выписка № 369 от 19 Decembrie 2022) | 34 858,11 | |
| 162 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457242 от 27 Decembrie 2022) | 2 117 913,95 | | 162 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457242 от 27 Decembrie 2022) | | 2 117 913,95 |
| 163 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457245 от 27 Decembrie 2022) | 38 501,09 | | 163 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457245 от 27 Decembrie 2022) | | 38 501,09 |
| 164 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457246 от 27 Decembrie 2022) | 244 415,78 | | 164 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457246 от 27 Decembrie 2022) | | 244 415,78 |
| 165 | Оплата (Выписка № 377 от 27 Decembrie 2022) | | 1 201 967,71 | 165 | Оплата (Выписка № 377 от 27 Decembrie 2022) | 1 201 967,71 | |
| 166 | Оплата (Выписка № 4 от 09 Ianuarie 2023) | | 1 206 878,64 | 166 | Оплата (Выписка № 4 от 09 Ianuarie 2023) | 1 206 878,64 | |
| 167 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457256 от 31 Ianuarie 2023) | 334 217,16 | | 167 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457256 от 31 Ianuarie 2023) | | 334 217,16 |
| 168 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457257 от 31 Ianuarie 2023) | 57 837,51 | | 168 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457257 от 31 Ianuarie 2023) | | 57 837,51 |
| 169 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457258 от 31 Ianuarie 2023) | 577 694,53 | | 169 | Продажа (Оказание услуг № AAR3457258 от 31 Ianuarie 2023) | | 577 694,53 |
| 170 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414031 от 31 Ianuarie 2023) | 967 529,52 | | 170 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414031 от 31 Ianuarie 2023) | | 967 529,52 |
| 171 | Оплата (Выписка № 29 от 01 Februarie 2023) | | 969 749,20 | 171 | Оплата (Выписка № 29 от 01 Februarie 2023) | 969 749,20 | |
| 172 | Оплата (Выписка № 30 от 02 Februarie 2023) | | 683 764,76 | 172 | Оплата (Выписка № 30 от 02 Februarie 2023) | 683 764,76 | |
| 173 | Оплата (Выписка № 50 от 21 Februarie 2023) | | 2 885 061,41 | 173 | Оплата (Выписка № 50 от 21 Februarie 2023) | 2 885 061,41 | |
| 174 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414056 от 24 Februarie 2023) | 1 596 945,06 | | 174 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414056 от 24 Februarie 2023) | | 1 596 945,06 |
| 175 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR9414060 от 24 Februarie 2023) | 793 092,30 | | 175 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR9414060 от 24 Februarie 2023) | | 793 092,30 |
| 176 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR9414061 от 24 Februarie 2023) | 355 556,25 | | 176 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR9414061 от 24 Februarie 2023) | | 355 556,25 |
| 177 | Оплата (Выписка № 59 от 01 Martie 2023) | | 949 603,40 | 177 | Оплата (Выписка № 59 от 01 Martie 2023) | 949 603,40 | |
| 178 | Оплата (Выписка № 70 от 13 Martie 2023) | | 5 136 907,07 | 178 | Оплата (Выписка № 70 от 13 Martie 2023) | 5 136 907,07 | |
| 179 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414075 от 27 Martie 2023) | 1 221 045,63 | | 179 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414075 от 27 Martie 2023) | | 1 221 045,63 |
| 180 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414076 от 27 Martie 2023) | 686 779,04 | | 180 | Продажа (Оказание услуг № AAR9414076 от 27 Martie 2023) | | 686 779,04 |
| 181 | Оплата (Выписка № 88 от 30 Martie 2023) | | 1 297 301,86 | 181 | Оплата (Выписка № 88 от 30 Martie 2023) | 1 297 301,86 | |
| 182 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307097 от 06 Aprilie 2023) | 1 041 726,63 | | 182 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307097 от 06 Aprilie 2023) | | 1 041 726,63 |
| 183 | Оплата (Выписка № 110 от 19 Aprilie 2023) | | 704 873,55 | 183 | Оплата (Выписка № 110 от 19 Aprilie 2023) | 704 873,55 | |
| 184 | Оплата (Выписка № 113 от 20 Aprilie 2023) | | 595 046,43 | 184 | Оплата (Выписка № 113 от 20 Aprilie 2023) | 595 046,43 | |
| 185 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307126 от 24 Mai 2023) | 897 186,17 | | 185 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307126 от 24 Mai 2023) | | 897 186,17 |
| 186 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307127 от 24 Mai 2023) | 263 364,15 | | 186 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307127 от 24 Mai 2023) | | 263 364,15 |
| 187 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307128 от 24 Mai 2023) | 103 402,42 | | 187 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307128 от 24 Mai 2023) | | 103 402,42 |
| 188 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307129 от 24 Mai 2023) | 100 939,02 | | 188 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307129 от 24 Mai 2023) | | 100 939,02 |
| 189 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307130 от 24 Mai 2023) | 1 244 003,22 | | 189 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307130 от 24 Mai 2023) | | 1 244 003,22 |
| 190 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307131 от 24 Mai 2023) | 187 854,82 | | 190 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307131 от 24 Mai 2023) | | 187 854,82 |

| По данным Eurostil Construct SRL, лев. | | | | По данным Bears Group SRL, лев. | | | |
|--|--|--------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит |
| 191 | Оплата (Выписка № 145 от 24 Mai 2023) | | 897 186,17 | 191 | Оплата (Выписка № 145 от 24 Mai 2023) | 897 186,17 | |
| 192 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307139 от 31 Mai 2023) | 2 314 149,34 | | 192 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307139 от 31 Mai 2023) | | 2 314 149,34 |
| 193 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307138 от 31 Mai 2023) | 167 750,10 | | 193 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307138 от 31 Mai 2023) | | 167 750,10 |
| 194 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307140 от 31 Mai 2023) | 493 749,09 | | 194 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAQ5307140 от 31 Mai 2023) | | 493 749,09 |
| 195 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307141 от 31 Mai 2023) | 1 478 266,92 | | 195 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307141 от 31 Mai 2023) | | 1 478 266,92 |
| 196 | Оплата (Выписка № 155 от 06 Iunie 2023) | | 2 157 183,97 | 196 | Оплата (Выписка № 155 от 06 Iunie 2023) | 2 157 183,97 | |
| 197 | Оплата (Выписка № 166 от 19 Iunie 2023) | | 192 592,99 | 197 | Оплата (Выписка № 166 от 19 Iunie 2023) | 192 592,99 | |
| 198 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307155 от 21 Iunie 2023) | 1 895 376,35 | | 198 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307155 от 21 Iunie 2023) | | 1 895 376,35 |
| 199 | Оплата (Выписка № 169 от 22 Iunie 2023) | | 1 400 000,00 | 199 | Оплата (Выписка № 169 от 22 Iunie 2023) | 1 400 000,00 | |
| 200 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307166 от 30 Iunie 2023) | 761 966,45 | | 200 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307166 от 30 Iunie 2023) | | 761 966,45 |
| 201 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307167 от 30 Iunie 2023) | 4 263 741,40 | | 201 | Продажа (Оказание услуг № AAQ5307167 от 30 Iunie 2023) | | 4 263 741,40 |
| 202 | Оплата (Выписка № 183 от 03 Iulie 2023) | | 2 801 569,60 | 202 | Оплата (Выписка № 183 от 03 Iulie 2023) | 2 801 569,60 | |
| 203 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614494 от 24 Iulie 2023) | 624 938,75 | | 203 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614494 от 24 Iulie 2023) | | 624 938,75 |
| 204 | Оплата (Выписка № 203 от 24 Iulie 2023) | | 624 938,75 | 204 | Оплата (Выписка № 203 от 24 Iulie 2023) | 624 938,75 | |
| 205 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614498 от 27 Iulie 2023) | 1 129 429,76 | | 205 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614498 от 27 Iulie 2023) | | 1 129 429,76 |
| 206 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614499 от 27 Iulie 2023) | 503 489,77 | | 206 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614499 от 27 Iulie 2023) | | 503 489,77 |
| 207 | Оплата (Выписка № 209 от 28 Iulie 2023) | | 1 829 429,76 | 207 | Оплата (Выписка № 209 от 28 Iulie 2023) | 1 829 429,76 | |
| 208 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614525 от 15 August 2023) | 1 705 140,73 | | 208 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614525 от 15 August 2023) | | 1 705 140,73 |
| 209 | Оплата (Выписка № 227 от 16 August 2023) | | 1 705 140,73 | 209 | Оплата (Выписка № 227 от 16 August 2023) | 1 705 140,73 | |
| 210 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614533 от 21 August 2023) | 43 024,76 | | 210 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614533 от 21 August 2023) | | 43 024,76 |
| 211 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614534 от 21 August 2023) | 97 114,50 | | 211 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614534 от 21 August 2023) | | 97 114,50 |
| 212 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614535 от 21 August 2023) | 180 228,16 | | 212 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614535 от 21 August 2023) | | 180 228,16 |
| 213 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614536 от 21 August 2023) | 286 193,91 | | 213 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614536 от 21 August 2023) | | 286 193,91 |
| 214 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614537 от 21 August 2023) | 392 228,20 | | 214 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614537 от 21 August 2023) | | 392 228,20 |
| 215 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614538 от 21 August 2023) | 18 209,10 | | 215 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614538 от 21 August 2023) | | 18 209,10 |
| 216 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614539 от 21 August 2023) | 263 763,58 | | 216 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614539 от 21 August 2023) | | 263 763,58 |
| 217 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614547 от 30 August 2023) | 782 808,53 | | 217 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614547 от 30 August 2023) | | 782 808,53 |
| 218 | Оплата (Выписка № 243 от 04 Septembrie 2023) | | 630 000,00 | 218 | Оплата (Выписка № 243 от 04 Septembrie 2023) | 630 000,00 | |
| 219 | Оплата (Выписка № 255 от 11 Septembrie 2023) | | 630 000,00 | 219 | Оплата (Выписка № 255 от 11 Septembrie 2023) | 630 000,00 | |
| 220 | Оплата (Выписка № 264 от 18 Septembrie 2023) | | 782 808,63 | 220 | Оплата (Выписка № 264 от 18 Septembrie 2023) | 782 808,63 | |
| 221 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614563 от 20 Septembrie 2023) | 66 618,72 | | 221 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAR5614563 от 20 Septembrie 2023) | | 66 618,72 |
| 222 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614564 от 28 Septembrie) | 1 394 498,56 | | 222 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614564 от 28 Septembrie 2023) | | 1 394 498,56 |
| 223 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614565 от 28 Septembrie) | 1 603 797,77 | | 223 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614565 от 28 Septembrie 2023) | | 1 603 797,77 |
| 224 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS2062835 от 02 Octombrie 2023) | 55 462,05 | | 224 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS2062835 от 02 Octombrie 2023) | | 55 462,05 |
| 225 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS2062836 от 02 Octombrie 2023) | 189 446,43 | | 225 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS2062836 от 02 Octombrie 2023) | | 189 446,43 |
| 226 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS2062837 от 02 Octombrie 2023) | 74 372,66 | | 226 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS2062837 от 02 Octombrie 2023) | | 74 372,66 |
| 227 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614575 от 05 Octombrie 2023) | 698 554,17 | | 227 | Продажа (Оказание услуг № AAR5614575 от 05 Octombrie 2023) | | 698 554,17 |
| 228 | Оплата (Выписка № 294 от 09 Octombrie 2023) | | 1 398 611,19 | 228 | Оплата (Выписка № 294 от 09 Octombrie 2023) | 1 398 611,19 | |
| 229 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS2062838 от 09 Octombrie 2023) | 8 008,87 | | 229 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS2062838 от 09 Octombrie 2023) | | 8 008,87 |

| По данным Eurostil Construct SRL, лев. | | | | По данным Bears Group SRL, лев. | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит | № п/п | Наименование операции, документы | Дебет | Кредит |
| 230 | Оплата (Выписка № 303 от 18 Octombrie 2023) | | 78 875,35 | 230 | Оплата (Выписка № 303 от 18 Octombrie 2023) | 78 875,35 | |
| 231 | Продажа (Оказание услуг № AAS2062847 от 24 Octombrie 2023) | 1 573 236,29 | | 231 | Продажа (Оказание услуг № AAS2062847 от 24 Octombrie 2023) | | 1 573 236,29 |
| 232 | Продажа (Оказание услуг № AAS2062848 от 24 Octombrie 2023) | 311 334,58 | | 232 | Продажа (Оказание услуг № AAS2062848 от 24 Octombrie 2023) | | 311 334,58 |
| 233 | Оплата (Выписка № 309 от 25 Octombrie 2023) | | 1 600 000,00 | 233 | Оплата (Выписка № 309 от 25 Octombrie 2023) | 1 600 000,00 | |
| 234 | Продажа (Оказание услуг № AAS2062853 от 31 Octombrie 2023) | 1 757 529,50 | | 234 | Продажа (Оказание услуг № AAS2062853 от 31 Octombrie 2023) | | 1 757 529,50 |
| 235 | Продажа (Оказание услуг № AAS2062854 от 31 Octombrie 2023) | 221 628,98 | | 235 | Продажа (Оказание услуг № AAS2062854 от 31 Octombrie 2023) | | 221 628,98 |
| 236 | Оплата (Выписка № 320 от 02 Noiembrie 2023) | | 396 018,70 | 236 | Оплата (Выписка № 320 от 02 Noiembrie 2023) | 396 018,70 | |
| 237 | Оплата (Выписка № 339 от 23 Noiembrie 2023) | | 800 000,00 | 237 | Оплата (Выписка № 339 от 23 Noiembrie 2023) | 800 000,00 | |
| 238 | Продажа (Оказание услуг № AAS2062874 от 28 Noiembrie 2023) | 1 185 195,88 | | 238 | Продажа (Оказание услуг № AAS2062874 от 28 Noiembrie 2023) | | 1 185 195,88 |
| 239 | Продажа (Оказание услуг № AAS3563160 от 30 Noiembrie 2023) | 1 770 808,40 | | 239 | Продажа (Оказание услуг № AAS3563160 от 30 Noiembrie 2023) | | 1 770 808,40 |
| 240 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563165 от 30 Noiembrie 2023) | 392 539,77 | | 240 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563165 от 30 Noiembrie 2023) | | 392 539,77 |
| 241 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563166 от 30 Noiembrie 2023) | 20 781,14 | | 241 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563166 от 30 Noiembrie 2023) | | 20 781,14 |
| 242 | Оплата (Выписка № 354 от 04 Decembrie 2023) | | 500 000,00 | 242 | Оплата (Выписка № 354 от 04 Decembrie 2023) | 500 000,00 | |
| 243 | Оплата (Выписка № 358 от 08 Decembrie 2023) | | 697 667,24 | 243 | Оплата (Выписка № 358 от 08 Decembrie 2023) | 697 667,24 | |
| 244 | Продажа (Оказание услуг № AAS3563180 от 15 Decembrie 2023) | 2 514 025,71 | | 244 | Продажа (Оказание услуг № AAS3563180 от 15 Decembrie 2023) | | 2 514 025,71 |
| 245 | Продажа (Оказание услуг № AAS3563197 от 19 Decembrie 2023) | 1 365 501,92 | | 245 | Продажа (Оказание услуг № AAS3563197 от 19 Decembrie 2023) | | 1 365 501,92 |
| 246 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563181 от 21 Decembrie 2023) | 51 398,80 | | 246 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563181 от 21 Decembrie 2023) | | 51 398,80 |
| 247 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563182 от 21 Decembrie 2023) | 4 973,91 | | 247 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563182 от 21 Decembrie 2023) | | 4 973,91 |
| 248 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563183 от 21 Decembrie 2023) | 71 706,85 | | 248 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563183 от 21 Decembrie 2023) | | 71 706,85 |
| 249 | Продажа (Оказание услуг № AAS3563193 от 26 Decembrie 2023) | 1 719 134,71 | | 249 | Продажа (Оказание услуг № AAS3563193 от 26 Decembrie 2023) | | 1 719 134,71 |
| 250 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563191 от 27 Decembrie 2023) | 63 637,51 | | 250 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563191 от 27 Decembrie 2023) | | 63 637,51 |
| 251 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563192 от 27 Decembrie 2023) | 14 760,06 | | 251 | Продажа (Расходная ТМЦ № AAS3563192 от 27 Decembrie 2023) | | 14 760,06 |
| 252 | Оплата (Выписка № 374 от 28 Decembrie 2023) | | 400 000,00 | 252 | Оплата (Выписка № 374 от 28 Decembrie 2023) | 400 000,00 | |
| | Обороты за период | 119 656 617,50 | 127 382 205,68 | | Обороты за период | 127 382 205,68 | 119 656 617,50 |
| | Сальдо на 31.12.2023 | | 7 725 588,18 | | Сальдо на 31.12.2023 | 7 725 588,18 | |

По данным Eurostil Construct SRL

на 31.12.2023 задолженность в пользу Bears Group SRL 7,725,588.

OT EUROSTIL CONSTRUCT SRL

М.П.



OT BEARS GROUP SRL, lei

Director General al intreprinderii in alta ramura

(Treci R.)



Акт сверки

взаимных расчетов по состоянию на 20.06.2024
между BEARS GROUP SRL, ф/к 1016600026138
и EUROSTIL CONSTRUCT SRL, ф/к 1010600001209

Мы, нижеподписавшиеся, Director executiv al intreprinderii in alte ramuri BEARS GROUP SRL Tcaci Roman, с одной стороны, и _____ EUROSTIL CONSTRUCT SRL _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

| По данным BEARS GROUP SRL, MDL | | | | По данным EUROSTIL CONSTRUCT SRL, MDL | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Дата | Документ | Дебет | Кредит |
| Сальдо начальное (01.01.24) | | 7 725 588,17 | | Сальдо начальное (01.01.24) | | | 7 725 588,17 |
| 12.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669417 | | 698 564,67 | 12.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669417 | 698 564,67 | |
| 12.01.24 | Платежное поручение № | 324 752,67 | | 12.01.24 | Платежное поручение № | | 324 752,67 |
| 15.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669415 | | 1 460 048,25 | 15.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669415 | 1 460 048,25 | |
| 15.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669414 | | 3 361 503,90 | 15.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669414 | 3 361 503,90 | |
| 15.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669430 | | 182 742,40 | 15.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669430 | 182 742,40 | |
| 24.01.24 | Платежное поручение № | 1 000 000,00 | | 24.01.24 | Платежное поручение № | | 1 000 000,00 |
| 24.01.24 | Платежное поручение № | 270 000,00 | | 24.01.24 | Платежное поручение № | | 270 000,00 |
| 24.01.24 | Платежное поручение № | 730 000,00 | | 24.01.24 | Платежное поручение № | | 730 000,00 |
| 29.01.24 | Возврат ТМЦ поставщику № AAS2062885 | | -59 079,48 | 29.01.24 | Возврат ТМЦ поставщику № AAS2062885 | -59 079,48 | |
| 29.01.24 | Налоговая накладная № AAS2062885 | | -11 815,91 | 29.01.24 | Налоговая накладная № AAS2062885 | -11 815,91 | |
| 31.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669431 | | 226 953,46 | 31.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669431 | 226 953,46 | |
| 31.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669423 | | 728 026,60 | 31.01.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669423 | 728 026,60 | |
| 20.02.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669437 | | 1 978 668,54 | 20.02.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669437 | 1 978 668,54 | |
| 21.02.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669438 | | 1 713 546,07 | 21.02.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669438 | 1 713 546,07 | |
| 21.02.24 | Платежное поручение № | | 1 016 460,27 | 21.02.24 | Платежное поручение № | | 1 016 460,27 |
| 21.02.24 | Платежное поручение № | | 1 568 879,24 | 21.02.24 | Платежное поручение № | | 1 568 879,24 |
| 22.02.24 | Платежное поручение № | | 394 695,00 | 22.02.24 | Платежное поручение № | | 394 695,00 |
| 22.02.24 | Платежное поручение № | 1 000 000,00 | | 22.02.24 | Платежное поручение № | 1 000 000,00 | |
| 22.02.24 | Платежное поручение № | 1 000 000,00 | | 22.02.24 | Платежное поручение № | 1 000 000,00 | |
| 29.02.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669446 | | 54 792,82 | 29.02.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669446 | 54 792,82 | |
| 01.03.24 | Платежное поручение № | | 200 000,00 | 01.03.24 | Платежное поручение № | | 200 000,00 |
| 04.03.24 | Платежное поручение № | | 779 277,82 | 04.03.24 | Платежное поручение № | | 779 277,82 |
| 12.03.24 | Платежное поручение № | 1 000 000,00 | | 12.03.24 | Платежное поручение № | | 1 000 000,00 |
| 15.03.24 | Платежное поручение № | 2 162,31 | | 15.03.24 | Платежное поручение № | | 2 162,31 |
| 25.03.24 | Платежное поручение № | 24 295,53 | | 25.03.24 | Платежное поручение № | | 24 295,53 |
| 27.03.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669470 | | 1 212 146,88 | 27.03.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669470 | 1 212 146,88 | |
| 27.03.24 | Платежное поручение № | 1 143 832,93 | | 27.03.24 | Платежное поручение № | | 1 143 832,93 |
| 27.03.24 | Платежное поручение № | 850 000,00 | | 27.03.24 | Платежное поручение № | | 850 000,00 |
| 28.03.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669471 | | 490 287,04 | 28.03.24 | Поступление ТМЦ № AAS8669471 | 490 287,04 | |
| 24.04.24 | Платежное поручение № | 40 462,84 | | 24.04.24 | Платежное поручение № | | 40 462,84 |
| 31.05.24 | Поступление ТМЦ № AAT4810260 | | 38 372,64 | 31.05.24 | Поступление ТМЦ № AAT4810260 | 38 372,64 | |
| 04.06.24 | Платежное поручение № | | 38 372,64 | 04.06.24 | Платежное поручение № | | 38 372,64 |
| Обороты за период | | 7 423 878,92 | 16 034 070,21 | Обороты за период | | 16 034 070,21 | 7 423 878,92 |
| Сальдо конечное (20.06.24) | | | 884 603,12 | Сальдо конечное (20.06.24) | | 884 603,12 | |

По данным BEARS GROUP SRL
на 20.06.2024 задолженность в пользу EUROSTIL CONSTRUCT SRL
884 603,12 MDL

По данным EUROSTIL CONSTRUCT SRL
на 20.06.2024 задолженность в пользу EUROSTIL CONSTRUCT SRL
884 603,12 MDL

От BEARS GROUP SRL, тел.

От EUROSTIL CONSTRUCT SRL

Director executiv al intreprinderii in alte ramuri

(Tcaci R.)

М.П.

