

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : *Modernizarea strazilor Nufarul Alb, Grivitei si Dunarii din municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum si intersectiei de tip giratoriu (str. Grivitei cu str. Dunarii) si podului de pe str. Grivitei - str. Nufdrul Alb*
2. Numărul și data contractului : Nr. 28/AP din 05.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria mun. Cahul
4. Adresa beneficiarului : mun. Cahul, str. Piata Independentei nr.6
5. Țara : Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) 89 877 085,03
- b) finală (la data finalizării contractului) 88 002 650,08

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ***la moment nu sunt***

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată ***17 luni***
- b) efectiv realizată ***21 luni***
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Proces verbal nr. 1 din 30 aprilie 2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 01.08.2024

Semnat: _____

Nume: Crețu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Masterdrum SRL _____

**Proiect : "Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea
transfrontalieră Cahul-Oancea – o mai bună infrastructură de transport"**

VOLUM 2

SECȚIUNEA 1

FORMULAR DE CONTRACT

de lucrări pentru Acțiunile Externe Ale Comunitatii Europene

FINANȚAT DE BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE

Între

Primăria municipiul Cahul

Cod fiscal: 1007601008340

IBAN: MD80TRPDAH30000001067300

Adresa juridică: mun. Cahul str. Piata Independentei nr. 6

Relații de contact (tel/fax; e-mail): 0299 2 19 49; 0299 2 19 29

AUTORITATE CONTRACTANTĂ,

și

pe de o parte,

Societatea Comercială MASTERDRUM SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Cod fiscal: 1009600036472

IBAN: MD93AG000000022513381039

Adresa juridică: s. Zîrnești r. Cahul

în calitate de CONTRACTANT

au convenit după cum urmează :

pe de altă parte,

În cadrul proiectului "Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul-Oancea - o mai bună infrastructură de transport", cod 1HARD/3.1/12/2, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

Este încheiat prezentul Contract, cu nr. 28/AP din 05 septembrie 2022 unde Autoritatea Contractantă dorește ca, Contractantul să realizeze următoarele lucrări:

Modernizarea străzilor Nufărul Alb, Griviței și Dunării din municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum și intersecției de tip giratoriu (str. Griviței cu str. Dunării) și podului de pe str. Griviței – str. Nufărul Alb" și a acceptat oferta contractantului privind executarea și finalizarea acestor lucrări și a reparației tuturor viciilor aferente.

Au fost convenite următoarele :

Articolul 1. În acest contract, cuvintele și expresiile vor avea semnificația care le este atribuită în condițiile contractuale anexate.

Articolul 2. Documentele următoare vor fi considerate citite și interpretate ca parte integrantă a prezentului contract în ordinea ierarhică următoare:



- (a) Contractul,
- (b) Condițiile speciale,
- (c) Condițiile generale,
- (d) Oferta financiară (după corectarea erorilor aritmetice)
- (e) Specificațiile tehnice (caietul de sarcini),
- (f) Desene tehnice
- (g) Formularul Ofertei cu Anexa,
- (h) Alte documente care fac parte din contract.

Articolul 3. În schimbul plăților efectuate de Autoritatea Contractantă către Contractant, după cum sînt menționate mai jos, Contractantul se angajează să execute și să finalizeze lucrările și sa repare toate viciile aferente în deplină conformitate cu prevederile Contractului.

- Prețul (TVA la cota zero/ alte taxe) 89 877 085,03 lei MDL
- Prețul contractului (în litere) : **optzeci și nouă milioane opt sute șaptezeci și șapte mii optzeci și cinci lei, 03 bani.**

Articolul 5. Alte conditii speciale aplicabile prezentului contract: **contractul este valabil până la 31.12.2023.**

Întocmit în limba română, în trei originale, două pentru Autoritatea Contractantă și unul pentru Contractor.

Data:



INVESTITOR: Primăria municipiului Cahul

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(recepția după înlăturarea obiecțiilor)**

Nr. 01 din 30 aprilie 2024

privind executarea lucrărilor de "Modernizare a străzilor Nufărul Alb, str. Griviței și str. Dunării din municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum și intersecției de tip giratoriu (str. Griviței cu str. Dunării) și podul de pe str. Grivitei – str.Nufărul Alb", în cadrul contractului de antrepriză nr. 28/AP din 05.09.2022, încheiat între Primăria municipiului Cahul și SRL Masterdrum, proiect 1HARD/3.1/12.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 051/2, eliberată de Primăria municipiului Cahul, la data de 12.09.2022.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul zilei de 30.04.2024, fiind formată din:

Președintele comisiei

Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei

Nucă Miric, administrator IM CRDSL Cahul, inginer în cadrul proiectului;

Membrii comisiei

Gheorghe Grecu, responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului;

Bitirescu Vasile, responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului;

Calin Valeriu, responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului

Bădin Stella, viceprimarul municipiului Cahul, manager financiar în cadrul proiectului;

Brînză Snejana, specialistă principală a Primăriei municipiului Cahul, manager în cadrul proiectului.

Au mai participat la recepție:

Crețu Mihail, director SRL Masterdrum;

Stăvilă Valeriu, diriginte de șantier SRL Masterdrum.

Invitat: Constantin Roșca, proiectant, autorul proiectului.

2. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **a recepționa lucrările executate.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **terminarea lucrărilor executate în baza autorizației de construire nr. 051/2 din 12.09.2022 și a proiectului de execuție.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **de a receptiona lucrările executate.**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: **strada Nufărul Alb, strada Griviței și strada Dunării din municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum și intersecția de tip giratoriu (str. Griviței cu str. Dunării) și podul de pe str. Grivitei – str.Nufărul Alb”, număr cadastral f/nr, destinația: drum.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30 aprilie 2024 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Nr. d/o	Nume, prenume	calitatea	semnătura
1.	Dandiș Nicolae	președinte	
2.	Nucă Miric	secretar	
3.	Grecu Gheorghe	membru	
4.	Bitirescu Vasile	membru	
5.	Calin Valeriu	membru	
6.	Bădin Stella	membru	
7.	Brînză Snejana	membru	

9. Lucrările de "Modernizare a străzilor Nufărul Alb, str. Griviței și str. Dunării din municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum și intersecției de tip giratoriu (str. Griviței cu str. Dunării) și podul de pe str. Grivitei – str.Nufărul Alb" sunt

TRANSMISE:

EXECUTANTUL: SRL Masterdum




PRIMITE:

INVESTITORUL: Primăria municipiului Cahul



Anexa nr. 01
piese lipsă sau incomplete

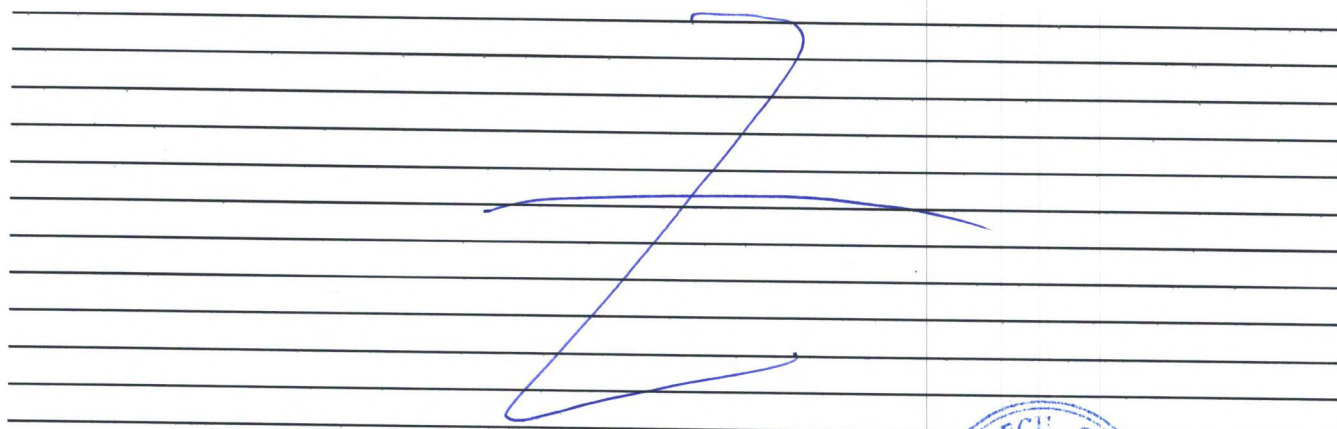

Geo
Bidirescu
Geo M.



Lucrări ce nu au fost executate

[Signature] Greau G.
[Signature] Bitirezca
[Signature] Greu M.



Anexa nr. 03
Lucrări ce nu au respectat prevederile proiectului

2

Gracu G
Bățezescu V
Gracu M.

