

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

«TELPROD-COM»

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181

Adresa poștala: MD-2059, or. Chișinău, str. Petricani 19/2

Tel. /fax +(373) 022-31-76-11, e-mail: telprodcom@mail.ru

Cont de decontare MD78MO2224ASV42810137100 la BC <<Mobiasbanca OTP Group >> SA

codul băncii MOBBMD22

Codul fiscal 1011600003819 Cod TVA 0506442

Anexa nr. 3
la anunț de participare

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. **Subsemnatul**, Lazarev Mihail, administrator S.R.L. „Telprod - Com, in calitate de asociat “SC FOREMCONS SRL &TELPROD-COM”din mun.Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181, *declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.*

3. Prezenta declarație este valabilă până la data de 30.05.2022

Semnat _____

Nume-prenume: Lazarev Mihail

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic S.R.L. „Telprod - Com

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

«TELPROD-COM»

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181

Adresa poștala: or. Chișinău, str. Petricani 19/2

Tel. /fax +(373) 022-31-76-11, e-mail: telprodcom @ mail.ru

Cont de decontare MD78MO2224ASV42810137100 la BC <<Mobiasbanca-GSG>> codul băncii MOBBMD22

Codul fiscal 1011600003819 Cod TVA 0506442

Anexa nr. 4
la anunțul de participare

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizării sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

1. Subsemnatul, Lazarev Mihail - reprezentant împuternicit al
SRL „Telprod - Com” str. Alba Iulia 113, of. 181 mun. Chișinău,
(denumirea și adresa operatorului economic)

În calitate de ofertant/asociat în cadrul procedurii de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1642771284554 din 02 martie 2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul efectiv al operatorului economic în ultimii 5 ani nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Lazarev Mihail Vitali	

Data competării: 28 februarie 2022

Semnat _____

Nume-prenume: Lazarev Mihail

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic S.R.L. „Telprod - Com”

IDNO al operatorului economic

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

«TELPROD-COM»

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181

Adresa poștala: MD-2059, or. Chișinău, str. Petricani 19/2

Tel. /fax +(373) 022-31-76-11, e-mail: telprodcom@mail.ru

Cont de decontare MD78MO2224ASV42810137100 la BC <<Mobiasbanca OTP Group >> SA

codul băncii MOBBMD22

Codul fiscal 1011600003819 Cod TVA 0506442

Anexa nr. 5

La anunț de participare

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: SC "Telprod-Com" SRL .
2. Codul fiscal: 1011600003819
Codul TVA: 0506442
3. Adresa sediului central: mun.Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181.
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Petricani 19/2.
Administrator: Lazarev Mihail
Persoana de contact: Lazareva Olga
4. Telefon: 079 34 68 14
Fax: 022-31-76-28
E-mail : telprodcom@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0103354 din 09.02.2011 eliberat de către Camera Înregistrării de Stat
6. Domeniile principale de activitate: Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice; alte tipuri de comerț cu ridicata; alte tipuri de comerț cu amănuntul; activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări; alte lucrări speciale de construcții; tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală.

7. Licențe în domeniu:

Numărul	Data	Instituția emitentă	Genurile de activitate	Durata de valabilitate
A MMII 054362	07.03.2017	Camera de Licențiere	construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări	07.03.2022
A MMII 054623	30.03.2017	Camera de Licențiere	activitatea de proiectare pentru construcții, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții	30.03.2022
399	27.05.2011	ANRCETI	declarația informativă de furnizor de rețele publice de comunicații electronice	nelimitată
53036	22.11.2018	Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii	Intermedieri în comerț	nelimitată

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ**«TELPROD-COM»**

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181

Adresa poștala: MD-2059, or. Chișinău, str. Petricani 19/2

Tel. /fax +(373) 022-31-76-11, e-mail: telprodcom@mail.ruCont de decontare MD78MO2224ASV42810137100 la BC <<Mobiasbanca OTP Group >> SA
codul băncii MOBBMD22

Codul fiscal 1011600003819 Cod TVA 0506442

493	27.11.2018	ANTA	Transport rutier contra cost	nelimitată
002310	24.05.2019	ANTA	Transport național și internațional în cont propriu	nelimitată

8. Compania SRL „Telprod-Com” dispune de un atelier de reparație și aplicare a izolației în 3 straturi pe baza de polietilen extrudat pe țevile pentru gazoducte magistrale, cu expertiza non-distructivă și controlul calității al întregului ciclu de lucrări, ce se situează pe o suprafață de 3000 m² în localitatea Vulcănești pe str. Frunze 115.

9. Structuri, interprinderi afiliate: nu sunt

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț: 150 523,3 mii lei la data de 31.12.2020.

11. Numărul personalului scriptic 105 persoane, din care muncitori 80 persoane.

12. Numărul personalului care va fi indicat în realizarea contractului 36 persoane, din care muncitori 27 persoane.

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 19 243,644 mii lei la data de 31.12.2020.

14. Dotare tehnică :

N/o	Instrumente și dispozitive	Cantitatea asigurată din dotare	Asigurate de la terți sau alte surse	Notă
1	Aparat de sudat K12040 Ivertec	4		
2	Aparat de sudura	3		
3	Aparat de sudură George Fischer	1		
4	Autocamion „Mercedes 208D”	1	2	
5	Autotractor DAF XF 95		1	
6	Autotractor MAN TGA	2		
7	Betonieră	2		
8	Mercedes cu macara 2546		1	
9	Bormașina cu percuție	1		
10	Butoi p-u combustibil	1		
11	Centrala electrica transportabilă	5		
12	Compresor Zif	1		
13	Dispozitiv de stivuire teava	6		
14	Exavator JCB 1CX-P	1		
15	Exavator JCB 3CX-P	1		
16	Exavator JCB 4CX Super	1		

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ**«TELPROD-COM»**

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181

Adresa poștala: MD-2059, or. Chișinău, str. Petricani 19/2

Tel. /fax +(373) 022-31-76-11, e-mail: telprodcom@mail.ruCont de decontare MD78MO2224ASV42810137100 la BC <<Mobiasbanca OTP Group >> SA
codul băncii MOBBMD22

Codul fiscal 1011600003819 Cod TVA 0506442

17	Rulou vibrator BOMAG	1		
18	Generator HYW-35 Carcasat	6		
19	Generator GP 6600	3		
20	Mai compactor WACER BS60-4	1		
21	Instrument de întindere UZK 150	4		
22	Instalație foraj orizontal Vermeer		1	
23	Mașină de găurit verticală	1		
24	Lansator de tevi pe baza T-170	3		
25	Mașina de tăiat camele MFE30	1		
26	Mașină pentru tăierea termică a conductelor	6		
27	Tractor MT3 -130	2		
28	Buldozer T-130	3		
29	Polizor unghiular	2		
30	Pompa de apă	1		
31	Mașina sablare cu nisip	1		
32	Defectoscop ultrasonic		1	
33	Receptor GPS SP 80	1		
34	Trimble TSC 3	2		
35	Semiremorca Krone SDP 27		1	
36	Semiremorca Schmitz S01	3		
37	Tral Iumba		1	
38	Statie radio portativa	13		
39	Stivuitoar Balcancar	1		
40	Vagon pentru montatori	3		
41	Vibrator de adâncime	2		

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani

		Volumul vânzărilor, mii lei
1	Anul 2018	195 667,87 mii lei
2	Anul 2019	217 815,11 mii lei
3	Anul 2020	138 081,31 mii lei

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

«TELPROD-COM»

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181

Adresa poștala: MD-2059, or. Chișinău, str. Petricani 19/2

Tel. /fax +(373) 022-31-76-11, e-mail: telprodcom@mail.ru

**Cont de decontare MD78MO2224ASV42810137100 la BC <<Mobiasbanca OTP Group >> SA
codul băncii MOBBMD22**

Codul fiscal 1011600003819 Cod TVA 0506442

16. Datoriile totale ale operatorului economic la data de 22.02.2022 : 320 mii lei
Inclusiv : față de buget 0,00 mii lei.

Cu stimă,

Semnat: în numele Asocierii

“SC FOREMCONS SRL &SRL TELPROD-COM” _____

Anexa nr. 6
la anunț de participare

RECHIZITE

DENUMIREA	S.R.L. “ TELPROD-COM”
COD FISCAL	1011600003819
BANK	BC “MOBIASBANCA-OTP GROUP” SA
SWIFT	MOBBMD22
IBAN	MD78MO2224ASV42810137100
TVA	0506442
TEL/FAX	(+373) 022-31-76-11
MOBILE	(+373) 079 34-68-14
E-MAIL	telprodcom@mail.ru
ADRESA JURIDICĂ	MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău str. Alba Iulia 113 of.181
ADRESA POȘTALĂ	MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău str. Petricani 19/2
DIRECTOR GENERAL	LAZAREV MIHAIL

Cu stimă,

Semnat: în numele Asocierii

“SC FOREMCONS SRL & SRL TELPROD-COM” _____



SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

«TELPROD-COM»

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181

Adresa poștala: MD-2059, or. Chișinău, str. Petricani 19/2

Tel. /fax +(373) 022-31-76-11, e-mail: telprodcom@mail.ru

Cont de decontare MD78MO2224ASV42810137100 la BC <<Mobiasbanca OTP Group >> SA

codul băncii MOBBMD22

Codul fiscal 1011600003819 Cod TVA 0506442

Anexa nr. 5
la anunț de participare

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate – 2 contracte executate
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate – **29 624 040,00 lei**
 - 2) Final la data executării contractelor – **27 934 080,00 lei**
3. Denumirea Beneficiarilor și adresa acestora
 - 1) **S.R.L. „Chișinău gaz”** mun. Chișinău str. Albișoara 38
 - 2) **S.R.L. „VESTMOLDTRANSGAZ”** mun. Chișinău bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 180.
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor
 - 1) Beneficiarul **S.R.L. „Chișinău gaz”** în calitate de Subantreprenor, Antreprenor General **S.R.L. „Casa Onici”** bd. Cuza Vodă 13/5 of.35 Valoarea lucrărilor executate – **5 185 652,00 lei**
 - 2) Beneficiarul **S.R.L. „VESTMOLDTRANSGAZ”** în calitate de Asociat. Acord de Asociere „**Habau PPS”** - „**Telprod-com”**. Valoarea lucrărilor executate către „Telprod-com” – **22 748 428,00 lei**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
6. Durata medie privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
7. Durata medie de executare a contractelor (zile) :
 - 1) contractată - 90 zile calendaristice
 - 2) efectiv realizată – 165 zile calendaristice
 - 3) motivul de decalare a termenelor contractate – modificări apărute în documentația de proiect, declararea Stării de urgență în Sistemul de Sănătate (COVID-2019).
8. **Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat):** **nu au fost**
9. **Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:** **nu au fost înregistrate.**

10. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: Toate lucrările au fost executate cu forțe proprii (resurse umane, resurse tehnice și financiare). Baza tehnică și de producție permanent actualizată și prezența angajaților calificați - sudori acreditați conform standartelor din Republica Moldova și Uniunea Europeană, ne permite să executăm un spectru larg de lucrări respectând cerințele calitative și cantitative.

- Compania SRL „Telprod-Com” dispune de un laborator acreditat în control nedistructiv pentru metodele VT, RT și UT. Avizul Nr. 1496 din 23.12.2016;

- Compania SRL „Telprod-Com” deține Certificatul de Acreditare pentru Calificare a procedurii de sudare (WPQR) TUV No. 2018-WPQR-048 Rev.1

Cu stimă,

Semnat: în numele Asocierii

“SC FOREMCONS SRL & SRL TELPROD-COM” _____

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Газопровод среднего давления (закольцовка) ул. Тудор Владимиреску – с.Трушень.

Localitatea or. Durlești – s.Trușeni " 22 " 12 2021an.

COMISIA DE RECEPȚIE ÎN URMĂTOAREA COMPONENTA

Președintele comisiei SRL "Chișinău Gaz" _____
Specialist principal al proiectului SRL "Inep-Luck" M. Cucimenco _____
Organizația de exploatare SRL "Chișinău Gaz" V. Scutaru _____
Agenția printru supraveghere tehnică _____

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Casa Onici" _____

La obiectul finisat, de către organizația de subantrepriză SRL "Telprod-Com" _____

A prezentat pentru recepție lucrările de construcție-montaj;

PRP cu două reglatoare RDG-50

2. Proiect 22-2018-AGE a fost elaborat de SRL "Inep-Luck" _____

3. Lucrarile de constructie-montaj au fost efectuate in perioada:

Inceputul lucrarilor 11.2020 terminarea lucrarilor 02.2021
(luna,anul) (luna,anul)

4. Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata in conformitate cu cerinte minime de securitatea privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor combustibile naturale, a efectuat examinarea obiectului, a determinat conformitatea lucrarilor de constructie-montaj efectuate cu cerintele proiectului. In caz de necesitate , incercari suplimentare (cu exceptie celor stipulate in documentatia executare)

(tipurile de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE

1. Lucrarile de constructie-montaj au fost efectuate in intregime conform proiectului si „Cerinte minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale”. Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. 522 din 12.07.2017

Obiectul prezentat pentru receptie:

Газопровод среднего давления (закольцовка) ул. Тудор Владимиреску – с.Трушень
(denumirea si adresa obiectului)

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar impreuna cu documetatia de executare anexata din “ _____ ” _____ 20____ an

OBIECTUL ESTE PRIMIT DE:

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Specialist principal al proiectului _____

(semnatura)

Organizatia de exploatare _____

(semnatura)

Agentie pentru supraveghere tehnica _____

(semnatura)

OBIECT PREDAT DE:

Antreprenor general _____

(semnatura)

BENEFICIAR
„Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 6 din 07.08.2020

privind lucrarea:

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI, LOT 6, parte componentă a obiectivului ”CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU”

în cadrul contractelor de lucrări:

Contractul de achiziție lucrări nr. 29 din 15.11.2019

Obiectul contractului: **CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI, LOT 6, încheiat între Beneficiar „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și Executantul de lucrări HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr. 2, eliberată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.
2. Comisia de recepție, nominalizată prin ordinul Administratorului „Vestmoldtransgaz” S.R.L. nr. 115/20 din 03.08.2020, și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.08.2020 ÷ 07.08.2020, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Anatolie MIRONAȘ – Ing. Șef ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Membrii Comisiei:

Vasile PĂDURARU – Responsabil Tehnic ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Petru GRĂDINARU – Ing. supervizare lucrări ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Cornel NENCIU – Manager Proiect HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Alexandru NEGRUȚĂ – Diriginte de Șantier HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Anatolie LÎHVAR – Proiectant de specialitate ENERGOPROIECT
Vladimir ARION – Șef Direcție supraveghere gazoducte magistrale AST

3. **Constatările Comisiei de Recepție:** Lucrările de construcție executate și documentația de execuție corespund cerințelor și normativelor în vigoare.
4. **Comisia de Recepție**, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor executate.**
5. **Comisia de Recepție** motivează propunerea făcută prin: **faptul că lucrările sunt executate conform prevederilor PT 1250/2017 și a Contractului de execuție lucrări nominalizate mai sus.**

6. Comisia de Recepție recomandă următoarele: admiterea recepției lucrării: CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI LOT 6, parte componentă a obiectivului "CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU" conform destinației sale.

Obiectivul se consideră recepționat pentru efectuarea lucrărilor de bransare și umplere cu gaze naturale.

7. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 07.08.2020 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei:
Anatolie MIRONAȘ

Membrii Comisiei:
Vasile PĂDURARU


Petru GRĂDINARU

Cornel NENCIU



Alexandru NEGRUȚĂ

Anatolie LÎHVAR

Vladimir ARION

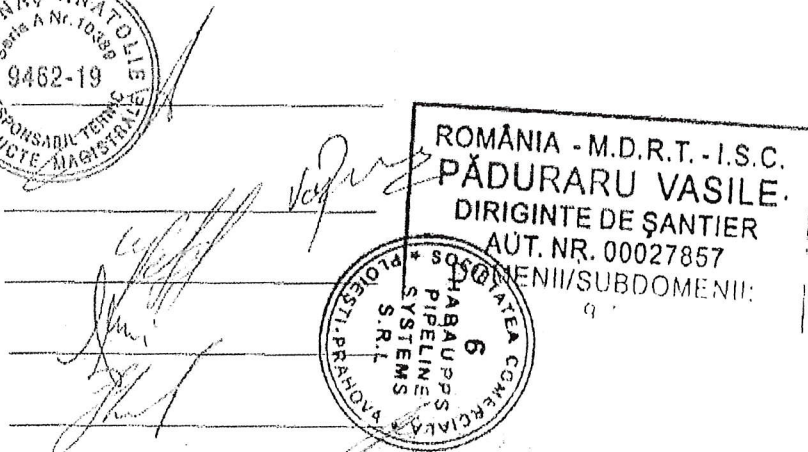

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
PĂDURARU VASILE
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00027857
MĂNENII/SUBDOMENII:



Obiectul:

"CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI LOT 6" este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.

7 august 2020

CORNEL NENCIU
L.Ș. (semnătură)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"Vestmoldtransgaz" S.R.L.

7 august 2020

Liviu DUMINICĂ
L.Ș. (semnătură)

BENEFICIAR
„Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 7 din 07.08.2020

privind lucrarea:

CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE: SRM TOHATIN – CET și SRM TOHATIN – DISTRIBUȚIE REȚELE ORAȘ, LOT 6, parte componentă a obiectivului ”CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU”

în cadrul contractelor de lucrări:

Contractul de achiziție lucrări nr. 29 din 15.11.2019

Obiectul contractului: **CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE: SRM TOHATIN – CET și SRM TOHATIN – DISTRIBUȚIE ORAȘ, LOT 6, încheiat între Beneficiar „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și Executantul de lucrări HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr. 2, eliberată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.
2. Comisia de recepție, nominalizată prin ordinul Administratorului „Vestmoldtransgaz” S.R.L. nr. 115/20 din 03.08.2020, și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.08.2020 ÷ 07.08.2020, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Anatolie MIRONAȘ – Ing. Șef ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Membrii Comisiei:

Vasile PĂDURARU – Responsabil Tehnic ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Petru GRĂDINARU – Ing. supervizare lucrări ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Cornel NENCIU – Manager Proiect HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Alexandru NEGRUȚĂ – Diriginte de Șantier HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Anatolie LÎHVAR – Proiectant de specialitate ENERGOPROIECT
Vladimir ARION – Șef Direcție supraveghere gazoducte magistrale AST

3. **Constatările Comisiei de Recepție:** incompletitudinea documentației de execuție și a lucrărilor de execuție în conformitate cu Anexa nr. 1.

4. **Comisia de Recepție, în urma constatărilor făcute, propune: remedierea neconformităților depistate conform Anexei nr. 1, în termenul stabilit de legislație.**

5. **Comisia de Recepție motivează propunerea făcută prin: faptul că lucrările nu sunt executate integral, conform prevederilor PT 1250/2017 și a Contractului de execuție lucrări nominalizate mai sus.**

6. **Comisia de Recepție recomandă următoarele: admiterea recepției, deoarece obiectiile consemnate nu afectează utilizarea lucrării: CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE: SRM TOHATIN – CET și SRM TOHATIN – DISTRIBUȚIE ORAȘ, LOT 6, parte componentă a obiectivului”CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE**

DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA,
FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU” conform destinației sale.

Obiectivul se consideră recepționat pentru efectuarea lucrărilor de bransare și umplere cu gaze naturale.

7. Prezentul Proces-verbal, conținând 2 (două) file, Anexa nr. 1 cu un total de 1 (una) filă, a fost încheiat astăzi la 07.08.2020 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei:
Anatolie MIRONAȘ

Membrii Comisiei:
Vasile PĂDURARU




Petru GRĂDINARU

Cornel NENCIU

Alexandru NEGRUȚĂ

Anatolie LÎHVAR

Vladimir ARION



Obiectul:

”CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI LOT 6” este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
”Vestmoldtransgaz” S.R.L.

7 august 2020

7 august 2020

CORNEL NENCIU

Livia DUMINICĂ

L.Ș.

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)



(semnătura)

ANEXA nr. 1 la Procesul – Verbal nr. 6 din 07.08.2020

Constatările Comisiei de recepție cu privire la lucrările executate:

1. La subtrabersările nr.3 și nr.4 nu este asigurată adâncimea amplasării cameretelor FO, conform cerințelor documentației tehnice de proiect,
2. Trebuie instalate 2 borne de marcaj, visavi de cele existente, care aparțin Moldovatransgaz, sectorul aval de intersecția cu apeductul,
3. Lipsesc plăcuțele informative de pe bornele de marcaj instalate,
4. Nu sunt finalizate lucrările de acoperire șanț și refacerea terenurilor aflate sub construcție,


Constatările Comisiei de recepție cu privire la documentația de execuție:

Fără obiecții.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:
Anatolie MIRONAȘ

Membrii Comisiei:
Vasile PĂDURARU
Petru GRĂDINARU
Cornel NENCIU
Alexandru NEGRUȚĂ
Anatolie LÎHVAR
Vladimir ARION

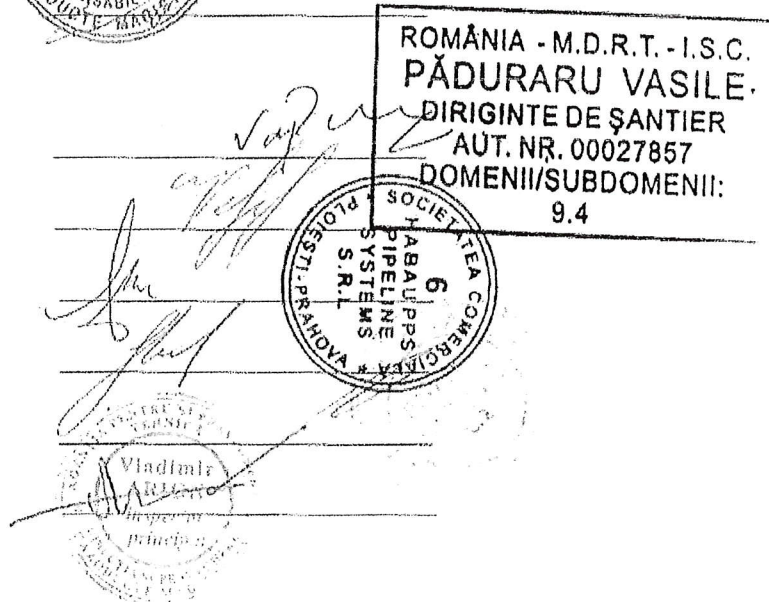

Beneficiar: „Vestmoldtransgaz” S.R.L.

**PROCES-VERBAL
DE CONSTATARE A REMEDIERII NECONFORMITĂȚILOR
Nr. 2 din 30.10.2020**

privind lucrarea:

CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA FAZA II PE DIRECȚIA IAȘI-UNGHENI-CHIȘINĂU, CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE SRM TOHATIN- CET CHIȘINĂU ȘI SRM TOHATIN- DISTRIBUȚIE CHIȘINĂU

în cadrul contractelor de lucrări:

Contractul de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019

Obiectiv: „Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatin- distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici - SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău (Lot 6)”

încheiat între „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și Executantul de lucrări, după cum urmează:

LOT 6: Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. – TELPROD COM S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.

2. **Comisia de recepție a neconformităților remediate** și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.10.2020 ÷ 30.10.2020, fiind formată din:

A. Din partea **BENEFICIARULUI**:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Mironaș Anatolie | Șef serviciu exploatare și mentenanță | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |
| 2. Păduraru Vasile | Responsabil tehnic | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |
| 3. Petru Grădinari | Inginer supervizare lucrări | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |

B. Din partea **EXECUTANȚILOR DE LUCRĂRI**:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Cornel Nenciu | Manager Proiect | HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. |
| 2. Alexandru Negruță | Diriginte șantier | HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. |

C. Din partea **PROIECTANTULUI GENERAL**:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Achim Muntean | Proiectant de specialitate | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|

3. **Constatarea Comisiei de recepție a neconformităților remediate:** se prezintă în Anexa nr. 1.

4. **Prezentul Proces-verbal, conținând 2 file, Anexa nr. 1 cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi la 30.10.2020 în 4 exemplare.**

Comisia de recepție a neconformităților remediate, fiind formată din:

A. Din partea **BENEFICIARULUI**:



- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Mironaș Anatolie | Șef serviciu exploatare și mentenanță |
| 2. Păduraru Vasile | Responsabil tehnic |
| 3. Petru Grădinari | Inginer supervizare lucrări |

B. Din partea **EXECUTANȚILOR DE LUCRĂRI**:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Cornel Nenciu | Manager Proiect |
| 2. Alexandru Negruță | Diriginte șantier |

C. Din partea **PROIECTANTULUI GENERAL**:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Achim Muntean | Proiectant de specialitate |
|-------------------------|----------------------------|



S.C. HABAU PPS Pipeline Systems S.R.L.

TELPROD COM S.R.L.

SANTIER : Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din Romania cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova faza II pe directia Iasi-Ungheni- Chisinau, conducta de distributie gaze naturale SRM Tohatin – CET Chisinau si SRM Tohatin-Distributie Chisinau

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1, din 30.10.2020

1. Cu ocazia receptiei la lucrarea: **Conducta de Distributie SRM Ghidighici – SRM Petroicani – lot 6** parte componenta a obiectivului **Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din Romania cu Sistemul de Transport gaze din Republica Moldova faza II pe directia Iasi-Ungheni- Chisinau, conducta de distributie gaze naturale SRM Tohatin – CET Chisinau si SRM Tohatin-Distributie Chisinau**

2. Pentru lucrarile de: **Constructii montaj conform - Contract de achizitie lucrari nr. 29 din 15.11.2019**

3. Comisia de receptie este formata din:

Cornel NENCIU – Manager Proiect HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL

Alexandru NEGRUTA – Diriginte de santier TELPROD COM

4. Au mai participat la receptie :

Mironas Anatolie – Sef serviciu exploatare si mentananta – VESTMOLDTRANSGAZ;

Paduraru Vasile – Responsabil Tehnic – VESTMOLDTRANSGAZ;

Petru Gradinari – Inginer supervizare – VESTMOLDTRANSGAZ;

Achim Muntean – Proiectant de specialitate - SNTGN TRANSGAZ

5. Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Au fost inchise toate neconformitatile conform Proces Verbal de constatare a remedierii neconformitatilor nr. 2 din 30.10.2020


6. Au fost stabilite urmatoarele masuri:

Nu au fost stabilite masuri suplimentare

7. Semnaturi

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL

Ing. Cornel NENCIU



TELPROD COM SRL

Ing. Alexandru NEGRUTA



SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

«TELPROD-COM»

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181

Adresa poștala: or. Chișinău, str. Petricani 19/2

Tel. /fax +(373) 022-31-76-11, e-mail: telprodcom @ mail.ru

Cont de decontare MD78MO2224ASV42810137100 la BC <<Mobiasbanca-OTP Group>> SA
codul băncii MOBBMD22

Codul fiscal 1011600003819 Cod TVA 0506442

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

	Obiectul contractului	Denumirea Beneficiarului/adresa	Calitatea Prestatorului	Prețul contractului/valoarea serviciilor livrate (fără TVA)	Cantitatea (km)	Perioada de livrare (luni)
1	Lucrări de construcție a gazoductului de presiune medie din str. T.Vladimirescu, or. Durlești-s. Trușeni (inelare)	<u>S.R.L.</u> “ <u>Chișinău gaz</u> ” <u>mun. Chișinău str.</u> <u>Albișoara 38</u>	Subcontractant S.R.L. “Casa Onici”	<u>Prețul contractului</u> <u>5 147 191,00 MDL /</u> <u>valoarea serviciilor livrate</u> <u>5 185 652,00 MDL</u>	<u>1,2 km</u>	4 luni
2	Conducta interconectare STG Romania cu STG R.Moldova Faza II - Ob.5 Cond.racord Ob.8 Cond.distributie	<u>S.R.L.</u> “ <u>Vestmoldtransgaz</u> ” <u>mun. Chișinău bul</u> <u>Ștefan cel Mare 180</u>	<u>Acord de asociere</u> <u>„Habau PPS” SRL –</u> <u>„Telprod-com” SRL</u>	<u>Prețul contractului</u> <u>24 476 849,00 MDL /</u> <u>valoarea serviciilor livrate</u> <u>22 748 428,00 MDL</u>	<u>8,11 km</u>	7 luni

- Procese Verbale de recepție la terminarea lucrărilor sunt anexate

Cu stimă,

Semnat: în numele Asocierii

“SC FOREMCONS SRL &SRL TELPROD-COM”

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ**«TELPROD-COM»**

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181

Adresa poștala: or. Chișinău, str. Petricani 19/2

Tel. /fax +(373) 022-31-76-11, e-mail: telprodc.com@mail.ru

Cont de decontare MD78MO2224ASV42810137100 la BC <<Mobiasbanca-OTP Group>> SA

codul băncii MOBBMD22

Codul fiscal 1011600003819 Cod TVA 0506442

DECLARAȚIE**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să adopte	Unitatea de măsură	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte resurse
1	Aparat de sudat K12040 Inertec	buc	4	
2	Aparat de sudura	buc	3	
3	Aparat de sudură George Fisher	buc	1	
4	Autocamion Mercedes 208D	buc	1	2
5	Autotractor DAF XF 95	buc		1
6	Autotractor MAN TGA	buc	2	
7	Betoniera	buc	2	
8	Compresor ZIF	buc	1	
9	Instalație foraj orizontal Vermeer	buc		1
10	Rulou vibrator BOMAG	buc	1	
11	Centrala electrica transportabila	buc	5	
12	Mai compactor WACER BS60-4	buc	1	
13	Excavator IUMZ + BOREX	buc	1	
14	Exavator JCB 1CX-P	buc	1	
15	Exavator JCB 4CXSuper	buc	1	
16	Buldozer T-130	buc	3	
17	Tractor MT3 -130	buc	2	
18	Mașina pentru tăierea termică a conductelor	buc	6	
19	Generator HYW-35 Carcasat	buc	6	
20	Butoi pentru combustibil	buc	1	
21	Dispozitiv de stivuire teava	buc	6	
22	Generator GP 6600	buc	3	
23	Mercedes cu automacara 1117	buc	2	
24	Lansator de tevi pe baza T-170	buc	3	
25	Mașina de gaurit vertical pe baza GAZ 52	buc	1	
26	Instrument de intindere UZK 150	buc	4	
27	Bormașina cu percuție	buc	1	

28	Mașina sablare cu nisip	buc	2	
29	Pompa de apă	buc	1	
30	Polizor unghiular	buc	2	
31	Defectoscop ultrasonic	buc		1
32	Receptor GPS SP 80	buc	1	
33	Trimble TSC 3	buc	2	
34	Semiremorca Robuste	buc		1
35	Semiremorca Schmitz S01	buc	1	
36	Semiremorca Van Hool	buc		1
37	Vagon (treiler) de constructii pentru montatori	buc	3	
38	Vibrator de adâncime	buc	2	
39	Statie radio portativa	buc	13	
40	Stivuitor Balcancar	buc	1	

Demunirea bazelor de producție și suprafața	Adresa
Atelier de producție a construcțiilor de metal S = 200 m2	com Stauceni, Constructorilor 12
Depozit de tip închis S = 900 m2	mun. Chișinău str. Petricani 19/2
Depozit de tip deschis S = 3000 m2	mun. Chișinău str. Petricani 19/2
Spații de cazare	vagoane transportabile
Atelier de reparație a tevilor din oțel S=3000m2	or. Vulcănești str. Frunze 115

Laborator acreditat în control nedistructiv prin metodele VT, RT și UT	Nr. 1496 din 23.12.2016
Cert. de Acreditare pentru Calificare a procedurii de sudare (WPQR) TUV	No. 2018-WPQR-048
Cert pentru calificare a sistemului de management conform ISO 14001:2015	No. 4158535
Cert pentru calificare a sistemului de management conform ISO 14001:2018	No. 4158536
Cert pentru calificare a sistemului de management conform ISO 9001:2015	No. 4158534

Cu stimă,

Semnat: în numele Asocierii

“SC FOREMCONS SRL & SRL TELPROD-COM” _____

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

«TELPROD-COM»

MD-2071, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 113, of. 181

Adresa poștala: or. Chișinău, str. Petricani 19/2

Tel. /fax +(373) 022-31-76-11, e-mail: telprodcom@mail.ru

Cont de decontare MD78MO2224ASV42810137100 la BC <<Mobiasbanca-OTP Group>> SA

codul băncii MOBBMD22

Codul fiscal 1011600003819 Cod TVA 0506442

Anexa nr. 11

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Cu stimă,

Semnat: în numele Asocierii

“SC FOREMCONS SRL & SRL TELPROD-COM” _____
