

**“PROIECT GABION” SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. Juritică/oficiul mun. Chișinău

str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ****Lista obiectelor executate 2012-2019**

<b>№</b>	<b>Datele proiectului</b>	<b>Denumirea obiectelor</b>
1.	Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. A.Iulia, 85 mun. Chișinău	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
2	Lucrări(Complex de lucrări) de reparații interioare la Hotelul “FLOWERS” mun.Chișinău str.Anestiade,7	SC”Domax-con Prim”SRL Hotelul “FLOWERS” dir.Donciu Stepan
3	Lucrări de reparații interioare la Dormitorul N1 a Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești	Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești director Țenu Tudor
4	Lucrări de reparații a acoperișului stației de pompare a apei IMSP Spitalul rational Cimișlia	IMSP Spitalul Cimișlia str,Alexandru cel Bun,135 dir.Florea MarianaTel.0241/2-21-93
5	Lucrări de reparații a acoperișului la stația de alimentare N73 PETROM mun.Chișinău str.Petricani	SC”LUMINTODE” SRL Dir. Mogîdea Galina
6	Lucrări de reparative a fașadei Liceului theoretic P.Stefănuță r-ul Ialoveni	Liceul theoretic P.Stefănuță
7.	Lucrari de finisare a Garajelor din mun. Chișinău str. Pietrarilor 10 SA “Ago-Dacia”	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
8	Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/4 SA Ago-Dacia	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
9	Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. Pietrarilor 10/2 mun. Chișinău	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
10	Lucrari de replanificare a școlii nefuncționale în grădiniță de copii din s.Micleușeni r-ul Strășeni	Consiliul Raional Strășeni
11	Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110
12	Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/3 SA Ago-Dacia	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
13	Lucrări de finisare a Parcării subterane din str.Pietrarilor,10/4 SA Ago-Dacia	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 dir.Rușesco Mihail
14	Reparația acoperișului căminului și cazangeriei LT Vătămanu or.Strășeni	Aparatul președintelui rational Strășeni
15	Lucrări de finisare interioare si exterioare a Casei de Locuit Blocul N3 din mun. Chișinău str. Pietrarilor	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
16	Lucrari de reparație a trotuarelor” din com.Micauti r-ul Straseni	Primăria Micăuți Strășeni
17	Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit N4 din str. Pietrarilor 10 mun. Chișinău	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
18	Lucrări de reparație la sala festivă” a gimnaziului din com.Micăuți r-ul Strășeni(pardosele,tavane,peretii)	Primăria Micăuți Strășeni
19	Lucrari de reparație interioară și exterioare a grădiniții de copii din s.Țigănești r-ul Strășeni (încălzire,iluminat,canalizare,apă,finisări,ventilare)	Primăria s.Țigănești r-ul Strășeni

20	<i>Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gimnaziul din s.Micauti r-ul Strasenii</i>	Aparatul preşedintelui raional Străşeni
21	<i>Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Ha r-ul Causeni(fasada uşi ,ferestre,termoizolare,finisari toclu)</i>	Gimnaziului "Ioan Voda" Hagimus
22	<i>Lucrari de reparație a trotuarelor din fața Grădiniței com.Micauti r-ul Strasenii)(pavaj,finisarea fatadei,finisar interioare)</i>	Primăria Micăuți Străşeni
23	<i>"Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la postul de transformatoare" la Tabara de odihna pentru copii "Codru"</i>	Direcția Învățămînt Străşeni
24	<i>"CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE" din s.Măgdăcești r-ul Crîuleni(lucrari interioare si exterioare) (încălzire,iluminat,apeduct și canalizare,finisări,utilaje,pavaje,)</i>	Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni
25	<i>Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri" la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Străşeni, etapa nr. 1</i>	Direcția Învățămînt Străşeni
26	<i>„Lucrari de reparatie curenta a blocului "B " la Centrul de odihna si agrement pentru tineret si copii "Divertis" din or.Strasenii</i>	Direcția Invățămînt Străşeni din cadrul Consiliului raional Străşeni
27	<i>Construcția si montarea unei scene pentru festivități în satul Micăuți r-ul Străşeni</i>	Primăria Micăuți Străşeni
28	<i>Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chişinău</i>	Direcția sănătății a Consiliului municipal Chişinău- <i>IMSP SCM de Copii nr.1</i>
29	<i>“Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chişinău</i>	INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI
30	<i>Lucrări de reparație la sala sportivă si vestiar la Liceul Teoretic "M.Eminescu" din or. Străşeni</i>	Consiliul raional Străşeni <i>Preşedinte Popa Mihail</i>
31	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gimnaziului din st. Decebal 3, s.Cojusna, r-nul Strasenii"</i>	Direcția Învățămînt Străşeni
32	<i>„Lucrări de pavare,reparația partiala a scărilor interioare si exterioare la Grădinița din s.Măgdaceșt”</i>	Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni
33	<i>Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1-2017</i>	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile <i>Dir.Larisa Şicanova tel.022/525110</i>
34	<i>“Construcția depozitului frigorific din mun.Chişinău com.Grătiești ”</i>	G.T „Cojocarul Gheorghe Nicolae”
35	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si blocurilor sanitare la LT "Aleco Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii"</i>	Consiliul raional Străşeni
36	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT"Zubresti" din satul Zubresti r-ul Strasenii</i>	Consiliul raional Străşeni
37	<i>Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3</i>	IP USMF "Nicolae Testemitanu"
38	<i>Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau</i>	IMSP SCM Sfintamicaue
39	<i>Reparația acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hîncești</i>	Direcția Scolii tip treimeat Carpineni
40	<i>Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau</i>	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
41	<i>Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Strasenii</i>	Primaria s.Tiganesti r-ul Strasenii
42	<i>"Lucrari de amenajare a teritoriului "la gradinita din satul Micauti"</i>	Primaria comunei Micauti r-ul Strasenii
43	<i>Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperişurilor intrărilor Căm. 16 din str. M. Sadoveanu 16/3</i>	IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova
44	<i>Lucrări de construcție depozitului frigorific din mun. Chişinău com. Grătiești, sat Grătiești</i>	Depozit frigorific din com. Grătiești, mun. Chişinău
45	<i>Lucrări de reparații interioare la Centrul Termika din str. Matei Basarab, 2/1</i>	Firma Ricas&P SRL, str. Matei Basarab, 2/1, director Pîntea Igor, tel: 430484
46	<i>Construcția sistemii exterioare de apă și canalizare la depozitul frigorific din mun. Chişinău,com. Grătiești, sat Grătiești</i>	Depozit frigorific din com. Grătiești, mun. Chişinău

47	<i>Reparația capitală a acoperișului școlii primare a liceului teoretic A. Donici</i>	Primăria Peresecina, satul Peresecina
48	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Basarabeasca</i>	Inspectoratul General al Poliției
49	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Cimișlia</i>	Inspectoratul General al Poliției
50	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Dondușeni</i>	Inspectoratul General al Poliției
51	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Șoldănești</i>	Inspectoratul General al Poliției
52	<i>Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la Liceul Teoretic Aleco Russo din s. Cojușna, r-nul Strășeni</i>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni
53	<i>Schimbarea geamurilor la gimnaziul din s. Micăuți, r-nul Strășeni</i>	Direcția Învățământ din Consiliul raional Strășeni
54	<i>Lucrări de tratare cu soluție ignifugă a elementelor construcției acoperișului clădirii</i>	Școala Profesională nr. 7, director Ciobanu Alexandru
55	<i>Lucrări de amenajare a teritoriului IMSP SR Telenești</i>	IMSP SR Telenești, str. C. Porumbescu 8
56	<i>Lucrări de confecționare și montare mână din metal scara exterioară la Centrul de Sănătate com. Bubuieci</i>	Primăria comunei Bubuieci
57	<i>Lucrări de reparație capitală a acoperișului LT “Zubrești” din satul Zubrești, r-nul Strășeni</i>	IP Aparatul Președintelui raionului Strășeni
58	<i>Lucrări de reparație capitală a încăperilor și construcția garajului la PAMU Sudarca, SAMU Dondușeni</i>	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
59	<i>Renovarea acoperișului IMSP “Centrul de sănătate Strășeni” din mun. Strășeni</i>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni
60	<i>Servicii de reparație curente la LT “Aleco Russo” din s. Cojușna, r-nul Strășeni</i>	IP Liceul Teoretic “Aleco Russo”
61	<i>Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2 Pelinia, sat. Pelinia, r-nul Drochia</i>	Inspectoratul General al Poliției
62	<i>Reparația capitală a acoperișului blocului de studii la LT “Aleco Russo” din s. Cojușna, r-nul Strășeni</i>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni; LT “Aleco Russo” din s. Cojușna
63	<i>Lucrări de reparații curente la edificiile IGP</i>	Inspectoratul General al Poliției
64	<i>Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni</i>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul Raional Strășeni)
65	<i>Construcția Oficiului Medicilor de Familie din s. Recea, r-nul Strășeni</i>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni; IMSP Centrul de Sănătate Strășeni
66	<i>Ignifugare (tratare a lemnului cu soluție ignifugă) a acoperișului sediului Curții Supreme de Justiție, str. Petru Rareș 18</i>	Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova

Nume: Ion SECRIERU /

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chisinău

**“PROIECT GABION” SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. Juritică/oficiul mun. Chișinău  
str. M.Sadoveanu,12/1 of.106 tel./fax: +(373  
22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.70 06.06.2017  Nr. 38/3 30.01.2018	<i>Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor intrărilor Căm. 16 din str. M. Sadoveanu 16/3</i> IP USMF Nicolae Testemițeanu	antreprenor	2 517 753,24 74 112,86	4 3	Nr. 61-T 26.10.2017
2	Nr.21G 18.05.2015 Nr.11 01.02.2018 Nr.32 24.05.2018	<i>Lucrări de construcție depozitului frigorific din mun. Chișinău com. Grătiești, sat Grătiești</i> GT “Cojocaru Gheorghe Nicolae”	antreprenor	108 705 37,32 681 076,63 66 434,89	20 6 1	Nr.1 din 21.02.17 Nr.07/33 din 23.02.17
3	Nr. 59/44 11.07.2018  Nr.13 09.09.2018	<i>Reparația capitală a acoperișului școlii primare a liceului teoretic A. Donici</i> Primăria s. Peresecina I.P. L/T Alexandru Donici	antreprenor	1 355 565,40 146 430,00	2	
4	Nr. 93/54 25.09.2018  Nr.131/100 09.12.2019	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Basarabeasca</i> Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	1 551 179,68 232 019,94	3	
5	Nr. 94/55 25.09.2018  Nr.131/100 09.12.2019	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Cimișlia</i> Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	529 174,56 72 350,15	2,5	
6	Nr.95/56 25.09.2018  Nr.131/100 09.12.2019	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1” al Inspectoratului de poliție Dondușeni</i> Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	2 489 538,57 360 270,57	4	
7	Nr.96/57 25.09.2018	<i>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului “Sectorului de Poliție nr. 1”</i>	antreprenor	2 129 656,17	4	



		<b>al Inspectoratului de poliție Șoldănești</b> Inspectoratul General al Poliției				
8	Nr. 32/59 01.10.2018	<b>Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la Liceul Teoretic Aleco Russo din s. Cojușna, r-nul Strășeni</b> Aparatul Președintelui raionului Strășeni L.T. Aleco Russo din s. Cojușna	antreprenor	2 448 822,94	3	
9	Nr. 22/63 02.10.2018	<b>Schimbarea geamurilor la gimnaziul din s. Micăuți, r-nul Strășeni</b> Aparatul Președintelui raionului Strășeni Direcția Învățământ Consiliul raional Strășeni	antreprenor	387 618,77	1	
10	Nr.19/70 09.11.2018	<b>Lucrări de tratare cu soluție ignifugă a elementelor construcției acoperișului clădirii</b> Școala Profesională nr.7	antreprenor	96 247,26	La necesitate	
11	Nr. 10/1/4 15.01.2019 Nr. 1 19.07.2019	<b>Lucrări de amenajare a teritoriului IMSP SR Telenești</b> IMSP SR Telenești	antreprenor	612 470,15 58 807,67	2	
12	Nr.17/03079/01 din 13.11.2017 Nr. MD-2019-03-18-000044-1-11/10/29 18.03.2019	<b>Lucrări de reparație capitală a acoperișului LT “Zubrești” din satul Zubrești, r-nul Strășeni</b> Aparatul președintelui raionului Strășeni	antreprenor	945 372,51 214 714,47	2 2	
13	Nr. 49/61 12.06.2019	<b>Lucrări de reparație capitală a încăperilor și construcția garajului la PAMU Sudarca, SAMU Dondușeni</b> IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	antreprenor	1 663 354,37	3,5	
14	Nr.10/73 23.07.2019 Nr.10/1 18.12.2019	<b>Renovarea acoperișului IMSP “Centrul de sănătate Strășeni” din mun. Strășeni</b> Aparatul președintelui raionului Strășeni IMSP “Centrul de Sănătate Strășeni”	antreprenor	2 144 660,88 307 417,04	3	Nr. 7 din 23.12.2019
15	Nr. 76/84 22.08.2019	<b>Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2 Pelinia, sat. Pelinia, r-nul Drochia</b> Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	1 977 100,45	5	
16	Nr. 7/82 23.08.2019	<b>Servicii de reparație curente la LT “Aleco Russo” din s. Cojușna, r-nul Strășeni</b> I.P. Liceul Teoretic “Aleco Russo” din s. Cojușna	antreprenor	36 928,58	10 zile	
17	Nr.77/91 28.08.2019	<b>Lucrări de reparații curente la edificiile IGP</b> Inspectoratul General al Poliției	antreprenor	500 000,00	La necesitate	
18	Nr. 27/89 12.09.2019	<b>Reparația capitală a acoperișului blocului de studii la LT “Aleco</b>	antreprenor	529 703,21	1	

		<b>Russo” din s. Cojușna, r-nul Strășeni</b> Aparatul Președintelui raionului Strășeni L.T. Aleco Russo din s. Cojușna				
19	<b>Nr. 17/96</b> 11.11.2019	<b>Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni</b> Aparatul președintelui raionului Strășeni	antreprenor	2 639 718,64	2	
20	<b>Nr. 37/101</b> 27.11.2019	<b>Construcția Oficiului Medicilor de Familie din s. Recea, r-nul Strășeni</b> Aparatul președintelui raionului Strășeni IMSP “Centrul de Sănătate Strășeni”	antreprenor	2 837 081,02	8	
21	<b>Nr. 51/103</b> 04.12.2019	<b>Ignifugare (tratate a lemnului cu soluție ignifugă) a acoperișului sediului Curții Supreme de Justiție, str. Petru Rareș 18</b> Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova	antreprenor	299 982,14	0,5	

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun. Chișinău**



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adresa Juridică/oficiul mun. Chișinău

str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru)

### EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la IP Liceul Teoretic "Alec Russo" din satul Cojușna, r-nul Strășeni;**
2. Numărul și data contractului: **Nr.32 din 01 octombrie 2018;**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Aparatul Președintelui raionului Strășeni, IP Liceul Teoretic "Alec Russo" din satul Cojușna, r-nul Strășeni;**
4. Adresa beneficiarului: **r-nul Strășeni, s. Cojușna, str. M.Viteazul, 38/ mun.Strășeni, str.M.Eminescu, nr.28;**
5. Țara: **Republica Moldova;**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor;**  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

	exprimată în monedă în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr. 32 (la data semnării contractului)	<b>2 448 822, 94</b>	<b>142 456,25</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>2 402 442,80</b>	<b>139 758,16</b>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată **90 zile calendaristice**
  - b) efectiv realizată **90 zile calendaristice**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numarul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.27 din 10.07.2020** și procesului-verbal de recepție finală **nr. 22/RF din 10.07.2020.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor proiect, graficul executării lucrărilor în terminile stabilite.*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte (**Lucrări de finisări interioare, lucrări electrice, lucrări tehnico – sanitare**).

Data completării 03.12.2020

Cu stimă, "PROIECT GABION" S.R.L.

directorul **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_ /

Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32/39

privind achiziția prin Licitatie publică

“01” octombrie 2018

mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 28

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie publică nr.18/03677 din 07 septembrie 2018, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**(Consiliul raional Strășeni), cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28, telefon/fax: 0(237)2 36 30, 0(237)2 24 89, cod fiscal:1017601000161, cod IBAN: MD75TRPDAU311120J15745AB, cont bancar: 226632, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar: TREZMD2X, reprezentat prin Președintele raionului Mihail POPA, în calitate de Beneficiar, **L.T.”Alec Russo” din s. Cojușna**, cu sediul în s. Cojușna, str. M. Viteazul 38, tel. 0(237)43361, cod fiscal: 1012620010209, cod bancar: TREZMD2X, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod IBAN: MD02TRPDAU311120A13791AB, reprezentată prin directorul Daniela DONOAGĂ, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.R.L.,PROIECT GABION**, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 12/1, of. 106, tel: (023722)60-60-77, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr:1010600016641 din 07.05.2010, cod IBAN: MD90EN000000222435308845, deschis la B.C. ”Energbank”S.A, cod bancar: ENEGMD22, reprezentată prin directorul Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: **Reparatia capitală la etajul III și a blocului sanitar la Liceul Teoretic „Alec Russo” din s. Cojușna, r-nul. Strășeni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **90 zile** calendaristice, de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul v-a convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul v-a aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 448 822, 94 lei** (*Două milioane patru sute patruzeci și opt de mii opt sute douăzeci și doi lei, 94 bani*) inclusiv TVA; **Aparatul Președintelui raionului Strășeni va achita suma de 1 848 822,94 lei și L.T. „Alec Russo”, s. Cojușna va achita suma de 600 000,00 lei**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



## **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.



- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. „Antreprenorul” general după semnarea contractului atribuit, în timp de cinci zile lucrătoare, prezintă „Beneficiarului” contractul-garanție de bună executare a lucrărilor (Cont Bancar de Deposit – Garanție), încheat cu banca unde se deserveste „Antreprenorul”, pentru depunerea garanției de bună executare a contractului atribuit în cuantum de 10% prin rețineri succesive din plățile facturilor din valoarea contractului.
- 7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 7.12. Garanția de bună executare se va restitui „Antreprenorului” general în baza notificării scrise de „Beneficiar” către agentul bancar, care se va face după finalizarea contractului, semnarea procesului-verbal de recepție finală și predare către „Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate.
- 7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul

- cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă**

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise**

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze

- și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
  - 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
    - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
    - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
    - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
  - 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
  - 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
  - 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **10 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **11. Răspunderea părților**

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.



- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de
- 11.9. 0.1 % din suma totală a contractului.
- 11.10. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1.0 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.11. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.01% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0.5 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **12. Soluționarea litigiilor**

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **13. Rezilierea contractului**

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
  - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
  - d. caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - e. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f. planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g. tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "01" octombrie 2018.


14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

<b>“ Beneficiar”:</b> Aparatul Președintelui raionului Strășeni		<b>“ Antreprenor”:</b> S.R.L ”PROIECT GABION”	
Adresa:	mun. Strășeni, str. M. Eminescu, nr. 28	Adresa:	mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, nr. 16, ap.4
Tel./Fax:	0(237)2-79-10; 0(237)2-24-89	Tel./Fax:	(023722)60-60-77
Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat	Denumirea Băncii:	B.C. ”Energbank”S.A
Adresa Băncii:	mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 133 b	Adresa Băncii:	
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	ENEGMD22
Cod IBAN:	MD75TRPDAU311120J15745AB	Cod IBAN:	MD90EN000000222435308845
Cod fiscal:	1017601000161	Cod fiscal:	1010600016641

Președintele raionului Strășeni: **Mihail POPA**

Directorul: **Ion SECRIERU**



<b>“ Beneficiar”:</b> L.T. ”Alecă Russo” din s. Cojușna	
Adresa:	r-nul. Strășeni, s. Cojușna, str. M. Viteazul, 38
Tel./Fax:	0(237)43361
Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:	mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 133 b
Cont Bancar:	TREZMD2X
Cod IBAN:	MD02TRPDAU311120A13791AB
Cod fiscal:	1012620010209

Directorul: **Daniela DONOAGĂ**

Contabil Șef: **Veronica GOBJA**



Înregistrat Nr:  
Trezoreria:  
Data:



Graficul de plată pe anul 2018-2019.  
Obiectul achiziției: Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la Liceul Teoretic „Alec Russo” din s. Cojușna, r-nul. Strășeni

Suma totală (lei)	2 448 822,94 lei	
	Anul	
	2018	2019
ianuarie		
februarie		1 063 822,94 lei
martie		300 000, 00 lei
aprilie		
mai		
iunie		
iulie		
august		
septembrie		
octombrie	500 000,00 lei	
noiembrie	585 000, 00 lei	
decembrie		

Președintele raionului Strășeni Mihail POPA



Ex.: Irina Calmiș  
Tel/fax.: 0 (237) 2 79 04

**PROCES- VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. RT 27 din 10.07. 2020

privind lucrarea **Reparatia capitală la etajul III și a blocului sanitar la IP Liceul Teoretic "Alecu Russo" din satul Copjusna, r-nul Strășeni**, este executată în cadrul contractului nr.32 din 01 octombrie 2018 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Beneficiar IP Liceul Teoretic "Alecu Russo" din satul Cojușna, r-ul Strășeni și SRL "PROIECT-GABION".

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.07.20, fiind format din :

TAMACIUC Pavel	- președinte al raionului, președintele Comisiei
Membrii comisiei:	
SÎRBU Nicolae	- șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale
LOZOVANU Ion	- consilier raional
DONOAGA Daniela	-director IP Liceul Teoretic "Alecu Russo"
CRĂCIUN Igor	- primar al satului Cojușna.

2. Au mai participat la recepție :

SECRIERU Ion - director SRL "PROIECT-GABION"

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată , care trebuia prezentată , au lipsit sa sînt Incomplete piesele cuprinse în lista – anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista – anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista –anexă nr.3 nu sa-u respectat prevederile proiectului;

4. Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

de receptionat lucrările

5. Comisia de recepție motivează propunere făcută prin :

lucrările au fost executate calitativ conform contractului de antrepriză în valoare de 2 402 442.80 lei și cu respectarea Legii și normativelor în vigoare

6. Comisea de recepție recomandă următoarele :

receptionarea lucrărilor terminate

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_ destinația Educație "**Reparatia capitală la etajul III și a blocului sanitar la IP Liceul Teoretic "Alecu Russo" din satul Copjusna, r-nul Strășeni,**" suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_ ha, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul process-verbal.

8. Prezaentul process-verbal, conținînd 2 file , a fost încheiat astăzi 10 iulie 2020, la 11:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

TAMACIUC Pavel

Membrii comisiei:


SÎRBU Nicolae

LOZOVANU Ion

DONOAGA Daniela

CRĂCIUN Igor

SCRIERU Ion .

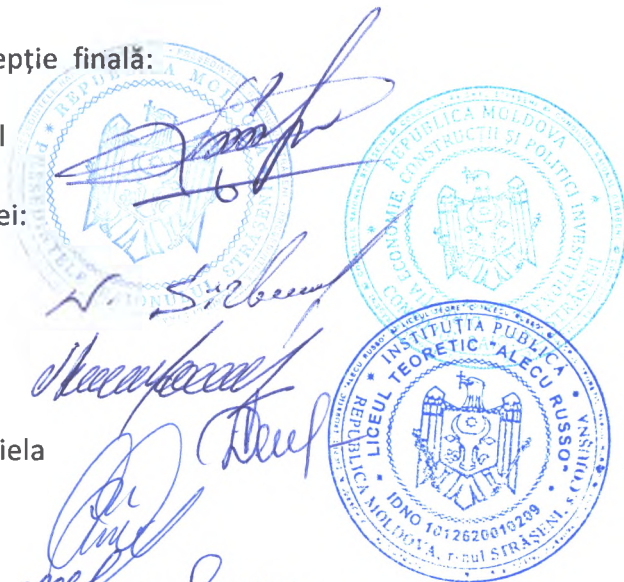

9. Concluzia Inspecției de stat în Construcții:

Lucrarea "Reparatia capitală la etajul III si a blocului sanitar la IP Liceul Teoretic "Alecu Russo" din satul Copjușna, r-nul Strășeni,

" " \_\_\_\_\_ 2020

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția,numele , prenumele)

10. Lucrarea „Reparatia capitală la etajul III si a blocului sanitar la IP Liceul Teoretic "Alecu Russo" din satul Copjușna, r-nul Strășeni, este


TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" " \_\_\_\_\_ 2019  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



" " \_\_\_\_\_ 2019  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



Lista documentatiei scrise si desenate, care trebuia,

Prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele:

*[A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly reading 'L' or 'I', is written across the page.]*

INVESTITORUL:

Aparatul președintelui c-nul Strășeni

*[Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp of the Strășeni Municipality.]*

IP Liceul Teoretic „Alecu Russo”

*[Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp of the Liceul Teoretic „Alecu Russo” in Strășeni.]*

EXECUTANTUL:


SRL „PROIECT-GABION”

*[Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp of SRL „PROIECT-GABION”.]*



**Lista lucrărilor ce urmează a fi executate:**

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 32 din 01 octombrie 2018  
**Reparatia capitală la etajul III și a blocului sanitar la IP Liceul Teoretic "Alec Russo" din satul  
Copjusna, r-nul Strășeni,** încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de  
beneficiar IP Liceul Teoretic „Alec Russo” și SRL PROIECT-GABION.

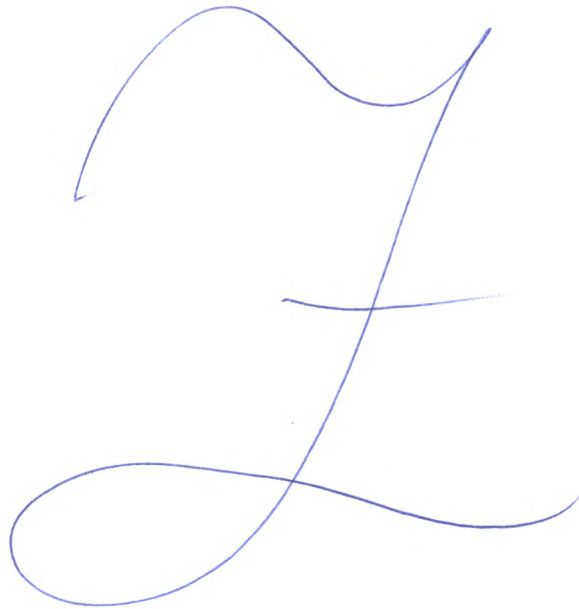

INVESTITORUL  
Aparatul Președintelui raionului Strășeni



EXECUTANTUL  
SRL PROIECT-GABION





Anexa nr. 3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_/RT din 10.07.2020

**Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție**

*(Large handwritten signature in blue ink)*

**INVESTITORUL:**

Aparatul președintelui raionului Strășeni

*(Handwritten signature in blue ink)*  


**IP Liceul Teoretic "Alec Russo"**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**EXECUTANTUL:**

SRL „PROIECT-GABION”

*(Handwritten signature in blue ink)*  




## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 21 /RF din 10.07. 2020

Obiectul Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la IP Liceul Teoretic "Alec Russo" din satul Copjușna, r-nul Strășeni, este executat în cadrul contractului nr. 32 din 01 octombrie 2018 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Beneficiar IP Liceul Teoretic "Alec Russo" și SRL PROIECT-GABION .

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.07. 2020, fiind forma din :

TAMACIUC Pavel	- președinte al raionului, președintele Comisiei
Membrii comisiei:	
SÎRBU Nicolae	- șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale
LOZOVANU Ion	- consilier raional
DONOAGA Daniela	-director Liceul Teoretic "Alec Russo"
CRĂCIUN Igor	- primar al satului Cojușna.

2. Au mai participat la recepție:

SECRIERU Ion - director SRL PROIECT-GABION

3. Comisia de recepție finală , în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexe nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data \_\_\_\_\_;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5)instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt ]n posesia utilizatorului;  
sînt în posesia utilizatorului
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat ) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent , respectiv pe o durată de timp \_\_\_ luni, constatările fiind enumerate în anexa nr. 3 ;
- 7)valoarea obiectului este de **2 402 442.80 lei.**

4. În baza constatărilor făcute , comisia de recepție finală propune :

de receptionat lucrările finalizate

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin :

Lucrările au fost executate calitativ conform contractului de antrepriză nr. 32 din 01 octombrie 2018 cu respectarea legii și normativelor în vigoare .

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele :

Recepționarea finală a lucrărilor executate

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația Educație-,, Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la IP Liceul Teoretic "Alecu Russo" din satul Copiușna, r-nul Strășeni suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_ ha, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, au fost încheiate astăzi 10 iulie 2020, la 14:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală :

TAMACIUC Pavel

Membrii comisiei:

SÎRBU Nicolae

LOZOVANU Ion

DONOAGA Daniela

CRĂCIUN Igor

SECRIERU Ion



9. Concluzia inspecției de stat în construcții :

Lucrarea „Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la IP Liceul Teoretic "Alecu Russo" din satul Copiușna, r-nul Strășeni

" " \_\_\_\_\_ 2020

L.S. \_\_\_\_\_

**Lista documentatiei scrise si desenate, care trebuia prezentată,  
au lipsit sau sunt incomplete piesele**

*[Handwritten signature in blue ink]*

INVESTITORUL  
Aparatul președintelui raionului Strășeni

EXECUTANTUL  
SRL PROIECT-GABION



IP Liceul Teoretic Alecu Russo



**Lista lucrărilor ce urmează a fi executate**

*[A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely representing the contractor or investor.]*

**IIINVESTITORUL**  
Aparatul președintelui raionului Strășeni

*[Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp of the Strășeni District Council.]*

**EXECUTANTUL**  
SRL PROIECT-GABION

*[Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp of SRL PROIECT-GABION.]*

**IP Liceul Teoretic "Alec Russo"**

*[Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp of the Liceul Teoretic "Alec Russo".]*

**PROIECT GABION**  
S.R.L.  
IDNO 1010600016641  
REPUBLICA MOLDOVA

**Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au  
fost executate cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau  
finalizate în perioada de garanție**

*[Handwritten signature]*

INVESTITORUL

Aparatul președintelui raionului Strășeni



EXECUTANTUL

SRL PROIECT-GABION

*[Handwritten signature]*

IP Liceul Teoretic „Alec Russo”





“PROIECT GABION” SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “*Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești*”

2. Numărul și data contractului Nr.21G din 18.05.2015

Denumirea/numele beneficiarului *G.T „Cojocaru Gheorghe Nicolae”*

4. Adresa beneficiarului *or.Șoldănești s.Parcani*

5. Țara *Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

**antreprenor**  
***antreprenor general***

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul (la data semnării contractului)	<b>10 874 631,64</b>	<b>591 012,58</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>10 870 537,32</b>	<b>590 790,07</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **21 luni**

b) efectiv realizată **20 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 21 februarie 2017 și procesul verbal de recepție finală nr.07/33 din 23.02.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect,graficul executării executat in terminile stabilite*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*(Lucrări de terasament,fundații,pardosele,pereți și tavane din paneele SandwciI,metaloconstrucții ferme,stâlpi,Utilaj,Lucrări electrice ,evacuarea apelor,gard,amenajare drum,trotuare,termoizolare pardosele)*

Data completării :

Semnat

Nume: **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_ /

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**



# CONTRACT № 21G /

de executare a lucrărilor

18.05.2015

mun.Chișinău

## I. Părțile contractante

1.1 Firma G.T"Cojocar Cheorge Nicolae" , reprezentată prin directorul Cojocar Cheorge denumit în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și „Proiect Gabion” SRL, reprezentată prin directorul societății Ion Secrieru , numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte (ambii numiți în continuare „Părți”) au încheiat prezentul Contract, privind următoarele:

## II. Obiectul Contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute „Lucrări de construcție a DEPOZITULUI FRIGORIFIC din mun.Chișinău com.Grătiești sat.Grătiești cu materialele Antreprenorului în conformitate cu prevederile proiectului și asigurarea volumelor de lucru.

## III. Durata de execuție

3.1. Lucrările indicate în obiectul contractului vor fi îndeplinite în termen de 21(douăzeci și una) luni calendaristice din momentul decontării de către „Beneficiar” a unui avans în mărimea indicată în p.4.4. a prezentului contract.

## IV. Costul lucrărilor și condițiile de achitare

4.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Lucrări de construcție” a DEPOZITULUI FRIGORIFIC din mun.Chișinău com.Grătiești sat.Grătiești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.examinînd documentația de proiect de elaborarea vă prezentăm oferta în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de proiect.

### Costul lucrărilor de construcție la obiectul dat este:

pentru suma fără TVA de 9 062 193,03 lei (nouă milioane șazeci și două mii o sută nouăzeci și trei lei și 03 bani) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 812 438,61 lei (un milion optsute doisprezece mii patru sute treizeci și opt lei și 61 bani).

TOTAL OFERTA 10 874 631,64 lei (zece milioane opt sute șaptezeci și patru mii șase sute treizeci și unu lei și 64bani)

4.2. Lucrările adăugătoare și lucrările neprevăzute va constitui suma de date facto reeșind din calcule.

4.3 In cazul majorarii preturilor la materialele de constructie costul devizelor vor fi recalculat.

4.4. „Beneficiarul” decontează pînă la începutul lucrărilor un avans în mărime de 5(cinci)%

4.5. Volumul lucrărilor îndeplinite lunar vor fi confirmate de către „Beneficiar” prin actul de recepție a lucrărilor în termen de 3 (trei) zile după prezentarea acestuia de „ Antreprenor”.

4.6. Achitarea lucrărilor îndeplinite se va efectua în baza actelor de recepție a lucrărilor, confirmate lunar de către „Beneficiar” în termen de 5 (cinci) zile după semnarea actelor de recepție.

## V. Obligațiunile părților

5.1. Ambele „Părți” se obligă să respecte toate condițiile și termenii prevăzuți în prezentul Contract.

5.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție, respectînd în corespundere normelor și regulilor în vigoare toate procesele tehnologică și î-și asumă integral răspunderea pentru asigurarea unui grad înalt a calității lucrărilor.

5.3. „Beneficiarul” î-și asumă asigurarea pazei antiincendiară a obiectului, bunurilor materiale, mecanismelor și instrumentelor, după terminarea zilei de muncă a „Antreprenorului”.

5.4. „Antreprenorul” se obligă să nu întreprindă acțiuni, care ar avea ca rezultat deteriorarea bunurilor imobiliare ale „Beneficiarului”.



### VI. Răspunderea patrimonială

6.1. A se conduce în acest caz de actele normative ale Republicii Moldova în vigoare la data semnării Contractului.

6.2. În cazul încălcării termenului de achitare pentru lucrările îndeplinite, „Beneficiarul” poate fi amendat în mărime de 0,05% din costul lucrărilor efectuate, pentru fiecare zi conform p.4.4. a contractului.

6.3. Pentru neefectuarea lucrărilor în termenii stabiliți de „Părți” „Antreprenorul” poate fi amendat în mărime de 0,05% din costul lucrărilor nefinalizate conform p.3.1. a contractului.

6.4. În cazul întreruperii finanțării lucrărilor ( din motive obiective sau neobiective ) „Beneficiarul” se obligă să preîntâmpine „Antreprenorul” în scris, nu mai târziu de 10 zile de aceasta.

### VII. Valabilitatea contractului

7.1. Prezentul Contract intră în vigoare din data semnării și este valabil pînă la îndeplinirea a obligațiunilor de către „Părțile” contractante.

7.2. Conținutul Contractului nu poate fi modificat fără acordul comun ale ambelor „Părți”.

7.3. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun ale ambelor „Părți” s-au în mod unilateral în caz de nerespectare a condițiilor prevăzute în prezentul Contract.

### VIII. Forța majoră

7.1. „Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială privind îndeplinirea obligațiunilor contractante, dacă acestea au provenit ca urmare a unor cauze de forțe majore.

7.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, Contractul rămîne în vigoare, fiind amînată îndeplinirea angajamentelor din prezentul Contract, corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile de acest gen și consecințele lor.

### IX. Dispoziții finale

8.1. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare nunate „original” cu aceeași putere juridică, dintre care, cite unul se prezintă la fiecare din „Părțile” contractante.



### X. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale „Părților”


„Beneficiar”: GT”Cojocarul Cheorghie Nicolae” “Antreprenor”: „PROIECT GABION” SRL

c/f 35242889  
cod TVA: 8800329  
c/d: 222400600050731  
BC „FinComBank” SA fil.6 mun Chisinau  
BIC: FTMDMD2X873  
MD 7225 or.Șoldănești s.Parcani  
tel/fax:


c/f 1010600016641  
cod TVA: 0404155  
c/d: 222435308  
BC Energbank SA  
BIC:ENEGMD22  
mun.Chisinau, str. M.Sadoveanu,16 ap.24  
tel/fax: 022/60-60-77 022/60-88-60



director/  Cojocarul Gheorghie



director/  SECRIERU



INVESTITOR G.T."Cojocaru Gheorghe Nicolae"

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_01\_\_ din 21.02.2017

privind lucrarea construirea Depozitului frigorific din mun. Chișinău, com. Grătiești, extravilan nr. Cadastral a terenului 0155203.758 în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între \_\_\_\_\_ pentru lucrările de constructive, finisare și amenajare a teritoriului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_07/06\_\_ din 24.03.2015\_\_, eliberată de Autoritatea Publică Locală com.Grătiești, cu valabilitatea până la 24.03.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_13.02-17.02.2017\_\_\_\_, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Mardare Victor , Primarul comunei Grătiești.

Membrii comisiei:

Buga Elena, Secretarul consiliului comunal Grătiești.

Balan Ana, Contabil-Șef.

Savelie Roșca, Inginer cadastral.

Crudu Corina, Arhitect.

3. Am mai participat la recepție:

Cojocaru Gheorghe

Investitor

Secieru Ion /"Proiect Gabion" SRL

Antreprenorul general

4. Constatările comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune.

Recepția obiectului Depozit frigorific amplasat în com.Grătiești, mun.Chișinău, extravilan nr. Cadastral 0155203.758.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Autorizația de construire nr.07/06 din 24.03.2015

Certificat de Urbanism nr. 07/02 din 13.01.2015

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția obiectului Depozit frigorific amplasat în com.Grătiești, mun.Chișinău, extravilan nr. Cadastral 0155203.758.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

Obiectivul cu numărul cadastral \_\_0155203.758, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinată agricol, compusă din următoarele construcții lit.A (01), suprafață la sol \_\_969,3 m.p. \_\_, suprafața totală, \_\_901,9 m.p. \_\_, numărul de etaje \_\_1 \_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobilier, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_2\_\_ file, , a fost încheiat astăzi \_\_21.02.2017\_\_.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Mardare Victor , Primarul comunei Grătiești.

Membrii comisiei:

Buga Elena, Secretarul consiliului comunal Grătiești.

Balan Ana, Contabil-Şef.

Savelie Roşca, Inginer cadastral.

Crudu Corina, Arhitect.



Specialiști:

PRIMĂRIA COMUNEI GRĂTIEȘTI  
ARHITECT

Crudu Corina *[Signature]*

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2017

L.Ş. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"21" februarie 2017

L.Ş. *[Signature]*



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"21" februarie 2017

L.Ş. *[Signature]*



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**  
Nr. 07/33 din 23.02.2017

Obiectul Depozitul frigorific în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. 07/06 din 24.03.2015 eliberată de către APL Grătiești.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 februarie- 17 februarie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Mardare Victor, Primarul comunei Grătiești.


Membrii comisiei:

Buga Elena, Secretarul consiliului comunal Grătiești.

Balan Ana, Contabil-Şef.

Savelie Roşca, Inginer cadastral.

Crudu Corina, Arhitect.



2. Au mai participat la recepție:

Cojocaru Gheorghe

Secrieru Ion/Proiect Gabion SRL

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei

documentelor conform listei, a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;

- Observații comisiei de recepție finală

- Certificatul de Urbanism Nr. 07/02 din 13.01.2015

- Autorizație de Construire Nr. 07/06 din 24.03.2015;

- Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 01 din 13.02.2017

- Cartea Tehnică nr. de ordine 4336.

- Aviz nr. 1/5 din 16.01.2017 privind recepția finală a construcției (serviciul protecției civile și situațiilor excepționale).

- Aviz nr. 06 din 27.01.2017 privind recepția finală a construcției (inspectoratul ecologic de stat).

- Aviz nr. 08 din 03.01.2017 privind recepția finală a construcției (centrul de sănătate publică).

- Valoarea obiectului este de \_\_\_\_\_ lei, conform datelor din \_\_\_\_\_.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune depozitul frigorific lit. A (01), anexa rece a(01), anexa caldă A1 (01), anexa catdă A2(01), amplasate pe adresa : mun. Chişinău, com. Grătiești; extravilan,

**- SPRE RECEPȚIE FINALĂ**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- Certificatul de Urbanism Nr. 07/02 din 13.01.2015



- Autorizație de Construire Nr. 07/06 din 24.03.2015;

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

depozitul frigorific lit. A (01), anexa rece a (01), anexa caldă A1 (01), anexa catdă A2 (01), amplasate pe adresa : mun. Chişinău, com. Grătiești, extravilan,

nr. cadastral 0155203.758.

**- SE.RECEPȚIONEAZĂ.**



6<sup>1</sup>. descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

depozitul frigorific lit. A (01), anexa rece a (01), anexa caldă A1 (01), anexa caldă A2 (01), amplasate pe adresa : mun.Chișinău, com. Grătiești, extravilan. nr. cadastral 0155203.758, cu suprafața la sol 969,3 mp și suprafața totală 901,9 mp, cu 1 nivel conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul procesul-verbal.

7. Prezentul proce-verbal, conținând 2 file, și 13 anexe numerotate, cu un total de 15 file, A fost încheiat astăzi 23.02.2017 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei:

Mardare Victor

Membrii comisiei:

Buga Elena

Roșca Savelie


Balan Ana

Crudu Corina

Secieru Ion „Proiect Gabion” SRL



*Handwritten signatures of Elena Buga, Savelie Roșca, and Ana Balan.*



*Handwritten signature of Ion Secieru.*

Specialiști:

Primarul comunei Grătiești


Secretarul consiliului comunal Grătiești

Inginer cadastral

Contabil-șef

Arhitect

Antreprenorul general




8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

*Handwritten signature of the State Inspector in Construction.*

192 din 28.02.17

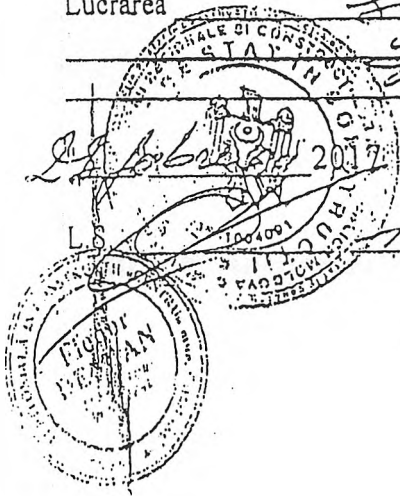

*Handwritten signature of the State Inspector in Construction.*



Gospodăria Țărănească  
MD 7225 or.Șoldănești  
Satul Parcani  
c/f 35242889

## GT"Cojocaru Gheorghe Nicolae"

Nr.16 din 27.02.2017

### Scrisoare de recomandare

Administrația G.T" Cojocaru Gheorghe Nicolae" c/f 35242889, reprezentantă de directorul *Cojocaru Gheorghe*, confirmă ca compania de construcție "Proiect Gabion"SRL c/f 1010600016642 reprezentantă de directorul *Secrieru Ion* a fost aleasă să efectueze "**Lucrările de construcție a depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grățiești**"

Pe parcursul executării lucrărilor prevăzute de proiect și documentele de execuție au fost respectate terminii și volumele prevăzute în contract, normele în construcție, lucrările executate calitativ, confirm un nivel profesional al muncitorilor, persoanelor responsabile și administrației.

Pe parcursul recepției finale a lucrărilor neconformități la care să aducă refaceri parțiale sau totale, recepții amânate nu au fost înregistrate.

Administrația G.T" Cojocaru Gheorghe Nicolae" în calitate de beneficiar recomanda autorităților contractate să selecteze compania de construcție "Proiect Gabion"SRL ca antreprenor credibil și profesioniști în domeniul construcțiilor.

directorul general Cojocaru Gheorghe //





**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrari de constructie a Pavilionului de dormitoare nr. 2 " cu 112 locuri la tabara de odihna pentru copii "Codru" din s. Capriana, raionul Straseni, etapa nr. 1**
2. Numărul și data contractului **Nr.56/84 din 28.10.2014 și acordul adițional nr.56/AA din 11.06.2015 conform (procesul verbal) nr.56/AA din 06.05.2015 la contractul nr.56 din 28 octombrie 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul Presedintelui raionului Straseni )Directia Invatamint din cadrul Consiliului raional Straseni**

4. Adresa beneficiarului **or.Strășeni str.M.Eminescu,28**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

**antreprenor**  
**antreprenor general**

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul <b>nr.56/84</b> (la data semnării contractului )	<b>3 619 414,34</b>	<b>320 302,15</b>
aa) Acordul adițional <b>nr.56AA</b>	<b>1 084 402,84</b>	<b>95 964,85</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>4 703 817,18</b>	<b>416 267,00</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **19 luni**

b) efectiv realizată **11 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.16 din 20 iulie 2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în terminile stabilite mai bine.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **(Lucrări de terasament, zidării, beton armat, pereți dispărțitori, acoperiș șarpant, montarea blocuri din beton subsol, perete de sprijin, scări din beton armat)**

Data completării

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**



# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT

Nr. 17874/14 data 13.11.2014

Semnătura

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 56/84  
din 28 octombrie 2014

### Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1996/14 din 27 octombrie 2014, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cont de virament 220114071679837, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax: 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin **Petru VOLOȘCIUC**, în calitate de Beneficiar, și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4, cont de virament 222435308, deschis la BC „Energbank” SA, cod bancar ENEGMD22, telefon: (022)-60-60-77, cod fiscal 1010600016641, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010, autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A-MMII nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă pînă la 03 iunie 2015), pentru genurile de activitate: \*Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, \*, reprezentată prin **Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute: Lucrărilor de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1 Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3

#### PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, transferarea avansului conform legislației în vigoare, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.



#### Articolul 4

### VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 619 414,34 lei (Trei milioane șase sute nouăsprezece mii patru sute paisprezece lei, 34 bani) inclusiv TVA 603 235,72 lei.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### Articolul 5

### AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### Articolul 6

### ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### Articolul 7

### DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.



13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până 31 decembrie 2016.

### BENEFICIAR

APARATUL PREȘEDINTELUI  
raionului Strășeni  
or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28  
cont trezorerial 220114071679837  
cod fiscal 33828860  
cont bancar 226632  
c/b TREZMD2X

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



*cepa corespunzătoare conform originalului*

### ANTREPRENOR

S.R.L. „Proiect Gabion”  
Mun. Chișinău,  
str. Mihail Sadoveanu, nr. 16 ap. 4  
cont de decontare 222435308  
cod fiscal : 1010600016641  
c/b ENEGMD22  
B.C. „Energbank” S.A.,





# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-2432/14 data 08.12.2014

Semnătura Cuiz

## ACORD ADIȚIONAL nr. 56-LP/AA din 27 noiembrie 2014 la contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 27 noiembrie 2014, în or. Strășeni, de către Aparatul Președintelui raionului, Consiliul raional Strășeni (beneficiar), în persoana Președintelui raionului Strășeni dlui Petru VOLOȘCIUC, S.R.L. „Proiect Gabion” în persoana dlui Ion SECRIERU și Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni (cobeneficiar), în persoana doamnei Iulia CERTAN, șeful direcției în scopul modificării contractului prin includerea ca cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni, prin acord adițional la contractul de achiziție publică nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni cu S.R.L. „Proiect Gabion” pentru achiziționarea : Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1 înregistrat de Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-7874 din 13.11.2014 Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, nr. 56-LP/AA 27 noiembrie 2014, Cod CPV: 45453000-7.

Prin prezentul Acord, se modifică punctul 1.1 din contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014 în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013 și Legii privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, cu modificările ulterioare și se introduce ca parte contractantă, avînd calitatea de cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni pentru a fi posibilă continuarea Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui.

“ OPERATOR ECONOMIC ”:

(semnătura autorizată)

S.R.L.

“PROIECT GABION”

IDNO 1010600018641

REPUBLICA MOLDOVA

“BENEFICIAR”

(semnătura autorizată)

L.S.

“COBENEFICIAR”

(semnătura autorizată)

CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI

REPUBLICA MOLDOVA  
PREȘEDINTELE RAIONULUI STRĂȘENI

1400.000





# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
INREGISTRAT

Nr. 1-9014/15 data 11.06.15

Semnătura

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 56/AA la contractul Nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 01 iunie 2015, în or. Strășeni, între **Aparatul Președintelui raionul Strășeni**, în persoana dlui **Petru VOLOȘCIUC**, **Președintele Raionului Strășeni, Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni** (cobeneficiar), în persoana doamnei **Iulia CERTAN**, șeful direcției și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, în persoana dlui **director Ion Secrieru**, în scopul modificării Contractului Nr. 56/AA din 28 octombrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu Nr. 1-7874/14 din 13 noiembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, Cod CPV: 45453000-7, procesul-verbal Nr. 56/AA din 06 mai 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se majorează suma contractului 1 084 402,84 lei (Un milion optzeci și patru mii patru sute doi lei, 84 bani) inclusiv TVA, ce reprezintă suma neplanificată pentru lucrările suplimentare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



INVESTITOR

**PROCES-VERBAL**  
de recepție la terminarea lucrărilor  
**Nr. 16 din 20 iulie 2016**

privind lucrarea *"Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I"* în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. 1".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07, din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriană.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza *Dispoziției președintelui raionului nr. 80 din 11 iulie 2016* în intervalul de o zi, fiind formată din:

POPA Mihail - președinte al raionului, președintele Comisiei

Membrii comisiei:

BUDU Nicolae - vicepreședinte al raionului  
URSU Ion - vicepreședinte al raionului  
SÎRBU Nicolae - șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, secretar al Comisiei  
CERTAN Iulia - șef al Direcției învățământ  
AMPAVA Ion - șef -adjunct al Direcției învățământ  
CIOBANU Iurie - director al taberei de odihnă pentru copii "Codru"  
CIOCHINĂ Ion - șef al Centrului de Sănătate Publică Strășeni  
SĂNDUȚĂ Oleg - șef al Secției Situații Excepționale Strășeni  
DIACENCO Rita - șef al Inspecției Ecologice Strășeni  
AGHENIE Tudor - inspector, Inspecția de Stat teritorială în construcții Centru  
BUGA Vasile - consilier raional  
ANGHEL Veaceslav - consilier raional  
CUBE Ludmila - consilier raional  
MAROLA Constantin - consilier raional  
GANEA Valentin - consilier raional  
TOPOR Iurie - consilier raional.

3. Au mai participat la recepție:

SECRIERU Ion - director SRL "PROIECT GABION"  
HOMIȚCHI Alexei - director SRL "GLOBAL - MAX"  
TORLAC Nicolae - responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Recepționarea la terminarea lucrărilor.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Executarea lucrărilor de construcție – montaj au fost executate conform contractului de antrepriză și a documentației de proiect cu respectarea normativelor în vigoare.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Recepționarea lucrărilor terminate**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd două file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **20 iulie 2016** în cinci exemplare.

Comisia de recepție

POPA Mihail

BUDU Nicolae

URSU Ion

SÎRBU Nicolae

CERTAN Iulia

AMPAVA Ion

CIOBANU Iurie

CIOCHINĂ Ion

SĂNDUȚĂ Oleg


DIACENCO Rita

AGHENIE Tudor

BUGA Vasile

ANGHEL Veaceslav

TORLAC

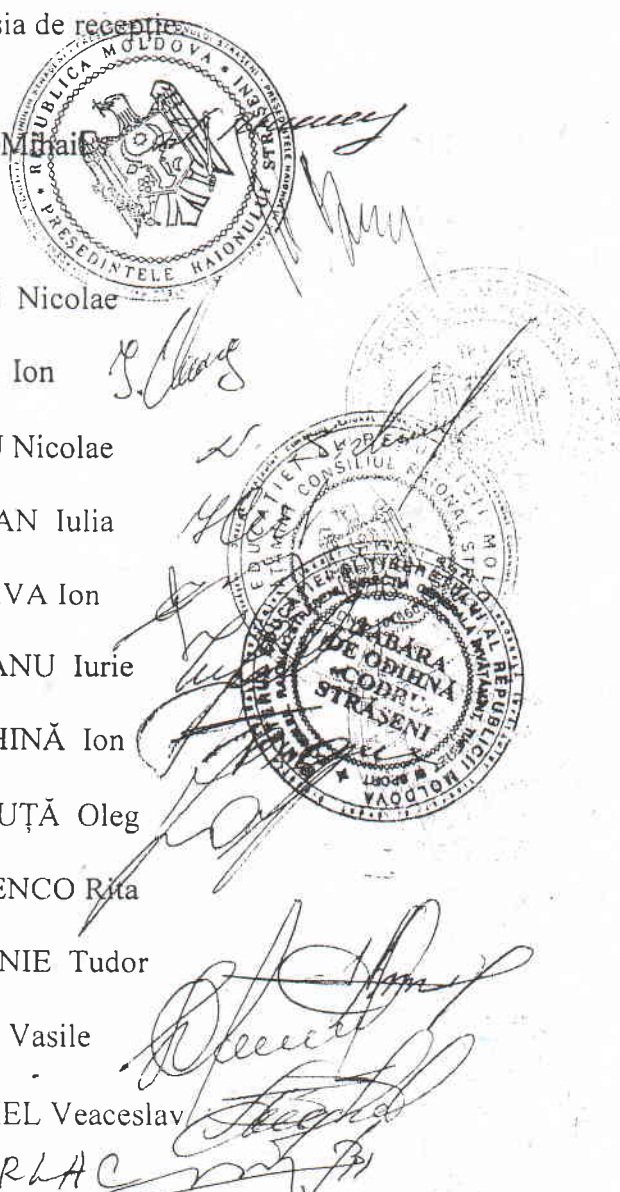



CUBE Ludmila

MAROLA Constantin

GANEA Valentin

TOPOR Iurie

HOMITCHI Alexei

*[Handwritten signatures and initials]*



9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrarea "Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriana raionul Strășeni, etapa nr. I"

" " 2016

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

\_\_\_\_\_  
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " "Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriana raionul Strășeni, etapa nr. I" este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:


EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

" " 2016

2016

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



Anexa nr. 1  
la procesul – verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr.16 din 20.07.2016

Lista documentației scrise și desenate, care trebuia prezentată,  
au lipsit sau sunt incomplete piesele:

7

Președinte al Comisiei


Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMIȚCHI



Anexa nr.2  
la procesul – verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr.16 din 20.07.2016

Lista lucrărilor ce urmasu a fi executate:

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriana raionul Strășeni, etapa nr. 1". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07 din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriana.

Președinte al Comisiei


Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMIȚCHI



Anexa nr.3  
la procesul – verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr.16 din 20.07.2016

Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție


*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*


Președinte al Comisiei

Mihail POPA



Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC



Proiectant

Alexei HOMITCHI

Republica Moldova

Președintele Raionului

**STRĂȘENI**

MD-3701, or. Strășeni, str.M.Eminescu, 28  
tel. (237) 2-36-30



Республика Молдова

Председатель Района

**СТРЭШЕНЬ**

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28  
тел.(237) 2-36-30

16 martie 2017 nr. 145


### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2015 „PROIECT GABION” SRL a câștigat dreptul de execuție a lucrărilor de construcție la obiectului „Pavilionul de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din r-nul Strășeni, în anul 2016 a executat lucrări de reparație capitală la sala de sport și vestiare la LT „M. Eminescu” din or. Strășeni.

În cadrul execuției lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectate normele în construcții, termenii și volumele prevăzute în contract, confirmând un nivel ridicat al profesionalismului. Pe parcursul executării și a recepției finale a lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „PROIECT GABION” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor credibil și profesionist.

Președinte al raionului



*Mihail POPA*  
Mihail POPA





**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ\*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație a sediului din str.Bucuriei,14"**
2. Numărul și data contractului **Nr.48/85 din 4 octombrie 2016 și contractul nr.34/5-41-94 din 06.12.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului **INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

**antreprenor general**

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr.48/85 (la data semnării contractului )	<b>2 411 671,64</b>	<b>129659,77</b>
aa) inițială contractul nr.34/5-41-94	<b>119 995,71</b>	<b>6451,38</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>2 531 667,35</b>	<b>136111,15</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **74 zile-lucrătoare**

b) efectiv realizată **48 zile-lucrătoare**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 23.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **Calitatea lucrarilor efectuate calitativ,conform documentelor proiect,graficul executării lucrărilor in terminile stabilite.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**(Reparatii interioare pereți,tavaniei,pardosele, timplarii din PVC ferestre,din lemn uși , conditionament, ventilare,încălzire amenajari)**

Data completării

Cu stimă,

"PROIECT GABION" S.R.L.

directorul **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_ /

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

AGENŢIA ACHIZIŢII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT

Nr. 16/01900/000 data 10.10.16

Semnătura

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48

privind achiziția prin Licitatie Publică

"04" 10 2016

mun. Chişinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 16/01900 din 23.08.2016, între **Inspectoratul General al Poliției al MAI**, cu sediul în m. Chişinău, str. Tiraspol 11/1, cod fiscal 1013601000495, cod IBAN \_\_\_\_\_, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin **Şef Alexandru PÎNZARI**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Proiect Gabion”** cu sediul în mun. Chişinău, str. Mihail Sadoveanu, 16, of. 4, telefon: 022- 60-60-70, fax: 022-60-88-60, e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515, din “11” iulie 2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606 cu seria A: MMII din “03” iunie 2010, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare și reconstrucții, reprezentat prin **Director Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chişinău**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe

timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 411 671,64 (două milioane patru sute unsprezece mii șase sute șaptezeci și unu),64 lei MD, inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat executat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare, prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.



- 7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0,1% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține

- o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită afita timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 7.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească



toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă**

- 8.1 Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise**

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute în art. 2 al prezentului contract este de **3 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

- 10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defectiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **11. Răspunderea părților**

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor.
- 11.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a contractului, dar nu mai mult.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2016.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "04"  
2016 .



14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Inspectoratul General al Poliției al MAI

Adresa: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1

Tel./Fax: 0 (22) 86-81-10

Denumirea Ministerul Finanțelor Trezoreria de  
Băncii: Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: \_\_\_\_\_

Cod fiscal: 1013601000495

“ ANTREPRENOR”:

SRL „Proiect Gabion”

Adresa: str. Mihai Sadoveanu 16, of. 4

Tel./Fax: (022) 60-60-77/60-88-60

Denumirea Băncii: BC „Energ Bank” SA

Cod Bancar: ENEGMD22

IBAN: MD90EN000000222435308845

Cod fiscal: 1010600016641

## 16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Șef  
Alexandru PÎNZARI



“ ANTREPRENOR”:

Director  
Ion SECRIERU



Șeful DF Dolintă Șt. Dolintă  
Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_  
Trezoreria \_\_\_\_\_  
” ” \_\_\_\_\_ 2016



**CONTRACT nr. 34/5-41**  
**pentru achiziționarea lucrărilor de valoare mică**

“06” 12 2016

mun. Chișinău

SRL „Proiect Gabion” reprezentat prin **directorul Ion SECRIERU**, denumit în continuare “Antreprenor”, pe de o parte, și **Inspectoratul General al Poliției** reprezentat prin **șef Alexandru PÎNZARI**, denumit în continuare “Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare “Părți”), au încheiat prezentul contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație suplimentare a edificiului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău, Cod CPV: 45000000-7, denumite în continuare Lucrări.

1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău iar Beneficiarul de a recepționa, achita Lucrările conform Specificației și Devizului anexat la prezentul Contract.
2. Executarea Lucrărilor se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract.
3. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația din prezentul Contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **119 995,71 (una sută nouăsprezece mii nouă sute nouăzeci și cinci lei, 71 bani) MD, inclusiv TVA.**
5. Achitarea se efectuează în decurs de 10 zile calendaristice de la recepționarea Lucrărilor consemnate în procesul - verbal de recepție a Lucrărilor, semnat de ambele Părți.
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor Părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 zile calendaristice înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile calendaristice din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, având aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

<b>„Antreprenor”:</b> <u>SRL „Proiect Gabion”</u>	<b>„Beneficiar”:</b> <u>Inspectoratul General al Poliției al MAI</u>
<b>Adresa poștală:</b> mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 16, of. 4	<b>Adresa poștală:</b> mun. Chișinău str. Tiraspol 11/1
<b>Telefon/fax:</b> (022) 60-60-77/60-88-60	<b>Telefon:</b> (022) 868-102
<b>Cod IBAN:</b> MD90EN000000222435308845	<b>Cod IBAN:</b> MD03TRPBA0311120A14294AE
<b>Banca:</b> BC „Energ Bank” SA	<b>Banca:</b> Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
<b>Cod:</b> ENEGMD22	<b>Cod:</b> TREZMD2X
<b>Cod fiscal:</b> 1010600016641	<b>Cod fiscal:</b> 1013601000495

### SPECIFICAȚIA lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cant-tea	Prețul fără TVA	Preț cu TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală cu TVA	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor	STAS (FOCT)
	Lucrări de reparație suplimentare a edificiului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău (conform devizului local anexat)	1	99 996,43	119 995,71	99 996,43	119 995,71			
<b>TOTAL</b>						<b>119 995,71</b>			

### Semnăturile părților

<b>„Antreprenor”:</b>	<b>„Beneficiar”:</b>
Director <b>Ion SECRIERU</b>	Șef <b>Alexandru PINZARI</b>
	

Șeful DE Polita Șt. Dolință  
 Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_  
 Trezoreria \_\_\_\_\_  
 ” ” \_\_\_\_\_ 2016

INVESTITOR

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 23.12.2016

privind "lucrările de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău" executate la obiectul Inspectoratului General al Poliției al MAI în cadrul contractului nr. 48 din 04.10.2016 încheiat între Inspectoratul General al Poliției al MAI, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte SRL "Proiect Gabion" în calitate de **Antreprenor**.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.12.2016-23.12.2016, fiind formată din:

Lilian PETICA  
Petru HANGANU  
Alexandr MOCAN  
Valeriu JAVELEA

**Beneficiar**  
- Șef al SAC al SAL al IGP al MAI  
- Specialist superior al SAC al SAL al IGP al MAI  
- Specialist superior al SAC al SAL al IGP al MAI  
- Șeful a DMO al INI al IGP al MAI

Ion SECRIERU

**Antreprenor**  
- Director SRL "Proiect Gabion"

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Nu sunt curățite de vopsea cutiile întrerupătoarelor și tocurele la uși;
- 2) Sunt vizibile fisuri la tocul de la ușă a biroului 316, necesită înlăturare;
- 3) Este necesară reparația ușii pe coridor a etajului 4;
- 4) Necesită a fi curățite de vopsea plintele ceramice și din plastic, curățirea geamurilor după montarea acestora;
- 5) Ferestrele nu sunt ajustate ceea ce nu permite închiderea ghermetică, necesită reglare;
- 6) În biroul 208 este crăpată sticla de la fereastra din termopan nou montată, necesar de schimbat;
- 7) În biroul 207 sunt deteriorate plintele din masă plastică, pervazul, laminatul, necesită înlăturare;
- 8) Pragurile ușilor din teracotă nu sunt finisate cu fugă;
- 9) Necesită a fi instalate lămpi pe coridor a etajului 3 și 4 în corpurile de iluminat;
- 10) Necesită instalarea vitrajelor din sticlă la peretele din termopan a etajului 3;

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Termen de înlăturare a tuturor lacunelor depistate pînă la data de 29.12.2016


4. Concluzia:

Recepția finală va fi convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție (3 ani), indicată în punct. 10.1. prezentului contract în conformitate cu Hotărîrea de Guvern Nr. 285 din 23.05.1996.

Comisia de recepție:

Membri: Lilian Petica  
Membri: Petru Hanganu  
Membri: Alexandr Mocan  
Membri: Valeriu Javelia  
Membri: Ion Secrieru

(numele, prenumele, semnatura)

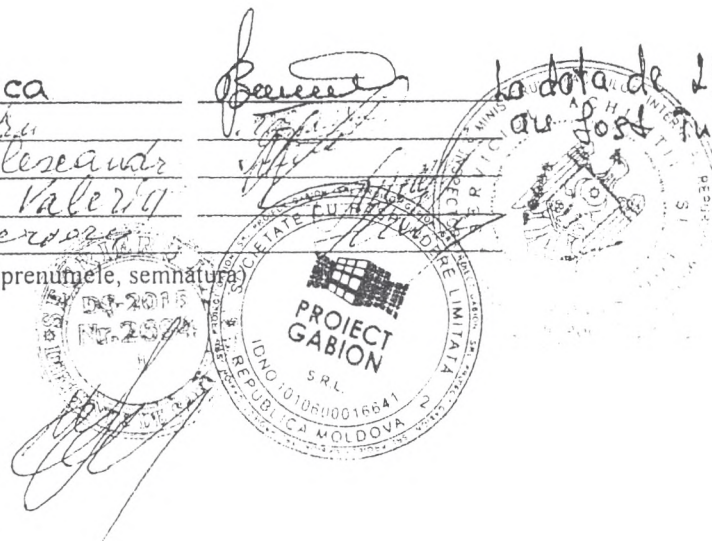



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova  
Inspectoratul General al Poliției  
Serviciul achiziții și logistică



MD 2012, mun. Chișinău, Tiraspol 11/1, tel. (373-22) 868-112, fax. (373-22) 868-116, email: igp@igp.gov.md,  
pagina web: www.igp.gov.md, c/f 1013601000495, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Nr. 43/17 din „24” 01. 2017

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Inspectoratul General al Poliției al MAI confirmă faptul că firma de construcție „PROIECT GABION” SRL, a efectuat „Lucrări de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău”, în cadrul contractului nr.48 din 04.10.2016. Pe întreaga perioadă contractuală „PROIECT GABION” SRL au respectat cu strictețe prevederile contractului, lucrările s-au efectuat calitativ, în termenul prevăzut de contract conform tehnologiilor de efectuare a lucrărilor. În timpul derulării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care să ducă la refaceri parțiale sau totale, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului, nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Aducem mulțumiri firmei „PROIECT GABION” pentru lucrările îndeplinite, și recomandăm „PROIECT GABION” SRL ca o companie responsabilă și aptă de a îndeplini lucrări de construcție și reparație.

Cu respect,

Șef al SAL al IGP,  
colonel de poliție

Viorel GANDRABUR





"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adresa Juridică/oficiul mun. Chișinău

str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru)

### EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Renovarea acoperișului IMSP "Centrul de sănătate Strășeni" din mun. Strășeni";
2. Numărul și data contractului: **Nr.10/73 din 23 iulie 2019, acordul nr.10/1 din 18 decembrie 2019;**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Aparatul președintelui raionului Strășeni, IMSP "Centrul de Sănătate Strășeni";**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 105/ mun. Strășeni, str. M. Eminescu, nr. 28;**
5. Țara: **Republica Moldova;**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor;**  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

	exprimată în monedă în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr. 10/73 (la data semnării contractului)	2 144 660,88	122 202,05
aa) inițială contractul nr.10/1	307 417,04	17 516,64
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>2 452 077,92</b>	<b>139 718,69</b>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată 90 zile-calendaristice
  - b) efectiv realizată 150 zile-calendaristice
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numarul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor\_nr.7 din 23.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor proiect, graficul executării lucrărilor în terminile stabilite.*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **(demolări, lucrări din beton armat, acoperiș șarpant, sistema de scurgere, streașină, tencuieli, zidării)**

Data completării 04.03.2020

Cu stimă, "PROIECT GABION" S.R.L.

directorul **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_ /

Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/73**  
privind achiziția prin Licitatie deschisă

"23" iulie 2019

or. Strășeni

**PĂRŢILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin Licitatie deschisă cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1555681874325 din data 14.05.2019, între **IMSP Centrul de Sănătate Strășeni**, cu sediul în MD 3702, mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 105, tel/fax: (0237)2-28-62, cod fiscal: 1007600073873, reprezentat prin șef al IMSP Centrul de sănătate Strășeni d-nul Victor BAHNARU în calitate de Beneficiar, **Aparatul președintelui raionului Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, cod fiscal:1017601000161, telefon: 0237 2 36 30, reprezentat prin Președintele raionului Mihail POPA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.R.L „PROIECT GABION”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 12/1, of. 106, tel: (022)60-60-77, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr: 1010600016641 din 07.05.2010, cod IBAN: MD90EN000000222435308845, la B.C.”Energbank”S.A, cod bancar: ENEGMD22, reprezentată prin directorul Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de **Renovarea acoperişului IMSP, „Centrul de sănătate Strășeni” din mun. Strășeni*** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor

evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 144 660, 88 lei MD**, inclusiv TVA (Două milioane o sută patruzeci și patru de mii șase sute șazeci, 88 bani)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în limitele alocărilor bugetare anuale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.



- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 „Antreprenorul” general după semnarea contractului atribuit, în timp de cinci zile lucrătoare, prezintă „Beneficiarului” contractul-garanție de bună executare a lucrărilor (Cont Bancar de Deposit – Garanție), încheat cu banca unde se deservește „Antreprenorul”, pentru depunerea garanției de bună executare a contractului atribuit în cuantum de 10%\_prin rețineri succesive din plățile facturilor din valoarea contractului.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Garanția de bună executare se va restitui „Antreprenorului” general în baza notificării scrise de „Beneficiar” către agentul bancar, care se va face după finalizarea contractului, semnarea procesului-verbal de recepție finală și predare către „Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract este de 6 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări



transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către



o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.


13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2020

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Antreprenor" S.R.L "PROIECT GABION"		Beneficiar" IMSP „Centrul de Sănătate Strășeni”	
Adresa:	mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, nr. 16, ap.4	Adresa:	mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 105
Tel./Fax:	022)60-60-77	Tel./Fax:	(0237)2-28-62
Email:	proiectgabion@mail.ru	Email:	victorbahnaru@mail.ru
Denumirea Băncii:	B.C. "Energbank" S.A	Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:	-	Adresa Băncii:	-
Cod Bancar:	ENEGMD22	Cod Bancar:	TREZMD2X
Cod IBAN:	MD90EN000000222435308845	Cod IBAN:	MD89TRPCCQ518430E00083AA
Cod fiscal:	1010600016641	Cod fiscal:	1007600073873



Ion SECRIERU




Victor BAHNARU

079542974

Beneficiar" Aparatul președintelui raionului Strășeni "	
Adresa:	mun. Strășeni, str. M. Eminescu, nr. 28
Tel./Fax:	(0237) 23630
Email:	consiliulraional@crstraseni.md
Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:	Mun. Chișinău, str. Pușkin 44
Cont Bancar:	TREZMD2X
Cod IBAN:	MD64TRPDAU30000001574500
Cod fiscal:	1017601000161

23630

→ 069305517 Versiunea



Mihail POPA

15004300



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## ACORD ADIŢIONAL Nr. 10/1

la contractul de antrepriză nr. 10 din 23.07.2019

Prezentul acord este semnat astăzi 18 decembrie 2019, în mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, între **Aparatul Preşedintelui raionului Străşeni**, cod fiscal:1017601000161, telefon: 0237 2 36 30, reprezentat prin Preşedintele raionului Străşeni Pavel TAMACIUC, în calitate de Beneficiar, **IMSP Centrul de Sănătate Străşeni**, cu sediul în MD 3702, mun. Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 105, tel/fax: (0237)2-28-62, cod fiscal: 1007600073873, reprezentat prin şef al IMSP Centrul de sănătate Străşeni d-nul Victor BAHNARU în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi **S.R.L „PROIECT GABION”**, cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu, 12/1, of. 106, tel: (022)60-60-77, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr: 1010600016641 din 07.05.2010, reprezentată prin directorul Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, în scopul modificării contractul de antrepriză nr.10 din 23.07.2019 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Agenţia Achiziţii Publice cu numărul de intrare 201911014

Prezentul acord se încheie, ca urmare a hotărîrii grupului de lucru nr. 40 din 17.12.2019 pentru achiziţii publice al Aparatul preşedintelui raionului Străşeni. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract de antrepriză nr. 10 din 23.07.2019 se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3.1 valoarea contractului se majorează cu 307 417, 04 lei, inclusiv TVA.

**Valoarea iniţială a contractului constituia – 2 144 660, 88 lei inclusiv TVA.**

Se majorează cu contractului cu 307 417, 04 lei

**Valoarea majorată a contractului va constitui – 2 452 077, 92 lei inclusiv TVA.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.


**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

“ Antreprenor” S.R.L ” PROIECT GABION”		Beneficiar” IMSP „Centrul de Sănătate Strășeni”	
Adresa:	mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, nr. 16, ap.4	Adresa:	mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 105
Tel./Fax:	022)60-60-77	Tel./Fax:	(0237)2-28-62
Email:	proiectgabion@mail.ru	Email:	victorbahnaru@mail.ru
Adresa Băncii:	-	Adresa Băncii:	-
Cod Bancar:	ENEGMD22	Cod Bancar:	TREZMD2X
Cod IBAN:	MD90EN000000222435308 845	Cod IBAN:	MD89TRPCCQ518430E00083A A
Cod fiscal:	1010600016641	Cod fiscal:	1007600073873

**Ion SECRIERU**




**Victor BAHNARU**




„ Beneficiar” Aparatul președintelui raionului Strășeni	
Adresa:	mun. Strășeni, str. M. Eminescu, nr. 28
Tel./Fax:	(0237) 23630
Email:	consiliulraional@crstraseni.md
Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Adresa Băncii:	Mun. Chișinău, str. Pușkin 44
Cont Bancar:	TREZMD2X
Cod IBAN:	MD64TRPDAU30000001574500
Cod fiscal:	1017601000161

**Pavel TAMACIUC**





**PROCES – VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr / 7 / din / **23 decembrie /2019**

Privind lucrarea „*Renovarea acoperișului IMSP „Centrul de sănătate Strășeni” din mun.Strășeni* executată în cadrul contractului *nr.10 din 23 iulie 2019*. Licitația deschisă nr.ocds-b3wdpl-MD-1555681874325 , și contractual adițional nr 10/1 din 18 decembrie 2019 încheiat între beneficiar *IMSP „Centrul de sănătate Strășeni”, cu sediul mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare,105* și antreprenorul compania “*PROIECT GABION*”SRL cu sediul în mun.Chișinău str.M.Sadoveanu 12/1 of.106 pentru lucrările de *de reparație a acoperișului și termoizolarea fațadei IMSP „Centrul de sănătate Strășeni”, conform contractului de finanțare a proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale Nr.04-21/17 din data de 14.03.2019.*

1. Lucrările au fost executate în baza „*Contractului de antrepriză nr. 10 și acordul adițional nr.10/1, au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de contracte și proiectul de execuție nr.10-10-2018 elaborat de „Sorom proiect” SRL*

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **16.12.2019 – 20.12.2019**

fiind formată din :

Victor BAHNARU	- șef -Președintele Ccomisiei
Viorica Clima	- contabil șef
Pavel DRAGUȚAN	- șef servicii economico-financiară
Nicolae POCINOC	- șef adjunct,vicepreședinte
Nicolae SÎRBU	-șef al Direcției economie,construcții și politici investiționale
Luiza Nicolaescu	-arhitect șef al mun. Strașeni
Igor CERVATIUC	-responsabil tehnic
Ion SECRIERU	-directorul „PROIECT GABION” SRL
Roman SOLODCHI	- proiectant SRL „Sorom Proiect”

3. Au mai participat la recepție :

Ion SECRIERU	-directorul „PROIECT GABION” SRL
Roman SOLODCHI	- proiectant SRL „Sorom Proiect”

4. Constatările comisiei de recepție :

- 1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
- 2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
- 3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De recepționat lucrările în cadrul obiectului Renovarea acoperișului IMSP „Centrul de sănătate Strășeni” din mun.Strășeni și finisării fațadei** cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

**1. Executarea lucrărilor de renovare au fost executate conform contractului de antrepriză nr. nr.10 din 23 iulie 2019 cu respectarea normativelor în vigoare.**

**Valoarea contractului nr.10 din 23 iulie 2019 - 2 144 619,66 lei**

Acordul adițional nr 10/1 din 18 decembrie 2019 –307 417,04 lei

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : **Exploatarea obiectului conform destinației**

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file,și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi **23 decembrie 2019** în **5(cinci)** exemplare.

Comisia de recepție

Victor BAHNARU

/  /

- șef -Președintele Ccomisiei

Viorica Clima

/  /

- contabil șef

Pavel DRAGUȚAN

/  /

- șef servicii economico-financiară

Nicolae POCINOC

/  /

- șef adjunct,vicepreședinte

Nicolae SÎRBU

/  /

-șef al Direcției economie,construcții  
și poloticiinvestiționale

Luiza NICOLAESCU

/  /

-arhitect șef al mun. Strășeni

Igor CERVATIUC

/  /

-responsabil tehnic

Ion SECRIERU

/  /

-directorul „PROIECT GABION” SRL

Roman SOLODCHI

/  /

- proiectant SRL „Sorom Proiect”

10.Lurarea „**Lucrări de Renovarea acoperișului IMSP „Centrul de sănătate Strășeni” din mun.Strășeni** în cadrul contractului **nr.10 din 23 iulie 2019 și acordul adițional nr.10/1 din 18 decembrie an 2019**

TRANSMISĂ

PRIMITĂ


EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

23 „ decembrie /2019

23 „ decembrie /2019









procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 7 / 23 decembrie /2019

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau întocmite**

“PROIECT GABION” SRL      Ion SECRIERU



Președinte a comisiei      Victor BAHNARU

*B. Văduva*

Responsabil tehnic      Igor CERVATIUC



procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 7 din 23 decembrie /2019

***Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate***

Lucrările au fost executate în cadrul contractului **nr.10 din 23 iulie 2019. proiectul de execuție nr.10-10-2018 și acordul adițional nr.10/1 din 18 decembrie 2019**, încheiat între **IMSP „Centrul de sănătate Strășeni”**, și **“PROIECT GABION” SRL** pentru lucrările **de Renovarea acoperișului IMSP „Centrul de sănătate Strășeni” din mun.Strășeni** în cadrul contractului **nr.10 din 23 iulie 2019, proiectul de execuție nr.10-10-2018 și acordul adițional nr.10/1 din 18 decembrie 2019**,  
Lucrările au fost executate conform contractului. contractului **nr.10 din 23 iulie 2019 proiectul de execuție nr.10-10-2018, și acordul adițional nr.10/1 din 18 decembrie 2019** ,

“PROIECT GABION”SRL	Ion SECRIERU
Președinte a comisiei	Victor BAHNARU
Responsabil tehnic	Igor CERVATIUC





Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor


Nr. 7 din 23 decembrie 2019

***Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.***

“PROIECT GABION” SRL      Ion SECRIERU



Președinte a comisiei      Victor BAHNARU



Responsabil tehnic      Igor CERVATIUC




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA  
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ  
CENTRUL DE SĂNĂTATE STRĂȘENI

MD-3702, mun.Strășeni • str.Ștefan cel Mare,105 • tel: +373(0237) 2-28-62 • fax: +373(0237) 2-28-62 • e-mail: cs.straseni@ms.md

nr. 07 din ianuarie 2020

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezența , **IMSP CS STRĂȘENI** din or.Strășeni cu sediul st.Ștefan Cel Mare,105 confirmă că compania de construcție "**PROIECT GABION**" SRL c/f 1010600016641 a executat lucrările de reparații conform contractului **nr.10** din 23.07.2019 ; *contractul adiționa nr.10/1 din 18 decembrie 2019* și proiectului de execuție **nr.10-10-2018-SAC** la obiectul: „**Renovarea acoperișului IMSP Centrul de Sănătate Strășeni din mun.Strășeni**”

Compania a respectat cu strictețe prevederile conform contractului și documentelor de proiect.

Lucrările sunt executate calitativ cu respectarea tehnologiilor expuse în proiectul de execuție.

Pe perioada executării lucrărilor neconformități nu au fost înregistrate.

Executarea lucrărilor au fost executate conform graficului de execuții.

Recomandăm compania „**PROIECT GABION**” SRL autorităților contractate,agenților economici cointeresate la executarea lucrări de construcții, reconstrucții , reparațiile imobililor.

Șeful IMSP CS STRĂȘENI

(semnătura)

(nume, prenume)

