

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Construcția drumului L401 (de la R10 la Mănăstirea Vărzărești)"**
2. Numărul și data contractului: **02 din 15.12.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Nisporeni**
4. Adresa beneficiarului: **or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, nr. 2**
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **17 754 203,36 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **20 417 333,86 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 12 luni;
 - b) efectiv realizată: 17 luni;
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Acord adițional nr. 1 din 19.12.2022 (apariția lucrărilor suplimentare)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr. f/n din 28.06.2023**

Semnat: _____

Nume: **Guțanu Pavel**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Nisprofcon” SRL**

VOLUME 2

SECTION 1 CONTRACT FORM

CONTRACTUL DE LUCRARI PENTRU ACȚIUNI EXTERNE A UNIUNII EUROPENE

NO. 02

FINANȚAT DIN BUGETUL GENERAL AL UE

Semnat de catre

Consiliul Raional Nisporeni, ca Autoritate Publică Locală, str. Ioan Vodă nr.2, Nisporeni, Republica Moldova, cod poștal MD-6401, cod fiscal 1007601004788

pe de o parte,

și

SC"NISPROFCON "SRL, societate cu raspundere limitata, str. Sfintul Petru 1, Nisporeni, Republica Moldova, cod postal MD-6401, cod fiscal 1003609010608
(‘Antreprenor’)

pe de alta parte,

au convenit asupra urmatoarelor clause:

PROIECT: Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră

(1HARD/3.1/47)

TITLUL CONTRACTULUI: Constructia drumului L401(de la R10 la Manastirea Varzaresti)
Număr de identificare NS01

Întrucât Autoritatea Contractantă ar dori ca Antreprenorul să execute următoarele lucrări:
Constructia drumului L401 (de la R10 pana la Manastirea Varzaresti): 3.115 km drum reabilitat
format din 3 portiuni de drum situat in raionul Nisporeni, cu urmatoorii indicatori tehnici:

- Indicatori tehnici:
- Lungime drum: 3.115km
- Categoria de drum: V
- Număr de benzi: două
- Lățimea drumului sec I: 5,5 m
- Latime drum sec II: 6,00 m
- Lățimea drumului secția III: 4,5 m
- Latime banchet: 1 m
- Dotarea ramurilor: 19 buc/m2
- Montare borduri: 2400 metri liniari
- Construire trotuare: 502/m2
- Montare stalpi metalici cu panouri fotovoltaice -23 buc
- Construire platforme containere -7 buc

- Instalarea unui punct telefonic cu conectivitate Wi-Fi

și a acceptat oferta Antreprenorului pentru execuția și finalizarea lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni ale acestora.

Prin prezenta s-a convinit la următoarele clauze:

- (1) În prezentul Contract, cuvintele și expresiile vor avea semnificațiile care le sunt atribuite în condițiile contractuale stabilite mai jos.
- (2) Următoarele documente vor fi considerate a fi formate, citite și interpretate ca parte a prezentului Contract, în următoarea ordine de prioritate:
- (a) Contractul,
 - (b) Condițiile speciale,
 - (c) Condițiile generale,
 - (d) defalcarea prețului forfetar,
 - (e) Specificațiile tehnice și/sau de performanță,
 - (f) documentația de proiectare (desene),
 - (g) orice alte documente care fac parte din Contract.

Documentele care compun prezentul contract sunt considerate a fi reciproc explicative; în cazuri de ambiguitate sau divergență, acestea vor prevala în ordinea în care apar mai sus. Actele adiționale vor avea ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică.

- (3) Având în vedere plățile care urmează să fie efectuate de către Autoritatea Contractantă către Antreprenor, așa cum se menționează în continuare, Antreprenorul se obligă să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze defecțiunile acestora în deplină conformitate cu prevederile Contractului.
- (4) Prin prezenta, Autoritatea Contractantă este de acord să plătească Antreprenorului, pentru executarea și finalizarea lucrărilor și remedierea defecțiunilor acestora, suma de:
- Valoarea contractului (fara TVA/alte taxe) 889993,00 EUR
 - TVA si alte taxe 0 EUR
 - Valoarea contractului Opt sute optzeci și nouă de mii nouă sute nouăzeci și trei EUR
 - Termenul de valabilitate a contractului 31 decembrie 2022.

sau orice altă sumă care poate deveni plătită în conformitate cu prevederile Contractului, la momentele și în modul prevăzute de Contract. TVA va fi plătită în conformitate cu reglementările obligatorii, legislația națională și acordurile internaționale privind execuția proiectului. TVA și alte taxe nu se plătesc pentru fondurile provenite din fonduri UE.

Drept pentru care părțile au semnat Contractul. Prezentul Contract va intra în vigoare la data la care este semnat de ultima parte, respectiv Antreprenorul.

Realizat în limba engleză în trei originale: un original pentru Autoritatea Contractantă, unul original pentru Comisia Europeană și unul original pentru Contractant.

Contractant**Autoritatea Contractanta**Nume **SC"NISPROFCON "SRL**Nume **Consiliul Raional Nisporeni**Persoana **Pavel GUTANU**Persoana **Vasile MARCUTA**Semnatur
aSemnatur
aData **15 decembrie 2021**Data **15 decembrie 2021**

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul nr. 01 din ” 12 „aprilie 2022
2022-0000000437

Servicii de reparație în proiectul “ Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră” 1HARD/3.1/47

Prezentul acord este semnat astăzi ”19„decembrie 2022, între Consiliul raional Nisporeni, în persoana președintelui d. Vasile Mărcuță și SC „ Nisprofcon SRL, în persoana directorului d. Pavel Gutanu, în scopul modificării Contractului nr. 01 din ”12”aprilie 2022(denumit în continuare Contract.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului cu suma de 2663130,50(Două milioane șase sute șazeci și trei mii una sută treizeci)lei 50 bani
2. După modificare suma contractului constituie 20417333,86 (Douăzeci milioane patru sute șaptesprezece mii trei sute treizeci și trei) lei 86 bani.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL/PRESTATORUL

SC „ Nisprofcon SRL
Director Pavel Gutanu

Digitally signed by Gutanu Pavel
Date: 2022.12.19 14:08:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Consiliul raional Nisporeni
Președinte Vasile Mărcuță

Digitally signed by Mărcuță Vasile
Date: 2022.12.19 14:00:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 28 iunie 2023

privind lucrarea „Construcția drumului L401 cu lungimea de 3,115 km (de la R10 până la mănăstirea Vărzărești)” executată la obiectul „Construcția drumului L401 cu lungimea de 3,115 km de la R10 până la mănăstirea Vărzărești)” în cadrul contractului nr. 02 din 12 decembrie 2022 încheiat între Consiliul raional Nisporeni și SC „NISPROFCON ” SRL pentru lucrările de „Construcția drumului L401 cu lungimea de 3,115 km (de la R10 până la mănăstirea Vărzărești)”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.04.din 07 mai 2021, eliberată de primăria comunei Vărzărești _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 iunie 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei: Vasile MĂRCUȚĂ – președintele raionului

Membrii comisiei: Iurie STAMATI - șef interimar Secția CDT

Fiodor ZAGAICIUC – responsabil tehnic

Vitalie SPATAR - arhitectul raionului Nisporeni

Vitalie LAZĂR – manager de proiect

Sergiu MARIAN – ofițer superior auto de stat a Inspectoratului de Poliție Nisporeni

Tudor POPA – diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Iurie PERTU – diriginte de șantier;

Victor GURULEA – diriginte de șantier

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Construcția drumului L401 cu lungimea de 3,115 km (de la R10 până la mănăstirea Vărzărești)”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate integral și de calitate satisfăcătoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Construcția drumului L401 cu lungimea de 3,115 km (de la R10 până la mănăstirea Vărzărești)”

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 6052304278, 6052405503, 6052407632, adresa poștală raionul Nisporeni satul Vărzărești, destinația drumuri.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28 iunie 2023 la 12⁰⁰ în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Vasile Mărcuță

Membri: Iurie STAMATI

Fiodor ZAGAICIUC

Vitalie SPATAR

Vitalie LAZĂR

Sergiu MARIAN

Tudor POPA

10. Lucrarea la obiectul „Construcția drumului L401 cu lungimea de 3,115 km (de la R10 până la mănăstirea Vărzărești)” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2023

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2023

L.S.

(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

1. Piesele din documentația scrisă și desenată sunt complete.



Președintele comisiei

Responsabil tehnic




Vasile MĂRCUȚĂ

Fiodor ZAGAICIUC

Lista pieselor lucrărilor în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

1. Așa lucrare lipsește.

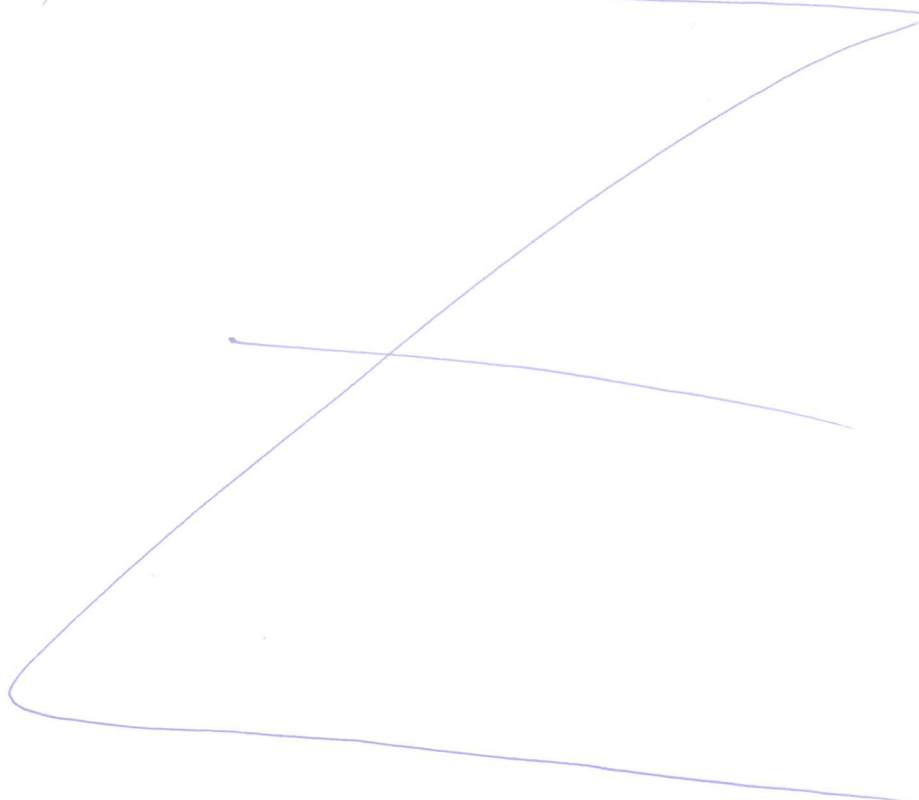

Președintele comisiei

Responsabil tehnic



Vasile MĂRCUȚĂ

Fiodor ZAGAIUC



REPUBLICA MOLDOVA
PREȘEDINTELE RAIONULUI NISPORENI



MD —6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2, tel/fax (264) 2-22-91, e_mail:
craional@mail.ruweb: www.nisporeni.md

nr 87
din 19 iulie 2023

Scrisoare de recomandare

Consiliul Raional Nisporeni, în calitate de beneficiar a lucrărilor executate de antreprenorul SC "Nisprofcon" SRL, la obiectul: **"Construcția drumului L401 (de la R10 la Mănăstirea Vărzărești)"**. Proiectul a fost realizat conform prevederilor contractuale fără dificultăți și abateri. În procesul realizării proiectului, personalul administrativ și ingineresc a demonstrat competență și performanță în domeniu, responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite și flexibilitate în luarea deciziilor.

Consiliul Raional Nisporeni, recomandă spre colaborare SC "Nisprofcon" SRL, fiind o companie ce corespunde tuturor cerințelor de performanță în executarea cu succes a proiectelor de construcții.

Cu respect,

Președintele raionului



Vasile MARCUȚA

Ex. Stamati Iurie

Tel: 0264 2-20-88
