

FORMULARUL F3.9

„GALICUS” SRL

denumirea, numele


EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **”Măsură de Eficiență Energetică la grădinița de copii Andries din s. Izbiște r-nul Criuleni.”**
Numărul și data contractului: **Nr. 7/15 din 11/02-2015**
2. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Izbiște**
Adresa beneficiarului: **s. Izbiște r-nul Criuleni.**
Țara: **Republica Moldova**
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **contractant unic, antreprenor general, ”Galicus S.R.L.”**
4. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
a) inițială / **1 909 014,81 lei moldovenești TVA** /
(la data semnării contractului):
b) finală / **1 998 000,00 lei moldovenești TVA** /
(la data finalizării contractului)
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
6. Durata de execuție a lucrării (luni)
a) Contractată **3 luni**
b) efectiv realizată **8 luni**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost**
7. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**

Administrator

GALICUS” SRL


Casap Iurie





ACHIZITII PUBLICE

“11” februarie 2015



s.Izbiste
(municipiu, oraș, județ)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 7/15

privind achiziția prin Licitație Publică

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 17/15 din 04.02.2015, între Primăria Izbiste, cu sediul în s.Izbiste r-nul Criuleni (denumirea autorității contractante) telefon: 024867236, fax: 024867238, e-mail: ion.plamadala81, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 232978 din “27” iulie 2011, reprezentat prin Pământăla Ion, Primar (localitatea)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Galicus” (numele, prenumele și funcția conducătorului) cu sediul în mun.Chisinau str str.Negruzzi 2, telefon/ fax: 022 83 67 11 mob. 068 155 455 (denumirea operatorului economic)

e-mail: casap@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0103142 din “27” septembrie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizarea nr. AMMII 038862 din “18” ianuarie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 2 ani, prelungită până “18” ianuarie 2017 pentru genurile de activitate: construcții de clădiri, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări; inclusiv - ...3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor.
3.1. Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge; 3.2. Izolații termice; 3.3. Izolații anticorozive;
4. Lucrări de finisare a construcțiilor; 4.1 Tencueli, placaje exterioare și interioare; 4.2 Pardoseli; 4.3 Produse de tencuială;... și a reprezentat prin Casap Iurie, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.. (numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Masuri de Eficiența Energetică la grădinița de copii Andries din s.Izbiste (descrierea succintă),

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare



Galican

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar, și ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală;
 - f) întârzierea finanțării.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod sistematic și va asigura suportul financiar necesar. Cheltuielile suplimentare generate în urma condițiilor de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1.909.014,81 lei (un milion nouă sute și nouă mii paisprezece lei, 81 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, în baza proceselor verbale de îndeplinire a lucrărilor.
- 4.3. Beneficiarul va efectua un transfer sub formă de avans la demularea lucrărilor în mărime de pînă la 10% din valoarea totală a contractului.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se petrece din cauze diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul verbal de recepție finală nu va fi



13.8. Beneficiarul legal.

prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărțurisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil 31.12.2017

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:



Adresa: s. Izbiște, r-nul Criuleni
Tel./Fax: 0248 67 236/0248 67 238
Denumirea: Ministerul Finanțelor, Trezoreria
Băncii: Teritorială Criuleni
Adresa: Or. Criuleni
Băncii: Or. Criuleni
Cod Bancar: TREZMD2X
226629
Cont de decontare: 230100000002002
Cod fiscal: 1007601009587

“ ANTREPRENOR”:


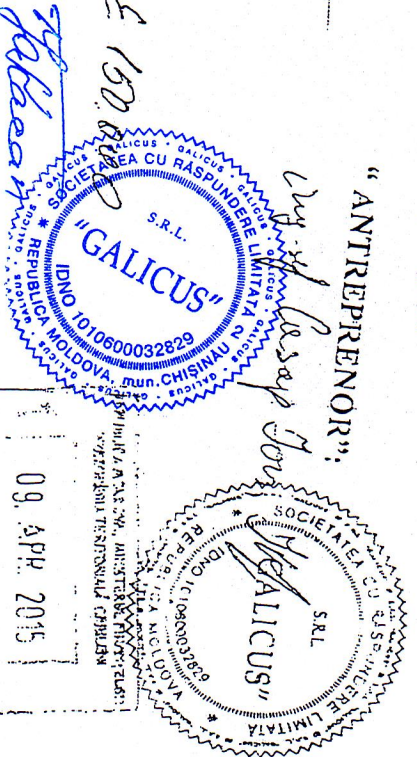
Adresa: mun. Chișinău str. Negruzzi 2,
MD.2001, of.401 A
Tel./Fax: 022.83 67 11
Denumirea: Moldincombank SA
Băncii: fil. Giocana
Adresa: Mun. Chișinău, str. Mircea cel
Bătrîn 30
Cod Bancar: MOLDMD2X349
Cont de decontare: 2251849164
Cod fiscal: 1010600032829


16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

“ ANTREPRENOR”:



IDNO 1010600032829
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
“GALICUS” S.R.L.
mun. CHIȘINĂU, str. Negruzzi 2, MD.2001
REPUBLICA MOLDOVA

09. APR. 2015


PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 10 decembrie 2015

Privind lucrarea Măsuri de eficiență Energetică la
grădinița de copii "Andrieș" din s. Yediste 35 Craiova
Executată la obiectul _____

În cadrul Contractului nr. 7/15 din 14.02.2015 pentru lucrările de _____

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, valabilă până la _____ eliberată de _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ din 10.12.2015 fiind formată din:

Plămădeală Ion Președintele comisiei
Membrii comisiei:


Dăuț Ț Dorina - directorul grădiniței
Potaru Nicolae - responsabil tehnic
Stanke Olga - contabile șef
Calanuc Ștefănel - inginer cadastre

3. Au mai participat la recepție:

Cosap Ion - ing. șef SRL "Galicus"
Ion Vlănică - expert de proiect IEE

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată sunt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista - anexă nr. 2 nu au fost executate
- 3) În lucrările, cuprinse lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat proiectului.



de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor și executarea

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
exploatarea obiectului după finalizarea

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un

total de 5 file, a fost încheiat astăzi 10.12.2015 la 19:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:


Președinte: Plămăcșală Ion

Membrii: Duță Dorina

Potaru Nicolae

Șteflea Dora



Călanuț Teodoru



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Lucrarea

10. Lucrarea _____
" _____"
_____ 2014

Acte de executare Euro normă la proiectele de copii. Actele și din 5 este



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

10 12 2015
L.S. _____
Semnătura

Semnătura

Semnătura

Proces-verbal privind finalizarea lucrărilor

Fondul pentru Eficiență Energetică

PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Data: 10 decembrie 2015

Acord de finanțare nr.: 02/03 din 22.12.2014

Denumirea agentului economic: S.R.L. „Galicus”













Tipul contractului de antrepriză: Măsuri de Eficiență Energetică la grădinița de copii „Andrieș” din s. Izbiște, r-nul Criuleni

Data inițierii lucrărilor: 13 aprilie 2015

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este „10” decembrie 2015. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani și începe pe data de „10” decembrie 2015.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în care o anumită lucrare necesită responsabilitatea de remedieri sau corectări nu este inclusă în lista atașată, Agentul economic nu va fi scutit de documentația de proiect.

Agentul economic va efectua toate remediile defecțate în termen pînă la data de 30 decembrie 2015.

<u>Cașapă Ion,</u> Agent economic			<u>10.12.2015</u> Data
<u>Plăușă Leoluța Ion</u> Beneficiar			<u>10.12.2015</u> Data
<u>Rotaru Niccolae</u> Proiectant (după caz)			<u>10.12.2015</u> Data
<u>Ion Mădăruș</u> Responsabil tehnic			<u>10.12.2015</u> Data
<u>Jenăuș Nicolae</u> Consultant tehnic			<u>10.12.2015</u> Data
<u>Jenăuș Nicolae</u> Expert proiect Fond			<u>10.12.2015</u> Data
_____ Director executiv Fond	_____ Semnătură	_____ Semnătură	_____ Data

(Autorizate prin ștampila tuturor entităților responsabile)

