



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ №. 6 inv-03/2022

or.Florești

28 martie 2022

„FLOREȘTI-GAZ” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în or.Florești, str.Ștefan cel Mare, 75, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003607001275, în persoana directorului, d-nul Groza Sergiu, care acționează în baza Statutului și „Efect-gas” SRL numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun.Chișinău, str. Igor Vieru 8 ap.11, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1011600042159, în persoana directorului d-na Mironov Veronica care acționează în baza Statutului, reprezentată de către Tessa Mihail, născut la data de 13.11.1985, titularul buletinului de identitate seria/număr B48082272, eliberat la data de 22.10.2020 de către Agenția Servicii Publice, în baza procurii nr.11 din 28.03.2022, ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denumiți în continuare **Părți**) au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul Contractului

- 1.1 Prin prezentul contract **Antreprenorul** se obligă să efectueze **Beneficiarului** lucrări de construcții (în continuare **Servicii**) a obiectului: „**Gazificarea satului Rublenița din r.Soroca**”, iar **Beneficiarul** se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.
- 1.2 Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul și Ordinea de efectuare a plăților

- 2.1. Prețul, pentru serviciile acordate în corespundere cu pct. 1.1. din prezentul Contract, constituie **1 679 979,10 lei inclusiv TVA (un milion șase sute șaptezeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și nouă lei, 10 bani)**.
- 2.2. Plata serviciilor conform prezentului Contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului**. Data efectuării transferului din contul **Beneficiarului** în contul **Antreprenorului**, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al **Antreprenorului**.
- 2.3. Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către Beneficiar în termen de **90 (nouăzeci)** zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care „Beneficiarul” are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul Antreprenorului.
- 2.4. **Beneficiarul** poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform gradului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate, în caz de necesitate și cu folosirea mijloacelor tehnice. Beneficiarul este obligat în termen de 5 zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către Antreprenor, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Beneficiarul întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în formă scrisă, în termenul indicat mai sus.
- 2.5. Beneficiarul efectuează plata pentru munca prestată în termen de 90 de zile lucrătoare după semnarea actului privind lucrări efectuate sau din momentul expirării termenului de semnare, dacă nu a parvenit refuzul întemeiat.

Beneficiar
Director  Groza S.


Antreprenor
Director  Mironov V.


- 2.6. Achitarea se efectuează prin transferul mijloacelor bănești în contul curent al Antreprenorului, indicat în prezentul contract.
- 2.7. Părțile se obligă să informeze în formă scrisă despre schimbarea contului sau a altor date aferente achitării conform prezentului contract.

3. Termenul Contractului

- 3.1. Termenul de executare a lucrărilor conform prezentului contract constituie **150** (una sută cincizeci) zile calendaristice din data semnării contractului.
- 3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră data semnării de către părți a Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate fără obiecții. Dacă Actul este semnat cu obiecții, momentul finisării lucrărilor se consideră data semnării Actului de înlăturare a neajunsurilor.
- 3.3. Prezentul contract este valabil pînă la executarea de către părți a obligațiunilor prevăzute în acesta.

4. Calitatea Obiectului Contractului

- 4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.
- 4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare.
- 4.3. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 2 ani. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlătore din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Perioada de garanție începe din ziua semnării Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

5. Drepturile și Obligațiunile Beneficiarului

5.1. Drepturile Beneficiarului:

- 5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.
- 5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.
- 5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor la necesitate în caz de neexecutare calitativă.

5.2. Obligațiunile Beneficiarului:

- 5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.
- 5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.
- 5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.
- 5.2.4. Să recepționeze lucrările efectuate în ordinea stabilită.

Beneficiar
Director _____ Groza S.



Antreprenor
Director _____ Mironov V.



6. Drepturile și Obligațiunile Antreprenorului

6.1. Drepturile Antreprenorului:

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plățile, prevăzute de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate.

6.2. Obligațiunile Antreprenorului:

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul pînă la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în prezentul contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.
- 6.2.5. Să participe împreună cu Beneficiarul la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în prezentul contract.
- 6.2.6. Să întocmească, în prezența persoanei responsabile pentru obiect din partea Beneficiarului la momentul transmiterii lucrărilor intermediare, un act în formă scrisă cu privire la lucrările efectuate, cu indicarea materialelor folosite la construcția obiectelor.
- 6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele pînă la finisarea efectuării achitărilor.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor cînd astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.

7. Reponsabilitatea Părților

- 7.1. În cazul încălcării prevederilor prezentului contract părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a RM.
- 7.2. Fiecare parte este obligată să urmărească și să informeze partea opusă despre încălcarea prevederilor contractului.
- 7.3. Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi care depășește termenul final de predare a obiectului, stabilit în prezentul contract.
- 7.4. Pentru înlăturarea cu întârziere a neajunsurilor, care au fost depistate în perioada termenului de garanție pentru exploatarea obiectului, Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1% din prețul lucrărilor de înlăturare a neajunsurilor pentru fiecare zi de întârziere.
- 7.5. Partea care a încălcat prezentul contract compensează părții opuse toate daunele care au fost cauzate ca urmare a încălcării contractului.
- 7.6. Dacă situațiile de forță majoră împiedică executarea prevederilor prezentului contract sau duc la întârzierea executării de către oricare dintre părți, partea este exonerată de executarea obligațiunilor, dar doar pe perioada cînd situațiile de forță majoră (cutremure de pămînt, inundații, alunecări de teren, etc.) au efect asupra executării obligațiunilor. Partea care nu poate executa obligațiunea din cauza situațiilor de forță majoră, este obligată să anunțe partea opusă prin telex, fax sau altă modalitate în termen de 24 de ore, prezentînd în termen de 30 de zile un document eliberat de Camera de Industrie și Comerț sau de un alt organ împuternicit, care atestă existența a astfel de circumstanțe.

Beneficiar
Director _____ Groza S.


Antreprenor
Director _____ Mironov V.


7.7. Riscul deteriorării accidentale a obiectului contractului pînă la transmiterea acestuia îl poartă Antreprenorul. Acest risc trece către Beneficiar odată cu recepționarea lucrărilor.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul comun al părților în conformitate cu legislația în vigoare.
8.2. Partea interesată înaintează o propunere cu privire la rezilierea contractului în formă scrisă ceilalte părți, care este obligată să o examineze în termen de 20 zile.
8.3. În cazul acordului ceilalte părți rezilierea contractului se efectuează în baza unui act bilateral în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor efectuate de fapt de către Antreprenor;
- lista documentelor de executare care a fost transmisă Beneficiarului;
- lista și costul patrimoniului Beneficiarului, care nu a fost utilizat de către Antreprenor în timpul efectuării lucrărilor la obiect;
- obligațiunile de garanție, stabilite în prezentul contract sau de legislație în vigoare, pentru lucrările recepționate de către Beneficiar și menționate în actul de reziliere a contractului;
- alte obligațiuni ale părților ce țin de rezilierea contractului.

8.4. Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă:

- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult decât o dată) a admis executarea necalitativă a lucrărilor;
- în cazul încălcării de către Antreprenor a termenului de efectuare a lucrărilor prevăzute în prezentul contract.

8.5. Antreprenorul se obligă să înceteze lucrările din momentul primirii avizului de către Beneficiar cu privire la rezilierea contractului.

8.6. Beneficiarul nu este obligat să achite pentru lucrările, care au fost efectuate după recepționarea avizului de către Antreprenor cu privire la rezilierea contractului.

8.7. În cazul apariției necesității de executare a lucrărilor pentru asigurarea păstrării obiectului nefinisat Antreprenorul se obligă să le efectueze în termenul convenit. Cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor respective sunt suportate de partea din a cărei inițiativă se reziliază contractul.

9. Transmiterea și Recepționarea Obiectului

9.1. Recepționarea obiectului se efectuează conform cerințelor Legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr.285 din 23.05.1996 și altor acte normative.

10. Soluționarea Litigiilor

10.1. Toate litigiile care apar la executarea prezentului Contract se soluționează de comun acord a părților, iar în cazul imposibilității găsirii unui acord comun prin adresarea în Instanța de Judecată a R.M., cu respectarea normelor dreptului material al Republicii Moldova.

11. Dispoziții Finale

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

11.2. Nu se admit modificări, completări, excluderi a prevederilor prezentului Contract.

Beneficiar
Director  Groza S.


Antreprenor
Director  Mironov V.


11.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a republicii Moldova.

11.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a prezentului Contract.

12. Rechizitele și Semnăturile Părților

Rechizitele Beneficiarului:

Adresa poștală: MD5001,
MD5001, Republica Moldova,
or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 75.
Cod fiscal: 1003607001275
Cont de decontare:
MD79VI022240200000032MDL
BC „VICTORIABANK” SA
Cod: VICBMD2X709

«BENEFICIAR»
S.R.L. „FLOREȘTI-GAZ”
director
Groza Sergiu



Rechizitele Antreprenorului:

Adresa poștală: MD2075,
Republica Moldova,
mun. Chișinău str. Igor Vieru 8 ap.11
Cod fiscal: 1011600042159
Cont de decontare:
MD62ML000000002251829186
BC "Moldinconbank" S.A. fil. Invest
Cod: MOLDM2X329

«ANTREPRENOR»
S.R.L. „EFECT GAS”
director
Mironov Veronica



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărinăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca

(denumirea și adresa obiectului)

„25” 08 2022

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar**

SRL "Florești gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Mihai Tessa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Grosu Serghei SRL „Florești Gaz” filiala Soroca

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Caraman P. reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul **„Efect Gas” SRL** , a prezentat pentru recepție: **Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø75x6,8mm L=185,0m; Ø63x5,8mm L=770,0m; Ø40x3,7mm L=100,0m; Ø32x3,0mm L=10,0m. Ot Ø32x3,0mm L=4,0m; Ø25x2,8mm L=1,0m. Robinet sferic cu flanșe Ø32mm – 4buc; Ø25mm – 1buc.**

Gazoductul de presiune medie supraterran Ot Ø32x3,0mm L=4,0m; Ø25x2,8mm L=1,0m

(componenta obiectului)

2.Proiectul № **10/07-0820-AGE** a fost elaborat de **SRL „Metan-K” an 2020**

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din ” **25 august** ” **2020** cu numărul **328**

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **05 aprilie** **2022** și s-au

(luna,anul)

terminat la **20 august** **2022**.

(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile:**

M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărinăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de execuție se anexează)

din „ ” 2022

Președintele Comisiei, beneficiar

Groza Sergiu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Mihai Tessa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Spitca Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Grosu Serghei /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Caraman Pavel /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărinăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca

(denumirea și adresa obiectului)

„28” 08 2022

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar**

SRL "Florești gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Mihai Tessa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Grosu Serghei SRL „Florești Gaz” filiala Soroca

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Caraman P. reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul **„Efect Gas” SRL** , a prezentat pentru recepție: **Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø90x8,2mm L=77,0m; Ø75x6,8mm L=90,0m; Ø63x5,8mm L=57,0m; Ø50x4,6mm L=1280,0m; Ø40x3,7mm L=1810,0m; Ø32x3,0mm L=1085,0m. Oț Ø89x3,5mm L=6,0m; Ø76x3,0mm L=2,0m; Ø57x3,0mm L=1,0m; Ø20x2,8mm L=268,0m. Robinet sferic cu flanșe Ø80mm –3buc; Ø76mm –1buc; Ø57mm – 1buc; Gazoductul de presiune joasă supraterran Oț Ø57x3,0mm L=67,0m; Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 134buc.**

(componenta obiectului)

2.Proiectul № **10/07-0820-AGE** a fost elaborat de **SRL „Metan-K” an 2020**

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din ” **25 august** ” **2020** cu numărul **328**

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **05 aprilie 2022** și s-au terminat la **20 august 2022**.

(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărinăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca**

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează) din „ ” 2022

Președintele Comisiei, **beneficiar**

Groza Sergiu

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Mihai Tessa

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Spitca Ion

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Grosu Serghei

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Caraman Pavel

(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărincăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca
(denumirea și adresa obiectului)

25 08 2022

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** SRL "Florești gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Mihai Tessa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Grosu Serghei SRL „Florești Gaz” filiala Soroca
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Caraman P. reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.5 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu)
(componența obiectului)

2.Proiectul № 10/07-0820-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2020
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 25 august ” 2020 cu numărul 328
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 05 aprilie 2022 și s-au terminat la 20 august 2022.
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA-COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelilor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărincăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca**
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2022

Președintele Comisiei, beneficiar Georgiana Sergiu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Mihai Tessa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare Spăla Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Grosu Serghei /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Caraman Pavel /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărinăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca
(denumirea și adresa obiectului)

„25” 09 2022

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** SRL "Florești gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Mihai Tessa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Grosu Serghei SRL „Florești Gaz” filiala Soroca
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Caraman P. reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție PRG Nr.2 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu)
(componenta obiectului)

2.Proiectul № 10/07-0820-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2020
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 25 august ” 2020 cu numărul 328
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 05 aprilie 2022 și s-au terminat la 20 august 2022.
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărinăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca**
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2022

Președintele Comisiei, beneficiar Groza Sergiu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Mihai Tessa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare Spitcă Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Grosu Serghei /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Caraman Pavel /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărinăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca
(denumirea și adresa obiectului)

„15” 09 2022

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** SRL "Florești gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Mihai Tessa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Grosu Serghei SRL „Florești Gaz” filiala Soroca
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Caraman P. reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.3 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu)
(componenta obiectului)

2.Proiectul № 10/07-0820-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2020
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 25 august ” 2020 cu numărul 328
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 05 aprilie 2022 și s-au terminat la 20 august 2022.
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărinăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca**
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2022

Președintele Comisiei, beneficiar Groza Sergiu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Mihai Tessa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare Spitca Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Grosu Serghei /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Caraman Pavel /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vârâncăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca
(denumirea și adresa obiectului)

„25” „08” 2022

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** SRL "Florești gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :
Reprezentantul antreprenorului , directorul Mihai Tessa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Grosu Serghei SRL „Florești Gaz” filiala Soroca
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Caraman P. reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.1 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două reglatoare tip ERG-SE – 50(dublu)
(componenta obiectului)

2.Proiectul № 10/07-0820-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2020
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 25 august ” 2020 cu numărul 328
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 05 aprilie 2022 și s-au terminat la 20 august 2022.
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelilor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vârâncăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca**
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2022

Președintele Comisiei, beneficiar Groza Sergiu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Mihai Tessa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare Spicu Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Grosu Serghei /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Caraman Pavel /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărinăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca
(denumirea și adresa obiectului)

„25” 08 2022

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** SRL "Florești gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Mihai Tessa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Grosu Serghei SRL „Florești Gaz” filiala Soroca
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Caraman P. reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.4 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu)
(componenta obiectului)

2.Proiectul № 10/07-0820-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2020
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 25 august ” 2020 cu numărul 328
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 05 aprilie 2022 și s-au terminat la 20 august 2022.
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelilor de distribuție gaze naturale presiune medie și joase pe străzile: M.Sadoveanu, Luceafărul, Trandafirilor, Viilor, Vărinăului, Ștefan cel Mare sectorul cu nr.cadastral 7845109 din s.Rublenița r-nul Soroca**
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2022

Președintele Comisiei, beneficiar Groza Sergiu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Mihai Tessa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare Spitca Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Grosu Serghei /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Ruslan DEMIȘCAN /
(semnătura, numele, prenumele)
Șef adjunct

CONTRACT – MODEL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23 privind achiziția prin Cererea ofertelor de preturi (COP)

„ 08 ” august 2023

Orhei
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1689247608228 din data 13 iulie 2023, între IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei,
(denumirea autorității contractante)
cu sediul în Orhei srt. V.Lupu 13 telefon: 0.235.2.34.73, fax: _____,
(localitatea)

IDNO: 1012620010900 reprezentat prin Director L.Hacina,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Efect Gas,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Chisinau str. Igor Vieru 8-11,
(localitatea)
telefon: 069557876 ; 069527989, fax: _____, IDNO 1011600042159
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „ _____ ” _____ 20____,
eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat prin Iurie Tesa - Administrator,
(numele și funcția conducătorului)
în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* „ Anexa la consrtuctia existenta pentru centrala termica autonoma la Liceul teoretic Alecu Russo Orhei „ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor_____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 954 879.54 (Unu milion noua sute cincizeci și patru mii opt sute șaptezeci și noua lei 54 bani)** lei MD, inclusiv

325 813.26 (Trei sute douăzeci și cinci mii opt sute treisprezece lei 26 bani) TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult

15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 3.48.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 3.68.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 3.78.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 3.88.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 4.3 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.
- 4.4 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 4.5 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție

împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 5.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data

rezoluțiunii contractului.

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

3.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

3.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

3.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

3.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023** /recepția finală a lucrărilor

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL Efect Gas

Adresa poștală: mun. Chisinau str. Igor Vieru 8/11
Telefon: 069557876
Cod fiscal: 1011600042159
Banca: BC Moldindconbank SA fil. Invest
Cod: MOLDMD2X329
IBAN: MD62ML000000002251829186

BENEFICIARUL

IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei

Adresa poștală: Orhei srt. V. Lupu 13
Telefon: 0.235.2.34.73
Cod fiscal: 1012620010900
Banca: Ministerul Finantelor Trez de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD81TRPDAC311120A13655AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Tesa Iurie
Date: 2023.08.08 16:59:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Hacina Lilia
Date: 2023.08.08 11:19:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Tabac Octeabrina
Date: 2023.08.24 16:51:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
Din „____” ____ 20____

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1					
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Tesa Iurie
Date: 2023.08.08 17:00:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări “ Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei din str. V.Lupu 13 mun. Orhei “	45000000-7	lucrari	1	1 954 879.54	1 954 879.54	31.12.2023
	TOTAL				1 954 879.54	1 954 879.54	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Tesa Iurie
Date: 2023.08.08 17:02:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACTUL

comisiei de lucru privind recepția utilajului pentru
efectuarea încercării în complex

din "14" 11 2023 strada Vasile Lupu 13 or. Orhei
(amplasamentul obiectului)

Comisia de lucru nominalizată de IP LT „Alec Russo”
(denumirea organizației-beneficiar)

prin decizia din " " 2023 nr.
în următoarea componență:

Președinte, reprezentant al beneficiarului (investorului)

L. Hacina - director

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei, reprezentanți ai:

organizației de montare Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare Godoroja Sergiu SRL „Orhei gaz”

(numele, prenumele, funcția)

proiectantului general Tesa Iurie SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

organului de Stat pentru supraveghere antiincendiară

(numele, prenumele, funcția)

Agencia pentru Supraveghere Tehnică (AST) Anatii Liudmila

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul SRL „Efect Gas”

(denumirea organizației)

a prezentat pentru recepție următorul utilaj Gazoductul interior de presiune joasă ($P_{max} = 250 \text{ mm col. H}_2\text{O}$); $\varnothing 219 \times 4,0 - 2,5 \text{ m}$; $\varnothing 108 \times 4,0 - 5,5 \text{ m}$; $\varnothing 57 \times 3,5 - 4,0 \text{ m}$; Conducta de purjare $\varnothing 25 \times 2,8 \text{ mm} - 4,0 \text{ m}$; Robinet cu bilă cu flanșe: $\varnothing 100 - 1 \text{ buc}$; Robinet cu bilă cu mușe: $\varnothing 50 - 2 \text{ buc}$; $\varnothing 25 - 1 \text{ buc}$; $\varnothing 15 - 1 \text{ buc}$; Clapetă de siguranță cu flanșe $\varnothing 100 - 1 \text{ buc}$; Cazan cu tiraj forțat ECODENSE FTC-X $Q = 456 \text{ KW} - 2 \text{ un}$

(lista utilajelor, caracteristica tehnică succintă)

montat în „Centrala termică autonomă, amplasat în strada Vasile Lupu 13, or. Orhei”

(denumirea clădirii, construcției, secției)

care face parte din IP LT „Alec Russo”

(denumirea întreprinderii, succesiunea dării în exploatare,)

2. Lucrările de montare au fost efectuate de SRL „Efect Gas”

(denumirea organizației)

3. Documentația de proiect a fost elaborată de SRL „Efect Gas”

(denumirea organizației de proiectare)

Data începerii lucrărilor de montare: septembrie 2023

(luna, anul)

Data finalizării lucrărilor de montare: noiembrie 2023

(luna, anul)

Comisia de lucru a efectuat următoarele încercări suplimentare (cu excepția încercărilor stipulate în documentația executorie prezentată de către antreprenor):

nu sunt

(denumirea lucrărilor)

DECIZIA COMISIEI DE LUCRU:

1. Lucrările de montare a utilajului prezentat au fost efectuate în conformitate cu proiectul, standardele, normele și regulile de construcție, condițiile tehnice și corespund cerințelor de recepție pentru încercările în complex ale acestuia.

2. Utilajul prezentat pentru recepție, indicat în poziția 1 a prezentului act, se consideră admis pentru încercarea în complex din „14”, 11 2023.

3. Până a începe lucrările de încercare în complex este necesar a obține la AST permisul tehnic pentru efectuarea lucrărilor de reglare.

4. După finalizarea încercărilor în complex obiectivul va fi prezentat pentru punere în exploatare în conformitate cu Legislația Republicii Moldova.

Președintele comisiei de lucru

(semnătura)

/ L.Hacina /
(F.I.O.)

Membrii comisiei de lucru:

(semnăturile)

/ Iurie Tesa /
(F.I.O.)

(semnăturile)

/ Iurie Tesa /
(F.I.O.)

(semnăturile)

/ Godoroja Sergiu /
(F.I.O.)

(semnăturile)

/ Anatii Liudmila /
(F.I.O.)

A PREDAT

Reprezentantul antreprenorului

Iurie Tesa

(semnătura)

A RECEPȚIONAT

Reprezentantul beneficiarului

L.Hacina

(semnătura)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

**Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic "Alec Russo",
din str. Vasile Lupu 13, mun. Orhei** (denumirea și adresa obiectului)

"_____" 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar L. Hacina IP Liceul Teoretic "Alec Russo"**

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului, directorul **Iurie Tesa SRL „Efect Gas”**

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul **Godoroja Sergiu SRL „Orhei Gaz ”**

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST **Anatii Liudmila reprezentant AST**

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul **„Efect Gas” SRL**, a prezentat pentru recepție: **Gazoductul**

(componenta obiectului)

**interior de presiune joasă Ot Ø57x3,5mm L=4,0m; Ø108x4,0mm L=5,5m; Ø219x4,0mm L=2,5m;
Conducta de purjare din Ot cu Ø25x2,8mm L=4,0m; Robinet sferic cu flanșe cu Ø100mm-1buc;
Robinet sferic cu mufe cu Ø15mm-1buc; Ø25mm-1buc; Ø50mm-2buc; Clapetă de siguranță cu
flanșe Ø100mm – 1buc.; Semnalizator CH4/CO – 1buc; Cazan cu tiraj forțat ECODENSE FTC-X
456KW – 2buc**

(componenta obiectului)

2. Proiectul № **484/23-AGE, AGI** a fost elaborat de **SRL „Efect gas” an 2023**

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din **” 12 iunie ” 2023** cu numărul **4973**

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **01 septembrie 2023** și s-au

(luna, anul)

terminat la **01 noiembrie 2023.**

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic
”Alec Russo”, din str. Vasile Lupu 13, mun. Orhei** (denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de execuție se anexează)

din „____” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

L. Hacina
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Godoroja Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Anatii Liudmila
(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic "Alec Russo",
din str. Vasile Lupu 13, mun. Orhei (denumirea și adresa obiectului) mun. Chișinău

"14" 11 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar** **L. Hacina** **IP Liceul Teoretic "Alec Russo"**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului, directorul **Iurie Tesa SRL "Efect Gas"**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul **Godoroja Sergiu SRL "Orhei Gaz"**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST **Anatii Liudmila reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul **"Efect Gas" SRL**, a prezentat pentru recepție: **Nod de evidență gaze**
(componenta obiectului)

cu contor cu rotor tip G40 Dresser și corector electronic nanoElcor Pintr = 3,0 kgf/cm²

2. Proiectul № **483/23-AGE, AGI** a fost elaborat de **SRL "Efect gas" an 2023**
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din "12 iunie" 2023 cu numărul **4973**
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **01 septembrie** 2023 și s-au
(luna, anul)
terminat la **01 noiembrie** 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări de construcție - montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic "Alec Russo", din str. Vasile Lupu 13, mun. Orhei** (denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din "14" 11 2023


Președintele Comisiei, beneficiar



L. Hacina

(semnătura, numele, prenumele)


Reprezentantul antreprenorului general



Iurie Tesa

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare



Iurie Tesa

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare



Godoroja Sergiu

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST



Anatii Liudmila

(semnătura, numele, prenumele)



ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic "Alec Russo",
din str. Vasile Lupu 13, mun. Orhei (denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

"14" "11" 2023
Președintele Comisiei, **beneficiar** L. Hacina **IP Liceul Teoretic "Alec Russo"**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului, directorul Iurie Tesa SRL "Efect Gas"
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Godoroja Sergiu SRL "Orhei Gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Anatii Liudmila reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul "Efect Gas" SRL, a prezentat pentru recepție: Post de reglare a presiunii
(componenta obiectului)

gazelor tip dulap cu două regulatoare tip FRG/2MBZ - 100 (dublu);

2. Proiectul № 484/23-AGE, AGI a fost elaborat de SRL "Efect gas" an 2023
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din "12 iunie" 2023 cu numărul 4973
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 01 septembrie 2023 și s-au
(luna, anul)
terminat la 01 noiembrie 2023.

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție - montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

Obiectul: **Anexă la construcția existentă pentru centrala termică autonomă, IP Liceul Teoretic "Alec Russo", din str. Vasile Lupu 13, mun. Orhei** (denumirea și adresa obiectului)

Prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se înregistrează)
din "14" "11" 2023

Președintele Comisiei, beneficiar L. Hacina
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Godoroja Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Anatii Liudmila
(semnătura, numele, prenumele)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31 privind achiziția prin COP

„31” iulie 2023

mun. Orhei
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. [ocds-b3wdp1-MD-1689419285802](#) din data **15.07.2023** între **Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”**, cu sediul în **mun. Orhei**, str. **Vasile Lupu 60/1**, telefon: **0235-24907** fax: _____, IDNO **1012620011000** reprezentat prin **Galina MELENCIUC, director instituție**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Efect gas” SRL**, cu sediul în **mun. Chișinău**, str. **Igor Vieru, 8/11**, telefon: **069557876**, fax: _____, IDNO **1011600042159** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „_____” _____ 20____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin **Iurie TESA, administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările Reparația capitală a imobilului cu nr. cadastral 6401310.123.05 cu reutilarea în centrală termică autonomă a I.P. L.T. „Ion Luca Caragiale” din str. Vasile Lupu 60/1** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 zile** după înregistrarea Contractului la Trezoreria Regională Centru și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 (cinci) ani de la semnarea Procesului verbal de finalizare a lucrărilor.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 628 164,77 (un milion șase sute douăzeci și opt mii una sută șasezeci și patru lei 77 bani)** lei MD, inclusiv 271360,80 (două sute șaptezeci și unu mii trei sute șasezeci lei 80 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, **în termen de 30 (treizeci) de zile.**

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **20 (douăzeci)** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a. un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,

b. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5%** din valoarea contractului atribuit. ***Forma garanției de execuție – se va reține succesiv din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție a contractului.***

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea

și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **15** zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de **0,1%** din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de **10 %** din suma totală a contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devizul de cheltuieli Formularul nr. 3,5,7;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL „EFECT GAS” SRL

Adresa poștală: **mun. Chișinău, str./Igor Vieru, 8/11**

Telefon: **069557876**

Cod fiscal: **1011600042159**

Banca: **BC ”Moldindconbank” S.A. fil.Invest**

Cod: **MOLDMD2X329**

IBAN: **MD62ML000000002251829186**

BENEFICIARUL

**Instituția Publică Liceul Teoretic
„Ion Luca Caragiale”**

Adresa poștală: **mun. Orhei, str. Vasile Lupu 60/1**

Telefon: **0235-24907**

Cod fiscal: **1012620011000**

Banca: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN: **MD32TRPDAC311120A13656AC**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR „EFECT GAS” SRL

Digitally signed by Tesa Iurie
Date: 2023.07.31 17:14:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Tabac Octeabrina
Date: 2023.08.24 10:17:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

**Instituția Publică Liceul Teoretic
„Ion Luca Caragiale”**

Digitally signed by Melenciuc Galina
Date: 2023.07.31 15:30:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. **31**
Din **31.07.2023**

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reparația capitală a imobilului cu nr. cadastral 6401310.123.05 cu reutilarea în centrală termică autonomă a I.P. L.T. „Ion Luca Caragiale” din str. Vasile Lupu 60/1	452000 00-9	Conform Caietului de sarcini	Conform Devizului local	
	TOTAL				

Anexa nr. 2
la Contractul nr. **31**
din **31.07.2023**

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma, lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Reparația capitală a imobilului cu nr. cadastral 6401310.123.05 cu reutilarea în centrală termică autonomă a I.P. L.T. „Ion Luca Caragiale” din str. Vasile Lupu 60/1	452000 00-9	Lucrări	1	1356803,97	1628164,77	90 zile
	TOTAL				1356803,97	1628164,77	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
„EFECT GAS” SRL

Digitally signed by Tesa Iurie
Date: 2023.07.31 17:15:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Instituția Publică Liceul Teoretic
„Ion Luca Caragiale”

Digitally signed by Melenciuc Galina
Date: 2023.07.31 15:30:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Reparația capitală a imobilului cu nr.cad.6401310.123.05 cu reutilizarea în centrală termică autonomă,
IP Liceul Teoretic "I.L. Caragiale", str.Vasile Lupu 60/1, mun.Orhei (denumirea și adresa obiectului)
mun. Chișinău

„14” 11 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar** **Galina MELENCIUC** **IP Liceul Teoretic "I.L. Caragiale"**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul **Iurie Tesa SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul **Godoroja Sergiu SRL „Orhei Gaz”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST **Anatii Liudmila reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul **„Efect Gas” SRL** , a prezentat pentru recepție: **Nod de evidență gaze**
(componenta obiectului)

cu contor cu rotor tip G40 Dresser și corector electronic nanoElcor Pintr = 3,0 kgf/cm²

2. Proiectul № **483/23-AGE,AGI** a fost elaborat de **SRL „Efect gas” an 2023**
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din „**27 aprilie**” **2023** cu numărul **4967**
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **01 septembrie** **2023** și s-au
(luna, anul)
terminat la **01 noiembrie** **2023**.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Reparația capitală a imobilului cu nr.cad.6401310.123.05 cu reutilizarea în centrală termică autonomă, IP Liceul Teoretic "I.L. Caragiale", str.Vasile Lupu 60/1, mun.Orhei**
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „**14**” **11** 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

Galina MELENCIUC
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Godoroja Sergiu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Anatii Liudmila
(semnătura, numele, prenumele)



ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Reparația capitală a imobilului cu nr.cad.6401310.123.05 cu reutilizarea în centrală termică autonomă,
IP Liceul Teoretic "I.L. Caragiale", str.Vasile Lupu 60/1, mun.Orhei (denumirea și adresa obiectului)
mun. Chișinău

„14” 11 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar Galina MELENCIUC** **IP Liceul Teoretic "I.L. Caragiale"**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul **Iurie Tesa SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul **Godoroja Sergiu SRL „Orhei Gaz ”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST **Anatii Liudmila reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul **„Efect Gas” SRL** , a prezentat pentru recepție: **Post de reglare a presiunii**
(componenta obiectului)

gazelor tip dulap cu două reglatoare tip FRG/2MBZ – 100 (dublu);

2. Proiectul № **483/23-AGE, AGI** a fost elaborat de **SRL „Efect gas” an 2023**
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din **27 aprilie ” 2023** cu numărul **4967**
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **01 septembrie 2023** și s-au
(luna, anul)
terminat la **01 noiembrie 2023.**

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Reparația capitală a imobilului cu nr.cad.6401310.123.05 cu reutilizarea în centrală termică autonomă, IP Liceul Teoretic "I.L. Caragiale", str.Vasile Lupu 60/1, mun.Orhei**
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „14” 11 2023

Președintele Comisiei, beneficiar _____ / **Galina MELENCIUC** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general _____ / **Iurie Tesa** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare _____ / **Iurie Tesa** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ / **Godoroja Sergiu** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST _____ / **Anatii Liudmila** /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Reparația capitală a imobilului cu nr.cad.6401310.123.05 cu reutilizarea în centrală termică autonomă,
IP Liceul Teoretic "I.L. Caragiale", str.Vasile Lupu 60/1, mun.Orhei (denumirea și adresa obiectului)
„14” „11” 2023 mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar Galina MELENCIUC** **IP Liceul Teoretic "I.L. Caragiale"**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul **Iurie Tesa SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul **Godoroja Sergiu SRL „Orhei Gaz ”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST **Anatii Liudmila reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul **„Efect Gas” SRL** , a prezentat pentru recepție: **Gazoductul**
(componenta obiectului)

de presiune medie suprateran din oțel Ø57x3,5mm L=6,0m; Robinet sferic cu flanșe Ø50mm – 2buc;
Gazoduct de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø63x5,8mm L=72,0m;
(componenta obiectului)

2.Proiectul № **483/23-AGE,AGI** a fost elaborat de **SRL „Efect gas” an 2023**
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din **” 27 aprilie ” 2023** cu numărul **4967**
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **01 septembrie 2023** și s-au
terminat la **01 noiembrie 2023**.
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Reparația capitală a imobilului cu nr.cad.6401310.123.05 cu reutilizarea în centrală termică autonomă, IP Liceul Teoretic "I.L. Caragiale", str.Vasile Lupu 60/1, mun.Orhei**
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „14” „11” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar _____ / **Galina MELENCIUC** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general _____ / **Iurie Tesa „Efect Gas”** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare _____ / **Iurie Tesa** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ / **Godoroja Sergiu** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST _____ / **Anatii Liudmila** /
(semnătura, numele, prenumele)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

„08” noiembrie 2023

mun.Orhei
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1697706288425](#) din data 19.10.2023, între **I.P. Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei**, cu sediul în mun.Orhei,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)
str. Vasile Mahu nr. 162, telefon: 023523634, fax: 023524654, IDNO 1008606007194 reprezentat prin **Directoare Valentina SANDUL**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL "EFECT GAS"**, cu sediul
(numele, prenumele și funcția conducătorului) (denumirea operatorului economic)
în mun. Chișinău str. Igor Vieru nr.8,ap.11, telefon: 069557876, IDNO 1011600042159, autorizat pentru
(localitatea)
activitatea în construcții: autorizația nr. 4812 din „14” martie 2017 eliberată de Camera Înregistrării de Stat ÎS, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-editare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, reprezentat prin **Director Iurie Tesa**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr. 2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe str. Vasile Lupu 11, mun. Orhei în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către

Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 139 153,65** (un milion o sută treizeci și nouă mii o sută cincizeci și trei, 65 bani) lei MD, inclusiv TVA **189 858,94** (o sută optzeci și nouă mii opt sute cincizeci și opt) lei MD.
(suma cu cifre și litere)
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.03.2024.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL "Efect Gas"

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Igor Vieru nr.8

Telefon: 069557876

Cod fiscal: 1011600042159

Banca: BC "Moldincombank" S.A.

Cod: MOLDMD2X329

IBAN: MD62ML000000002251829186

BENEFICIARUL

I.P. Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei

Adresa poștală: mun.Orhei, str. Vasile Mahu 162

Telefon: 0-235-24654

Cod fiscal: 1008606007194

Banca: MF, Trezoreria Regională

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD04TRPCCC518430E01433AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

SRL "Efect Gas"

Director

Digitally signed by Tesa Iurie
Date: 2023.11.08 11:10:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Iurie TESA



BENEFICIAR

I.P. Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei

Directoare

Digitally signed by Sandul Valentina
Date: 2023.11.08 08:28:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Valentina SANDUL



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr. 2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe str. Vasile Lupu 11, mun. Orhei	45200000-9	Conform devizelor locale (formularele 3,5,7,)	Conform devizelor locale (formularele 3,5,7,)	-----
	TOTAL	X	X	X	X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
SRL ”Efect Gas”

BENEFICIAR
I.P. Colegiul ”Vasile Lupu” din Orhei

Director

Iurie TESA

Digitally signed by Tesa Iurie
Date: 2023.11.08 11:11:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Directoare

Valentina SANDUL

Digitally signed by Sandul Valentina
Date: 2023.11.08 08:28:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Can- titat ea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lot 1 : Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr. 2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe str. Vasile Lupu 11, mun. Orhei						
1	Lucrări de soluții arhitectural - constructive	4520000-9	lucr.	1	414609,90	497531,89	<u>Efectuarea lucrărilor se vor efectua în termen de 60 (șaizeci) zile de la primirea ordinului de începere</u>
2	Lucrări de alimentare cu gaze. Conducte interior. AGI		lucr.	1	21433,40	25720,08	
3	Lucrări de soluții termomecanice SM		lucr.	1	251707,32	302048,78	
4	Lucrări de automatizarea instalațiilor termomecanice AIT		lucr.	1	69345,66	83214,79	
5	Lucrări de echipament electric interior IEI		lucr.	1	73723,79	88468,55	
6	Lucrări semnalizarea de incendiu si pază. SIP		lucr.	1	13924,12	16708,94	
7	Lucrări de alimentare cu apă și canalizare AAC		lucr.	1	7836,19	9403,43	
8	Lucrări de alimentare cu gaze. conducte exterioare AGE		lucr.	1	96714,33	116057,20	
	TOTAL	x	x	x	949294,71	1 139 153,65	x

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
SRL "Efect Gas"

BENEFICIAR
I.P. Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei

Director

Iurie TESA

Digitally signed by Tesa Iurie
Date: 2023.11.08 11:13:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Directoare

Digitally signed by Sandul Valentina
Date: 2023.11.08 08:29:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

**Construcția centralei termice autonome pentru Căminul Nr.2 a Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu",
situat pe str. Vasile Lupu 11, mun. Orhei** (denumirea și adresa obiectului)

"05" 01 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar Valentina Sandul I.P. Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul **Iurie Tesa SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul **Godoroja Sergiu SRL „Orhei Gaz ”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST **Ioana Madan reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul **"Efect Gas" SRL** , a prezentat pentru recepție: **Gazoductul**
(componenta obiectului)

de presiune medie suprateran din oțel Ø32x3,0mm L=3,5m; Robinet sferic cu flanșe Ø32mm – 1buc;
(componenta obiectului)

2. Proiectul № **485/23-AGE, AGI** a fost elaborat de **SRL „Efect gas” an 2023**
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din **"09 august" 2023** cu numărul **4512**
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **13 noiembrie 2023** și s-au
terminat la **22 decembrie 2023**.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Construcția centralei termice autonome pentru Căminul Nr.2 a Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu", situat pe str. Vasile Lupu 11, mun. Orhei** (denumirea și adresa obiectului)
prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar **Valentina Sandul** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general **Iurie Tesa** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare **Iurie Tesa** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare **Godoroja Sergiu** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST **Ioana Madan** /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Construcția centralei termice autonome pentru Căminul Nr.2 a Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu",
situat pe str. Vasile Lupu 11, mun. Orhei (denumirea și adresa obiectului)

„05” 01 2023 mun. Chișinău
Președintele Comisiei, **beneficiar Valentina Sandul I.P. Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul **Iurie Tesa SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul **Godoroja Sergiu SRL „Orhei Gaz ”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST **Ioana Madan reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

Antreprenorul **„Efect Gas” SRL** , a prezentat pentru recepție: **Post de reglare a presiunii**
(componența obiectului)

gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50 (dublu);

Proiectul № **485/23-AGE, AGI** a fost elaborat de **SRL „Efect gas” an 2023**
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din **„09 august ” 2023** cu numărul **4512**
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **13 noiembrie 2023** și s-au

terminat la **22 decembrie 2023**.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

Obiectul: **Construcția centralei termice autonome pentru Căminul Nr.2 a Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu", situat pe str. Vasile Lupu 11, mun. Orhei** (denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar **Valentina Sandul** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general **Iurie Tesa** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare **Iurie Tesa** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare **Godoroja Sergiu** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST **Ioana Madan** /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Construcția centralei termice autonome pentru Căminul Nr.2 a Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu",
situat pe str. Vasile Lupu 11, mun. Orhei (denumirea și adresa obiectului)
" " 2023 mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar Valentina Sandul I.P. Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :
Reprezentantul antreprenorului, directorul **Iurie Tesa SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul **Godoroja Sergiu SRL „Orhei Gaz”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST **Ioana Madan reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul **„Efect Gas” SRL**, a prezentat pentru recepție: **Gazoductul**
(componenta obiectului)

interior de presiune joasă Ot Ø57x3,5mm L=5,0m; Ø108x4,0mm L=3,0m; Conducta de purjare din Ot
cu Ø20x2,8mm L=5,0m; Robinet sferic cu mufe cu Ø15mm-1buc; Ø20mm-1buc; Ø25mm-3buc;
Ø50mm-1buc; Clapetă de siguranță cu mufe Ø50mm – 1buc.; Semnalizator CH4/CO – 1buc;
Cazan cu tiraj forțat Warmhaus 90KW – 3buc
(componenta obiectului)

2. Proiectul № **485/23-AGE, AGI** a fost elaborat de **SRL „Efect gas” an 2023**
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din **„09 august” 2023** cu numărul **4512**
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **13 noiembrie 2023** și s-au
(luna, anul)
terminat la **22 decembrie 2023**.
(luna, anul)


4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție - montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)


2. Obiectul: **Construcția centralei termice autonome pentru Căminul Nr.2 a Colegiului Pedagogic**
„Vasile Lupu”, situat pe str. Vasile Lupu 11, mun. Orhei (denumirea și adresa obiectului)
prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)

din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar  / **Valentina Sandul** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general  / **Iurie Tesa** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare  / **Iurie Tesa** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare  / **Godoroja Sergiu** /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST  / **Ioana Madan** /
(semnătura, numele, prenumele)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

№ UN-G-05/2023

28 aprilie 2023

or. Ungheni

"Ungheni-gaz" SRL, numită în continuare "**Beneficiar**", cu sediul în or. Ungheni, str. V.Țepeș, nr.13, înregistrat în Registrul de Stat al Întreprinderilor, cod fiscal 1003609007411, în persoana directorului **Sergiu Cațer**, care acționează în baza Statutului și "**Efect Gas**" SRL, numită în continuare "**Antreprenor**", cu sediul în mun.Chișinău, str.Igor Vieru,nr.8 ap.11, înregistrată în Registrul de Stat al Întreprinderilor, cod fiscal c/f c/f 1011600042159, în persoana administratorului Iurie Tesa care acționează în baza Statutului, ambii ("**Beneficiarul**" și "**Antreprenorul**") denumiți în continuare **Părți** au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele :

1. Obiectul Contractului

1.1 Antreprenorul se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcții (în continuare **Servicii**) a obiectului "Gazificarea satului Petrești, r-nul Ungheni" iar "Beneficiarul" se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție și instalare în conformitate cu documentația de proiectare și deviz, în conformitate cu cerințele SNIP G05.01.-2006 „Sistem de distribuție a gazelor”, Regulilor de securitate în industria gazelor și altă legislație aplicabilă.

1.3 Antreprenorul achiziționează materiale în mod independent.

2. Prețul și Ordinea de efectuare a plăților

2.1 Prețul pentru **Serviciile** acordate corespunzător pct.1.1 din prezentul Contract constituie 1157070,94 (un milion una sută cinci zeci și șapte mii șaptezeci lei, 94 bani) inclusiv TVA.

2.2 Plata **Serviciilor** se realizează prin transferul bănesc din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului**. Data efectuării transferului din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului** se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al **Antreprenorului**.

2.3 Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul **Serviciilor** se achită pe deplin de către **Beneficiar** în termen de 90 (nouăzeci) zile lucrătoare din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care **Beneficiarul** are pretenții referitor la calitatea **Serviciilor** efectuate, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către **Antreprenor**. Înlăturarea neajunsurilor depistate se efectuează din contul **Antreprenorului**.

2.4 **Beneficiarul** este în drept să achite parțial **Serviciile** efectuate conform graficului lor de executare, dar nu mai des decât o dată pe lună în baza unui Act privind lucrările executate. Totodată, **Antreprenorul** este obligat să ofere **Beneficiarului** posibilitatea de a verifica lucrările efectuate, dacă este cazul, folosind mijloace tehnice. În cazul dezacordului cu datele indicate în Act, **Beneficiarul**, în termen de 10 zile lucrătoare întoarce Actul cu anexarea refuzului motivat.

2.5 **Beneficiarul** efectuează plata pentru lucrul efectuat în termen de 20 zile lucrătoare de la semnarea Actului.

2.6 Achitarea se efectuează prin transferul mijloacelor bănești în contul current al **Antreprenorului** indicat în Contract.

2.7 Părțile se obligă să informeze în scris despre schibarea contului sau a altor date aferente achitării conform prezentului Contract.

3. Termenul Contractului

3.1 Termenul de executare a Lucrărilor conform prezentului Contract constituie data de 30 septembrie 2023.

3.2 Momentul finalizării executării Lucrărilor conform prezentului Contract se consideră data semnării de către părți a Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate.

3.3 Prezentul Contract este valabil până la executarea de către părți a obligațiilor prevăzute în acesta.

4. Calitatea Obiectului Contractului

4.1 **Antreprenorul** garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor executate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice prevăzute de legislația R.Moldova în vigoare.

4.2 **Antreprenorul** garantează, că lucrările de construcție a obiectului prezentului Contract nu vor prezenta defecte care să reducă valoarea și posibilitatea de utilizare a obiectului în condiții normale de funcționare.

4.3 Perioada de garanție pentru lucrările efectuate este de 2 ani, sub rezerva funcționării corespunzătoare. În perioada de garanție **Antreprenorul** răspunde în fața **Beneficiarului** pentru lucrările efectuate și se obligă să înlăture pe cheltuiala proprie deficiențele în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul în care acestea devin cunoscute. Perioada de garanție începe să curgă din momentul semnării Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate. Calculul perioadei de garanție se întrerupe pentru timpul eliminării defectelor.

5. Drepturile și Obligațiunile Beneficiarului

5.1 Drepturile Beneficiarului :

5.1.1 Să supravegheze și să recepționeze lucrările finalizate la construcția obiectului în conformitate cu termenii prevăzuți în acest Contract și alte reglementări.

5.1.2. Să ceară eliminarea deficiențelor, precum și compensarea materială a daunelor cauzate ca urmare a neexecutării sau a executării necorespunzătoare a obligației contractuale de la **Antreprenor**.

5.1.3. Să suspende executarea lucrărilor în caz de calitate slabă a acestora, precum și încălcarea termenilor de construcție prevăzuți în Contract cu dreptul de reziliere a Contractului.

5.2 Obligațiunile Beneficiarului :

5.2.1 Să permită Antreprenorului accesul la locul de executare a lucrărilor de construcție a obiectului.

5.2.2 Să efectueze la timp achitările pentru lucrările executate.

5.2.3 Să emită în adresa Antreprenorului dispoziții scrise referitor la eliminarea deficiențelor în cazul depistării executării lucrărilor necalitative.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție finalizat în modul prevăzut de lege.

6. Drepturile și Obligațiunile Antreprenorului

6.1 Drepturile Antreprenorului :

6.1.1 Să solicite și să accepte plățile prevăzute de prezentul Contract în baza Actului privind executarea lucrărilor.

6.1.2 Să întreprindă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care împiedică executarea corespunzătoare a clauzelor Contractului.

6.1.3 Să numească reprezentanții săi pentru a întocmi actele privind lucrările efectuate, să verifice conformitatea materialelor și echipamentelor utilizate cu documentația de proiect.

6.2 Obligațiunile Antreprenorului :

6.2.1 Să efectueze lucrările de construcție conform graficului convenit cu Beneficiarul înainte de începerea lucrărilor și să le finalizeze în termenii prevăzuți din prezentul Contract.

6.2.2 Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, lipsite de orice vicii materiale sau legale.

6.2.3 Să respecte proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.

6.2.4 Să execute în timpul construcției obiectului, indicațiile Beneficiarului, dacă acestea nu contravin condițiilor Contractului și legislației în vigoare a Republicii Moldova.

6.2.5 Să participe împreună cu Beneficiarul la darea în exploatare a obiectului în termenii prevăzuți de prezentul Contract.

6.2.6 Să întocmească, în prezența persoanei responsabile pentru obiect din partea Beneficiarului, la momentul transmiterii lucrării intermediare, un act în formă scrisă cu privire la lucrările executate, indicând materialele utilizate la construcția obiectului.

6.2.7 Să înlăture în procesul construcției și în perioada de garanție neajunsurile identificate în termenele stabilite prin prezentul Contract.

6.2.8 Să păstreze documentele care confirmă toate costurile pentru efectuarea lucrărilor la construcția obiectului și să ofere Beneficiarului acces la acestea până la finalizarea plăților pentru lucrările efectuate.

6.2.9 Să informeze Beneficiarul în scris despre faptul, că instrucțiunile sale pot cauza daune obiectului, cu excepția cazurilor în care este obiectiv imposibil de prevăzut aceste consecințe.

6.2.10 Să aducă terenurile ocupate temporar la starea inițială la finalizarea lucrărilor conform devizului.

7. Responsabilitatea Părților

7.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract, părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Fiecare dintre părțile prezentului Contract este obligat să monitorizeze și să informeze cealaltă parte cu privire la încălcarea prevederilor contractuale.

7.3 Antreprenorul plătește o penalitate în valoare de 0,1% din valoarea Contractului pentru fiecare zi care depășește termenul final de predare a obiectului, stabilite prin prezentul Contract.

7.4 Pentru eliminarea cu întârziere a deficiențelor identificate în perioada de garanție pentru exploatarea obiectului Antreprenorul plătește o penalizare în mărime de 0,1% din costul lucrărilor executate pentru eliminarea deficiențelor pentru fiecare zi de întârziere.

7.5 Partea care a încălcat prevederile prezentului Contract va rambursa celeilalte părți toate pierderile cauzate ca urmare a încălcării Contract.

7.6 În cazul în care circumstanțele de forță majoră împiedică îndeplinirea prevederilor prezentului Contract sau duc la o întârziere a executării pentru oricare dintre părți, partea este exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai pentru perioada în care circumstanțe de forță majoră (cutremur, inundații, alunecări de teren etc.) au efect asupra îndeplinirii obligațiilor contractuale. Partea care nu poate îndeplini obligația din caz de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți despre aceasta prin telex, fax sau alte mijloace în termen de 24 de ore, prezentând în termen de treizeci de zile un document eliberat de Camera de Comerț și Industrie sau de alt organism împuternicit, care confirmă existența acestor circumstanțe.

7.7 Riscul de deteriorare accidentală a obiectului Contractului înainte de transmiterea acestuia este suportat de Antreprenor. Acest risc trece la Beneficiar simultan din momentul recepționării obiectului în modul stabilit.

8. Rezilierea Contractului

8.1 Contractul poate fi reziliat prin acordul părților în conformitate cu legislația în vigoare.

8.2 Partea interesată transmite celeilalte părți o propunere de reziliere a Contractului în scris, care este obligată să o examineze în termen de 20 de zile.

8.3 Cu acordul celeilalte părți, rezilierea Contractului se efectuează în baza unui act bilateral, în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor efectiv efectuate de Antreprenor;
- lista documentelor de executare transmise Beneficiarului;
- lista și costul proprietății Beneficiarului, neutilizate de Antreprenor în executarea lucrărilor de construcție la obiect;
- lista bunurilor Antreprenorului care urmează să fie scoase de pe șantier, precum și termenele pentru îndeplinirea acestei obligații;
- obligații de garanție stabilite prin lege sau prin contract pentru lucrările recepționate de Beneficiar și reflectate în actul de reziliere a Contractului;
- alte obligatii ale partilor legate de rezilierea Contractului.

8.4 Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă:

- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult de o dată) a admis executarea necalitativă a lucrărilor
- în cazul încălcării semnificative de către Antreprenor a termenilor de executare a lucrărilor de construcții prevăzute de prezentul Contract.

8.5 Antreprenorul se obligă să oprească lucrările din momentul primirii unei notificări de la Beneficiar cu privire la rezilierea Contractului.

8.6. Beneficiarul nu este obligat să plătească pentru lucrările efectuate după ce Antreprenorul a primit o notificare de reziliere a Contractului.

8.7.Dacă devine necesară efectuarea lucrărilor pentru asigurarea siguranței obiectului neterminat, Antreprenorul este obligat să le execute în termenul convenit. Costurile aferente executării acestor lucrări vor fi suportate de partea din vina căreia se reziliază Contractul.

9.Transmiterea și Recepționarea Obiectului

9.1 Recepționarea obiectului se efectuează conform cerințelor Legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr. 285 din 23.05.1996 și a altor acte normative în vigoare.

10. Soluționarea litigiilor

10.1 Toate litigiile care decurg din prezentul Contract se soluționează prin acordul comun al părților, iar în cazul în care este imposibil de găsit un acord comun, prin sesizarea instanței de judecată a Republicii Moldova, folosind dreptul material al Republicii Moldova.

11. Confidențialitatea

11.1 Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv,

subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

12. Dispoziții finale

12.1 Prezentul Contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, are forță juridică și este obligatorie pentru ambele părți.

11.2 Orice modificare, completare, excludere a prevederilor acestui Contract va fi considerată valabilă dacă este în scris și semnată de fiecare parte.

11.3 Problemele care nu sunt reglementate de prezentul Contract vor fi rezolvate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11.4 Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a prezentului Contract în temeiul legal.

13. Rechizitele și semnăturile părților

BENEFICIAR

"Ungheni-gaz" SRL

mun.Ungheni, str. V.Țepeș,13

c/d MD94ML000000002251346132

BC "Moldindconbank"SA, fil. Ungheni

c/b MOLDMD2X346

c/f 1003609007411

tel. 023622703

ANTREPRENOR

"Efect Gas" SRL

mun.Chișinău, str.Igor Vieru, 8 ap.11

c/d MD62ML000000002251829186

BC "Moldindconbank"SA, fil. Invest

c/b MOLDMD2X329

c/f 1011600042159

tel. 069557876




Director

Sergiu CAȚER

Administrator

Iurie TESA

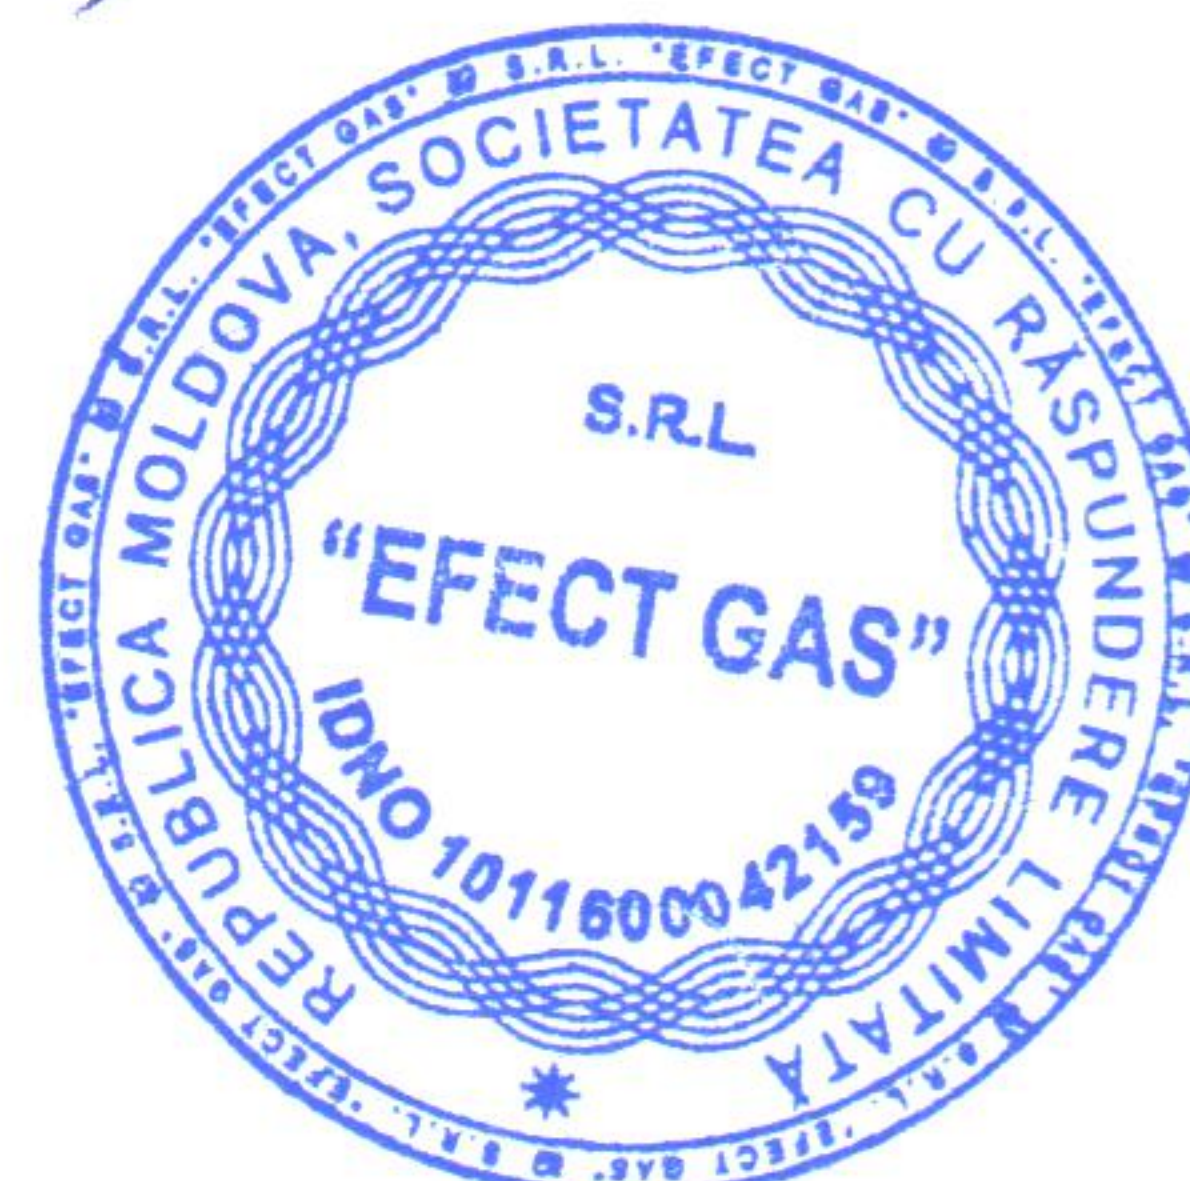

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare
Gazificarea microraionului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)

„ 18 ” 09 2023
(denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** Sergiu Căter **SRL "Ungheni-gaz"**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa **SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Caldare Ion **SRL „Ungheni-Gaz”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Arion Vladimir **reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.3 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø90x8,2mm L=44,0m; Ø40x3,7mm L=13,0m; Robinet PE80 SDR11 Ø90mm – 1buc; Gazoductul de presiune medie suprateran Ot Ø32x3,0mm L=0,5m; Robinet sferic cu flanșe Ø32mm – 1buc.
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 246-1-2021-AGE a fost elaborat de SRL „Voledis Grup” an 2021
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din „ 08 iulie ” 2021 cu numărul 3422
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 16 mai 2023 și s-au terminat la 30 iunie 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Gazificarea microraionului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar



Sergiu Căter /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

/
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Caldare Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Arion Vladimir /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare
Gazificarea microraioului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)

„19” 09 2023
(denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** Sergiu Cater **SRL "Ungheni-gaz"**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa **SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Caldare Ion **SRL „Ungheni-Gaz”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Arion Vladimir **reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.4 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø90x8,2mm L=170,0m; Ø50x4,6mm L=370,0m; Ø40x3,7mm L=3,0m; Gazoductul de presiune medie supraterran Ø32x3,0mm L=0,5m; Robinet sferic cu flanșe Ø32mm – 1buc.

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 246-1-2021-AGE a fost elaborat de SRL „Voledis Grup” an 2021
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 08 iulie ” 2021 cu numărul 3422
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 16 mai 2023 și s-au terminat la 30 iunie 2023.
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Gazificarea microraioului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar**



Sergiu Cater /

S.R.L. (semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare



(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Caldare Ion /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Arion Vladimir /

(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare
Gazificarea microraionului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)

(denumirea și adresa obiectului)
„19” 09 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** Sergiu Cater **SRL „Ungheni-gaz”**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa **SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Caldare Ion **SRL „Ungheni-Gaz”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Arion Vladimir **reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.3 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu); Gazoduct de p/m supratăran din Ot Ø32x3,0mm L= 0,85m; Gazoduct de p/j supratăran din Ot Ø65x3,5mm L= 1,0m
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 246-1-2021-AGE a fost elaborat de SRL „Voledis Grup” an 2021
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 08 iulie ” 2021 cu numărul 3422
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 16 mai 2023 și s-au terminat la 30 iunie 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Gazificarea microraionului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar**

Sergiu Cater /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului **general**

Iurie Tesa /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Caldare Ion /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Arion Vladimir /

(semnătura, numele, prenumele)



ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare
Gazificarea microraiionului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)

„ 19 ” 09 2023 (denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** Sergiu Cațer **SRL "Ungheni-gaz"**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa **SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Caldare Ion **SRL „Ungheni-Gaz”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Arion Vladimir **reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.4 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu); Gazoduct de p/m supratcran din Ot Ø32x3,0mm L= 0,85m; Gazoduct de p/j supratcran din Ot Ø65x3,5mm L= 1,0m
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 246-1-2021-AGE a fost elaborat de SRL „Voledis Grup” an 2021
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 08 iulie ” 2021 cu numărul 3422
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 16 mai 2023 și s-au terminat la 30 iunie 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Gazificarea microraiionului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar**

Sergiu Cațer /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Caldare Ion /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Arion Vladimir /

(semnătura, numele, prenumele)



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Gazificarea microraiionului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)

(denumirea și adresa obiectului)

„13” 09 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** Sergiu Cater **SRL „Ungheni-gaz”**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa **SRL „Efect Gas”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Caldare Ion **SRL „Ungheni-Gaz”**
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Arion Vladimir **reprezentant AST**
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.3 Consumatori - 26 Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø75x6,8mm L=250,0m; Ø63x5,8mm L=120,0m; Ø50x4,6mm L=91,0m; Ø40x3,7mm L=240,0m; Ø32x3,0mm L=183,5m; Gazoductul de presiune joasă suprateran Ot Ø65x3,5mm L=0,5m; Ø25x2,8mm L=12,5m; Ø20x2,8mm L=44,2m; Robinet sferic cu flanșe Ø65mm – 1buc. Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 26buc.
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 246-1-2021-AGE a fost elaborat de SRL „Voledis Grup” an 2021
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din „08 iulie” 2021 cu numărul 3422
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 16 mai 2023 și s-au terminat la 30 iunie 2023.
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Gazificarea microraiionului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar**

Sergiu Cater /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

„УНГЕНЬ-ГАЗ” О.О.О. /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Caldare Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Arion Vladimir /
(semnătura, numele, prenumele)



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Gazificarea microraionului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)

(denumirea și adresa obiectului)

„ 18 ” 09 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar** Sergiu Căter **SRL "Ungheni-gaz"**
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Caldare Ion SRL „Ungheni-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Arion Vladimir reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul **„Efect Gas” SRL** , a prezentat pentru recepție: **PRG Nr.4 Consumatori - 40**
Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø90x8,2mm L=154,0m; Ø75x6,8mm
L=190,0m; Ø63x5,8mm L=270,0m; Ø50x4,6mm L=301,0m; Ø40x3,7mm L=256,0m; Ø32x3,0mm
L=330,0m;

Gazoductul de presiune joasă supraterran Ot Ø65x3,5mm L=0,5m; Ø25x2,8mm L=20,0m; Ø20x2,8mm
L=68,0m; Robinet sferic cu flanșe Ø65mm – 1buc. Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 40buc.
(componenta obiectului)

2. Proiectul № **246-1-2021-AGE** a fost elaborat de **SRL „Voledis Grup” an 2021**
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din **„ 08 iulie ” 2021** cu numărul **3422**
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **16 mai 2023** și s-au
terminat la **30 iunie 2023**.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul **Gazificarea microraionului satului Petrești, r-nul Ungheni (Etapa II)**
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar**


Sergiu Căter /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general


Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare



Caldare Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Caldare Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Arion Vladimir /
(semnătura, numele, prenumele)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

№. 1 inv-02/2023

09 februarie 2023

mun. Cahul

„Cahul-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003603150315, în persoana directorului, d-nul Valachi Valeriu, care acționează în baza Statutului și „Efect-gas” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Igor Vieru 8, ap.11, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1011600042159, în persoana directorului d-nul Tesa Iurie, care acționează în baza Statutului, ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denumiți în continuare-**Părți**) au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1 Prin prezentul contract **Antreprenorul** se obligă să efectueze **Beneficiarului** lucrări de construcții (în continuare **Servicii**) a obiectului: „**Gazificarea satului Burlacu, din r-nul Cahul**”, iar **Beneficiarul** se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2 **Antreprenorul** se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele **Antreprenorului**, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor legislației privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

1.3 Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul și Ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul, pentru serviciile acordate în corespundere cu pct. 1.1. din prezentul Contract, constituie **323 045,91 lei inclusiv TVA (trei sute douăzeci și trei mii patruzeci și cinci lei, 91 bani)**.

2.2. Plata serviciilor conform prezentului Contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului**. Data efectuării transferului din contul **Beneficiarului** în contul **Antreprenorului**, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al **Antreprenorului**.

2.3. Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către **Beneficiar** în termen de **90 (nouăzeci)** zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care **Beneficiarul** are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către **Antreprenor**. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul **Antreprenorului**.

2.4. **Beneficiarul** poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform gradului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate. Beneficiarul este obligat în termen de **5** zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către Antreprenor, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Beneficiarul întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în formă scrisă, în termenul indicat mai sus.

2.5. **Beneficiarul** efectuează plata pentru lucrările executate în termen de **90** de zile lucrătoare după semnarea actului privind executarea lucrărilor.


2.6. Achitarea se efectuează prin transferul mijloacelor bănești în contul curent al Antreprenorului, indicat în prezentul contract.

2.7. Părțile se obligă să informeze în formă scrisă despre schimbarea contului sau a altor date aferente achitării conform prezentului contract.

Beneficiar

Director

Valachi V.

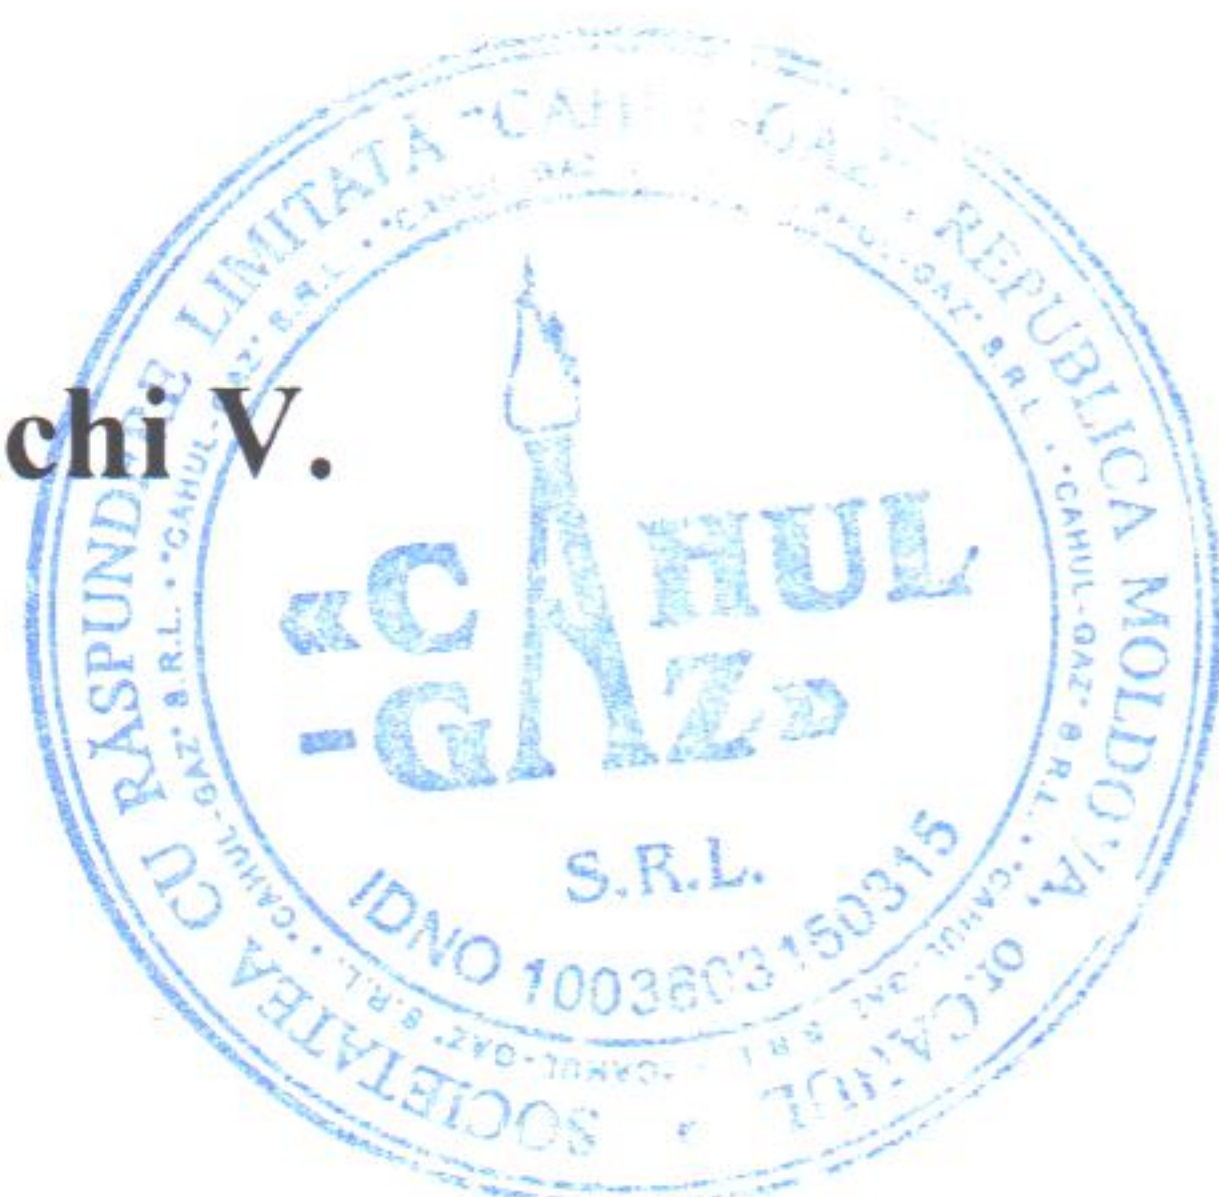

Antreprenor

Director

Tesa Iu.



3. Termenul Contractului

3.1. Termenul de executare a lucrărilor, conform prezentului contract, se stabilește din data semnării contractului, dar nu mai târziu de data **03.04.2023**, până la **15.06.2023**, cu termenul final de dare în exploatare până la **30.06.2023**.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră data semnării de către părți a Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate fără obiecții.

3.3. Prezentul contract este valabil până la executarea de către părți a obligațiunilor prevăzute în acesta.

4. Calitatea Obiectului Contractului

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare. Cerințele față de materialele de construcție și utilaj trebuie să corespundă condițiilor indicate în anexa Nr. 1 la prezentul contract.

4.3. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 2 ani. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlăture din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Perioada de garanție începe din ziua semnării Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

4.4. Garanția de executare justă este asigurată prin transferul de către Antreprenor 5% din suma contractului, pe contul bancar al Beneficiarului, până la începerea lucrărilor.

5. Drepturile și Obligațiunile Beneficiarului

5.1. Drepturile Beneficiarului:

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor la necesitate în caz de neexecutare calitativă.

5.2. Obligațiunile Beneficiarului:

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.

5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.

5.2.4. Să recepționeze lucrările efectuate în ordinea stabilită.

5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

Beneficiar

Director

Valachi V.



Antreprenor

Director



6. Drepturile și Obligațiunile Antreprenorului

6.1. Drepturile Antreprenorului:

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plățile, prevăzute de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

6.2. Obligațiunile Antreprenorului:

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul pînă la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.
- 6.2.5. Să participe împreună cu Beneficiarul la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.
- 6.2.6. Să întocmească, în prezența persoanei responsabile pentru obiect din partea Beneficiarului la momentul transmiterii lucrărilor intermediare, un act în formă scrisă cu privire la lucrările efectuate, cu indicarea materialelor folosite la construcția obiectelor.
- 6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele pînă la finisarea efectuării achitărilor.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor cînd astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.
- 6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.


7. Reponsabilitatea Părților

- 7.1. În cazul încălcării prevederilor prezentului contract părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a RM.
- 7.2. Fiecare parte este obligată să urmărească și să informeze partea opusă despre încălcarea prevederilor contractului.
- 7.3. Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi care depășește termenul final de predare a obiectului, stabilit în prezentul contract, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.
- 7.4. Pentru înlăturarea cu întârziere a neajunsurilor, care au fost depistate în perioada termenului de garanție pentru exploatarea obiectului, Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,3% din prețul lucrărilor de înlăturare a neajunsurilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.
- 7.5. Partea care a încălcat prezentul contract compensează părții opuse toate daunele care au fost cauzate ca urmare a încălcării contractului.
- 7.6. Dacă situațiile de forță majoră împiedică executarea prevederilor prezentului contract sau duc la întârzierea executării de către oricare dintre părți, partea este exonerată de executarea obligațiunilor, dar doar pe perioada cînd situațiile de forță majoră (cutremure de pămînt, inundații, alunecări de teren, etc.) au efect asupra executării obligațiunilor. Partea care nu poate executa obligațiunea din cauza situațiilor de forță majoră, este obligată să anunțe partea opusă prin telex, fax sau altă modalitate în termen de 24 de ore, prezentînd în termen de 30 de zile un document eliberat de Camera de Industrie și Comerț sau de un alt organ împuternicit, care atestă existența a astfel de circumstanțe.
- 7.7. Riscul deteriorării accidentale a obiectului contractului pînă la transmiterea acestuia se poartă Antreprenorul. Acest risc trece către Beneficiar odată cu recepționarea lucrărilor.

Beneficiar

Director

Valachi V.

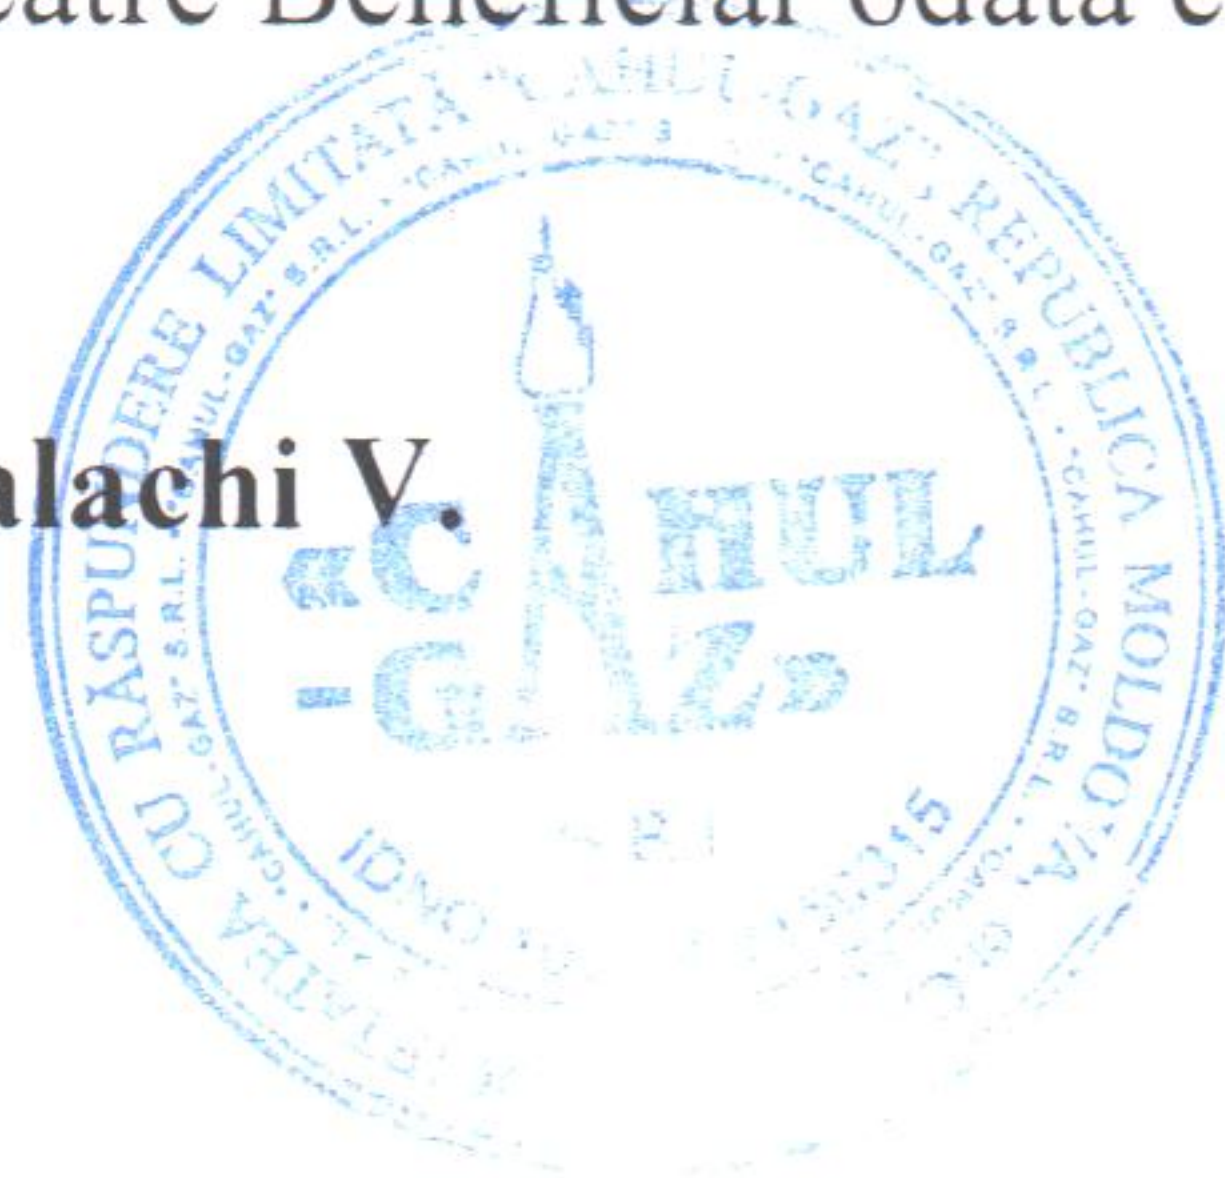

Antreprenor

Director

Besa Iu.



8. Rezilierea Contractului

8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul comun al părților în conformitate cu legislația în vigoare.

8.2. Partea interesată înaintează o propunere cu privire la rezilierea contractului în formă scrisă celeilalte părți, care este obligată să o examineze în termen de 20 zile.

8.3. În cazul acordului celeilalte părți rezilierea contractului se efectuează în baza unui act bilateral în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor efectuate de fapt de către Antreprenor;
- lista documentelor de executare care a fost transmisă Beneficiarului;
- obligațiunile de garanție, stabilite în prezentul contract sau de legislație în vigoare, pentru lucrările recepționate de către Beneficiar și menționate în actul de reziliere a contractului;
- alte obligațiuni ale părților ce țin de rezilierea contractului.

8.4. Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă:

- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult decât o dată) a admis executarea necalitativă a lucrărilor;
- în cazul încălcării de către Antreprenor a termenului de efectuare a lucrărilor prevăzute în p.3.1. din prezentul contract.

8.5. Antreprenorul se obligă să înceteze lucrările din momentul primirii avizului de către Beneficiar cu privire la rezilierea contractului.

8.6. Beneficiarul nu este obligat să achite pentru lucrările, care au fost efectuate după recepționarea avizului de către Antreprenor cu privire la rezilierea contractului.

8.7. În cazul apariției necesității de executare a lucrărilor pentru asigurarea păstrării obiectului nefinisat Antreprenorul se obligă să le efectueze în termenul convenit. Cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor respective sunt suportate de partea din a cărei inițiativă se reziliază contractul.

9. Transmiterea și Recepționarea Obiectului

9.1. Recepționarea obiectului se efectuează conform cerințelor Legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr.285 din 23.05.1996 și NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor) și altor acte normative.

10. Soluționarea Litigiilor

10.1. Toate litigiile care apar la executarea prezentului Contract se soluționează de comun acord a părților, iar în cazul imposibilității găsirii unui acord comun prin adresarea în Instanța de Judecată a R.M., cu respectarea normelor dreptului material al Republicii Moldova.

11. Dispoziții Finale

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

11.2. Nu se admit modificări, completări, excluderi a prevederilor prezentului contract.

11.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a republicii Moldova.

11.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a Contractului.


12. Rechizitele și Semnăturile Părților

Rechizitele Beneficiarului:

mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49.
Cod fiscal: 1003603150315
MD46VI022510900000007MDL
BC „VICTORIABANK” SA
Cod: VICBMD22871

«BENEFICIAR»

S.R.L. „Cahul gaz”
director Valachi Valeriu

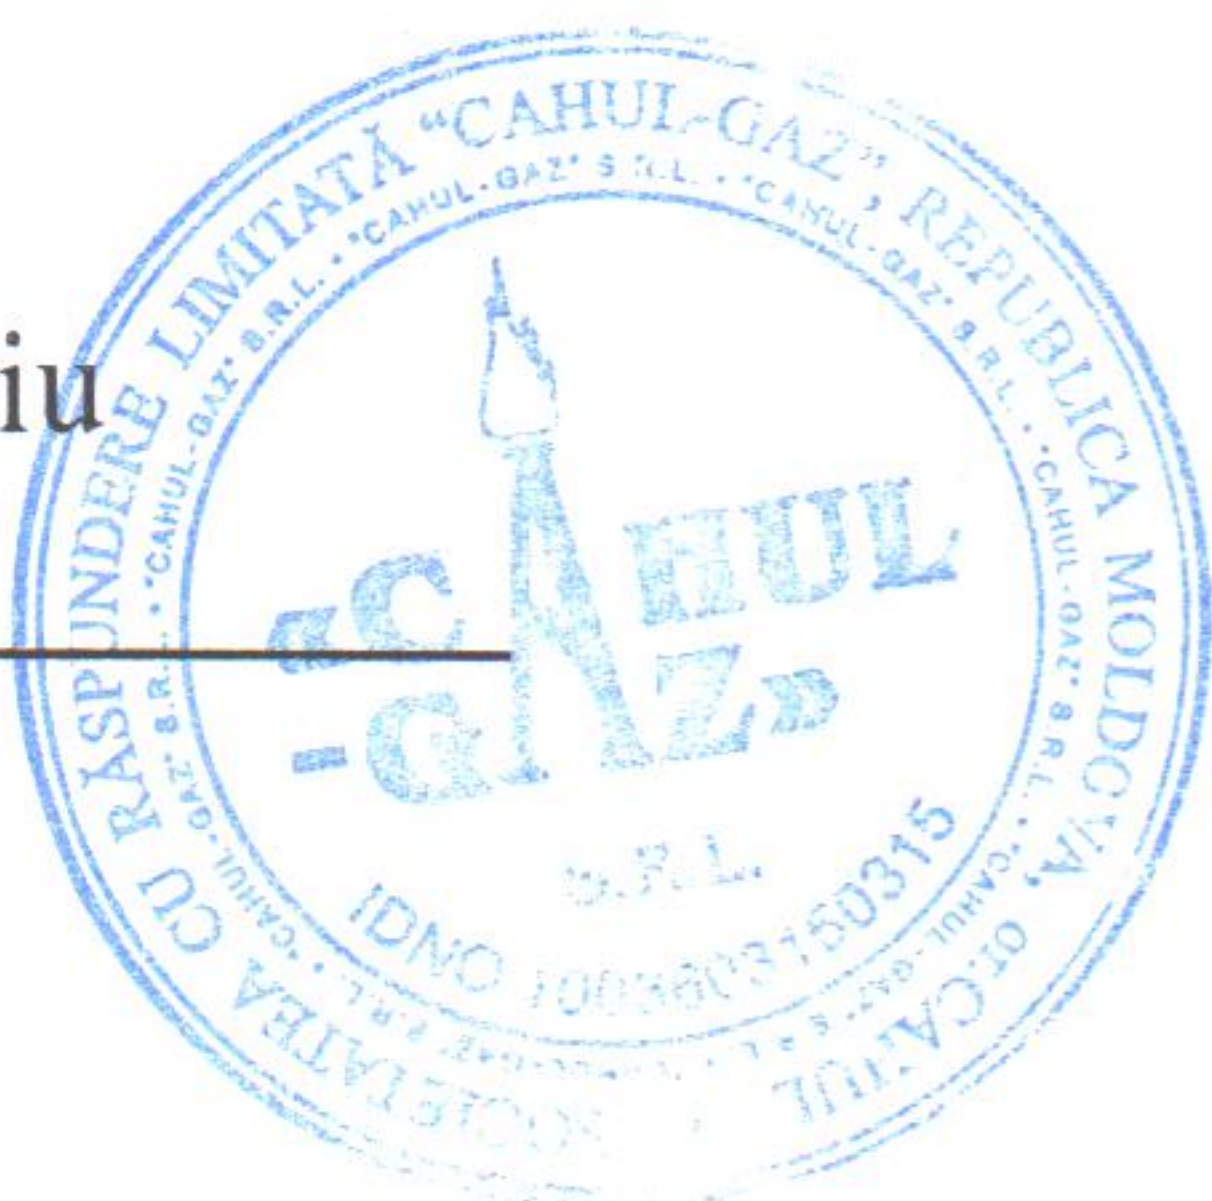

Rechizitele Antreprenorului:

mun. Chișinău str. Igor Vieru 8 ap.11
Cod fiscal: 1011600042159
MD62ML000000002251829186
BC“Moldinconbank” S.A. fil. Invest
Cod: MOLDMD2X329

«ANTREPRENOR»

S.R.L. „Efect gas”
director Tesa Iurie



Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate în procesul de construcție a obiectului:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

- Cerințe față de PRG:
 - * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
 - * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1.5 mm;
 - * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
 - * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
 - * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
 - * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
 - * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
 - * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
 - * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
 - * grile pentru ventilare;
 - * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
 - * țevile de refulare-purjare să fie de culoare roșie;
 - * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
 - * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
 - * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
 - * garanție la utilaje – minim 24 de luni;
 - * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte;
 - * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
 - * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
 - * tavă pentru depozitarea documentelor;
 - * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
 - * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor.
 - * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
 - * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
 - * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
 - * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip K3M;
 - * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă:
 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete pînă și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.
 - * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de pînă la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.



* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;

* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;

• Cerințe față de țeava de oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
- verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

• Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- corespundere - ГОСТ 50838-95;
- calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100;
- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;
- trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

• Cerințe față de armături din oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

Beneficiar

Director


Valachi V.



Antreprenor

Director

Tesa In

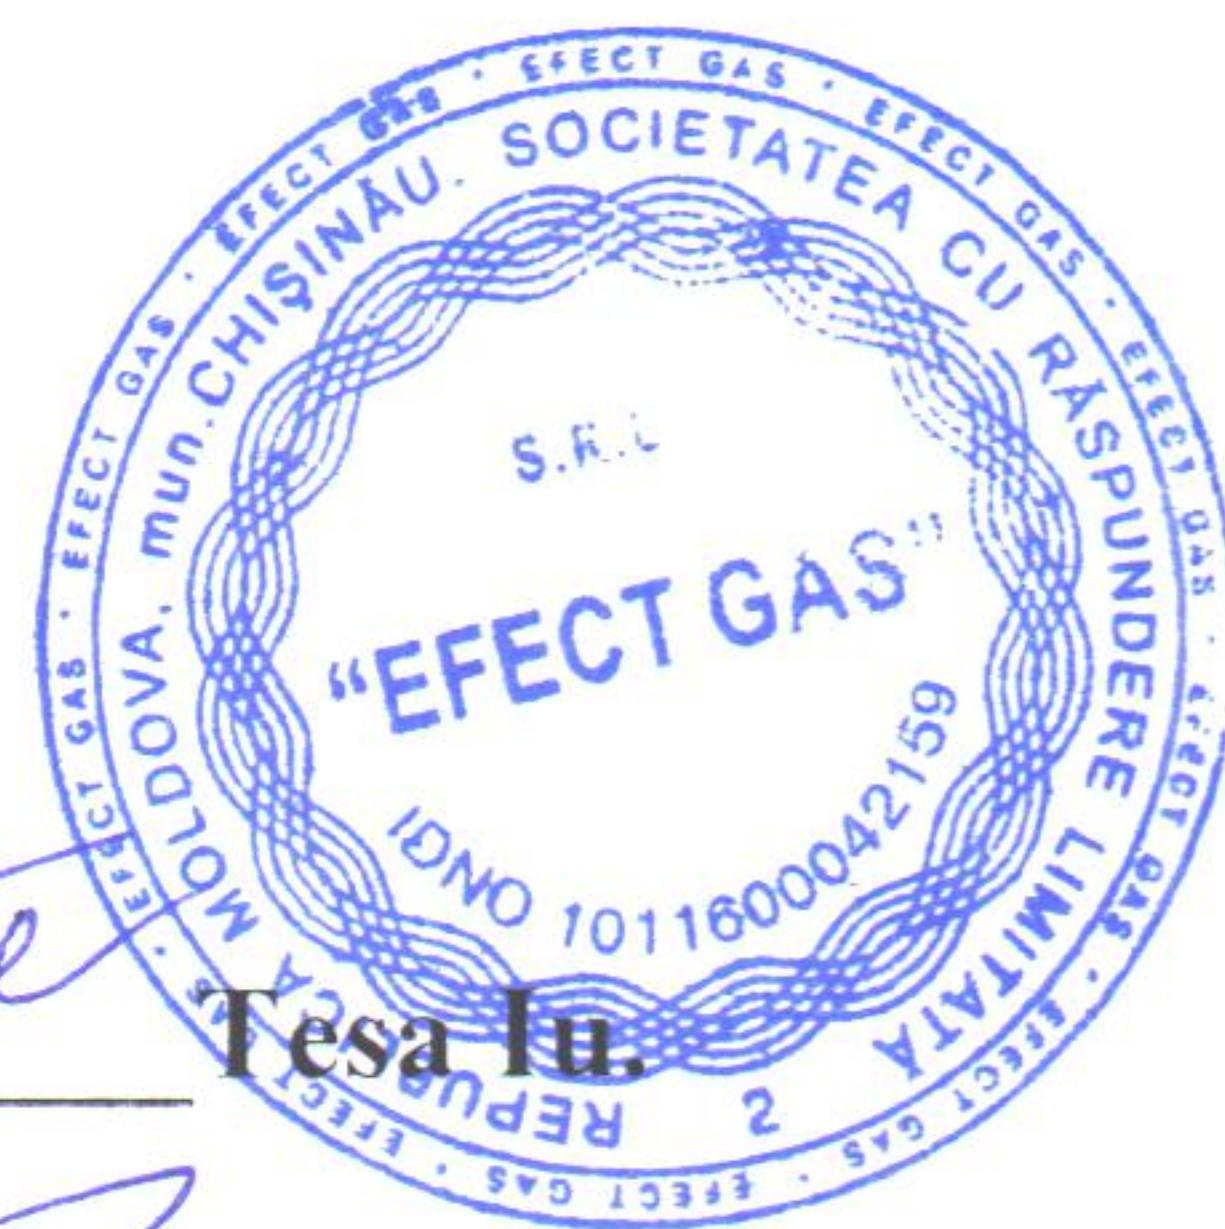

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

"12" 06 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar

SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.1 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø40x3,7mm L=185,0m; Ø32x3,0mm L=320,0m; Gazoductul de presiune medie suprateran Oț Ø25x2,8mm L=2,0m; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm – 2buc.

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 1106.A-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2007

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 30 iulie ” 2008 cu numărul 3364

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 27 februarie 2023 și s-au terminat la 28 aprilie 2023

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de ezechutare se anexează)

din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Burlacu r-nul Cahul (denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

„12” 06 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demișcan Ruslan. reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție PRG Nr.1 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 25(dublu)

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 1106.A-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2007

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 30 iulie ” 2008 cu numărul 3364

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 27 februarie 2023 și s-au terminat la 28 aprilie 2023.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

V. Valachi /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Spitca Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Olceanu Marin /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Demișcan Ruslan /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

"12" 06 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.1 Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø40x3,7mm L=45,0m; Ø32x3,0mm L=181,0m; Gazoductul de presiune joasă suprateran Ø40x3,5mm L=1,5m; Ø25x2,8mm L=2,5m; Ø20x2,8mm L=10,0m; Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 5buc. Ieri din sol: - 5buc (componenta obiectului)

2. Proiectul № 1106.A-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2007 Copie din proiect: - 5buc.
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 30 iulie ” 2008 cu numărul 3364
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 27 februarie 2023 și s-au terminat la 28 aprilie 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)

din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

Reprezentantul antreprenorului general

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

(semnătura, numele, prenumele)

Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Spitca Ion
(semnătura, numele, prenumele)

Olceanu Marin
(semnătura, numele, prenumele)

Demışcan Ruslan
(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

"12" 06 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olteanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.3 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø40x3,7mm L=6,0m; Gazoductul de presiune medie suprateran Ø1025x2,8mm L=1,0m; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm – 1buc.

(componența obiectului)

2. Proiectul № 1106.A-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2007

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din 30 iulie 2008 cu numărul 3364

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 27 februarie 2023 și s-au

(luna, anul)

terminat la 28 aprilie 2023.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)


2. Obiectul: Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)

din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar



(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general



Iurie Tesa /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare



Spitca Ion /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare



Olteanu Marin /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan /

(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul (denumirea și adresa obiectului)

„12” 06 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, **beneficiar**

SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan. reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul **„Efect Gas” SRL**, a prezentat pentru recepție **PRG Nr.3 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 25(dublu)**

(componenta obiectului)

2. Proiectul № **1106.A-AGE** a fost elaborat de **SRL „Metan-K” an 2007**

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din **„30 iulie” 2008** cu numărul **3364**

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **27 februarie 2023** și s-au terminat la **28 aprilie 2023**.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul** (denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)

din „ ” 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar**

V. V. Bachi /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Spitca Ion /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Olceanu Marin /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan /
(semnătura, numele, prenumele)

Ruslan DEMİȘCAN
Sef adjunct

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

„12” 06 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

SRL „Cahul gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.3 Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø50x4,6mm L=30,0m; Ø40x3,7mm L=294,0m; Ø32x3,0mm L=210,0m; Gazoductul de presiune joasă suprateran Ø1 Ø57x3,5mm L=1,5m; Ø25x2,8mm L=5,0m; Ø20x2,8mm L=20,0m; Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 10buc. Țeșiri din pol: - 9 buc.
(componenta obiectului) Conștența: - 10 buc.

2. Proiectul № 1106.A-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2007

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din „30 iulie” 2008 cu numărul 3364

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 27 februarie 2023 și s-au

(luna, anul)

terminat la 28 aprilie 2023.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Burlacu r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se considera primit (documentația de executare se anexează)

din „” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

V. Valachi
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Spitca Ion
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Olceanu Marin
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan
(semnătura, numele, prenumele)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
№. 2 inv-02/2023

09 februarie 2023

mun. Cahul

„Cahul-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003603150315, în persoana directorului, d-nul Valachi Valeriu, care acționează în baza Statutului și „Efect-gas” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Igor Vieru 8, ap.11, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1011600042159, în persoana directorului d-nul Tesa Iurie, care acționează în baza Statutului, ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denumiți în continuare-**Părți**) au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1 Prin prezentul contract **Antreprenorul** se obligă să efectueze **Beneficiarului** lucrări de construcții (în continuare **Servicii**) a obiectului: „**Gazificarea satului Lucești, din r-nul Cahul**”, iar **Beneficiarul** se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2 **Antreprenorul** se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele **Antreprenorului**, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor legislației privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

1.3 Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul și Ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul, pentru serviciile acordate în corespundere cu pct. 1.1. din prezentul Contract, constituie **799 985,06 lei inclusiv TVA (șaptesute nouăzeci și nouă mii nouă sute optzeci și cinci lei, 06 bani)**.

2.2. Plata serviciilor conform prezentului Contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului**. Data efectuării transferului din contul **Beneficiarului** în contul **Antreprenorului**, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al **Antreprenorului**.

2.3. Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către **Beneficiar** în termen de **90 (nouăzeci)** zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care **Beneficiarul** are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către **Antreprenor**. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul **Antreprenorului**.

2.4. **Beneficiarul** poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform gradului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate. Beneficiarul este obligat în termen de **5** zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către Antreprenor, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Beneficiarul întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în formă scrisă, în termenul indicat mai sus.

2.5. **Beneficiarul** efectuează plata pentru lucrările executate în termen de **90** de zile lucrătoare după semnarea actului privind executarea lucrărilor.

2.6. Achitarea se efectuează prin transferul mijloacelor bănești în contul curent al Antreprenorului, indicat în prezentul contract.

2.7. Părțile se obligă să informeze în formă scrisă despre schimbarea contului sau a altor date aferente achitării conform prezentului contract.

Beneficiar

Director

Valachi V.



Antreprenor

Director

Tesa Iu.



3. Termenul Contractului

3.1. Termenul de executare a lucrărilor, conform prezentului contract, se stabilește din data semnării contractului, dar nu mai târziu de data **01.05.2023** pînă la **15.06.2023**, cu termenul maxim de dare în exploatare pînă la **30.06.2023**.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră data semnării de către părți a Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate fără obiecții.

3.3. Prezentul contract este valabil pînă la executarea de către părți a obligațiunilor prevăzute în acesta.

4. Calitatea Obiectului Contractului

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare. Cerințele față de materialele de construcție și utilaj trebuie să corespundă condițiilor indicate în anexa Nr. 1 la prezentul contract.

4.3. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 2 ani. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlăture din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Perioada de garanție începe din ziua semnării Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

4.4. Garanția de executare justă este asigurată prin transferul de către Antreprenor 5% din suma contractului, pe contul bancar al Beneficiarului, pînă la începerea lucrărilor.

5. Drepturile și Obligațiunile Beneficiarului

5.1. Drepturile Beneficiarului:

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor la necesitate în caz de neexecutare calitativă.

5.2. Obligațiunile Beneficiarului:

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.


5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.

5.2.4. Să recepționeze lucrările efectuate în ordinea stabilită.

5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.


Beneficiar

Director

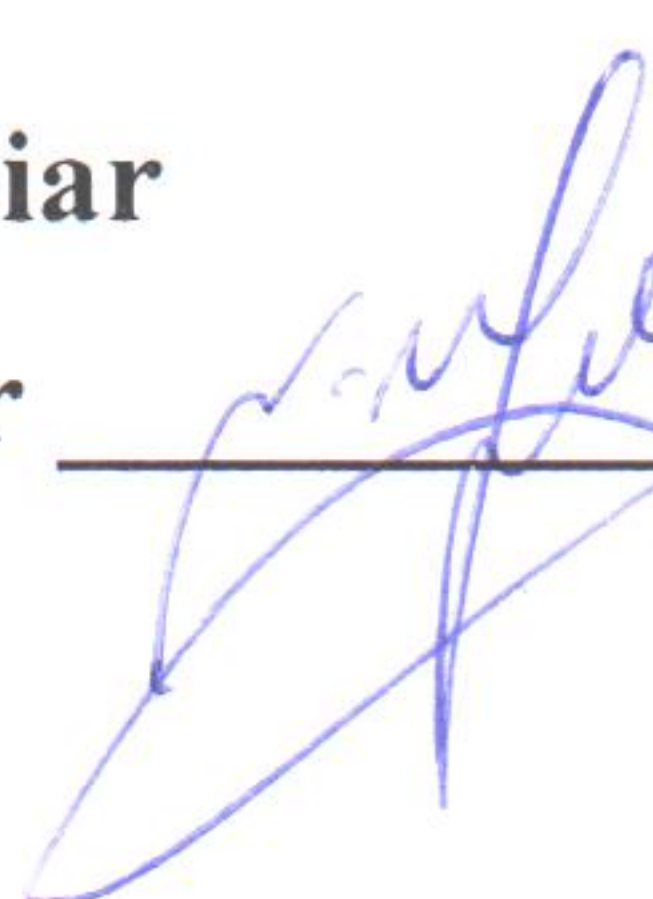
Valachi V.


Antreprenor

Director

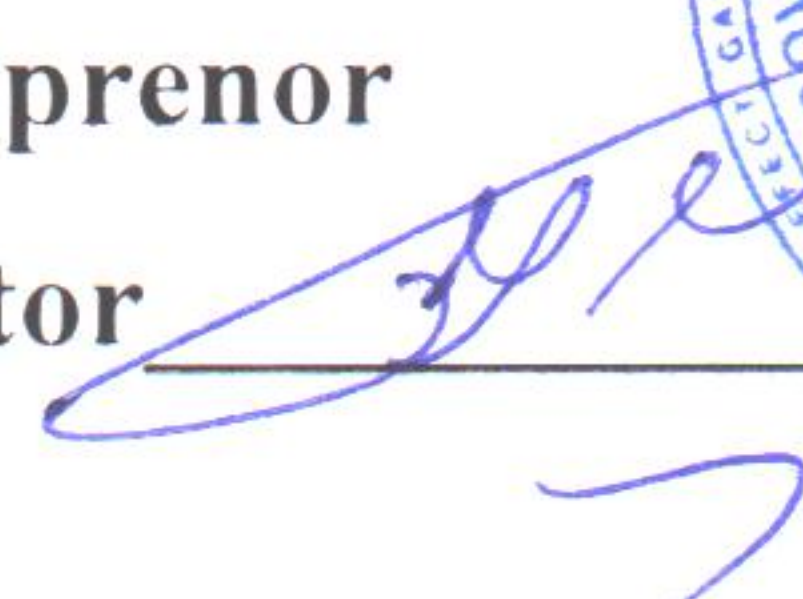
Tesa Iu.


6. Drepturile și Obligațiunile Antreprenorului

6.1. Drepturile Antreprenorului:

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plățile, prevăzute de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

6.2. Obligațiunile Antreprenorului:

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul pînă la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.
- 6.2.5. Să participe împreună cu Beneficiarul la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.
- 6.2.6. Să întocmească, în prezența persoanei responsabile pentru obiect din partea Beneficiarului la momentul transmiterii lucrărilor intermediare, un act în formă scrisă cu privire la lucrările efectuate, cu indicarea materialelor folosite la construcția obiectelor.
- 6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele pînă la finisarea efectuării achitărilor.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor cînd astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.
- 6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.

7. Reponsabilitatea Părților

- 7.1. În cazul încălcării prevederilor prezentului contract părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a RM.
- 7.2. Fiecare parte este obligată să urmărească și să informeze partea opusă despre încălcarea prevederilor contractului.
- 7.3. Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi care depășește termenul final de predare a obiectului, stabilit în prezentul contract, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.
- 7.4. Pentru înlăturarea cu întârziere a neajunsurilor, care au fost depistate în perioada termenului de garanție pentru exploatarea obiectului, Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,3% din prețul lucrărilor de înlăturare a neajunsurilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.
- 7.5. Partea care a încălcat prezentul contract compensează părții opuse toate daunele care au fost cauzate ca urmare a încălcării contractului.
- 7.6. Dacă situațiile de forță majoră împiedică executarea prevederilor prezentului contract sau duc la întârzierea executării de către oricare dintre părți, partea este exonerată de executarea obligațiunilor, dar doar pe perioada cînd situațiile de forță majoră (cutremure de pămînt, inundații, alunecări de teren, etc.) au efect asupra executării obligațiunilor. Partea care nu poate executa obligațiunea din cauza situațiilor de forță majoră, este obligată să anunțe partea opusă prin telex, fax sau altă modalitate în termen de 24 de ore, prezentînd în termen de 30 de zile un document eliberat de Camera de Industrie și Comerț sau de un alt organ împuternicit, care atestă existența a astfel de circumstanțe.
- 7.7. Riscul deteriorării accidentale a obiectului contractului pînă la transmiterea acestuia îl poartă Antreprenorul. Acest risc trece către Beneficiar odată cu recepționarea lucrărilor.

Beneficiar

Director


Valachi V.



Antreprenor

Director

Tesa Iu.

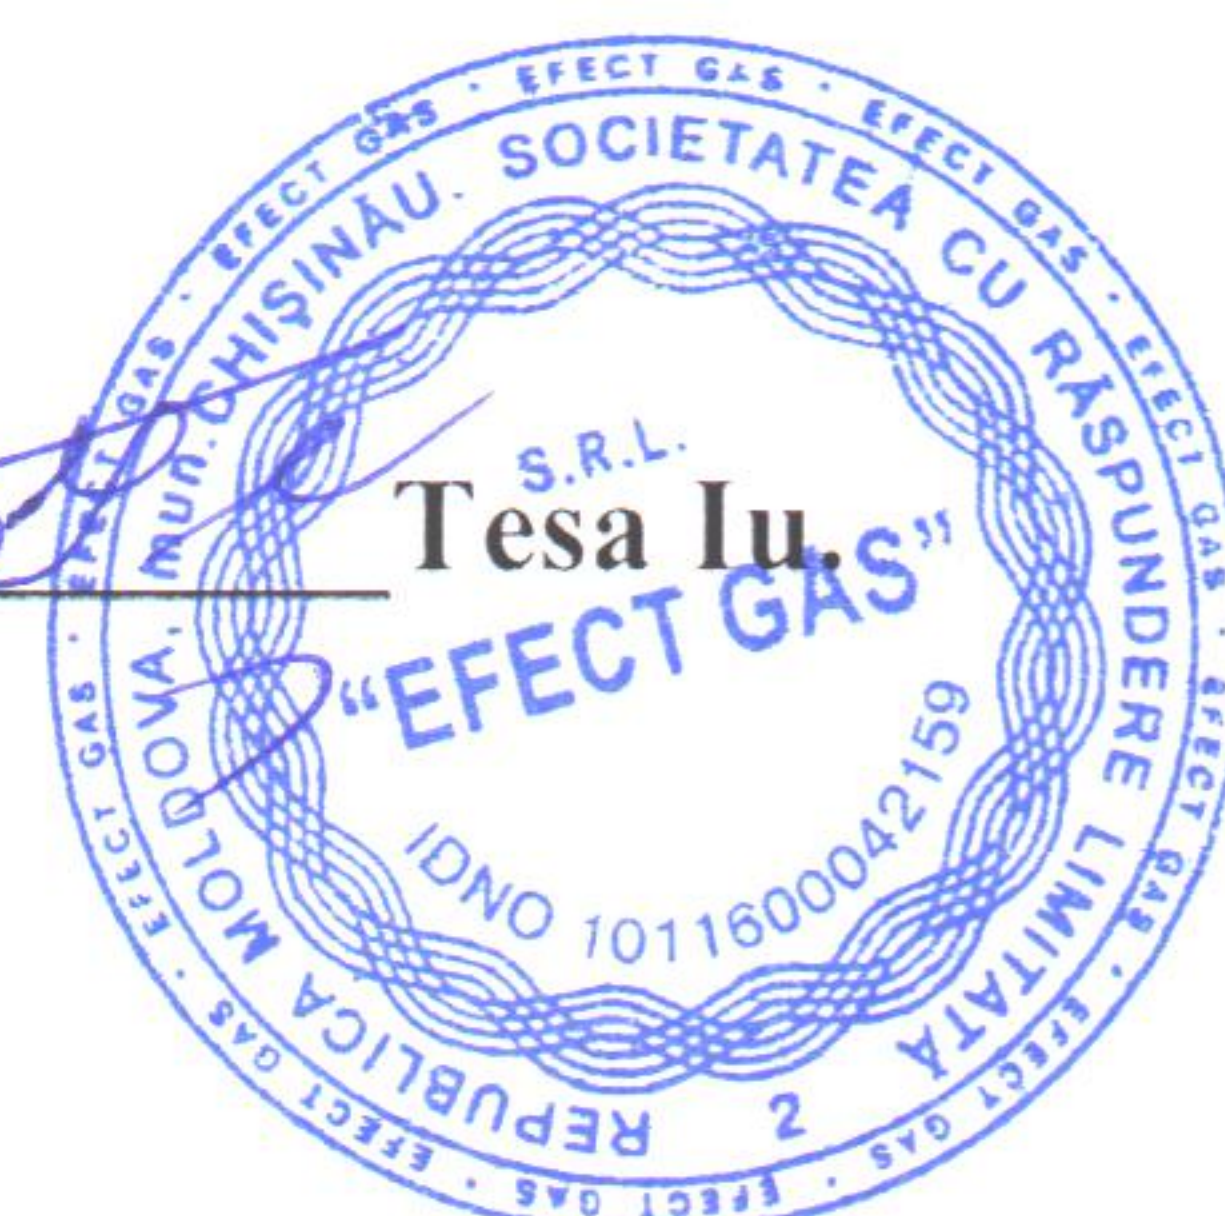

8. Rezilierea Contractului

8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul comun al părților în conformitate cu legislația în vigoare.

8.2. Partea interesată înaintează o propunere cu privire la rezilierea contractului în formă scrisă celeilalte părți, care este obligată să o examineze în termen de 20 zile.

8.3. În cazul acordului celeilalte părți rezilierea contractului se efectuează în baza unui act bilateral în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor efectuate de fapt de către Antreprenor;
- lista documentelor de executare care a fost transmisă Beneficiarului;
- obligațiunile de garanție, stabilite în prezentul contract sau de legislație în vigoare, pentru lucrările recepționate de către Beneficiar și menționate în actul de reziliere a contractului;
- alte obligațiuni ale părților ce țin de rezilierea contractului.

8.4. Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă:

- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult decât o dată) a admis executarea necalitativă a lucrărilor;
- în cazul încălcării de către Antreprenor a termenului de efectuare a lucrărilor prevăzute în p.3.1. din prezentul contract.

8.5. Antreprenorul se obligă să înceteze lucrările din momentul primirii avizului de către Beneficiar cu privire la rezilierea contractului.

8.6. Beneficiarul nu este obligat să achite pentru lucrările, care au fost efectuate după recepționarea avizului de către Antreprenor cu privire la rezilierea contractului.

8.7. În cazul apariției necesității de executare a lucrărilor pentru asigurarea păstrării obiectului nefinisat Antreprenorul se obligă să le efectueze în termenul convenit. Cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor respective sunt suportate de partea din a cărei inițiativă se reziliază contractul.

9. Transmiterea și Recepționarea Obiectului

9.1. Recepționarea obiectului se efectuează conform cerințelor Legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr.285 din 23.05.1996 și NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor) și altor acte normative.

10. Soluționarea Litigiilor

10.1. Toate litigiile care apar la executarea prezentului Contract se soluționează de comun acord a părților, iar în cazul imposibilității găsirii unui acord comun prin adresarea în Instanța de Judecată a R.M., cu respectarea normelor dreptului material al Republicii Moldova.

11. Dispoziții Finale

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

11.2. Nu se admit modificări, completări, excluderi a prevederilor prezentului contract.

11.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a republicii Moldova.

11.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a Contractului.

12. Rechizitele și Semnăturile Părților

Rechizitele Beneficiarului:

mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49.
Cod fiscal: 1003603150315
MD46VI022510900000007MDL
BC „VICTORIABANK” SA
Cod: VICBMD22871

«BENEFICIAR»

S.R.L. „Cahul gaz”
director Valachi Valeriu




Rechizitele Antreprenorului:

mun. Chișinău str. Igor Vieru 8 ap.11
Cod fiscal: 1011600042159
MD62ML000000002251829186
BC "Moldinconbank" S.A. fil. Invest
Cod: MOLDMD2X329

«ANTREPRENOR»

S.R.L. „Efect gas”
director Tesa Iurie

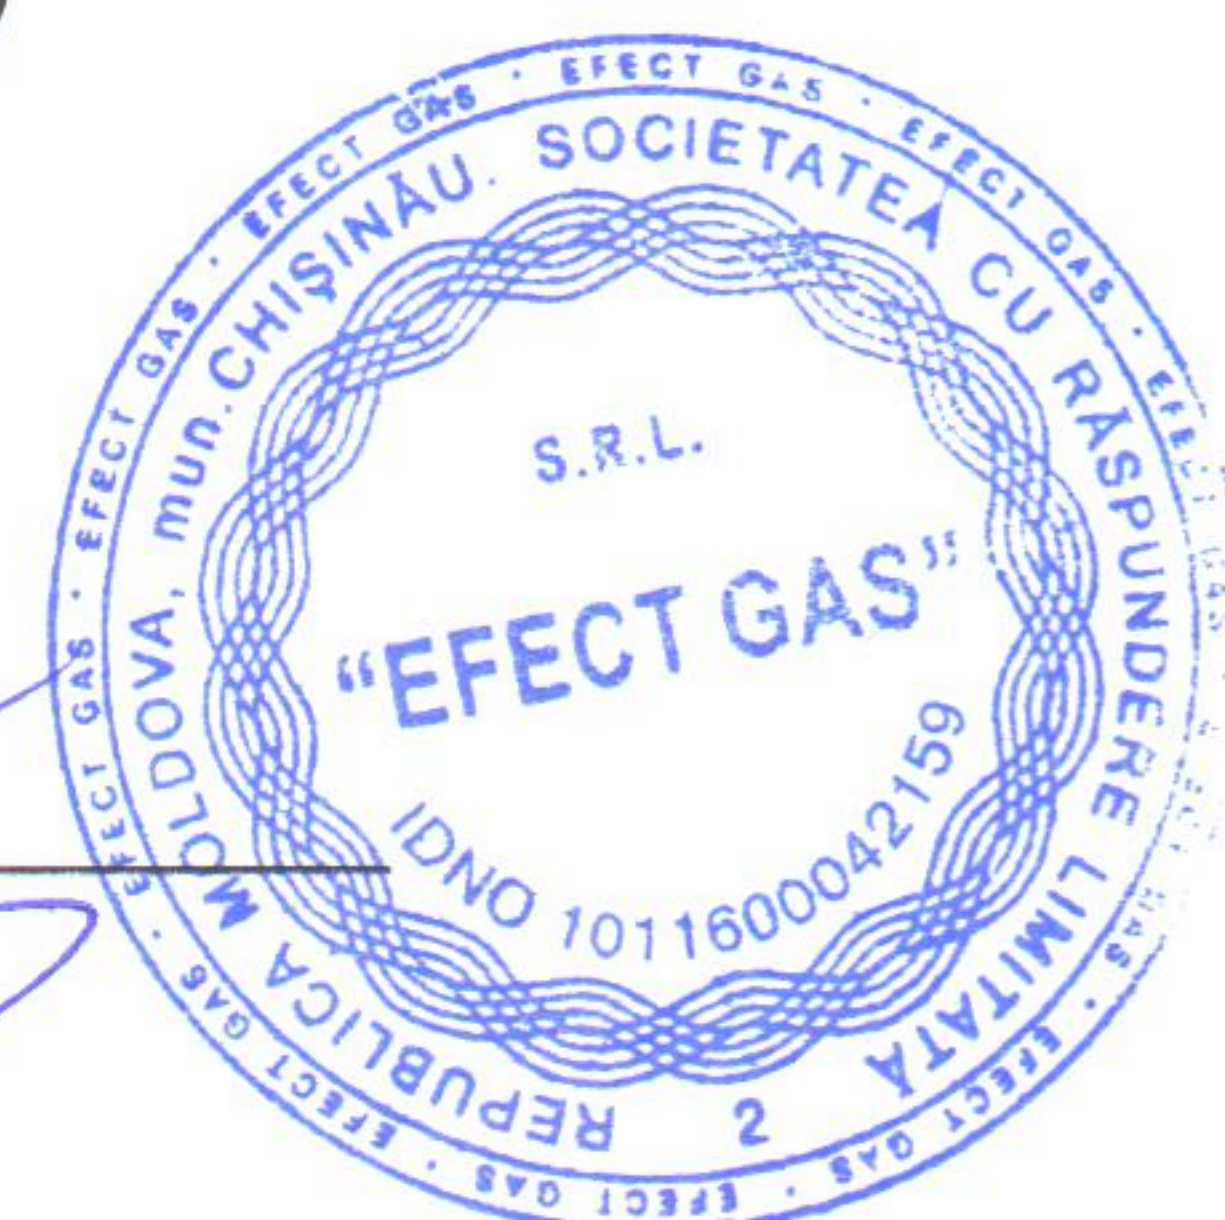

Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate în procesul de construcție a obiectului:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

• Cerințe față de PRG:

- * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
- * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
- * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
- * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
- * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
- * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
- * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
- * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
- * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
- * grile pentru ventilare;
- * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
- * țevile de refulare-purjare să fie de culoare roșie;
- * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
- * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
- * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
- * garanție la utilaje – minim 24 de luni;
- * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte;
- * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
- * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
- * tavă pentru depozitarea documentelor;
- * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
- * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor.
- * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
- * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
- * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
- * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip K3M;
- * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă:
1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete pînă și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - GOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.
- * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de pînă la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.



* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;

* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;

- Cerințe față de țeava de oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
- verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

- Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă:


- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- corespundere - ГОСТ 50838-95;
- calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100;
- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;
- trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

- Cerințe față de armături din oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

Beneficiar

Director

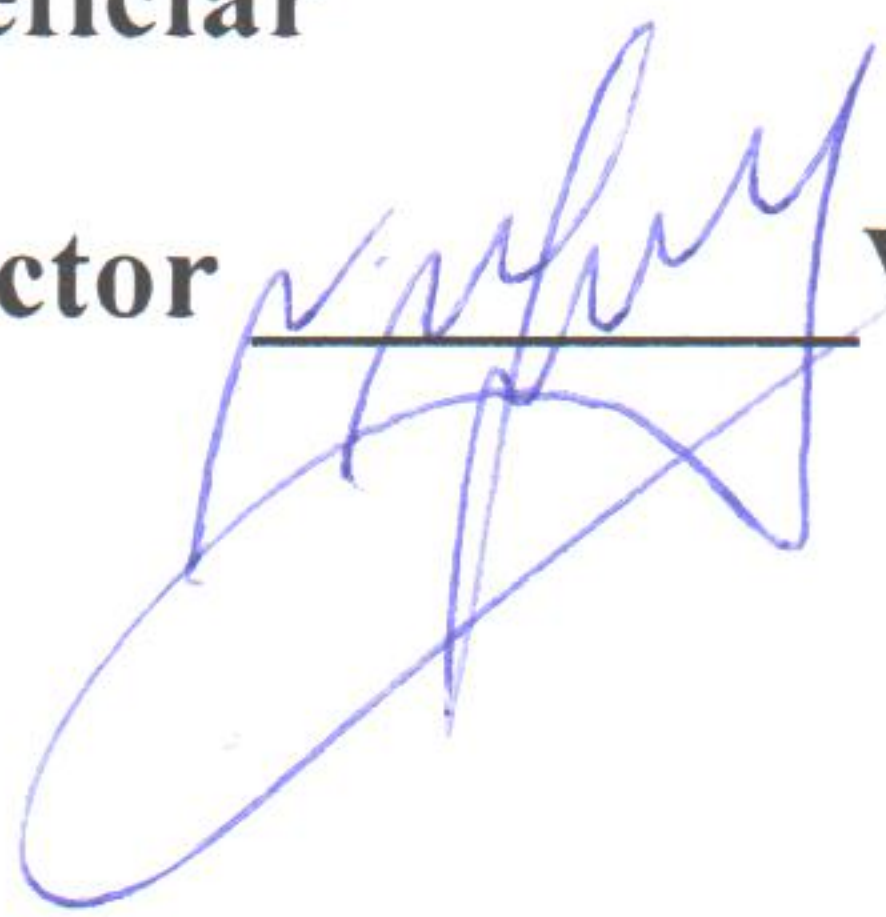


Valachi V.



Antreprenor

Director

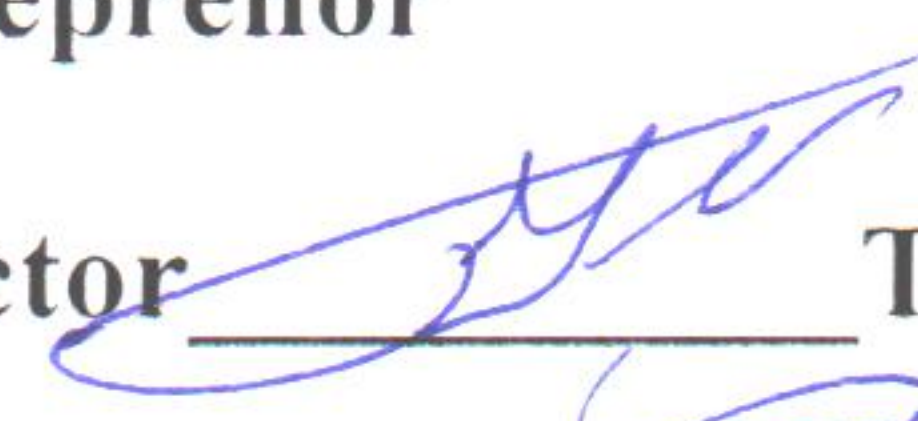

Tesa Iu.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Lucești r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

„12” 06 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar

SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr 1 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø32x3,0mm L=4,0m; Gazoductul de presiune medie suprateran Ø25x2,8mm L=1.0m; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm – 1buc.

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 213.A-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2006

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 05 februarie ” 2007 cu numărul 29824

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 27 februarie 2023 și s-au

(luna, anul)

terminat la 28 aprilie 2023.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Lucești r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

Reprezentantul antreprenorului general

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

(semnătura, numele, prenumele)

Iurie Tesa /

(semnătura, numele, prenumele)

Spitea Ion /

(semnătura, numele, prenumele)

Olceanu Marin /

(semnătura, numele, prenumele)

Demışcan Ruslan /

(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Lucești r-nul Cahul (denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

„12” 06 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar**

SRL „Cahul gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan. reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul **„Efect Gas” SRL**, a prezentat pentru recepție **PRG Nr 1 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip FRG 2MB – 100(dublu)**

(componenta obiectului)

2. Proiectul № **213.A-AGE** a fost elaborat de **SRL „Metan-K” an 2006**

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din **” 05 februarie ” 2007** cu numărul **29824**

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **27 februarie 2023** și s-au

(luna, anul)

terminat la **28 aprilie 2023.**

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Lucești r-nul Cahul**

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar**

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Spitca Ion

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Olceanu Marin

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan

(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din

satul Lucești r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

„12” 06 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demișcan Ruslan reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr. 1 Gazoductul

de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø63x5,8mm L=175,0m; Ø50x4,6mm L=371,0m;

Ø40x3,7mm L=245,0m; Ø32x3,0mm L=651,0m; Gazoductul de presiune joasă suprateran Ø

Ø57x3,5mm L=1,5m; Ø25x2,8mm L=17,0m; Ø20x2,8mm L=62,0m; Robinet sferic cu mufe Ø20mm –

31buc. Ieșiri din sol – 28 buc. (componența obiectului) Consumatori :- 31 buc.

2. Proiectul № 213.A-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2006

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 05 februarie ” 2007 cu numărul 29824

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 27 februarie 2023 și s-au

(luna, anul)

terminat la 28 aprilie 2023.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări de construcție - montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Lucești r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

V. Vălcăchi
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Spitea Ion
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Olceanu Marin
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Demișcan Ruslan
(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Lucești r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

„12” 06 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr. 2 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø32x3,0mm L=5,0m; Gazoductul de presiune medie supratran Ot Ø25x2,8mm L=1.0m; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm – 1buc.

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 213.A-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2006

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 05 februarie ” 2007 cu numărul 29824

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 27 februarie 2023 și s-au

(luna, anul)

terminat la 28 aprilie 2023.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Lucești r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)

din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar



(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general



Iurie Tesa

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Spitca Ion

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Olceanu Marin

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST



Demışcan Ruslan

(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Lucești r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

„12” 06 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar**

SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demișcan Ruslan. reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul **„Efect Gas” SRL**, a prezentat pentru recepție **PRG Nr. 2 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două reglatoare tip ERG-SE – 50(dublu)**

(componenta obiectului)

2. Proiectul № **213.A-AGE** a fost elaborat de **SRL „Metan-K” an 2006**

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de **AST** din **„05 februarie” 2007** cu numărul **29824**

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la **27 februarie 2023** și s-au

(luna, anul)

terminat la **28 aprilie 2023**.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări de construcție - montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: **Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Lucești r-nul Cahul**

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, **beneficiar**

V. Vorobci /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Spitca Ion /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Olceanu Marin /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Demișcan Ruslan /

(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Lucești r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

„12” 06 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar

SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Olceanu Marin SRL „Cahul Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Demiscan Ruslan reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr. 2 Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø63x5,8mm L=165,0m; Ø50x4,6mm L=180,0m; Ø40x3,7mm L=120,0m; Ø32x3,0mm L=406,0m; Gazoductul de presiune joasă suprateran Ø1057x3,5mm L=2,0m; Ø25x2,8mm L=10,0m; Ø20x2,8mm L=36,0m; Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 18buc. Je piri din vol: - 15.buc (componenta obiectului) Consumatori: - 16buc.

2. Proiectul № 213.A-AGE a fost elaborat de SRL „Metan-K” an 2006

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 05 februarie ” 2007 cu numărul 29824

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 27 februarie 2023 și s-au terminat la 28 aprilie 2023.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Lucești r-nul Cahul

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se considera primit (documentația de executare se anexează)

din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

V. Valachi
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

Spitca Ion /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Olceanu Marin /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Demiscan Ruslan /

(semnătura, numele, prenumele)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

№. 3 inv-02/2023

09 februarie 2023

mun. Cahul

„Cahul-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003603150315, în persoana directorului, d-nul Valachi Valeriu, care acționează în baza Statutului și „Efect-gas” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Igor Vieru 8, ap.11, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1011600042159, în persoana directorului d-nul Tesa Iurie, care acționează în baza Statutului, ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denumiți în continuare-Părți) au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1 Prin prezentul contract **Antreprenorul** se obligă să efectueze **Beneficiarului** lucrări de construcții (în continuare **Servicii**) a obiectului: „**Gazificarea satului Vișneovca, din r-nul Cantemir**”, iar **Beneficiarul** se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2 **Antreprenorul** se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele **Antreprenorului**, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor legislației privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

1.3 Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul și Ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul, pentru serviciile acordate în corespundere cu pct. 1.1. din prezentul Contract, constituie **560 076,56 lei inclusiv TVA (cincisute șaizeci mii șaptezeci și șase lei, 56 bani).**

2.2. Plata serviciilor conform prezentului Contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului**. Data efectuării transferului din contul **Beneficiarului** în contul **Antreprenorului**, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al **Antreprenorului**.

2.3. Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către **Beneficiar** în termen de **90 (nouăzeci)** zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care **Beneficiarul** are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către **Antreprenor**. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul **Antreprenorului**.

2.4. **Beneficiarul** poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform gradului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate. **Beneficiarul** este obligat în termen de **5** zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către **Antreprenor**, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, **Beneficiarul** întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în formă scrisă, în termenul indicat mai sus.

2.5. **Beneficiarul** efectuează plata pentru lucrările executate în termen de **90** de zile lucrătoare după semnarea actului privind executarea lucrărilor.

2.6. Achitarea se efectuează prin transferul mijloacelor bănești în contul curent al **Antreprenorului**, indicat în prezentul contract.

2.7. Părțile se obligă să informeze în formă scrisă despre schimbarea contului sau a altor date aferente achitării conform prezentului contract.

Beneficiar

Director

Valachi V.



Antreprenor

Director

Tesa Iu.



3. Termenul Contractului

3.1. Termenul de executare a lucrărilor, conform prezentului contract, este din data de **03.07.2023** pînă la **15.08.2023**, cu termenul final de dare în exploatare pînă la **30.08.2023**.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră data semnării de către părți a Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate fără obiecții.

3.3. Prezentul contract este valabil pînă la executarea de către părți a obligațiunilor prevăzute în acesta.

4. Calitatea Obiectului Contractului

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare. Cerințele față de materialele de construcție și utilaj trebuie să corespundă condițiilor indicate în anexa Nr. 1 la prezentul contract.

4.3. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 2 ani. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlăture din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Perioada de garanție începe din ziua semnării Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

4.4 Garanția de executare justă este asigurată prin transferul de către Antreprenor 5% din suma contractului, pe contul bancar al Beneficiarului, pînă la începerea lucrărilor.

5. Drepturile și Obligațiunile Beneficiarului

5.1. Drepturile Beneficiarului:

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor la necesitate în caz de neexecutare calitativă.

5.2. Obligațiunile Beneficiarului:

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.

5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.

5.2.4. Să recepționeze lucrările efectuate în ordinea stabilită.

5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

Beneficiar

Director

Valachi V.



Antreprenor

Director

Tesa lu



6. Drepturile și Obligațiunile Antreprenorului

6.1. Drepturile Antreprenorului:

6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plățile, prevăzute de prezentul Contract.

6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.

6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

6.2. Obligațiunile Antreprenorului:

6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul pînă la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.

6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.

6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.

6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.

6.2.5. Să participe împreună cu Beneficiarul la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.

6.2.6. Să întocmească, în prezența persoanei responsabile pentru obiect din partea Beneficiarului la momentul transmiterii lucrărilor intermediare, un act în formă scrisă cu privire la lucrările efectuate, cu indicarea materialelor folosite la construcția obiectelor.

6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.

6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele pînă la finisarea efectuării achitărilor.

6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor cînd astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.

6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.

7. Reponsabilitatea Părților

7.1. În cazul încălcării prevederilor prezentului contract părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

7.2. Fiecare parte este obligată să urmărească și să informeze partea opusă despre încălcarea prevederilor contractului.

7.3. Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi care depășește termenul final de predare a obiectului, stabilit în prezentul contract, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.

7.4. Pentru înlăturarea cu întârziere a neajunsurilor, care au fost depistate în perioada termenului de garanție pentru exploatarea obiectului, Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,3% din prețul lucrărilor de înlăturare a neajunsurilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.

7.5. Partea care a încălcat prezentul contract compensează părții opuse toate daunele care au fost cauzate ca urmare a încălcării contractului.

7.6. Dacă situațiile de forță majoră împiedică executarea prevederilor prezentului contract sau duc la întârzierea executării de către oricare dintre părți, partea este exonerată de executarea obligațiunilor, dar doar pe perioada cînd situațiile de forță majoră (cutremure de pămînt, inundații, alunecări de teren, etc.) au efect asupra executării obligațiunilor. Partea care nu poate executa obligațiunea din cauza situațiilor de forță majoră, este obligată să anunțe partea opusă prin telex, fax sau altă modalitate în termen de 24 de ore, prezentînd în termen de 30 de zile un document eliberat de Camera de Industrie și Comerț sau de un alt organ împuternicit, care atestă existența a astfel de circumstanțe.

7.7. Riscul deteriorării accidentale a obiectului contractului pînă la transmiterea acestuia se poartă Antreprenorul. Acest risc trece către Beneficiar odată cu recepționarea lucrărilor.

Beneficiar

Director

Valachi V.

Antreprenor

Director

Tesa Iu.



8. Rezilierea Contractului

- 8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul comun al părților în conformitate cu legislația în vigoare.
- 8.2. Partea interesată înaintează o propunere cu privire la rezilierea contractului în formă scrisă celeilalte părți, care este obligată să o examineze în termen de 20 zile.
- 8.3. În cazul acordului celeilalte părți rezilierea contractului se efectuează în baza unui act bilateral în care se indică:
- volumul și costul lucrărilor efectuate de fapt de către Antreprenor;
 - lista documentelor de executare care a fost transmisă Beneficiarului;
 - obligațiunile de garanție, stabilite în prezentul contract sau de legislație în vigoare, pentru lucrările recepționate de către Beneficiar și menționate în actul de reziliere a contractului;
 - alte obligațiuni ale părților ce țin de rezilierea contractului.
- 8.4. Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă:
- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult decât o dată) a admis executarea necalitativă a lucrărilor;
 - în cazul încălcării de către Antreprenor a termenului de efectuare a lucrărilor prevăzute în p.3.1. din prezentul contract.
- 8.5. Antreprenorul se obligă să înceteze lucrările din momentul primirii avizului de către Beneficiar cu privire la rezilierea contractului.
- 8.6. Beneficiarul nu este obligat să achite pentru lucrările, care au fost efectuate după recepționarea avizului de către Antreprenor cu privire la rezilierea contractului.
- 8.7. În cazul apariției necesității de executare a lucrărilor pentru asigurarea păstrării obiectului nefinisat Antreprenorul se obligă să le efectueze în termenul convenit. Cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor respective sunt suportate de partea din a cărei inițiativă se reziliază contractul.

9. Transmiterea și Recepționarea Obiectului

- 9.1. Recepționarea obiectului se efectuează conform cerințelor Legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr.285 din 23.05.1996 și NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor) și altor acte normative.

10. Soluționarea Litigiilor

- 10.1. Toate litigiile care apar la executarea prezentului Contract se soluționează de comun acord a părților, iar în cazul imposibilității găsirii unui acord comun prin adresarea în Instanța de Judecată a R.M., cu respectarea normelor dreptului material al Republicii Moldova.

11. Dispoziții Finale

- 11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
- 11.2. Nu se admit modificări, completări, excluderi a prevederilor prezentului contract.
- 11.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a republicii Moldova.
- 11.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a Contractului.

12. Rechizitele și Semnăturile Părților

Rechizitele Beneficiarului:

mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49.
Cod fiscal: 1003603150315
MD46VI022510900000007MDL
BC „VICTORIABANK” SA
Cod: VICBMD22871

«BENEFICIAR»

S.R.L. „Cahul gaz”
director Valachi Valeriu

Rechizitele Antreprenorului:

mun. Chișinău str. Igor Vieru 8 ap.11
Cod fiscal: 1011600042159
MD62ML000000002251829186
BC “Moldinconbank” S.A. fil. Invest
Cod: MOLDMD2X329

«ANTREPRENOR»

S.R.L. „Efect gas”
director Tesa Iurie



Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate în procesul de construcție a obiectului:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

• Cerințe față de PRG:

- * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
- * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foi metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1.5 mm;
- * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
- * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
- * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
- * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
- * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
- * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
- * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
- * grile pentru ventilare;
- * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
- * țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșie;
- * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
- * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
- * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
- * garanție la utilaje – minim 24 de luni;
- * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte;
- * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
- * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
- * tavă pentru depozitarea documentelor;
- * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
- * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor.
- * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
- * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
- * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
- * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip K3M;
- * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă:
1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - GOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.
- * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.



[Handwritten signature]



* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;

* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;

• Cerințe față de țeava de oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
- verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

• Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- corespundere - ГОСТ 50838-95;
- calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100;
- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;
- trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

• Cerințe față de armături din oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

Beneficiar

Director


Valachi V.



Antreprenor

Director

Tesa Iu.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Visniovca r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

„ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.6 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø75x6,8mm L=80,0m; Ø32x3,0mm L=130,0m; Gazoductul de presiune medie supraterran Ø25x3,0mm L=1,0m; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm – Ibuc.

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 10-38/2004-K a fost elaborat de SA „Intexnauca” an 2011
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)
Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 04 aprilie ” 2011 cu numărul 3926
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 03 iulie 2023 și s-au terminat la 18 august 2023.
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Visniovca r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ 30 ” 08 2023

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare S.R.L. «CAHUL-GAZ» /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Beregoi R. /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Vișniovca r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„ ” 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.6 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu); Gazoduct de p/m supraterran din Ot Ø25x3,0mm L= n; Gazoduct de p/j supraterran din Ot Ø76x3,5mm L= m
(componența obiectului)

2. Proiectul № 10-38/2004-K a fost elaborat de SA „Intexnauca” an 2011
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)
Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 04 aprilie ” 2014 cu numărul 3926
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 03 iulie 2023 și s-au terminat la 18 august 2023.
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Vișniovca r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „30 ” 08 2023

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST /
(semnătura, numele, prenumele)



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din

satul Visniovca r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„ ” 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.6 Consumatori - 42 Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø75x6,8mm L=90,0m; Ø63x5,8mm L=250,0m; Ø50x4,6mm L=180,0m; Ø40x3,7mm L=250,0m; Ø32x3,0mm L=440,0m; Gazoductul de presiune joasă supraterran Ot Ø76x3,5mm L=20m; Ø25x2,8mm L=21,0m; Ø20x2,8mm L=84,0m. Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 42buc.

(componența obiectului)

2. Proiectul № 10-38/2004-K a fost elaborat de SA „Intexnauca” an 2014

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din „ 04 aprilie ” 2011 cu numărul 3926

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 03 iulie 2023 și s-au

(luna, anul)

terminat la 18 august 2023.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Visniovca r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de ezechutare se anexează)

din „ 30 ” 08 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

Valachi Valeriu /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Vavilov Gheorghe /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

(semnătura, numele, prenumele)

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
№. 4 inv-02/2023

09 februarie 2023

mun. Cahul

„Cahul-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003603150315, în persoana directorului, d-nul Valachi Valeriu, care acționează în baza Statutului și „Efect-gas” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Igor Vieru 8, ap.11, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1011600042159, în persoana directorului d-nul Tesa Iurie, care acționează în baza Statutului, ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denumiți în continuare-Părți) au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1 Prin prezentul contract **Antreprenorul** se obligă să efectueze **Beneficiarului** lucrări de construcții (în continuare **Servicii**) a obiectului: „**Gazificarea satului Gotești, din r-nul Cantemir**”, iar **Beneficiarul** se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2 **Antreprenorul** se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele **Antreprenorului**, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor legislației privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

1.3 Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul și Ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul, pentru serviciile acordate în corespundere cu pct. 1.1. din prezentul Contract, constituie **694 480,59 lei inclusiv TVA (șasesute nouăzeci și patru mii patrusute optzeci lei, 59 bani).**

2.2. Plata serviciilor conform prezentului Contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului**. Data efectuării transferului din contul **Beneficiarului** în contul **Antreprenorului**, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al **Antreprenorului**.

2.3. Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către **Beneficiar** în termen de **90 (nouăzeci)** zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care **Beneficiarul** are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către **Antreprenor**. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul **Antreprenorului**.

2.4. **Beneficiarul** poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform gradului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate. Beneficiarul este obligat în termen de **5** zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către Antreprenor, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, Beneficiarul întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în formă scrisă, în termenul indicat mai sus.

2.5. **Beneficiarul** efectuează plata pentru lucrările executate în termen de **90** de zile lucrătoare după semnarea actului privind executarea lucrărilor.

2.6. Achitarea se efectuează prin transferul mijloacelor bănești în contul curent al Antreprenorului, indicat în prezentul contract.

2.7. Părțile se obligă să informeze în formă scrisă despre schimbarea contului sau a altor date aferente achitării conform prezentului contract.

Beneficiar

Director


Valachi V.



Antreprenor

Director

Tesa Iu.

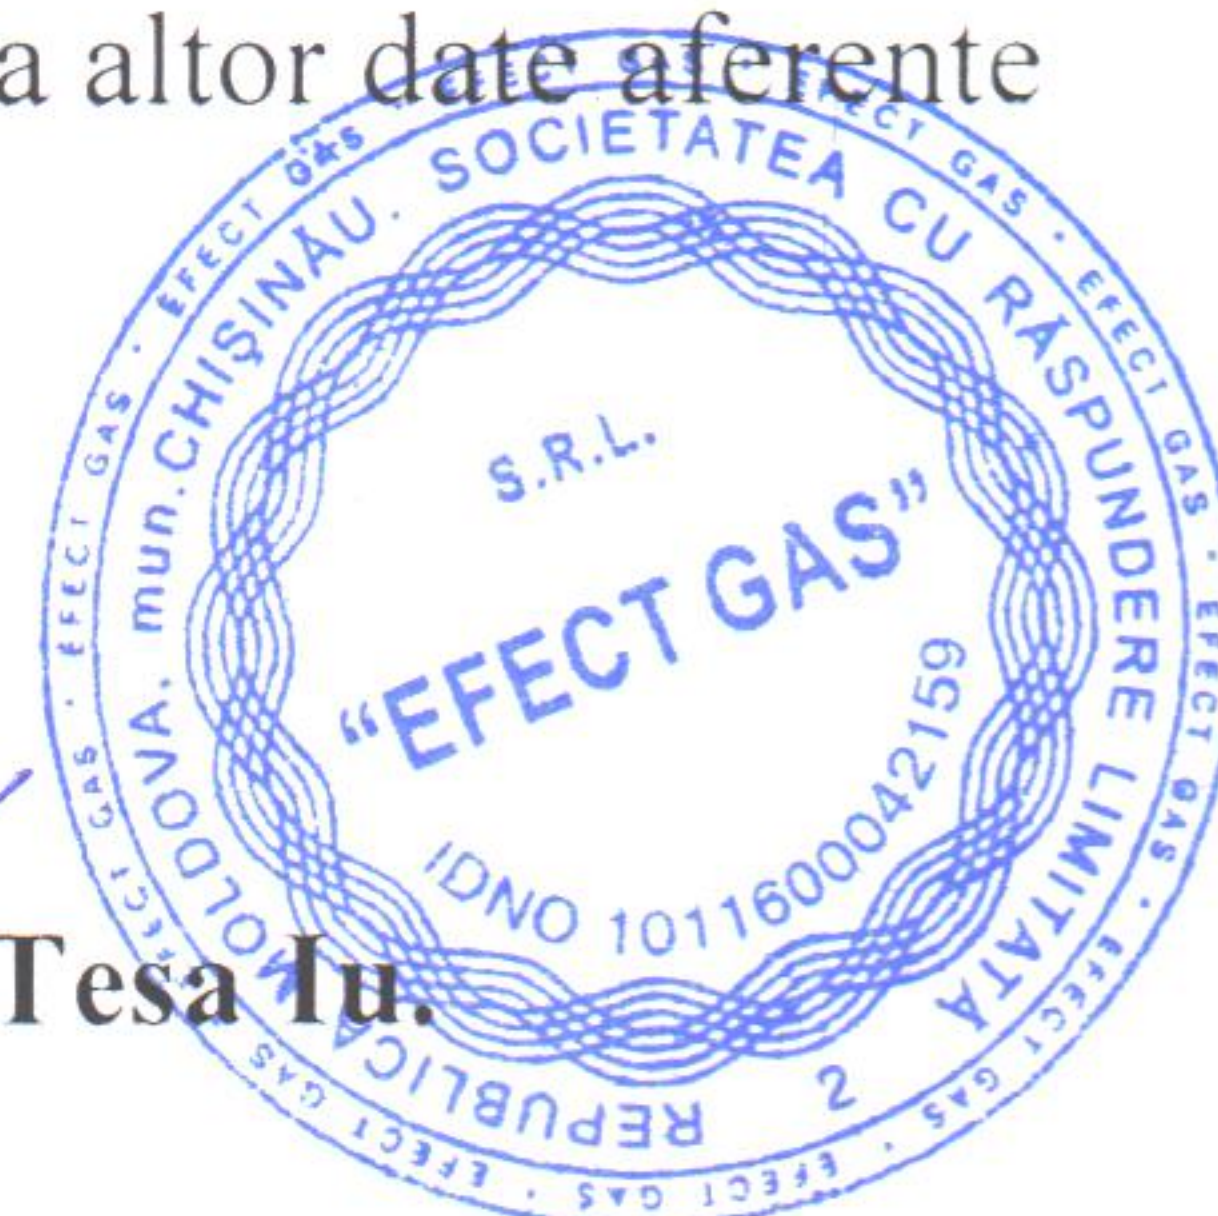

3. Termenul Contractului

- 3.1. Termenul de executare a lucrărilor, conform prezentului contract, este din data de **03.07.2023** până la **15.08.2023**, cu termenul final de dare în exploatare până la **30.08.2023**.
- 3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră data semnării de către părți a Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate fără obiecții.
- 3.3. Prezentul contract este valabil până la executarea de către părți a obligațiilor prevăzute în acesta.

4. Calitatea Obiectului Contractului

- 4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.
- 4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare. Cerințele față de materialele de construcție și utilaj trebuie să corespundă condițiilor indicate în anexa Nr. 1 la prezentul contract.
- 4.3. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 2 ani. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlăture din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Perioada de garanție începe din ziua semnării Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.
- 4.4. Garanția de executare justă este asigurată prin transferul de către Antreprenor 5% din suma contractului, pe contul bancar al Beneficiarului, până la începerea lucrărilor.

5. Drepturile și Obligațiunile Beneficiarului

5.1. Drepturile Beneficiarului:

- 5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.
- 5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către Antreprenor.
- 5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor la necesitate în caz de neexecutare calitativă.

5.2. Obligațiunile Beneficiarului:

- 5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.
- 5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.
- 5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.
- 5.2.4. Să recepționeze lucrările efectuate în ordinea stabilită.
- 5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

Beneficiar

Director

Valachi V.



Antreprenor

Director

Tesa Tu



6. Drepturile și Obligațiunile Antreprenorului

6.1. Drepturile Antreprenorului:

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plățile, prevăzute de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

6.2. Obligațiunile Antreprenorului:

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul pînă la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.
- 6.2.5. Să participe împreună cu Beneficiarul la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.
- 6.2.6. Să întocmească, în prezența persoanei responsabile pentru obiect din partea Beneficiarului la momentul transmiterii lucrărilor intermediare, un act în formă scrisă cu privire la lucrările efectuate, cu indicarea materialelor folosite la construcția obiectelor.
- 6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele pînă la finisarea efectuării achitărilor.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor cînd astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.
- 6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.

7. Reponsabilitatea Părților

- 7.1. În cazul încălcării prevederilor prezentului contract părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a RM.
- 7.2. Fiecare parte este obligată să urmărească și să informeze partea opusă despre încălcarea prevederilor contractului.
- 7.3. Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi care depășește termenul final de predare a obiectului, stabilit în prezentul contract, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.
- 7.4. Pentru înlăturarea cu întârziere a neajunsurilor, care au fost depistate în perioada termenului de garanție pentru exploatarea obiectului, Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,3% din prețul lucrărilor de înlăturare a neajunsurilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.
- 7.5. Partea care a încălcat prezentul contract compensează părții opuse toate daunele care au fost cauzate ca urmare a încălcării contractului.
- 7.6. Dacă situațiile de forță majoră împiedică executarea prevederilor prezentului contract sau duc la întârzierea executării de către oricare dintre părți, partea este exonerată de executarea obligațiunilor, dar doar pe perioada cînd situațiile de forță majoră (cutremure de pămînt, inundații, alunecări de teren, etc.) au efect asupra executării obligațiunilor. Partea care nu poate executa obligațiunea din cauza situațiilor de forță majoră, este obligată să anunțe partea opusă prin telex, fax sau altă modalitate în termen de 24 de ore, prezentînd în termen de 30 de zile un document eliberat de Camera de Industrie și Comerț sau de un alt organ împuternicit, care atestă existența a astfel de circumstanțe.
- 7.7. Riscul deteriorării accidentale a obiectului contractului pînă la transmiterea acestuia îl poartă Antreprenorul. Acest risc trece către Beneficiar odată cu recepționarea lucrărilor.

Beneficiar


Director

Valachi V.

Antreprenor

Director

Tesa lu.

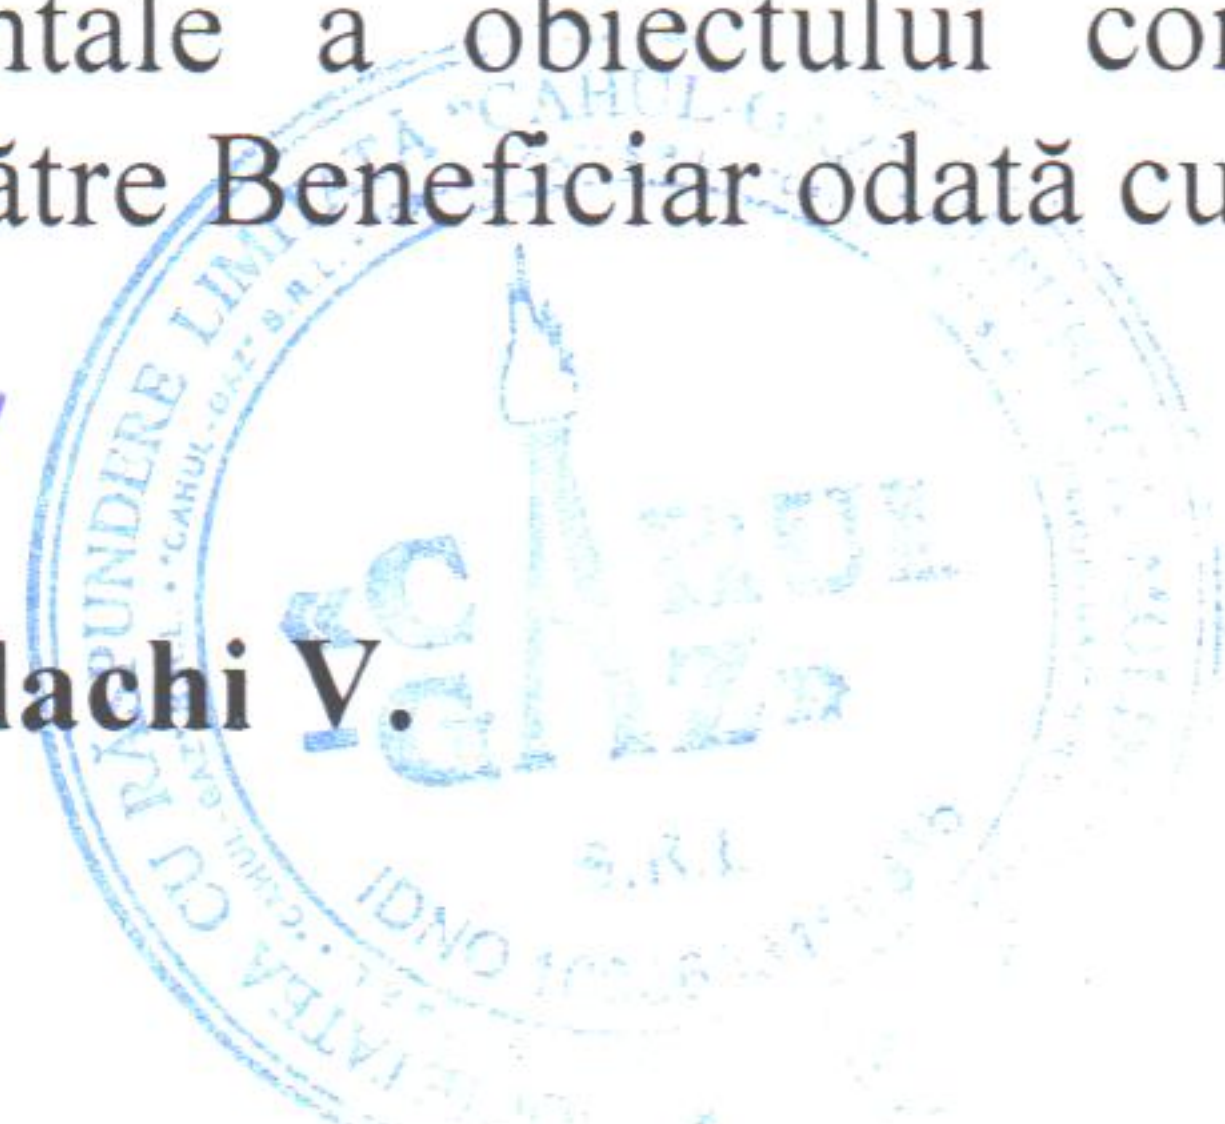

8. Rezilierea Contractului

- 8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul comun al părților în conformitate cu legislația în vigoare.
- 8.2. Partea interesată înaintează o propunere cu privire la rezilierea contractului în formă scrisă celeilalte părți, care este obligată să o examineze în termen de 20 zile.
- 8.3. În cazul acordului celeilalte părți rezilierea contractului se efectuează în baza unui act bilateral în care se indică:
- volumul și costul lucrărilor efectuate de fapt de către Antreprenor;
 - lista documentelor de executare care a fost transmisă Beneficiarului;
 - obligațiunile de garanție, stabilite în prezentul contract sau de legislație în vigoare, pentru lucrările recepționate de către Beneficiar și menționate în actul de reziliere a contractului;
 - alte obligațiuni ale părților ce țin de rezilierea contractului.
- 8.4. Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă:
- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult decât o dată) a admis executarea necalitativă a lucrărilor;
 - în cazul încălcării de către Antreprenor a termenului de efectuare a lucrărilor prevăzute în p.3.1. din prezentul contract.
- 8.5. Antreprenorul se obligă să înceteze lucrările din momentul primirii avizului de către Beneficiar cu privire la rezilierea contractului.
- 8.6. Beneficiarul nu este obligat să achite pentru lucrările, care au fost efectuate după recepționarea avizului de către Antreprenor cu privire la rezilierea contractului.
- 8.7. În cazul apariției necesității de executare a lucrărilor pentru asigurarea păstrării obiectului nefinisat Antreprenorul se obligă să le efectueze în termenul convenit. Cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor respective sunt suportate de partea din a cărei inițiativă se reziliază contractul.

9. Transmiterea și Recepționarea Obiectului

- 9.1. Recepționarea obiectului se efectuează conform cerințelor Legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr.285 din 23.05.1996 și NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor) și altor acte normative.

10. Soluționarea Litigiilor

- 10.1. Toate litigiile care apar la executarea prezentului Contract se soluționează de comun acord a părților, iar în cazul imposibilității găsirii unui acord comun prin adresarea în Instanța de Judecată a R.M., cu respectarea normelor dreptului material al Republicii Moldova.

11. Dispoziții Finale

- 11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
- 11.2. Nu se admit modificări, completări, excluderi a prevederilor prezentului contract.
- 11.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a republicii Moldova.
- 11.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a Contractului.

12. Rechizitele și Semnăturile Părților

Rechizitele Beneficiarului:

mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49.
Cod fiscal: 1003603150315
MD46VI022510900000007MDL
BC „VICTORIABANK” SA
Cod: VICBMD22871

«BENEFICIAR»

S.R.L. „Cahul gaz”
director Valachi Valeriu




Rechizitele Antreprenorului:

mun. Chișinău str. Igor Vieru 8 ap.11
Cod fiscal: 1011600042159
MD62ML000000002251829186
BC „Moldinconbank” S.A. fil. Invest
Cod: MOLDMD2X329

«ANTREPRENOR»

S.R.L. „Efect gas”
director Tesa Iurie

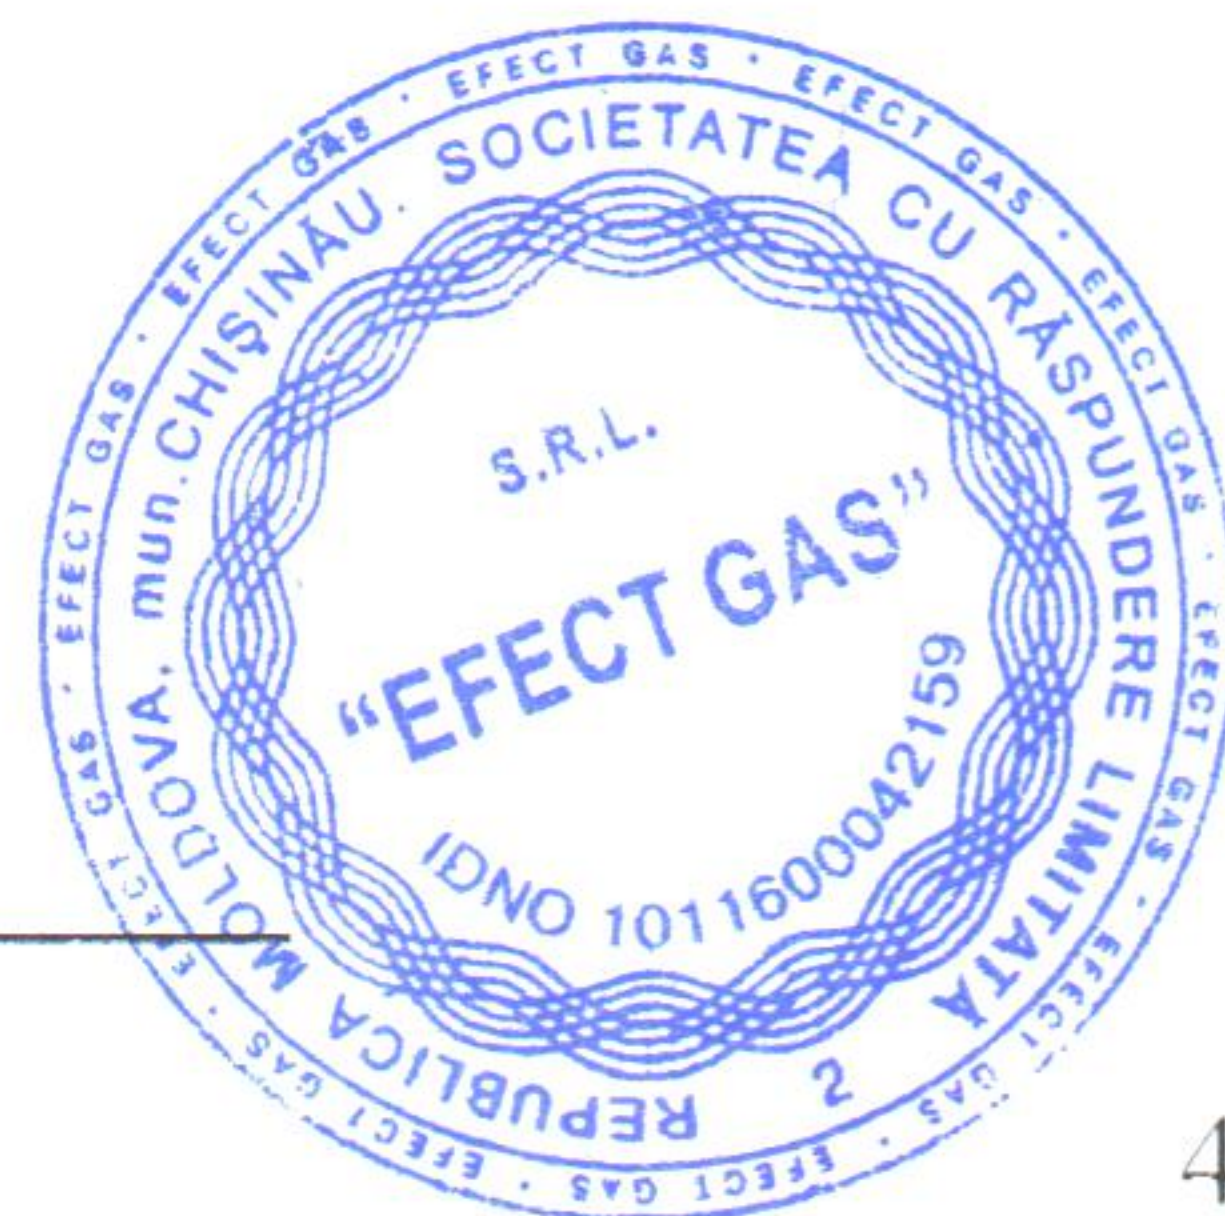


Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate în procesul de construcție a obiectului:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

• Cerințe față de PRG:

- * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
- * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foii metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
- * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
- * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
- * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
- * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
- * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
- * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
- * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
- * grile pentru ventilare;
- * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
- * țevile de refulare-purjare să fie de culoare roșie;
- * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
- * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
- * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
- * garanție la utilaje – minim 24 de luni;
- * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte;
- * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
- * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
- * tavă pentru depozitarea documentelor;
- * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
- * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor.
- * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
- * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
- * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
- * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip K3M;
- * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă:
1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete pînă și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.
- * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de pînă la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.

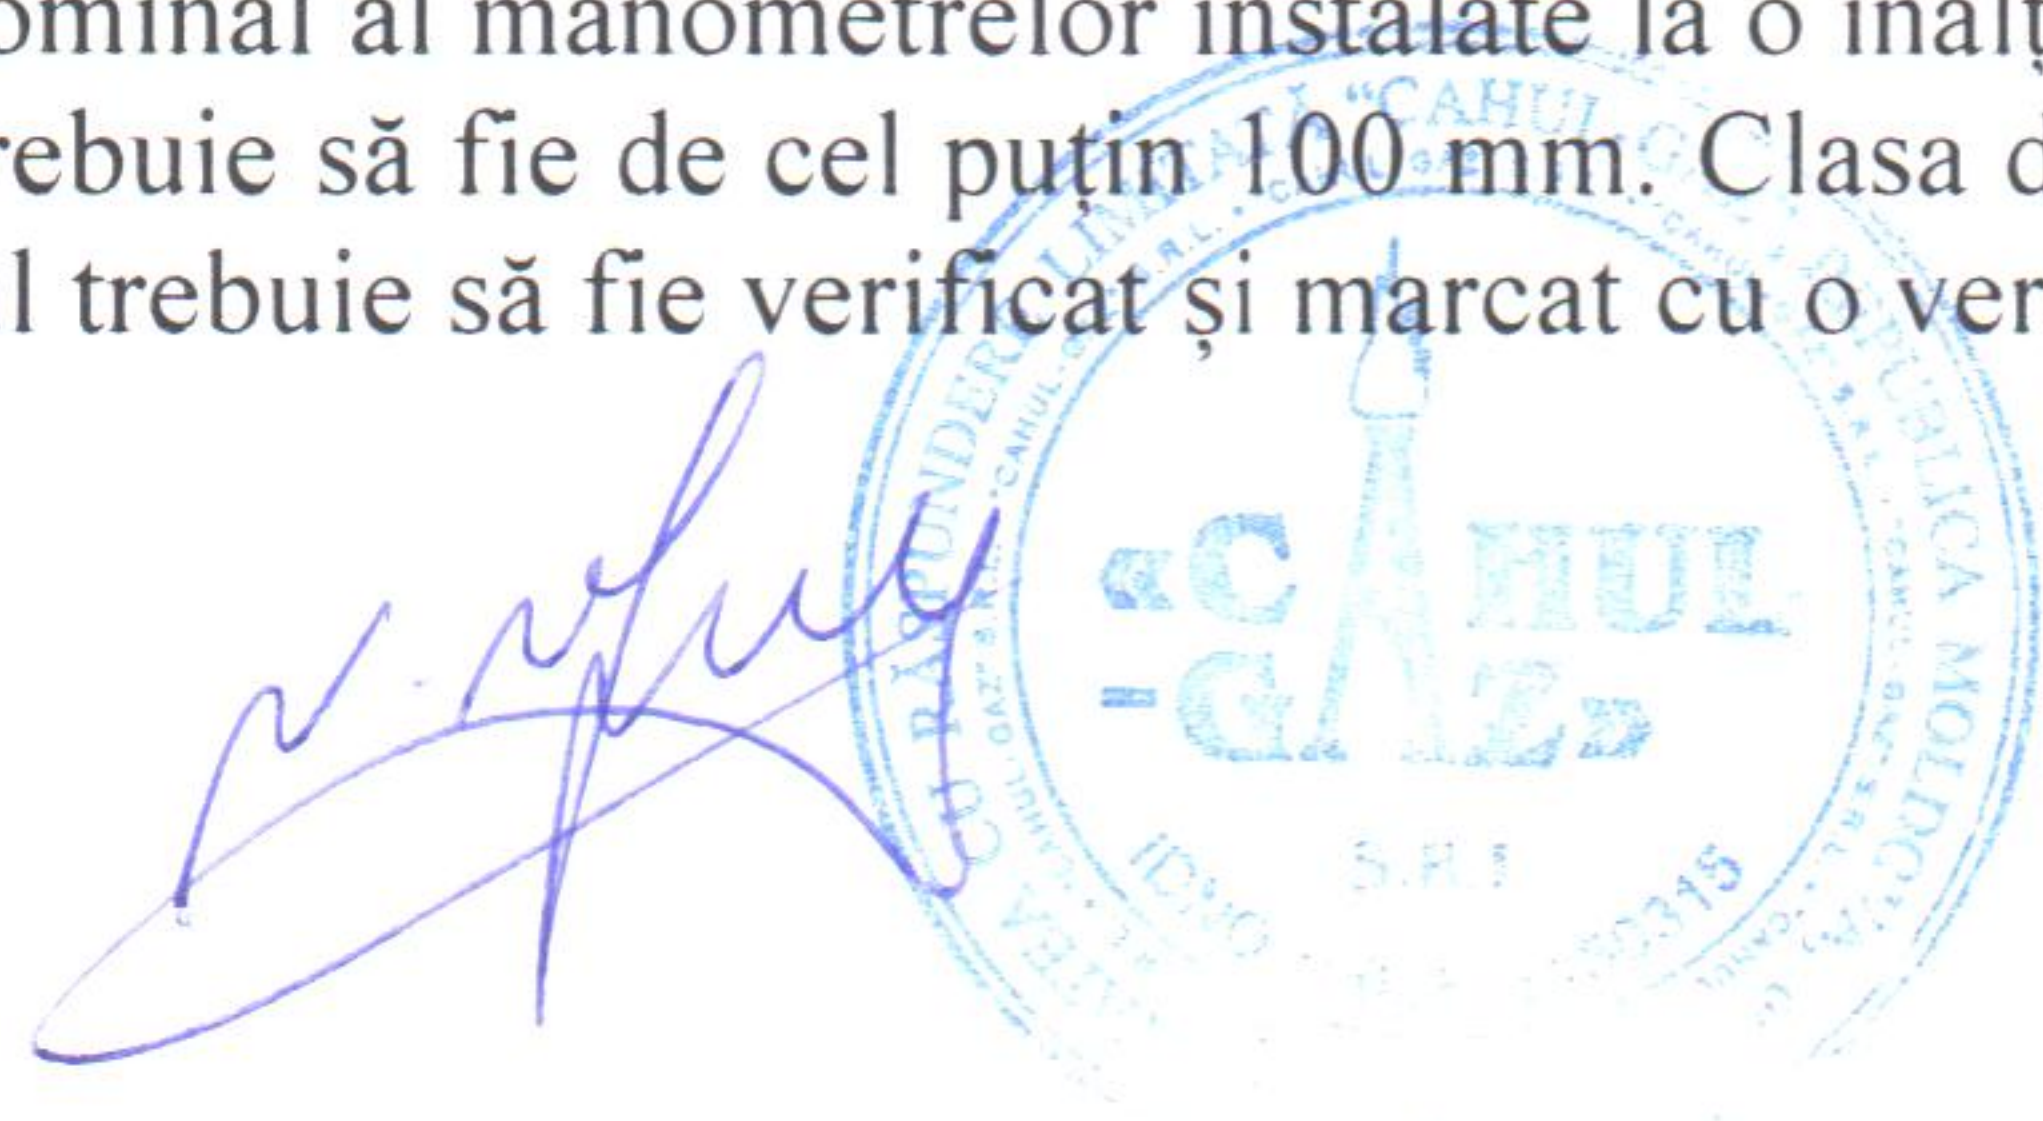

* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;

* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;

- Cerințe față de țeava de oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;
- verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;


- Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă:


- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- corespundere - ГОСТ 50838-95;
- calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100;
- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;
- trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;
- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

- Cerințe față de armături din oțel:


- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
- cu respectarea prevederilor documentației de proiect;
- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

Beneficiar

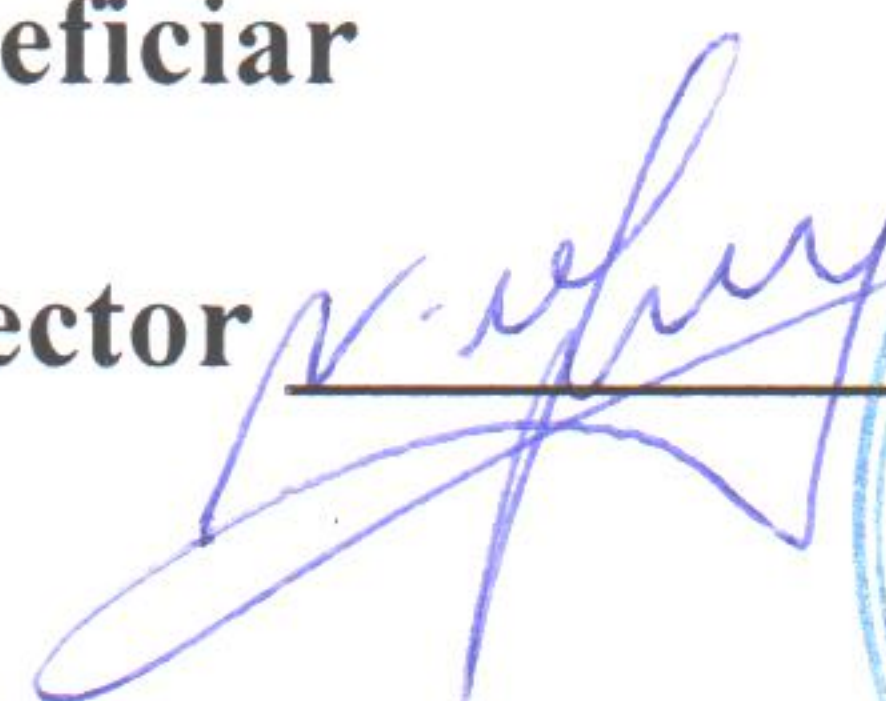Director  **Valachi V.**

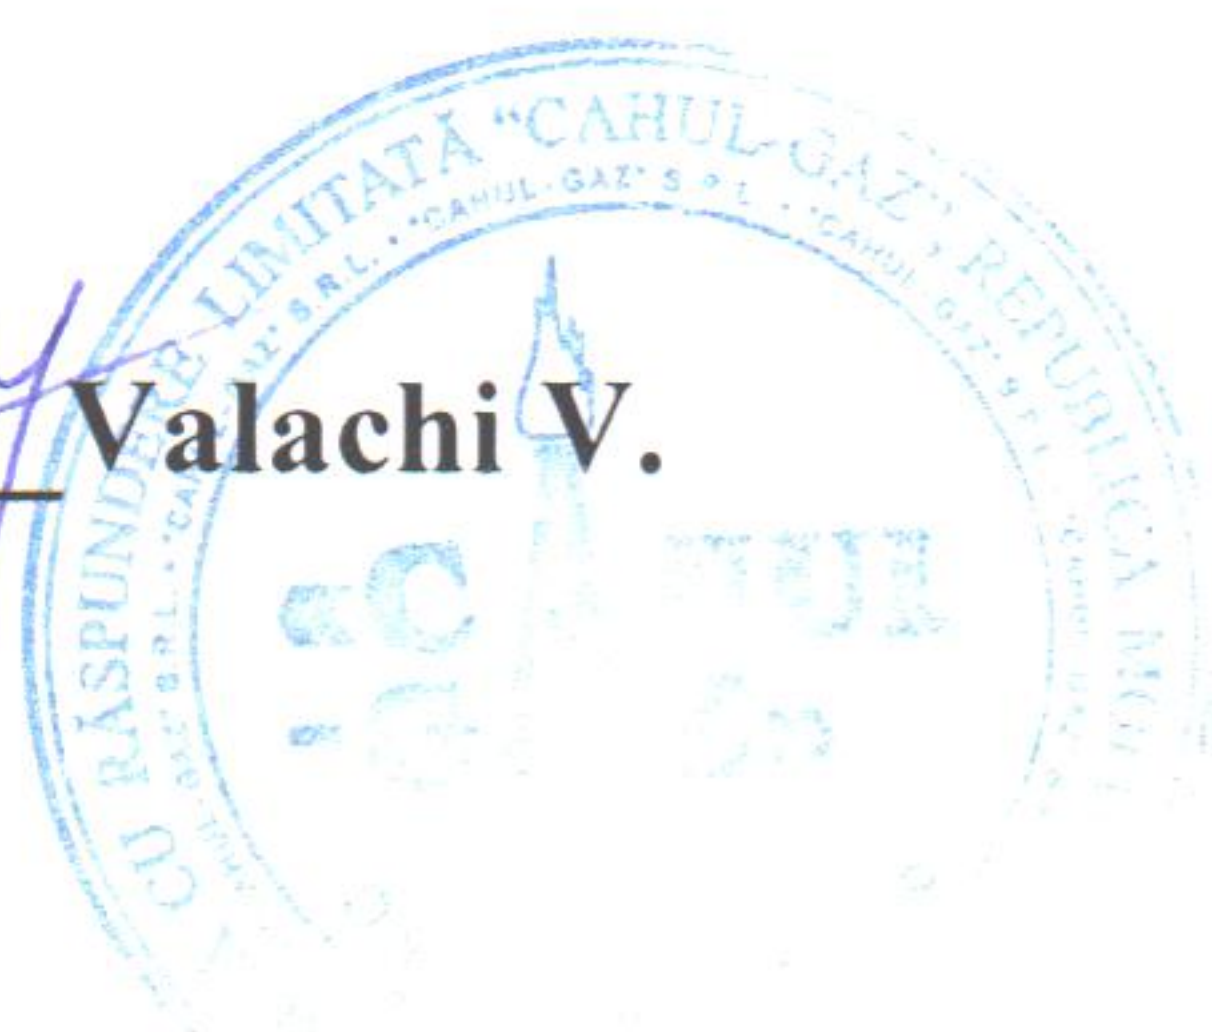

Antreprenor

Director  **Tesa Iu.**



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Gotesti r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„ ” 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.29 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu); Gazoduct de p/m supraterran din Ot Ø25x3,0mm L= 0 n; Gazoduct de p/j supraterran din Ot Ø57x3,5mm L= 0 m
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 01001/9-RGE a fost elaborat de SRL „Politen gaz” an 2011
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din 25 ianuarie 2011 cu numărul 3902
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 03 iulie 2023 și s-au terminat la 18 august 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Gotesti r-nul Cantemir, str. V. Bresceanu
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de execuție se anexează)
din „ 30 ” 08 2023

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare S.R.L. „CAHUL-GAZ” /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Beregoi N /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Gotești r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„ ” 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.30 Consumatori - 20 Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø50x4,6mm L=250,0m; Ø40x3,7mm L=220,0m; Ø32x3,0mm L=300,0m; Gazoductul de presiune joasă suprateran Ot Ø57x3,5mm L=2,0m; Ø25x2,8mm L=32,0m; Ø20x2,8mm L=30,0m. Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 20buc.
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 01001/9-RGE a fost elaborat de SRL „Politen gaz” an 2011
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)
Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 25 ianuarie ” 2011 cu numărul 3902
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 03 iulie 2023 și s-au terminat la 18 august 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Gotești r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ 30 ” 08 2023

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare Politen Gaz /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Peregoi M. /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Gotești r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„_____” 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL „Cahul gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.30 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø32x3,0mm L=30 m; Gazoductul de presiune medie suprateran Ø25x3,0mm L=1,0m; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm – 1buc.
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 01001/9-RGE a fost elaborat de SRL „Politen gaz” an 2011
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)
Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din 25 ianuarie ” 2011 cu numărul 3902
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 03 iulie 2023 și s-au terminat la 18 august 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Gotești r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de execuție se anexează)
din „30” 08 2023


Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare _____ /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Beregoi R /
(semnătura, numele, prenumele)

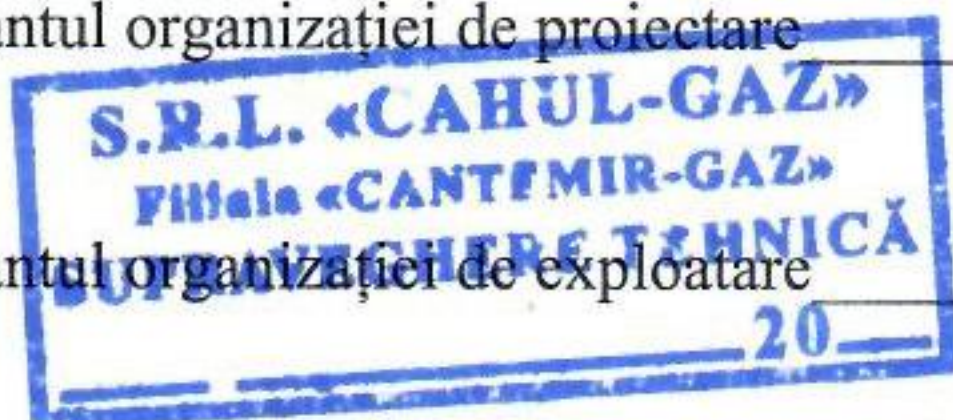

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Gotești r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„_____” 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL „Cahul gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Demiscan Ruslan reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.29 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø32x3,0mm L=30,0m; Gazoductul de presiune medie suprateran Ø25x3,0mm L=2,0m; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm – 1buc.
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 01001/9-RGE a fost elaborat de SRL „Politen gaz” an 2011
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)
Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din 25 ianuarie 2011 cu numărul 3902
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 03 iulie 2023 și s-au terminat la 18 august 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Gotești r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „30” 08 2023

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare _____ /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST _____ /
(semnătura, numele, prenumele)



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Gotestii r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„ ” 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: PRG Nr.29 Consumatori - 17 Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø50x4,6mm L=250,0m; Ø40x3,7mm L=450,0m; Ø32x3,0mm L=440,0m; Gazoductul de presiune joasă supraterran Ot Ø57x3,5mm L=2,0m; Ø25x2,8mm L=11,0m; Ø20x2,8mm L=44,0m. Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 17buc.

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 01001/9-RGE a fost elaborat de SRL „Politen gaz” an 2011
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)
Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 25 ianuarie ” 2011 cu numărul 3902
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 03 iulie 2023 și s-au terminat la 18 august 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din satul Gotestii r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ 30 ” 08 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

Valachi Valeriu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare

_____ /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Vavilov Gheorghe /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

_____ /
(semnătura, numele, prenumele)

ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Gotești r-nul Cantemir, str. Gh. Mazilu (denumirea și adresa obiectului)

„ ” 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.30 Post de reglare a
presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu); Gazoduct de p/m
suprateran din Ot Ø25x3,0mm L= ; Gazoduct de p/j suprateran din Ot Ø57x3,5mm L=
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 01001/9-RGE a fost elaborat de SRL „Politen gaz” an 2011
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)
Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din 25 ianuarie 2011 cu numărul 3902
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 03 iulie 2023 și s-au
(luna, anul)
terminat la 18 august 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Extinderea rețelilor de distribuție a gazelor naturale de presiune medie și joasă din
satul Gotești r-nul Cantemir str. Gh. Mazilu (denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ 30 ” 08 2023


Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de proiectare Politen Gaz /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Beregoi /
(semnătura, numele, prenumele)

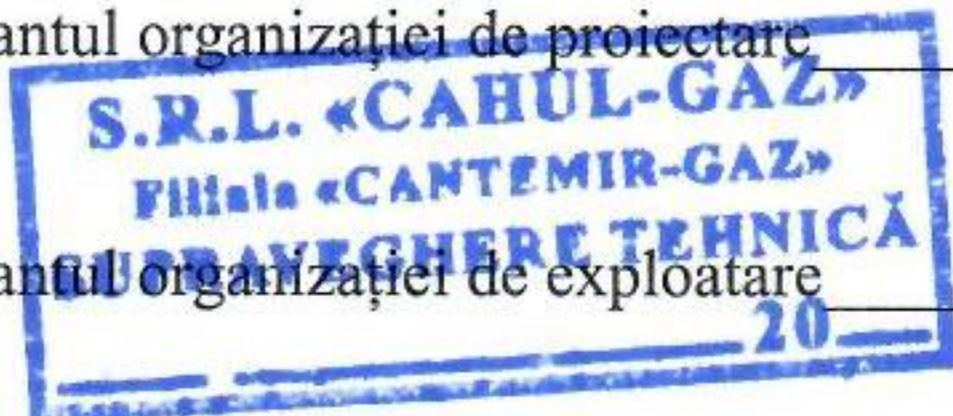

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

№. 5 inv-02/2023

09 februarie 2023

mun. Cahul

„Cahul-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003603150315, în persoana directorului, d-nul Valachi Valeriu, care acționează în baza Statutului și „Efect-gas” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Igor Vieru 8, ap.11, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1011600042159, în persoana directorului d-nul Tesa Iurie, care acționează în baza Statutului, ambii „Beneficiarul” și „Antreprenorul” (denumiți în continuare-Părți) au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul Contractului

1.1 Prin prezentul contract **Antreprenorul** se obligă să efectueze **Beneficiarului** lucrări de construcții (în continuare **Servicii**) a obiectului: „Gazificarea satului Lărguța, din r-nul Cantemir”, iar **Beneficiarul** se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2 **Antreprenorul** se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele **Antreprenorului**, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor legislației privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

1.3 Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul și Ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul, pentru serviciile acordate în corespundere cu pct. 1.1. din prezentul Contract, constituie **570 734,74 lei inclusiv TVA (cincisute șaptezeci mii șaptesute treizeci și patru lei, 74 bani).**

2.2. Plata serviciilor conform prezentului Contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului**. Data efectuării transferului din contul **Beneficiarului** în contul **Antreprenorului**, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al **Antreprenorului**.

2.3. Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către **Beneficiar** în termen de **90 (nouăzeci)** zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care **Beneficiarul** are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înlăturarea neajunsurilor de către **Antreprenor**. Înlăturarea neajunsurilor se realizează din contul **Antreprenorului**.

2.4. **Beneficiarul** poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform gradului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate. **Beneficiarul** este obligat în termen de **5** zile lucrătoare să analizeze actul prezentat de către **Antreprenor**, să-l semneze și să aplice ștampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act, **Beneficiarul** întoarce actul cu anexarea unui refuz întemeiat în formă scrisă, în termenul indicat mai sus.

2.5. **Beneficiarul** efectuează plata pentru lucrările executate în termen de **90** de zile lucrătoare după semnarea actului privind executarea lucrărilor.

2.6. Achitarea se efectuează prin transferul mijloacelor bănești în contul curent al **Antreprenorului**, indicat în prezentul contract.

2.7. Părțile se obligă să informeze în formă scrisă despre schimbarea contului sau a altor date aferente achitării conform prezentului contract.

Beneficiar


Director

Valachi V.

Antreprenor

Director

Tesa Iu.



3. Termenul Contractului

- 3.1. Termenul de executare a lucrărilor, conform prezentului contract, este din data de **01.09.2023** pînă la **15.10.2023**, cu termenul final de dare în exploatare pînă la **30.10.2023**.
- 3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră data semnării de către părți a Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate fără obiecții.
- 3.3. Prezentul contract este valabil pînă la executarea de către părți a obligațiunilor prevăzute în acesta.

4. Calitatea Obiectului Contractului

- 4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.
- 4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare. Cerințele față de materialele de construcție și utilaj trebuie să corespundă condițiilor indicate în anexa Nr. 1 la prezentul contract.
- 4.3. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 2 ani. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlăture din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Perioada de garanție începe din ziua semnării Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.
- 4.4. Garanția de executare justă este asigurată prin transferul de către Antreprenor 5% din suma contractului, pe contul bancar al Beneficiarului, pînă la începerea lucrărilor.

5. Drepturile și Obligațiunile Beneficiarului

5.1. Drepturile Beneficiarului:

- 5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.
- 5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.
- 5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor la necesitate în caz de neexecutare calitativă.

5.2. Obligațiunile Beneficiarului:

- 5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.
- 5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.
- 5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.
- 5.2.4. Să recepționeze lucrările efectuate în ordinea stabilită.
- 5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

Beneficiar

Director

Valachi V.



Antreprenor

Director

Tesa Iu



6. Drepturile și Obligațiunile Antreprenorului

6.1. Drepturile Antreprenorului:

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plățile, prevăzute de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.


6.2. Obligațiunile Antreprenorului:

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul pînă la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.
- 6.2.5. Să participe împreună cu Beneficiarul la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.
- 6.2.6. Să întocmească, în prezența persoanei responsabile pentru obiect din partea Beneficiarului la momentul transmiterii lucrărilor intermediare, un act în formă scrisă cu privire la lucrările efectuate, cu indicarea materialelor folosite la construcția obiectelor.
- 6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele pînă la finisarea efectuării achitărilor.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor cînd astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.
- 6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.

7. Reponsabilitatea Părților


- 7.1. În cazul încălcării prevederilor prezentului contract părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a RM.
- 7.2. Fiecare parte este obligată să urmărească și să informeze partea opusă despre încălcarea prevederilor contractului.
- 7.3. Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi care depășește termenul final de predare a obiectului, stabilit în prezentul contract, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.
- 7.4. Pentru înlăturarea cu întârziere a neajunsurilor, care au fost depistate în perioada termenului de garanție pentru exploatarea obiectului, Antreprenorul achită o penalitate în mărime de 0,3% din prețul lucrărilor de înlăturare a neajunsurilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractului.
- 7.5. Partea care a încălcat prezentul contract compensează părții opuse toate daunele care au fost cauzate ca urmare a încălcării contractului.
- 7.6. Dacă situațiile de forță majoră împiedică executarea prevederilor prezentului contract sau duc la întârzierea executării de către oricare dintre părți, partea este exonerată de executarea obligațiunilor, dar doar pe perioada cînd situațiile de forță majoră (cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, etc.) au efect asupra executării obligațiunilor. Partea care nu poate executa obligațiunea din cauza situațiilor de forță majoră, este obligată să anunțe partea opusă prin telex, fax sau altă modalitate în termen de 24 de ore, prezentînd în termen de 30 de zile un document eliberat de Camera de Industrie și Comerț sau de un alt organ împuternicit, care atestă existența a astfel de circumstanțe.
- 7.7. Riscul deteriorării accidentale a obiectului contractului pînă la transmiterea acestuia îl poartă Antreprenorul. Acest risc trece către Beneficiar odată cu recepționarea lucrărilor.

Beneficiar

Director  Valachi V.



Antreprenor

Director  Tesa Iu.



8. Rezilierea Contractului

- 8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul comun al părților în conformitate cu legislația în vigoare.
- 8.2. Partea interesată înaintează o propunere cu privire la rezilierea contractului în formă scrisă celeilalte părți, care este obligată să o examineze în termen de 20 zile.
- 8.3. În cazul acordului celeilalte părți rezilierea contractului se efectuează în baza unui act bilateral în care se indică:
- volumul și costul lucrărilor efectuate de fapt de către Antreprenor;
 - lista documentelor de executare care a fost transmisă Beneficiarului;
 - obligațiunile de garanție, stabilite în prezentul contract sau de legislație în vigoare, pentru lucrările recepționate de către Beneficiar și menționate în actul de reziliere a contractului;
 - alte obligațiuni ale părților ce țin de rezilierea contractului.
- 8.4. Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă:
- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult decât o dată) a admis executarea necalitativă a lucrărilor;
 - în cazul încălcării de către Antreprenor a termenului de efectuare a lucrărilor prevăzute în p.3.1. din prezentul contract.
- 8.5. Antreprenorul se obligă să înceteze lucrările din momentul primirii avizului de către Beneficiar cu privire la rezilierea contractului.
- 8.6. Beneficiarul nu este obligat să achite pentru lucrările, care au fost efectuate după recepționarea avizului de către Antreprenor cu privire la rezilierea contractului.
- 8.7. În cazul apariției necesității de executare a lucrărilor pentru asigurarea păstrării obiectului nefinisat Antreprenorul se obligă să le efectueze în termenul convenit. Cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor respective sunt suportate de partea din a cărei inițiativă se reziliază contractul.

9. Transmiterea și Recepționarea Obiectului

- 9.1. Recepționarea obiectului se efectuează conform cerințelor Legii privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr.285 din 23.05.1996 și NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor) și altor acte normative.

10. Soluționarea Litigiilor

- 10.1. Toate litigiile care apar la executarea prezentului Contract se soluționează de comun acord a părților, iar în cazul imposibilității găsirii unui acord comun prin adresarea în Instanța de Judecată a R.M., cu respectarea normelor dreptului material al Republicii Moldova.

11. Dispoziții Finale

- 11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, fiecare dintre ele având forță juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.
- 11.2. Nu se admit modificări, completări, excluderi a prevederilor prezentului contract.
- 11.3. În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a republicii Moldova.
- 11.4. Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a Contractului.

12. Rechizitele și Semnăturile Părților

Rechizitele Beneficiarului:

mun. Cahul, str. M. Viteazul, 49.
Cod fiscal: 1003603150315
MD46VI022510900000007MDL
BC „VICTORIABANK” SA
Cod: VICBMD22871

«BENEFICIAR»

S.R.L. „Cahul gaz”
director Valachi Valeriu

Rechizitele Antreprenorului:

mun. Chișinău str. Igor Vieru 8 ap.11
Cod fiscal: 1011600042159
MD62ML000000002251829186
BC “Moldinconbank” S.A. fil. Invest
Cod: MOLDM2X329

«ANTREPRENOR»

S.R.L. „Efect gas”
director Tesa Iurie



Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate în procesul de construcție a obiectului:

Cerințe obligatorii față de materialele și utilajele montate la obiectul achiziției:

• Cerințe față de PRG:

- * nou (fără exploatare) și fără elemente reconstituite;
- * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foilor metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1.5 mm;
- * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluetizând scurgerea lor;
- * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi anti vandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
- * volum sporit al spațiului interior al PRG-lui pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire;
- * amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;
- * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului);
- * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
- * orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza și ermetizate cu cauciuc care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;
- * grile pentru ventilare;
- * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grund apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
- * țevile de refulare-purjare să fie de culoare roșie;
- * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
- * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină;
- * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea);
- * garanție la utilaje – minim 24 de luni;
- * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte;
- * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;
- * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG-lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică;
- * tavă pentru depozitarea documentelor;
- * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos.
- * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor.
- * pentru PRG de tip combinat (DKR-FRG) de prevăzut filtru pentru fiecare linie tehnologică în parte;
- * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
- * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
- * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip cu bilă sau de tip K3M;
- * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă:
1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul supapei să fie conectat la colector) - GOCT 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.
- * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni.



* scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;

* îngrădirea și acoperișul se execută conform documentației de proiect și documentelor de autorizare a construcției;

• Cerințe față de țeava de oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;

- verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

• Cerințe față de țeavă, fittinguri și armături de polietilenă:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- corespundere - ГОСТ 50838-95;

- calificativul PE și SDR la țeavă în conformitate cu documentația de proiect, la fittinguri PE100;

- fabricate conform SM EN 1555-2:2014;

- trebuie să fie netedă atât pe interior cât și pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecțiuni vizibile;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentației de execuție, și a OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

• Cerințe față de armături din oțel:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- cu respectarea prevederilor documentației de proiect;

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calității și conformității pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislației în vigoare, cerințelor documentelor de execuție, și OSD în raza căruia se execută lucrărilor de construcție;

Beneficiar

Director

Valachi V.



Antreprenor

Director

Tesa Iu.



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„30” 10 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz, filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Demışcan Ruslan reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.58 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø32x3,0mm L=5,0m; Ø90x8,2mm L=313,0m; Gazoductul de presiune medie suprateran Ot Ø25x3,0mm L=2,0m; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm – Ibuc.
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 17-11 AGE a fost elaborat de SRL „Protelco Geocad” an 2015
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 23 decembrie ” 2015 cu numărul 4443
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 18 septembrie 2023 și s-au terminat la 15 octombrie 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrările de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „30” 10 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

Reprezentantul antreprenorului general

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Organizația de proiectare

Valachi Valeriu
(semnătura, numele, prenumele)

Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Vavilov Gheorghe
(semnătura, numele, prenumele)

Beregoi Nikon
(semnătura, numele, prenumele)



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„30” 10 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.58 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu)
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 17-11 AGE a fost elaborat de SRL „Protelco Geocad” an 2015
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 23 decembrie ” 2015 cu numărul 4443
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 18 septembrie 2023 și s-au terminat la 15 octombrie 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

2 prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „30” 10 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

Valachi Valeriu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)


Reprezentantul organizației de exploatare

Vavilov Gheorghe
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Nicon BEREGOI
(semnătura, numele, prenumele)

Organizația de proiectare



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„30” 10 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei:
Reprezentantul antreprenorului, directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Beregoi Nikon reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.58 Consumatori -
7 Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø50x4,6mm L=90,0m; Ø32x3,0mm
L=66,0m;
Gazoductul de presiune joasă supraterran Ot Ø57x3,5mm L=2,0m; Ø25x2,8mm L=3,5m; Ø20x2,8mm
L=14,0m. Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 7buc.
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 17-11 AGE a fost elaborat de SRL „Protelco Geocad” an 2015
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 23 decembrie ” 2015 cu numărul 4443
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 18 septembrie 2023 și s-au
(luna, anul)
terminat la 15 octombrie 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „30” 10 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

Valachi Valeriu
(semnătura, numele, prenumele) SRL

Reprezentantul antreprenorului general

Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Vavilov Gheorghe
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Beregoi Nikon
(semnătura, numele, prenumele)

Organizația de proiectare



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

„30” 10 2023

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Demișcan Ruslan reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.64 Gazoductul de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø32x3,0mm L=10,0m; Ø40x3,7mm L=7,0m Ø110x10,0mm L=250,0m; Gazoductul de presiune medie suprateran Ot Ø25x3,0mm L=2,0m; Robinet PE Ø110mm – 1buc; Robinet sferic cu flanșe Ø25mm – 1buc.
(componența obiectului)

2. Proiectul № 17-11 AGE a fost elaborat de SRL „Protelco Geocad” an 2015
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 23 decembrie ” 2015 cu numărul 4443
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 18 septembrie 2023 și s-au terminat la 15 octombrie 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Nicon Berge /
(semnătura, numele, prenumele)

Organizația de proiectare



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„30” 10 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :
Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.64 Post de reglare a presiunii gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG-SE – 50(dublu)
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 17-11 AGE a fost elaborat de SRL „Protelco Geocad” an 2015
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 23 decembrie ” 2015 cu numărul 4443
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 18 septembrie 2023 și s-au terminat la 15 octombrie 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

Prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „30” 10 2023

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu /
S.R.L. (semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general Iurie Tesa /
S.R.L. (semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare Vavilov Gheorghe /
S.R.L. (semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST Beregoi Nikon /
S.R.L. (semnătura, numele, prenumele)

Organizația de proiectare



ACT

de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir

(denumirea și adresa obiectului)

„30” 10 2023

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar Valachi Valeriu SRL "Cahul gaz"
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Vavilov Gheorghe Cantemir-Gaz filiala SRL „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST reprezentant AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție: PRG Nr.64 Consumatori - 11 Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø50x4,6mm L=216,0m; Ø32x3,0mm L=101,0m; Gazoductul de presiune joasă supraterran Ø1 Ø57x3,5mm L=2,0m; Ø25x2,8mm L=5,0m; Ø20x2,8mm L=22,0m. Robinet sferic cu mufe Ø20mm – 11buc.
(componenta obiectului)

2. Proiectul № 17-11 AGE a fost elaborat de SRL „Protelco Geocad” an 2015
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 23 decembrie ” 2015 cu numărul 4443
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 18 septembrie 2023 și s-au terminat la 15 octombrie 2023.
(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

Obiectul Proiectarea gazoductului de presiune medie și joasă a satului Lărguța r-nul Cantemir
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „30” 10 2023

Președintele Comisiei, beneficiar

Reprezentantul antreprenorului general

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul AST

Organizația de proiectare




Valachi Valeriu
(semnătura, numele, prenumele)

Iurie Tesa "EFFECT GAS"
(semnătura, numele, prenumele)

Vavilov Gheorghe
(semnătura, numele, prenumele)

Beregoi Nikon
(semnătura, numele, prenumele)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 72 privind achiziția prin Cererea ofertelor de preț

„11” iulie 2023

mun. Cahul
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1686723001858](#) din data 14.06.2023, între Consiliul raional Cahul, cu sediul în mun. Cahul, (denumirea autorității contractante)
str. Independenței, 2, MD-3909, tel. 0299- 31400 Președinte, IDNO 1007601010297 reprezentat prin (localitatea)
Nicolae DUNAS, Președinte al raionului Cahul în calitate de Beneficiar, pe de o parte, (numele, prenumele și funcția conducătorului)
Și SRL Efect Gas, cu sediul în str. Igor Vieru 8, ap.11, or. Chișinău, MD-2075 (denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon: 069557876, IDNO 1011600042159, care acționează în baza statutului, Extras Nr. 514240 data 21.02.2023, reprezentat prin Iurie TESA, în calitate de Administrator, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* „Lucrări de testare și punere în funcțiune a gazoductului de presiune înaltă Cahul-Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina, tronsonul Badicul Moldovenesc” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni după primirea ordinului** de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **24 luni**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **373 213,78 lei MD** (trei sute șaptezeci și trei mii două sute treisprezece, 78 lei) , inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5% din valoarea contractului atribuit**, prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel,

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. **Lucrările încep în termen de 5 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **24 luni**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil **până la 31.12.2023**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

SRL Efect Gas

Adresa poștală: str. Igor Vieru, 8
or. Chișinău, MD-2075

Telefon: 069557876

Cod fiscal: 1011600042159

Banca: BC Moldindconbank SA

Filiala Invest

Cod: MOLDMD2X329

IBAN: MD62ML000000002251829186

Consiliul raional Cahul

Adresa poștală: str. Independenței, 2
Mun. Cahul, MD-3909

Telefon: 0299-31400 Președintele
raionului

0299-22058 anticamera

Cod fiscal: 1007601010297

Banca: MF- Trezoreria Regională Cahul

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD96TRPDAH319230I10674AC

Digitally signed by Oprea Lilia
Date: 2023.07.26 15:51:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SRL Efect Gas

Iurie TESA, Administrator

Digitally signed by Tesa Iurie
Date: 2023.07.12 13:29:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Consiliul raional Cahul

Nicolae DUNAS, Președinte al raionului

Digitally signed by Dunas Nicolae
Date: 2023.07.12 19:29:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Gazoductul de presiune înaltă din raionul Cahul satele Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Baurci
Moldoveni, Zîrnești, Paicu, Cucoara, Chircani, Larga Nouă, Larga Veche, Badicul
Moldovenesc, Rumentev, Doina, Iasnaia Paliana

mun. Chişinău

"23" 11 2023

Președintele Comisiei, beneficiar **Nicolae Dunas** *"Consiliul Raional Cahul"*
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul antreprenorului, directorul Iurie Tesa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, ing. Olteanu Marin „Cahul-Gaz”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST _____ **Demışcan Ruslan reprezentant INST**
(numele, prenumele, funcția)

1. Antreprenorul "Efect Gas" SRL, a prezentat pentru recepție: Gazoductul de presiune înaltă subteran PE100 SDR11 cu Ø125x11,4mm L=5164,0m; Ø110x10,0mm L=5910,0m Gazoductul de presiune înaltă supraterran Ot Ø108x4,0mm L=12,0m; Robinet sferic cu flanșe Ø100mm – 7buc.

(componenta obiectului)

2. Proiectul № 2693/2005 AGE a fost elaborat de SA „Agroindproiect” an 2005
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de INST din " " cu numărul _____
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la 01 septembrie 2023 și s-au terminat la 29 septembrie 2023.
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Gazoductul de presiune înaltă din raionul Cahul satele Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Baurci Moldoveni, Zîrnești, Paicu, Cucoara, Chircani, Larga Nouă, Larga Veche, Badicul Moldovenesc, Rumentev, Doina, Iasnaia Paliana
(denumirea și adresa obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2023

Președintele Comisiei, beneficiar  Nicolae Dunas

Reprezentantul antreprenorului general  Iurie Tesa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare _____ Olteanu Marin _____
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST _____ / Demışcan Ruslan
(semnătura, numele, prenumele)

Gazoductul de presiune înaltă din raionul Cahul satele Andrușul de Sus, Andrușul de Jos, Baurci Moldoveni, Zîrnești, Paicu, Cucoara, Chircani, Larga Nouă, Larga Veche, Badicul Moldovenesc, Rumentev, Doina, Iasnaia Paliana

mun. Chişinău

(numele, prenumele, funcția)

(numele, prenumele, funcția)

(numele, prenumele, funcția)

(numele, prenumele, funcția)

(componenta obiectului)

(denumirea organizatiei de proiectare, anul elaborării proiectului)

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

(luna anul)

(denumirea și adresa obiectului)

din „ ” 2022

(semnătura, numele, prenumele)

(semnătura, numele, prenumele)

(semnătura, numele, prenumele)

(semnătura, numele, prenumele)



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР № 50

о закупке товаров/ работ/ услуг
небольшой стоимости.

Код CPV: 15500000-3

« 04 » августа 2021г.

с. Дезгинжа

(населенный пункт)

Поставщик товаров/Поставщик услуг	Закупающий орган
« SRL Efect gas » (полное наименование предприятия, ассоциации, организации) представленное <u>директором Mironov</u> Veronica (должность, фамилия, имя) действующий на основании <u>Устава</u> , (устав, положение, решение и др.) именуемый(ая) в дальнейшем Продавец/Поставщик (указывается номер и дата регистрации в Государственном регистре) с одной стороны,	Примэрия с. Дезгинжа (полное наименование предприятия, ассоциации, организации) представленное <u>примаром Капсамун Василий</u> (должность, фамилия, имя) действующий на основании <u>Устава</u> , (устав, положение, решение и др.) именуемый(ая) в дальнейшем Продавец/Поставщик (указывается номер и дата регистрации в Государственном регистре) с одной стороны,

совместно (называемые в дальнейшем Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- а. Закупка « **Установка дополнительного оборудования в существующей котельной теоретического лицея по ул. Мичурина, с.Дезгинжа комратского района** », (название товара, услуги)
называемых в дальнейшем Товары (и/или Услуги), согласно (процедура закупок)

на основании решения рабочей группы и Покупателя/Бенефициара от «__» _____ 20__ г.

- б. Следующие документы будут считаться составной и неотъемлемой частью Договора:
- Техническая спецификация;
 - Ценовая спецификация;
 - [добавьте другие документы, составные части, по необходимости, например: рисунки, графики, формуляры, протоколы временной и окончательной приемки и т.д.]
- с. Настоящий Договор превалирует над всеми составными документами. В случае

расхождений либо несоответствий между составными документами Договора, документы будут иметь приоритетность, перечисленную выше.

- d. В качестве встречного исполнения за платы, которые будут осуществлены Покупателем/бенефициаром, Продавцом/поставщиком, настоящим обязуется поставить Покупателю/бенефициару Товары и/или Услуги и устранить их дефекты в соответствии с положениями Договора во всех аспектах.
- e. Покупатель/бенефициар настоящим обязуется выплатить Продавцу/поставщику в качестве встречного исполнения за поставку товаров и услуг, а также устранение их дефектов, стоимость Договора либо любую другую сумму, подлежащую выплате в соответствии с положениями Договора в сроки и согласно способу, предусмотренному Договором.

1. Предмет Договора

1.1. Продавец/поставщик обязуется поставить Товары и/или оказать Услуги согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Покупатель/бенефициар в свою очередь обязуется уплатить и принять Товары и/или Услуги у Продавца.

1.3. Качество Товаров и/или Услуг подтверждается сертификатами качества, указанными в Спецификации. Поставленные товары и/или оказанные услуги на основании договора будут отвечать стандартам, предусмотренным в Спецификации. Если не указан какой-либо применимый стандарт либо регламент, будут соблюдаться стандарты или другие регламенты, утвержденные в стране происхождения товаров.

1.4. Сроки гарантии [действия, если необходимо] Товаров и/или Услуг указаны в Спецификации.

2. Сроки и условия поставки/оказания

2.1. Поставка Товаров и/или оказание Услуг осуществляется Продавцом в сроки, предусмотренные графиком поставки.

2.2. Сопроводительные документы Товаров и/или Услуг включают:

[Вышеуказанные требования должны быть предусмотрены закупающим органом и приведены в соответствие согласно актуальным требованиям.]

2.3. Оригиналы документов, предусмотренных в пункте 2.2 представляются Покупателем не позднее момента поставки товаров по финальному месту назначения. Поставка товаров считается выполненной в момент, когда представлены вышеуказанные документы.

3. Цена и условия оплаты

3.1. Цена поставленных в соответствии с настоящим Договором Товаров и/или Услуг предусмотрена в молдавских леех, будучи указанной в Спецификации настоящего Договора.

3.2. Общая сумма настоящего Договора, включая НДС, устанавливается в молдавских леех и составляет:

252855,86 (двести пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят пять леев 86 бань) молдавских леев.

(сумма цифрами и прописью)

3.3. Оплата поставленных Товаров и/или оказанных Услуг осуществляется в молдавских леех.

Оплата осуществляется в течение 14 календарных дней с момента отгрузки товара, которая подтверждается выпиской/получением налоговой накладной

3.5. Оплата будет производиться банковским переводом на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре.

4. Условия приемки-передачи

4.1. Товары и/или Услуги считаются переданными Продавцом и принятыми Покупателем [получателем, если необходимо], если:

а) количество Товаров и/или Услуг соответствует информации, указанной в Списке товаров / услуг и графике поставки / оказания и в сопроводительных документах, согласно пункту 2.2 настоящего Договора;

б) качество Товаров и/или Услуг соответствует информации, указанной в Спецификации;

в) упаковка и целостность Товаров соответствует информации, указанной в Спецификации.

4.2. Продавец обязуется представить Покупателю оригинал налоговой накладной одновременно с поставкой Товаров и/или оказанием Услуг для осуществления платы. В случае несоблюдения Продавцом настоящего положения, Покупатель оставляет за собой право продлить срок для оплаты, предусмотренный пунктом 3.4, на соответствующее количество дней задержки, будучи освобожденным от уплаты неустойки, предусмотренной пункте 10.3.

5. Стандарты

5.1. Товары, поставленные на основании договора, будут отвечать стандартам, представленным поставщиком в своем техническом предложении.

5.2. Если ни один применимый стандарт либо регламент не указан, будут соблюдаться стандарты либо другие регламенты, утвержденные в стране происхождения товаров.

6. Обязательства сторон

6.1. На основании настоящего Договора Продавец обязуется:

а) поставить Товары и/или Услуги согласно условиям, предусмотренным настоящим Договором;

б) уведомить Покупателя после подписания Договора в течение 5 календарных дней посредством телефона/факса либо авторизированной телеграммы о возможности поставки Товаров и/или оказании Услуг;

в) обеспечить соответствующие условия для приемки Товаров и/или Услуг Покупателем [получателем, если необходимо] в сроки, предусмотренные согласно требованиям настоящего Договора;

г) обеспечить целостность и качество Товаров и/или Услуг в течение периода до их приемки Покупателем [получателем, если необходимо].

6.2. На основании настоящего Договора Покупатель обязуется:

а) предпринять все необходимые меры для обеспечения приемки в установленные сроки поставленных Товаров и/или оказанных Услуг в соответствии с требованиями настоящего Договора;

б) обеспечить оплату поставленных Товаров и/или оказанных Услуг, соблюдая способы и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, если оно было обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы (войны, природные катаклизмы: пожары, наводнения, землетрясения, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон).

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно (но не позже 10 дней) уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, момент их ведения в действие и срок действия должны быть подтверждены сертификатом, выданным соответствующим образом компетентным органом страны Стороны, где такие обстоятельства имели место.

8. Расторжение

8.1. Расторжение Договора может быть осуществлено с обоюдного согласия обеих Сторон.

8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае:

а) Покупатель в случае отказа Продавца поставить Товары и/или выполнить Услуги, предусмотренные настоящим Договором;

б) Покупатель в случае несоблюдения Продавцом установленных сроков поставки/выполнения;

с) Продавец в случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты за Товары/Услуги;

д) Продавец или Покупатель в случае неисполнения какой-либо Стороной претензии, поданной в соответствии с настоящим Договором.

8.3. Сторона, намеревающаяся расторгнуть Договор, обязана сообщить другой Стороне об этом намерении в течение 5 рабочих дней посредством мотивированного уведомления.

8.4. Сторона, получившая уведомление, обязана ответить на него в течение 5 рабочих дней с момента его получения. В случае, если спор не будет разрешен в установленные сроки, Сторона, его инициировавшая, вправе инициировать расторжение.

9. Жалобы

9.1. Жалобы о количестве поставленных Товаров или оказанных Услуг направляются Продавцу/Поставщику в момент их получения, будучи подтвержденными актом, составленным совместно с представителями Продавца/Поставщика.

9.2. Претензии относительно качества поставленных товаров и/или услуг направляются Продавцу в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения недостатков качества и должны быть подтверждены сертификатом, выданным независимой организацией, нейтральной и авторизованной в этом смысле.

9.3. Продавец обязан рассмотреть претензии в течение 5 рабочих дней с момента их получения и сообщить Покупателю о принятом решении.

9.4. В случае признания претензий, Продавец будет обязан в 5-дневный срок поставить/оказать Покупателю дополнительное количество недопоставленных товаров и/или услуг, а в случае обнаружения несоответствующего качества – заменить либо скорректировать его в соответствии с условиями Договора.

9.5. Продавец несет ответственность за качество Товаров и/или Услуг в предусмотренных

пределах, включая и скрытые дефекты.

9.6. В случае отклонения от качества, подтвержденного сертификатом качества, составленным независимой организацией, нейтральной и авторизированной в этом смысле, расходы за простой либо задержку будет нести виновная сторона.

10. Санкции

10.1. Форма гарантии добросовестного исполнения договора, принятая Покупателем, является 0 , в размере % от стоимости договора.

10.2. За отказ продать Товары и/или оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, удерживается гарантия добросовестного исполнения договора, в случае если она была установлена в соответствии с положениями пункта 10.1

10.3. За поставку/оказание с опозданием Товаров/Услуг Продавец несет материальную ответственность в размере 0,1% от суммы недопоставленных Товаров и/или Услуг за каждый день просрочки, но не больше 5 % *[укажите проценты]* от общей стоимости настоящего Договора. В случае если задержка превышает 30 дней, это считается отказом продавать Товары и/или оказывать Услуги, предусмотренные в настоящем Договоре, и у Продавца удерживают гарантию добросовестного исполнения договора, в случае если она была установлена в соответствии с положениями пункта 10.1.

За оплату с задержкой Покупатель несет материальную ответственность в размере 0,1 % *[укажите проценты]* от стоимости неоплаченных Товаров и/или Услуг за каждый день просрочки, но не больше 5 % *[укажите проценты]* от общей стоимости настоящего договора. В случае если задержка по оплате превышает 31 дней, это считается отказом оплачивать за товар и Продавец вправе расторгнуть договор и потребовать вернуть поставленный товар.

11. Право интеллектуальной собственности

11.1. Поставщик обязан возместить ущерб покупателю в случае:

а) жалоб либо актов юстиции, вытекающих из нарушения определенных прав интеллектуальной собственности (патенты, имена, зарегистрированные товарные знаки и т.д.), связанных с оборудованием, материалами, установками либо инструментами, используемыми для либо в связи с закупаемым товаром, и

б) ущерба интересов, плат, налогов и расходов любого вида, за исключением ситуации, когда такое нарушение вытекает из соблюдения Технического задания, составленного покупателем.

12. Заключительные положения

12.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В противном случае они будут переданы на рассмотрение компетентной судебной инстанции в соответствии с законодательством Республики Молдова.

12.2. С момента подписания настоящего Договора все переговоры и документы, составленные ранее, теряют свою юридическую силу.

12.3. Договаривающиеся Стороны вправе на протяжении исполнения договора вносить изменения в положения договора посредством дополнительного акта только в случае возникновения определенных обстоятельств, затрагивающих законные коммерческие интересы сторон, и которые не могли быть предусмотрены в момент заключения договора. Дополнения и

изменения к настоящему Договору действительны, только если они были выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, третьим лицам, без письменного согласия другой стороны.

12.5. Настоящий Договор заключается в трех экземплярах на государственном языке Республики Молдова по одному экземпляру для Продавца, Покупателя, Агентства государственных закупок.

12.6. Настоящий Договор считается заключенным в момент его подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством государственных закупок и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов и будет действительным до 31 декабря 2021 г.

12.7. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня: « » 2021 г.


12.8. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

13. Юридические, почтовые и банковские данные Сторон

Поставщик товаров / Поставщик услуг	Закупающий орган
Почтовый адрес: <u>« SRL Efect gas »</u> Телефон: IBAN: MD62ML000000002251829186 Фискальный код: 1011600042159 Банк: BC "Moldindconbanc" SA fil. Invest Почтовый адрес банка: Код: MOLDMD2X329 Фискальный код: 1011600042159	Почтовый адрес: <u>с. Дезгинжа ул. Ленина, 149</u> Телефон: <u>0298 63-2-45, 63-2-36</u> Расчетный счет: MD98TRPDAG222500A11158AC Фискальный код: <u>1007601004294</u> Банк: <u>TREZMD2X</u> Почтовый адрес банка: <u>г. Комрат</u> Код: <u>TREZMD2X</u> Расчетный счет: MD63TRPDAG319230A09276AF

лей

14. Подписи сторон

Поставщик товаров / Поставщик услуг	Закупающий орган
Уполномоченная подпись: 	Уполномоченная подпись: 

Спецификация


Товаров /работ/услуг

№ п/п	Наименование Товаров/работ/Услуг	Колич ество Объем (едини ца Измер ения))	Цена/ Стоимость договорная	Общая Сумма	Стать я/ Пунк т	Характеристики Товаров/работ/ Услуг			ГОСТ
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Установка дополнительного оборудования в существующей котельной теоретического лица по ул. Мичурина, с.Дежгинжа комратского района (прилагается смета)	1	252855,86	252855,86					
2									
	Итого			252855,86					

Подписи Сторон



Продавец/поставщик/подрядчик



Покупатель

М.П.

Бухгалтер:

Зарегистрировано :№ _____

Казначейство _____

«__» _____ 2021__

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Установка дополнительного оборудования в существующей котельной теоретического
лицея по ул. Мичурина, 13 в с. Дезгинжа, Комратского р-на. (denumirea și adresa obiectului)

mun. Chișinău

„22” 06/09/2021

Președintele Comisiei, beneficiar

Vasili Capsamun

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului, directorul

Mihai Tessa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Nicolai Grozdev SRL „Găgău - Gaz”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Piotr Gheorghiev inspector principal AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL, a prezentat pentru recepție:

Gazoductul

(componenta obiectului)

de presiune medie subteran PE80 SDR11 cu Ø32x3,0mm L=20,0m; gazoduct suprateran de presiune

medie Ø25x3,0mm L=1,5m; Robinet cu flanșe Ø25mm – 1buc; Filtru cu flanșe Ø25mm – 1buc;

Gazoductul de presiune joasă subteran PE80 SDR11 cu Ø40x3,7mm L=63,0m; gazoduct suprateran de

presiune joasă Ø25x3,0mm L=42,0m; Robinet cu mufe Ø32mm – 4buc; Contor BK G10CT – 1buc.

2. Proiectul № 131-20 a fost elaborat de SRL „Vladlon prim”, an 2021

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din „07 mai” 2021 cu numărul 3070

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la august 2021 și s-au

(luna, anul)

terminat la septembrie 2021.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări de construcție - montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Установка дополнительного оборудования в существующей котельной теоретического лицея по ул. Мичурина, 13 в с. Дезгинжа, Комратского р-на.

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)

din „ ” 2021

Președintele Comisiei, beneficiar



Vasili Capsamun

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Mihai Tessa

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Nicolai Grozdev

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST



Piotr Gheorghiev

(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Установка дополнительного оборудования в существующей котельной теоретического
лицея по ул.Мичурина, 13 в с.Дезгинжа, Комратского р-на. (denumirea și adresa obiectului)

22 octombrie 2021

mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar

Vasili Capsamun

(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul

Mihai Tessa SRL „Efect Gas”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul

Nicolai Grozdev SRL „ Găgău - Gaz ”

(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST

Piotr Gheorghiev inspector principal AST

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție:

Post de reglare a presiunii

(componența obiectului)

gazelor tip dulap cu două regulatoare tip ERG - SE 25

2. Proiectul № 131-20 a fost elaborat de SRL „Vladlon prim”, an 2021

(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din „ 07 mai ” 2021 cu numărul 3070

(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3. Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la august 2021 și s-au

(luna, anul)

terminat la septembrie 2021.

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1. Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Установка дополнительного оборудования в существующей котельной
теоретического лицея по ул.Мичурина, 13 в с.Дезгинжа, Комратского р-на

(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de execuție se anexează)

din „ ” 2021

Președintele Comisiei, beneficiar

Vasili Capsamun /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Mihai Tessa /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Nicolai Grozdev /

(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Piotr Gheorghiev /

(semnătura, numele, prenumele)

ACT
de recepție a obiectului sistemului de gazificare

Установка дополнительного оборудования в существующей котельной теоретического лицея
по ул.Мичурина, 13 в с.Дезгинжа, Комратского р-на. (denumirea și adresa obiectului)
22 octombrie 2021 mun. Chișinău

Președintele Comisiei, beneficiar

Vasili Capsamun
(numele, prenumele, funcția)

Membrii Comisiei :

Reprezentantul antreprenorului , directorul Mihai Tessa SRL „Efect Gas”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul organizației de exploatare, inginerul Nicolai Grozdev SRL „ Găgău - Gaz ”
(numele, prenumele, funcția)

Reprezentantul AST Piotr Gheorghiev inspector principal AST
(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1 .Antreprenorul „Efect Gas” SRL , a prezentat pentru recepție: Gazoductul
(componenta obiectului)

de presiune joasă interior Oțal Ø32x3,0mm L=14,0m; Conducta de purjare cu Ø20x2,8mm L=8,0m. Robinet sferic cu mufe cu Ø32mm-1buc; Ø20mm-3buc; Ø15mm-1buc.; Cazan cu tiraj forțat Thermona Therm 45Kw – 2buc.

2.Proiectul № 131-20 a fost elaborat de SRL „Vladlon prim”, an 2021
(denumirea organizației de proiectare, anul elaborării proiectului)

Documentația de proiect a fost înregistrată de AST din ” 07 mai ” 2021 cu numărul 3070
(denumirea organului care a înregistrat documentația de proiect)

3.Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate în perioada: început la august 2021 și s-au terminat la septembrie 2021 .
(luna,anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volum prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție - montaj efectuate cu cerințele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE :

1.Lucrări le de construcție -montaj au fost efectuate în volum deplin conform proiectului, cerințelor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul Установка дополнительного оборудования в существующей котельной теоретического лицея по ул.Мичурина, 13 в с.Дезгинжа, Комратского р-на.
(denumirea obiectului)

prezentat pentru recepție se consideră primit (documentația de executare se anexează)
din „ ” 2021

Președintele Comisiei, beneficiar

Vasili Capsamun
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul antreprenorului general

Mihai Tessa
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizației de exploatare

Nicolai Grozdev
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul AST

Piotr Gheorghiev
(semnătura, numele, prenumele)
