

Digitally signed by Bogdan Sergiu
Date: 2024.04.28/11:23:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
Instituția Medico-Sanitară Publică
SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moșneaga”

MD2025, Chișinău, str. N. Testemițanu, 29. Tel.: +373 22 72-85-85; 40-36-00; 40-34-85. Fax: +373 22 72-90-33, e-mail: scr@ms.md
<http://www.scr.md>

nr. 26/22-APP din 04.09.23
la nr. _____ din _____

Digitally signed by Bogdan Sergiu
Date: 2026.01.05 14:26:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Scrisoare de Recomandare

Prin prezenta, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” confirmă, că a contractat (Contract nr. 06 165/22 din 03.08.2022) Societatea Comercială “TAUMATURG” SRL, privind achiziția serviciilor de supraveghere a lucrărilor de reconstrucție a etajelor I și II din blocul principal și a blocului alimentar.

Compania SC “TAUMATURG” SRL, prin profesionalismul Responsabililor tehnici, a oferit pe toată perioada de execuție a lucrărilor suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre, asigurând nivelul de calitate corespunzător normelor și cerințelor fundamentale în construcții.

Menționăm receptivitatea și exprimăm aprecierea față de colaborarea noastră cu compania SC “TAUMATURG” SRL în vederea supravegherii lucrărilor la obiect.

În concluzie, recomandăm SC “TAUMATURG” SRL, ca fiind o companie cu Responsabili tehnici profesioniști și de încredere pentru orice beneficiar cu care va colabora și apreciem serviciile de calitate de Supraveghere tehnică a construcțiilor.

Director

Andrei UNCUTA



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituția medico-sanitară publică
CENTRUL NAȚIONAL de ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ
str. C. Vîrnav, 16 MD-2025, or. Chișinău, Tel. +373 22 286270; Fax. +373 22 286270
e-mail: cnamup@ambulanta.md

“ 04” septembrie 2023

Scrisoare de Recomandare

Prin prezenta, IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, confirmă, că a contractat SC “TAUMATURG” SRL, pentru prestarea Serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție al acoperișului edificiului administrativ și a garajului cu două boxe din construcții metalice ușor demontabile la PAMU, Bucuria, rn. Cahul (Contract nr. 178 din 08.12.2020), Serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a garajului cu două boxe din construcții metalice ușor demontabile la PAMU Iargara, rn. Leova (Contract nr. 143 din 16.09.2020), și a Serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție a clădirii administrative a PAMU s. Gotești, rl. Cantemir (Contract nr. 55 din 13.02.2019).

Compania SC “TAUMATURG” SRL, prin profesionalismul său, a oferit pe toată perioada de execuție a lucrărilor suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre, asigurând nivelul de calitate corespunzător normelor și cerințelor fundamentale în construcții.

Menționăm receptivitatea și exprimăm aprecierea față de colaborarea noastră cu compania “TAUMATURG” SRL în vederea supravegherii lucrărilor la obiect.

În concluzie avem plăcerea să recunoaștem meritele și să recomandăm această companie ca un contractor competent și profesional în domeniul serviciilor de Supraveghere tehnică (Responsabil tehnic) a lucrărilor de construcții.

Inginer constructor - resp. de obiect



V. Doni

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI
PRIMARIA COM. CIOBANOVCA
MD-6516, Anenii Noi, c. Ciobanovca
tel. (265) 78-305



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН АНЕНИЙ НОЙ
ПРИМАРИЯ КОМ. ЧОБАНОВКА
МД-6516, Анений Ной, с. Чебановка
тел. (265) 78-305

e-mail: primaria.ciobanovca@mail.ru

Nr. 218 din 17.07.2023

Scrisoare de Recomandare

Prin prezenta, Primăria comunei Ciobanovca confirmă, că a contractat SC "TAUMATURG" SRL, pentru prestarea Serviciilor Responsabilului Tehnic la lucrările "Complex de măsuri de eficiență energetică la clădirea grădiniței de copii din s. Ciobanovca" pentru perioada 26.07.2021- 31.12.2021.

Menționăm receptivitatea și exprimăm aprecierea față de colaborarea noastră cu compania "TAUMATURG" SRL în vederea supravegherii lucrărilor la obiect.

Compania SC "TAUMATURG" SRL, prin profesionalismul Responsabililor tehnici, a oferit pe toată perioada de execuție a lucrărilor suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre, asigurând nivelul de calitate corespunzător normelor și cerințelor fundamentale în construcții.

În concluzie, recomandăm SC "TAUMATURG" SRL, ca fiind o companie cu Responsabili tehnici profesioniști și de încredere pentru orice beneficiar cu care va colabora și apreciem serviciile de calitate de Supraveghere tehnică a construcțiilor.

Primar



Cușnir Valina

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 76 din 22 decembrie 2021

Privind lucrările: „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Călarășovca”, efectuate în baza contractului de antrepriză Nr. 167 din 3 noiembrie 2020, încheiate între Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Consiliul Raional Ocnîța și SRL „Magistrala-Nistru”.

1. Lucrările au fost executate în baza: Autorizației de construire nr. 05 din 03.11.2020 eliberată de Consiliul Raional Ocnîța.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada zilei de la „ ____ ” decembrie 2021, până la „ ____ ” decembrie 2021.

Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Iurie PLOPA

- Președintele Raionului Ocnîța

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI

- Director ADR Nord

Constantin BÂNDIU

- Șef SMIP, ADR Nord

Eugen ȘIPCALOV

- Vicepreședinte al Raionului Ocnîța

Adelina CARABEȚ

- Manager de proiect, șef direcție DEATRFC al CR Ocnîța;

Vasilii PAPUȘA

- Primarul comunei Călarășovca

Igor GROPA

- Arhitector șef

Ion RUSU

- Persoană atestată tehnic

Elena DRAGHICI

- Persoană atestată tehnic

3. Au participat la recepție invitați:

Mircea MOLDOVAN

- Director SRL „Magistrala-Nistru”

Andrei BUDEI

- Director tehnic SRL „Magistrala-Nistru”

Galina ZALEVSCAIA

- Vicepreședinte al Raionului Ocnîța

Sergiu BOGDAN

- Director SRL „Taumaturg”

Serghei NASTAS

- Responsabil tehnic

Valentin PLEȘCA

- Comisar șef al IP Ocnîța

Constantin GAIDĂU

- Director filiala „Ocnîța-Gaz”

Victor LEVCA

- Șef Oficiul Raional Ocnîța al S.A. „RED-Nord”;

Alexandru LUNGA

- Șef S.A. "MOLDTELECOM" filiala Ocnîța;

Igori BORDEIAN

- Inspector al Direcției supraveghere tehnice al AST Nord

Igor BORDIAN

- Inspector al Direcției supraveghere tehnice al AST Briceni

Ion ILIEV

- Jurist, șef Secția Administrativă, ADR Nord

Daniela RĂILEANU

- Specialist SMIP, ADR Nord

Valeriu SEVERIN

- Director SRL „UNIVERSINJ”

Oleg BARABANOV

- Proiectant SRL „UNIVERSINJ”

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările la Obiectul: „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din s. Calarășovca” să fie recepționate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De a recepționa lucrările efectuate la obiectul:

„Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s. Călărășovca”.

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul nr. 2002 „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din s. Călărășovca” valorificat în totalmente cu suma de 22 482 975,61 lei.

Indicatori realizați:

- 3,92 km de drum de acces către Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” din satul Călărășeuca cu îmbrăcăminte rigidă construit
- 2 poduri reconstruite
- 1 stațiune de popas construită
- 1 parcare amenajată
- 1 Grup sanitar construit

8. Prezentul Proces-verbal, conținând: 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file și a fost încheiat astăzi: 22.12.2021 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei:

Iurie PLOPA

Membrii Comisiei:

Maria PRISACARI
Constantin BÂNDIU
Eugen ȘIPCALOV
Adelina CARABEȚ
Vasilii PAPUȘA
Igor GROPA
Ion RUSU
Elena DRAGHICI

9. Concluzia Agenției de Stat pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrările sunt terminate
Bordnar Iy
(numele, prenumele, funcția)

[Semnătură]
(semnătura)
Igor BORDNAR
Ins. Principal
„22” decembrie 2021

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

„22” decembrie 2021

Mircea MOLDOVAN
Director “Magistrala-Nistru” SRL

L.Ș.

Maria PRISACARI
Director ADR Nord

L.Ș.

**PRIMITĂ:
BENEFICIAR:**

„22” decembrie 2021

Iurie PLOPA

Președintele Raionului Ocnîța

[illegible]

Lucas



3

Anexa nr.2

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

(Lista obiecțiilor la lucrările executate cuprinse în Documentația Tehnică).

Discord

Director

1009601000257

ROG

Director ADR Nord



Handwritten signature and official stamp of Bogdan Serciu, Director of the Institute of Technical Sciences (ITP).

Responsabil tehnic SRL „Taumaturg”

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

Maria PRISACARI

Director ADR Nord

Sergiu BOGDAN

Responsabil tehnic SRL „Taumaturg”



„ APROB”
Ministerul Sănătății

” *Mina* ” *Mestie* 2024



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 02 F din 19 martie 2024

**Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină
Urgentă**

mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. 02 F din 19 martie 2024

Obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă este executat în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31 octombrie 2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de „Investitor” și Compania “Eurostil Construct” SRL în calitate de „Antreprenor” pentru lucrările de reparație capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.AC-0000546, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 06.12.2022

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 martie 2024, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	-	Secretar de Stat, președinte
Alexandru Gasnaș	-	Secretar de Stat, membru
Vadim Aftene	-	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Diana Manea	-	Vicedirector medical IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Mihail Ciocanu	-	Vicedirector interimar cercetare și inovare IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Igor Maxim	-	Vicedirector medical IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Sergiu Cobîlețchi	-	Șef department clinic anestezie și terapie intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru

1. Au mai participat la recepție:

Angela Scarbina
Sergiu Bogdan

Director - Eurostil Construct SRL
Responsabil tehnic

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29.09. 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 16 472 590,87 lei, conform listei-anexă nr.1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă”

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 martie 2024 la obiectul nominalizat în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion Prisăcaru

Membri: Alexandru Gasnaș

Vadim Aftene


Diana Manea

Mihail Ciocanu

Igor Maxim

Sergiu Cobilețchi

Specialiști:




Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă

**Lista cheltuielilor
efectuate la Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de
Medicină Urgentă**

Total 16 472 590,87 lei, inclusiv:

1. Servicii de proiectare, supraveghere tehnică și autor – 634 377,87 lei
2. Lucrări de reparație – 15 838 213,00 lei

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru

Lista observațiilor comisiei de recepție finală
la Reparația capitală a a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină
Urgentă

Obiecții nu sunt

Președintele comisiei

Ion Prisăcaru

Antreprenor

Angela Scerbina



Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Lista constatărilor comisiei de recepție finală
privind comportarea în timp a construcției Unității de Terapie Intensivă IMSP
Institutul de Medicină Urgentă în perioada de garanție

În perioada de garanție un an
aparut defect care pot inferenta
negativ exploatarea obiectivului

Președintele comisiei

Antreprenor

Ion Prisăcaru

Angela Scerbina





Nemel
„ APROB”
Ministerul Sănătății

” 19 ” martie 2024

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 03 F din 19 martie 2024

Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SCR „T.Moșneaga”

mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. 03 F din 19 martie 2024

Obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga” este executat în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03 noiembrie 2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de „Investitor” și Compania “Eurostil Construct” SRL în calitate de „Antreprenor” pentru lucrările de reparație capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SCR „T.Moșneaga”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.AC-0000511, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 11.11.2022

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 martie 2024, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	-	Secretar de Stat, președinte
Alexandru Gasnaș	-	Secretar de Stat, membru
Vadim Aftene	-	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Andrei Uncuța	-	Director IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Dragoș Pidleac	-	Șef depărtament gestionarea patrimoniului IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Sergiu Bușmachi	-	Șef secție situații excepționale, protecție a obiectului, transport și gospodărie IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Vladimir Bolgari	-	Inginer – specialist principal a serviciului logistic IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru

1. Au mai participat la recepție:

<u>Sergiu Bogdan</u>	<u>Responsabil tehnic</u>
<u>ANGELA SCORBINA</u>	<u>DIRECTOR „EUROSTIL CONSTRUCT” SRL</u>

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29.09. 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 15 461 567,06 lei, conform listei-anexă nr.1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De receptionat obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”.

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De receptionat obiectul „Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 martie 2024 la obiectul nominalizat în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion Prisăcaru

Membri: Alexandru Gasnaș

Vadim Aftene


Andrei Uncuța

Dragoș Pidleac

Sergiu Bușmachi

Vladimir Bolgari

Specialiști:

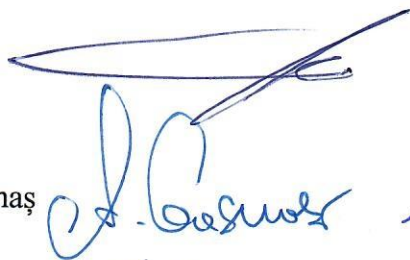


Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

Lista cheltuielilor
efectuate la Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic
Republican „T.Moșneaga”

Total 15 461 567,06 lei, inclusiv:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Servicii de proiectare, supraveghere tehnică și autor | — | 589 196,06 lei |
| 2. Lucrări de reparație | — | 14 872 371,00 lei |

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru

Anexa 2
la procesul verbal de recepție finală
nr. 03 F din 19 martie 2024 la obiectul
Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”,

Lista observațiilor comisiei de recepție finală
la Reparația capitală a a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican
„T.Moșneaga”

Obiecții nu sunt

Președintele comisiei

Antreprenor



Ion Prisăcaru

Angela Scerbina

Anexa 3
la procesul verbal de recepție finală
nr. 03 F din 19 martie 2024 la obiectul
Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Republican „T. Moșneaga”,

Lista constatărilor comisiei de recepție finală
privind comportarea în timp a construcției Unității de Terapie Intensivă IMSP
Spitalul Clinic Republican „T. Moșneaga”, în perioada de garanție

Pe parcursul perioadei de garanție
nu au apărut defecte care pot
influența negativ exploatarea obiectului

Președintele comisiei

Antreprenor

Ion Prisăcaru

Angela Scerbina



INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 04 T din 30 noiembrie 2023

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi” în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316533-CW-RFQ din 01.11.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania “Unicons AI” SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.AC-0000584, eliberată de *Primăria mun.Chișinău* la 11.01.2023, cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 30 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Iurie Țugui	Vicedirector medical IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru
Artur Școlnic	Șef departament autoadministrare, infrastructură și logistică IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru
Ghenadie Severin	Șef secție anestezie și terapie intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh.Paladi”, membru

Au mai participat la recepție:

Bogdan Sergiu - Responsabil Tehnic
Vicențiu Avdeev - Director Unicons AI

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 30 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

Iurie Țugui

Artur Școlnic

Ghenadie Severin

Specialiști:



S. Bopceanu

[Handwritten signatures]

8. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

" " 2023
L.S. _____
 (semnătura)

" " 2023
L.S. _____
 (semnătura)

Anexa nr. 1
La procesul – verbal nr. 4T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 30 noiembrie 2023

REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

[illegible]

Beneficiar: IMSP SCM "Gh. Paladi"

 Iurie Țugui
semnătura

Antreprenor "Unicons AI" SRL

_____ Andrei Nigai
semnătura



Anexa nr. 1
La procesul – verbal nr. 4T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 30 noiembrie 2023

REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

[illegible]

Beneficiar: IMSP SCM “Gh.Paladi”


semnătura Iurie Țugui

Antreprenor "Unicons AI" SRL

semnătura Andrei Nigai




OBSERVAȚII
Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Beneficiar: IMSP SCM "Gh.Paladi"

Iurie Tugui

Antreprenor "Unicons AI" SRL

Andrei Nigai

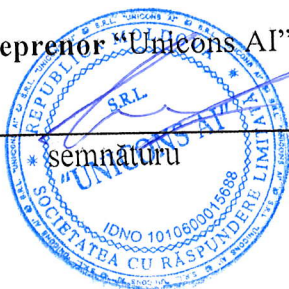


Anexa nr. 3

La procesul – verbal nr. 2T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 30 noiembrie 2023

Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție
la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	<i>Nu sunt</i>		

Beneficiar: IMSP SCM “Gh. Paladi”


semnătura Iurie Țugui

Antreprenor “Unicons AI” SRL


semnătura Andrei Nigai



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 1 din 19.12 2023

privind lucrarea "Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești", executată la obiectul IMSP Spitalul Raional Hîncești în cadrul contractului Nr. 21078987/01/2023 din 13 iulie 2023 încheiat între IMSP Spitalul Raional Hîncești și SRL "UNICONS AI"

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Iurie PETCU-președintele comisiei

Valeriu BOBROV-inginer protecția muncii

Tatiana ERMACOV-contabil

Andrei BOLGAVSCHI-șef gospodărie

Anatol ANGHELSCHI-inginer electric

Constantin MICINEANU-electrician

Eugenia RABOVILĂ-șef secție radiologie

Mihail FĂRÎMĂ-radiolog

Vadim GORILĂ-tehnic radiolog

2. Au mai participat la recepție:

Andrei NIGAI – director SRL "UNICONS AI"

Sergiu BOGDAN – Responsabil tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) **Documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată au lipsit sau sînt incomplete, piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.**
- 2) **Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;**
- 3) **În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.**

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de a recepționa "Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești", la finisarea executării.

5. Lucrarea "Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești" se recepționează la etapa **FINISĂRIL LUCRĂRILOR**.

Iurie PETCU-

Valeriu BOBROV-

Tatiana ERMACOV-

Andrei BOLGAVSCHI-

Anatol ANGHELSCHI-

Constantin MICINEANU-

Eugenia RABOVILĂ-

Mihail FĂRÎMĂ-

Vadim GORILĂ-



6. Lucrarea “Lucrări de reparație a secției Imagistică (Tomograf) la IMSP Spitalul Raional Hîncești” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL “UNICONS AI”
" " " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)




PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IMSP Spitalul Raional Hîncești
" " " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



Nr. 1 din 19.12 2023

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete

sunt complet.



Iurie PETCU-

Valeriu BOBROV-

Tatiana ERMACOV-

Andrei BOLGAVSCHI-

Anatol ANGHELSCHI-

Constantin MICINEANU-

Eugenia RABOVILĂ-

Mihail FĂRÎMĂ-

Vadim GORILĂ-

Bobrov
Sturza
Angheleschi
Micineanu
Rabovila
Farima
Gorila

Nr. 1 din 19.12. 2023

Lista lucrărilor care a fost cuprinsă în documentația tehnică
ce nu au fost executate

1. Verificarea suplimentară de punere
în funcțiune a sistemului de ventilație

Iurie PETCU-

Valeriu BOBROV-

Tatiana ERMACOV-

Andrei BOLGAVSCHI-

Anatol ANGHELSCHI-

Constantin MICINEANU-

Eugenia RABOVILĂ-

Mihail FĂRIMĂ-

Vadim GORILĂ-



Nr. 1 din 19.12 2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
la care nu s-au respectat prevederile proiectului

nu sunt.



Iurie PETCU-

Valeriu BOBROV-

Tatiana ERMACOV-

Andrei BOLGAVSCHI-

Anatol ANGHELSCHI-

Constantin MICINEANU-

Eugenia RABOVILĂ-

Mihail FĂRÎMĂ-

Vadim GORILĂ-

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Bobrov', 'Angheleschi', 'Micineanu', 'Rabovila', 'Farima', and 'Gorila']

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 29 din decembrie 2023

privind lucrarea "Lucrări de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi", executată la obiectul IMSP SCM "Gheorghe Paladi" în cadrul contractului Nr. 23/014 din 13 noiembrie 2023 încheiat între IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, investitor, Ministerul Sănătății și SRL "UNICONS AI" în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP SCM "Gheorghe Paladi"

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic

Școlnic Artur-Șef department AIL

2. Au mai participat la recepție:

Andrei NIGAI – director SRL "UNICONS AI"

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) *Documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată au lipsit sau sînt incomplete, piesele cuprinse în lista-anexă nr.1.*
- 2) *Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;*
- 3) *În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.*

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune de a recepționa "Lucrările de reparație a spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi", la finisarea executării.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în documentația de execuție sunt îndeplinite și este posibilă xploatarea obiectului.

6. Lucrarea "Reparația spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi" se recepționează la etapa **FINISĂRII LUCRĂRILOR.**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 Anexe numerotate, cu un total de 5 file a fost întocmit astăzi 29 decembrie 2023 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:


Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic

Școlnic Artur-Șef department AIL



6. Lucrarea "Reparația spațiilor în vederea instalării computerului tomograf la IMSP SCM Gh. Paladi" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL "UNICONS AI"
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IMSP SCM "Gheorghe Paladi"
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie - Consultant tehnic

Bogdan Sergiu - Responsabil tehnic

Școlnic Artur - Șef department AIL



Nr. _____ din 29 decembrie 2023

Lista lucrărilor care a fost cuprinsă în documentația tehnică
ce nu au fost executate

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic

Școlnic Artur-Șef department AIL



Nr. ____ din 29 decembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
la care nu s-au respectat prevederile proiectului

- 1) Radcațările de consolidat
- 2) Reprezent Lepoleuri
- 3) pe versantul Vesticleru citorera

Ciuș Alexandru - Consultant

Cazacu Andrei - Șef direcție cooperare externă

Damian Vitalie-Consultant tehnic

Bogdan Sergiu-Responsabil tehnic

Școlnic Artur-Șef department AIL



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and to its right]

“ APROB”

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



_____ 2023

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr.02 T din 29 noiembrie 2023

**Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă din cadrul IMSP Institutul
de Medicină Urgentă**

Chișinău 2023

INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 02 T din 29 noiembrie 2023

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Institutul de Medicină Urgentă în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-316537-CW-DIR din 31.10.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania "Eurostil Construct" SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de reparație la IMSP Institutul de Medicină Urgentă

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.AC-0000546, eliberată de *Primăria mun.Chișinău la 06.12.2022, cu valabilitate de 12 luni*
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 29 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Mihail Ciocanu	Vicedirector interimar cercetare și inovare IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru
Igor Maxim	Vicedirector medical IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru,
Sergiu Cobîlețchi	Șef departament clinic anestezie și terapie intensivă IMSP Institutul de Medicină Urgentă, membru

3. Au mai participat la recepție:

Sergiu Bogdan *Responsabil Tehnic*

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De receptionat lucrarea la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 29 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Specialiști:



Membri: Vadim Afteni

Mihail Ciocan

Igori Maxim

Sergiu Cobilețchi

9. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 29 " 11 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

" 29 " 11 2023

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr. 1
La procesul – verbal nr. 2T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 29 noiembrie 2023

REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

[illegible]

Beneficiar: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Semnătură

Mihail Ciocan

Antreprenor "Eurostil Construct" SRL

semnătură

Angela Scerbina

[illegible]

Beneficiar: IMSP Institutul de Medicină Urgentă


_____ Mihail Ciocan
Semnătură

Antreprenor "Eurostil Construct" SRL

_____ Angela Scerbina

semnatura



Angela Scerbina

“ APROB”

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



[Handwritten signature]

” _____ 2023

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr.03 T din 29 noiembrie 2023

Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă din cadrul IMSP Spitalul

Clinic Republican “T.Moșneaga”

Chișinău 2023

INVESTITOR Ministerul Sănătății

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 03 T din 29 noiembrie 2023

privind lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă executată la obiectul IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga” în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 03.11.2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de Investitor și Compania “Eurostil Construct” SRL în calitate de Antreprenor pentru lucrările de construcție la IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000511 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 11.11.2022 cu valabilitate de 12 luni
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 29 noiembrie 2023, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	Secretar de Stat, președinte
Vadim Aftene	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Dragoș Pidleac	Șef-interimar al departamentului gestionarea patrimoniului, IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Sergiu Bușmachiu	Șef secție situații excepționale, protecție a obiectului, transport și gospodărie IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru
Vladimir Bolgari	Inginer specialist principal al serviciului logistic IMSP Spitalul Clinic Republican „T.Moșneaga”, membru

Au mai participat la recepție:

Bogdan Sergiu – Responsabil Tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Bolgar

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

7. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi 29 noiembrie 2023 la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Ion Prisăcaru*

Membri: *Vadim Afteni*

Dragoș Pidleac

Sergiu Bușmachi

Vladimir Bolgari




8. Lucrarea Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă este :

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2023

L.Ș.




PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

" " 2023

L.Ș.



Anexa nr. 1
La procesul – verbal nr. 3T
de recepție la terminarea lucrărilor
din 29 noiembrie 2023

REGISTRU

Documentației scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista.

[illegible]

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T.Moşneaga

Dragoş Pidleac

semnătura

Antreprenor "Eurostil Construct" SRL

Angela Scerbina


semnătura

OBSERVAȚIILE

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, lista lucrărilor care nu au fost executate la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
1.	De astupat scutla de ben zilare de la et. 14-15	10 zile	Remediat
2.	De astupat gaura in incalzirea WC (pardosea)	10 zile	Remediat
3.	De schimbare usita de la desfurmăre cu una cu olexin	10 zile	Remediat
4.	unde sunt coșete de la Armstrong murdare de schimbare.	10 zile	Remediat
5.	Reparatia linoleum la uso solo, cu 6 locuri.	10 zile	Remediat
6.	De inlăcrat apa posibil toate conexiunile între Armstrong și peret, colan	10 zile	Remediat
7.	De reglat eroarea siste- mului de evacuare a fumei	10 zile	In observare
8.	De schimbare panoul de iluminat et. 15, vestiar	10 zile	Remediat
9.	De schimbare capacul de la conolul de boiler et. 15	10 zile	Remediat
10.	De reglat uso, et. 15 laborator	10 zile	Remediat

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T. Moșneaga



Dragoș Pidleac

Antreprenor "Eurostil Construct" SRL



semnătura

Angela Scerbina



Lucrările care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de execuție
la recepția lucrărilor

Nr.	Denumirea observației	Termenul de executare	Responsabil
	nu sunt		

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Republican T.Moșneaga


Semnătură Dragoș Pidleac

Antreprenor "Eurostil Construcții" SRL


semnătură Angela Scerbina

INVESTITOR:
**Instituția Publică „Agenția de Guvernare
Electronică”**
www.egov.md

Contract nr. MD-EGA-223149-CW-RFQ
(L1;L2;L3&L6) din 25 august 2021
Lot-3: CUPS Mereni (A.7.) – com. Mereni, r.
Anenii Noi

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. A.7./CUPS-Mereni/ANENII NOI/W/MGSP din 24 decembrie 2021

Executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (CUPS)
Lot-3 (r. Anenii Noi: A.7. CUPS Mereni – com. Mereni)

Privind lucrarea: **Amenajarea Centrelor Unificate de Prestări Servicii/CUPS Mereni – com. Mereni, r. Anenii Noi**, în valoare de **149 714,15 MDL** (una sută patruzeci și nouă mii șapte sute paisprezece lei, 15 bani), scutită de TVA cu drept de deducere, executată la obiectul **CUPS Mereni – com. Mereni, r. Anenii Noi** în cadrul contractului nr. MD-EGA-223149-CW-RFQ (L1;L2;L3&L6) (CUPS-Mereni/Anenii Noi A.7. Lot-3) din 25 august 2021 încheiat între **Instituția Publică “Agenția de Guvernare Electronică”** (în calitate de Investitor) pe de o parte și **“SIGMA VENMER” SRL** (în calitate de Antreprenor) pe de altă parte.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de lucrări MD-EGA-223149-CW-RFQ (L1;L2;L3&L6) din 25 august 2021.
2. Lucrările de amenajare au fost executate fără certificat de urbanism conform prevederilor art. 14 a legii 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.
3. Comisia de recepție (conform *Ordinului AGE nr. 3005-112* din 22 decembrie 2021) și-a desfășurat activitatea la data de 24 decembrie 2021 fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

- 1) Diana ZAHARIA - Director administrativ în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, Agenția de Guvernare Electronică

Membrii comisiei de recepție:

- 2) Valentin VIERU – Primar, primăria Mereni, r. Anenii Noi
 - 3) Natalia STRATU – Contabil-șef, primăria Mereni, r. Anenii Noi
 - 4) Tatiana SINCOVSCHI - Manager CUPS, Agenția de Guvernare Electronică
 - 5) Ion BARBARASA - Specialist Achiziții, Agenția de Guvernare Electronică
 - 6) Sergiu BOGDAN - Responsabil tehnic, Certificat de atestare tehnico-profesională Nr. 0362, Seria 2019-RT
4. Au mai participat la recepție:
- 7) Reprezentanți ai “SIGMA VENMER” SRL
 - 8) Eugen PRODAN - Proiectant SC “GORGONA” S.R.L., Certificat: 2020-P, nr. 0598

5. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă a prezentului Proces-verbal.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **De a NU recepționa lucrările de amenajare a CUPS Mereni (A.7.) – com. Mereni, r. Anenii Noi.**
7. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: *Obiecții parvenite din partea administrației publice locale s. Mereni, primar dl. Valentin VIERU, membru al Comisiei de Recepție, în privința materialului utilizat la construcția CUPS Mereni, articol 2.0., subcapitol 1.1., capitolul 1. și la soluția propusă de către proiectant SC Gorgona SRL și consultată cu Antreprenor, în baza Procesului Verbal nr.2 din 01.11.2021, și transmisă spre informare în atenția administrației publice locale s. Mereni, primar dl. Valentin VIERU.*
8. Comisia de recepție recomandă următoarele: *De supus reevaluării soluția propusă de către proiectant SC Gorgona SRL pentru CUPS Mereni (A.7.) – com. Mereni, r. Anenii Noi prin detalierea, probarea acestora și prezentarea tuturor certificatelor de calitate pentru materialele utilizate la construcția articolului 2.0., subcapitol 1.1., capitolul 1., luând în calcul modificările la designul propus inițial, într-un termen de 10 zile.*
9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file, a fost încheiat astăzi 24 decembrie 2021 în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei de recepție:

Diana ZAHARIA

Membrii comisiei de recepție:

Valentin VIERU

Natalia STRATU

Tatiana SINCOVSCHI

Ion BARBĂRASĂ

Sergiu BOGDAN

Specialiști cu activități în construcție:

Rep.

