

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. -90 din
№ от

1. Destinatar / Получатель

Pentru participare la achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<input type="text" value="S.R.L. MONCOMTEX"/>	<input type="text" value="1004611003677"/>
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<input type="text" value="Sciors nr.26"/>	<input type="text" value="9601-OR.COMRAT"/>

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 28.02.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа




Semnătura/Подпись



Avramova I.
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.02.2019 ora 11:34:58
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (208,17)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ SOCIETATEA CU
RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MONCOMTEX" ESTE ÎNREGISTRATĂ
LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004611003677

Data înregistrării

23.09.1997

Data eliberării

05.01.2005

Capacii Semion, registrator de stat
Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul



MD 0011544

Digitally signed by Mavrodi Oleg
Date: 2018.11.30 17:08:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 368 din 10.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «MONCOMTEX» .**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «MONCOMTEX» .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004611003677.**

Data înregistrării de stat: **23.09.1997.**

Sediul: **MD-3801, str. Șciors, 26, mun. Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova. tel. 069344944.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;
- 2 ANULAT - Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru construcții;
- 3 Comerțul cu amănuntul al aparatelor de iluminat și articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii;
- 4 Producția altor mecanisme și aparate electrice;
- 5 Fabricarea altor articole din metal;
- 6 Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;
- 7 Lucrări de lăcătușerie și apeduct;
- 8 Alte lucrări de utilare a construcțiilor;
- 9 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- 10 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;
- 11 Lucrări de tencuire;
- 12 Lucrări de învelitori;
- 13 Lucrări de pardosire și placare a podelelor și pereților;
- 14 Alte lucrări de finisare a construcțiilor;
- 15 Fabricarea plăcilor, benzilor, fișilor, tuburilor, profilurilor din material plastic;
- 16 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- 17 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- 18 Fabricarea altor articole din material plastic;
- 19 Fabricarea altor produse din cauciuc;
- 20 Comerțul cu amănuntul al încălzămintei și articolelor din piele;
- 21 Comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;
- 22 Reparații de articole și aparate electrice de uz casnic;
- 23 Demolarea clădirilor; lucrări de terasament;
- 24 Lucrări de explorare prin forare și găurire;
- 25 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
- 26 Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
- 27 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 28 Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;



- 29 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;
- 30 Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 31 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;
- 32 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
- 33 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală);
- 34 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate.

Capitalul social: 1411980 lei.

Administrator: MAVRODI OLEG, IDNP 2000019003652,

Asociați:

1. MAVRODI OLEG , IDNP 2000019003652

cota 1411980.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 10.10.2018.

— Rtgistrator



Gradinar Lidia





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 034440

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"MONCOMTEX"

or. Comrat, str. Pobeđi, 26

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

05.01.2005 MD 0011544

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1004611003677

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

30 APR 2010

Reperfectată: 12.02.2013

Valabilă pînă la

30 APR 2015

Prelungită pînă la: 29.04.2020

Semnătura conducătorului autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Lilia PALII

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autentificată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 034440

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "MONCOMTEX"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

Reperfectată: 12.02.2013

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiarie, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Terasamente și lucrări de teren1.1 Lucrări de terasere.1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor.1.4 Baraje, diguri, terasamente.1.3 Lucrări de drenaj.2. Executarea construcțiilor2.1 Fundații din piloți.2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele.2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat.2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.2.8 Clădiri din beton armat monolit.2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului.2.10 Construcții rutiere categoriile III-V.2.15 Construcții hidrotehnice din beton și beton armat.2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele.2.19 Galerii și estacade metalice.2.20 Construcții metalice tip turn și catarg.2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație.2.22 Buncăre și silozuri metalice.2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3.2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m3.2.25 Construcții din lemn.2.26 Consolidarea structurilor portante.2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge.3.2 Izolații termice.3.3 Izolații anticorozive.4. Lucrări de finisare a construcțiilor4.1 Tencuieli, plaje exterioare și interioare.4.2 Pardoseli.4.3 Produse de timplărie.4.4 Profile și ornamente decorative. | <ol style="list-style-type: none">5. Instalații și rețele interioare5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.5.2 Instalații și rețele termice.5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.6. Instalații și rețele exterioare6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.6.2 Instalații și rețele termice.6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice7.1 Contoare de apă.7.2 Contoare de energie termică.7.4 Automatizări7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa.7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei.7.17 Utilaje și instalații termoenergetice.7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
|---|--|

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu stampila originală a autorității de licențiere.



19. iulie 2018
Data primirii *Mucen*



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea *Moncomtex SRL* pentru perioada *regulată* 20 *17*
(Denumirea completă) *38 59 30 89*
Cod CUII0

Sediul: MD *3800* *Kaepam Uspea* Cod IDNO *1004611003644*
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM *9601*

Activitatea principală *Yceyca* strada, nr. bl. Cod CAEM, rev.2 *4120*

Forma de proprietate *Yacmca* Cod CFP *16*

Forma organizatorico-juridică *SRH* Cod CFOJ *530*

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) _____
Tel. _____




Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	<i>14147113</i>	<i>30313838</i>
Alte venituri din activitatea operațională	020	<i>1800</i>	<i>40000</i>
Venituri din alte activități	030	<i>208083</i>	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<i>14356996</i>	<i>30383838</i>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<i>43745097</i>	<i>27809605</i>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<i>150985</i>	<i>263338</i>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<i>41521</i>	<i>42418</i>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<i>126100</i>	<i>148241</i>
Alte cheltuieli	110	<i>212681</i>	<i>1012368</i>
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<i>14276384</i>	<i>29208000</i>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<i>80612</i>	<i>1097538</i>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<i>16333</i>	<i>163248</i>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<i>64278</i>	<i>934290</i>

Digitally signed by *Mavrod Oleg*
Date: 2018.12.28 09:04:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BILANȚUL

Anexa 1

la cegoaba 20 14

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6223	3833
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	319290	1232960
	Terenuri	030	280506	640954
	Mijloace fixe	040	215203	411249
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	821222	2288996
2.	Active circulante			
	Materiale	140	233557	
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	17417	21731
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	1297211	3466
	Creanțe comerciale	190	778629	4949642
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	80046	310034
	Creanțe ale bugetului	220	228852	81087
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	13070	413470
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	176366	1687208
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	3773	
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2828921	7466968
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3650143	9755964

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar			
	Rezerve	320	181058	181058
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	330		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	340	x	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	350	230110	230110
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	360	x	
	Alte elemente de capital propriu	370	x	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	380		
		390	411168	1355708
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	100	10000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	1670000	6000000
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	70000	
			1740100	6010000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1141041	214865
	Datorii față de părțile afiliate	480		1522428
	Avansuri primite curente	490	330695	509645
	Datorii față de personal	500	4344	7325
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	11206	12433
	Datorii față de buget	520	11449	123394
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	140	140
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1498875	2390250
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3650143	9755964



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 1 septembrie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	14147113	30313838
Costul vânzărilor	020	13657880	27809605
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	489233	2504233
Alte venituri din activitatea operațională	040	1800	40000
Cheltuieli de distribuie	050	87217	766382
Cheltuieli administrative	060	489043	414075
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	42244	15948
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(124491)	1047838
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	20803	-
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	80612	1047838
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16353	133298
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	64259	944540

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 1 septembrie până la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	181038			181038
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	181038			181038
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	230110			230110
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	944540		944540
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	230110	944540		1174650
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	411168	944540		1355408



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DȘ

Numărul 2525

Eliberat domnului (doamnei): **Topal Piotr**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.
5. Construcții speciale:
 - a) fântâni arteziene.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, reafacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 noiembrie 2014**

Valabil până la **14 noiembrie 2019**



Viceministru

Anatolie ZOLOTCOV



SRL "MONCOMTEX"
MD 3800, Republica Moldova
or. Comrat, str. Siorsa, 26
Tel./fax (373) 298 3 17 17
mob. (373) 69 344 944



Company «MONCOMTEX»
Victory Street 26,
Comrat, The Republic of Moldova
Tel/Fax: 373 298 3 17 17
Tel.: 373 69 344 944

№_{hex}. 15 OT 19/02/2019

Primaria mun. Cahul

Scrisoare de garanție pentru lucrările de construcții

Compania SRL "Moncomtex" își confirmă oferta de a-și desfășura activitatea «Lucrari de amenajare a curtii blocurilor locative din str. C. Negruzzi nr. 28, M. Frunze nr. 43, I.L. Caragiale nr. 37 si tronsonul din srt. M. Frunze cuprins intre str. I. L. Carageale si str. C. Negruzzi, mun. Cahul » asigurând în același timp (garantând) calitatea înaltă a muncii efectuate pe o perioadă de 3 ani.

Cu respect,
Director SRL "Moncomtex"



//Mavrodi O.L.//



OFERTANT
SRL „Moncomtex”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F3.9

1. Denumirea și obiectul contractului: **Construcția unui sector de drum pe strada Puschin in s. Cazaclia, UTAG Gagauzia.**

2. Numărul și data contractului *Nr.ITB18/1755-Lot-1 din 24/07/2018*
3. Denumirea/numele beneficiarului *UNDP Moldova*
4. Adresa beneficiarului *31 August 1989 Street*
5. Țara *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *anteprenor general*

(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
anteprenor asociat
subanteprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 672 305.00	216 017.88
b) finală (la data finalizării contractului)	3 672 305.00	216 017.88

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ***Nu***

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată ***4 (patru) luni***

b) efectiv realizată ***4 (patru) luni***

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***Nu***

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1, 2 din 20/12/2018.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***Nu***

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .



Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT FOR WORKS

Date: July 24, 2018

Contract Ref.: ITB18/1755-Lot-1

Dear Sir/Madam,


The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage "MONCOMTEX" LLC, duly incorporated under the Laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform: **Construction Works for "Rehabilitation of a segment of road on Pushkin Street in Cazaclia village"** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a. this Contract;
 - b. Annex I – The General Conditions of Contract for Civil Works;
 - c. Annex II – Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 17 May 2018, including the Technical Design Documentation for this lot, not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
 - d. Annex III - the Contractor's Offer including the Price Schedule and Bills of Quantities submitted by the Contractor as part of its Bid dated 15 June 2018, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

"MONCOMTEX" LLC

Pobedy street 26, Comrat city, Republic of Moldova,



2. Obligations of the Contractor

- 2.1 The Contractor shall commence the Works within **5 (five) days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and Substantially complete the Works in 120 calendar days, but not later than **December 15, 2018**, in

accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labor and other services necessary to that end.

- 2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions within 5 (five) days from the date on which he shall have been given access to the Site.
- 2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **216,017.88 USD (two hundred sixteen thousand seventeen dollars and 88 cents)**.
- 3.2 The price of this Contract is not subject to any adjustment or revision because of price or currency fluctuations or the actual costs incurred by the Contractor in the performance of the Contract.
- 3.3 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.4 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.5 Invoices for the work performed and materials utilized shall be submitted every 15 days; and a final invoice within 15 days from the issuance of the Certificate of Final Completion by the Engineer. Payments will be made in MDL at UNORE on the day of payment.
- 3.6 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 10 days of their receipt, when no objections for the performed works exist.
- 3.7 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.8 Payment of the **final invoice** in the amount of not less than **10% (ten)** of the total estimated price of the contract shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion only against **PERFORMANCE BANK GUARANTEE**. The Performance Guarantee referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount equal to the amount of final invoice.
- 3.9 All funds paid to the Contractor for works performed under this contract are carried out under the EU funded technical assistance Project "Support in Agricultural and Rural Development in ATU Gagauzia and Taraclia" implemented by UNDP.


8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Alexandru URSUL

Le Roi Business Center, #29 Sfatul Tarii Street, off. 403, Chisinau, Moldova
e-mail: Alexandrul Ursul <alexandru.ursul65@gmail.com>

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor.
If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,



Dafina Gercheva
UN Resident Coordinator
UNDP Resident Representative in Moldova



For "Moncomtex" LLC

Agreed and Accepted:

Signature _____
Name **Mavrodi Oleg** _____
Title **Director** _____
Date _____



INVESTITOR (UNDP Moldova)
BENEFICIAR (Primaria s. Cazaclia)

Anexanr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.1 Din 20.12.2018

Privind lucrarea: «*Rehabilitation of a segment of road on Pushkin Street*», Cazaclia village, UTAG/ Реконструкция дороги по ул.Пушкина», în s. Cazaclia în cadrul contractului nr. ITB-18/1755 din 24.07.2018, încheiat între: UNDP Moldova u SRL „Moncomtex”, pentru lucrările de: «*Rehabilitation of a segment of road on Pushkin Street*», Cazaclia village, UTAG/ Реконструкция дороги по ул.Пушкина».

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.31 din 15.06.2018 eliberată de Primăria s. Cazaclia cu valabilitate pînă la 14.06.2019

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 11-00 în data de 20.12.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Chior Grigorii - Primar s. Cazaclia

Membrii comisiei:

Cecal Fiodor - Viceprimar s. Cazaclia
Gaidarji Stefanida - Contabil Primaria s. Cazaclia
Calac Dmitrii - Inginer Cadastral s. Cazaclia
Chior Afanasii - Presedintele Consiliului s. Cazaclia
Ianae Piotr - Responsabil Tehnic
Vladimir Baghici - Consultant UE SARD

3. Au mai participat la recepție:

Administrator SRL „Moncomtex” – Oleg Mavrodi
Diriginte de santier SRL „Moncomtex” – Topal Piotr

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor «*Rehabilitation of a segment of road on Pushkin Street*», Cazaclia village, UTAG/ Реконструкция дороги по ул.Пушкина», sunt cuprinse în articolele nr. 1, 2, 3, la acest proces verbal:

Anexa 1: piesele din documentația tehnică și documentația prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din contract de servicii care nu au fost executate (în caz că sînt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma examinării lucrărilor, constată:

Допуск объекта к эксплуатации по техническим условиям, предусмотренным проектом.



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Окончание выполнения работ в соответствии с тендерным заданием

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемка объекта по окончанию строительно-монтажных работ.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемка объекта по окончанию строительно-монтажных работ.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală: s.Cazaclia UTAG, destinație _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului de recepție rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20.12.2018, la ora 11-00, în 5 exemplare.

Președintele comisiei:

Chior Grigorii

Membrii comisiei:

Cecal Fiodor

Gaidarji Stefanida

Calac Dmitrii

Chior Afanasii

Ianac Petr

Vladimir Baghici

Au mai participat la recepție:

Oleg Mavrodi

Topal Piotr

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea «*Rehabilitation of a segment of road on Pushkin Street*», Cazaclia village, UTAG/
Реконструкция дороги по ул.Пушкина», UTAG este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL "Moncomtex"

20 decembrie, 2018

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

BENEFICIAR

Primaria s.Cazaclia

20 decembrie, 2018

L.Ș.

(semnătura)

Chior
Prima

Oleg
Admi

Vladi
Ingin


Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Проектная документация предоставлена в полном комплекте

Chior Grigorii
Primar s. Cazaclia

Oleg Mavrodi
Administrator SRL "Moncomtex"

Vladimir Baghici,
Inginer Consultant UE SARD



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.

Chior Grigorii
Primar s. Cazaclia



Oleg Mavrodi
Administrator SRL "Moncomtex"



Vladimir Baghici,
Inginer Consultant UE SARD



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Все работы выполнены в соответствии с технической и тендерной документацией

Chior Grigorii
Primar s. Cazaclia

Oleg Mavrodi
Administrator SRL "Moncomtex"

Vladimir Baghici,
Inginer Consultant UE SARD



INVESTITOR (UNDP Moldova)
BENEFICIAR (Primaria s.Cazaclia)

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr.2 Din .2018

Privind lucrarea: «*Rehabilitation of a segment of road on Pushkin Street*», Cazaclia village, UTAG/ «*Реконструкция дороги по ул.Пушкина*». în s.Cazaclia în cadrul contractului nr. . ITB-1755 din 24.07.2018, încheiat între: *UNDP Moldova u SRL „Moncomtex”*, pentru lucrările: «*Rehabilitation of a segment of road on Pushkin Street*», Cazaclia village, UTAG/ «*Реконструкция дороги по ул.Пушкина*».

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Chiciorogorii - Primar s. Cazaclia

Membrii comisiei:

Cecalișor - Viceprimar s. Cazaclia
Gaidă Stefanida - Contabil Primaria s. Cazaclia
Calabușitrii - Inginer Cadastral s. Cazaclia
Chicioranasii - Președintele Consiliului s. Cazaclia
Ianaștr - Responsabil Tehnic
Vladimir Baghici - Consultant UE SARD

2. Au participat la recepție:

Adrian Măgariș SRL "Moncomtex" - Oleg Mavrodî
Diriginta de santier SRL "Moncomtex" - Topal Piotr

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei - anexă nr.1;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 20.12.2018;
- 3) Documentația comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) Lucrările de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Obiectul s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20.12.2018 până în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;

Valoarea obiectului este de 216 017,00 \$ SUA

4. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:



эксплуатация

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Содержание и эксплуатация объекта согласно назначению

7. Presentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 20.12.2018, la ora 11-00 in 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Chior Grigorii

Membri comisiei:

Cecalia Dor

Gaidar Stefanida

Calac Dmitrii

Chior Afanasii

Ianae Petr

Vladimir Baghici

Reprezentantii antreprenorului;

Administrator SRL "Moncomtex" – Oleg Mavrodi

Diriginta de santier SRL "Moncomtex" – Topal Piotr

Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:



L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Mediac B.K. g.A.M.H.

Topal Piotr

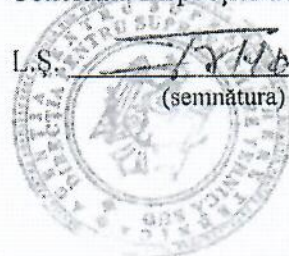

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. Demolarea construcțiilor existente
2. Defrisarea copacilor
3. Sistemul rutier
4. Drumuri laterale
5. Deversoare carosabile
6. Construcția trotuarului
7. Ridicarea și coborirea capacelor la fântini
8. Execuția casurilor
9. Repararea podetului de diam. 1.2m
10. Lucrări pentru siguranța circulației rutiere

Costul lucrărilor executate în cadrul proiectului
«*Rehabilitation of a segment of road on Pushkin Street*», Cazaclia village, UTAG/
«*Реконструкция дороги по ул.Пушкина*».

Finanțate prin programul EU/UNDP – SARD este 216 017,00 \$ SUA

Chior Mihail
Primar, Cazaclia

Oleg Mavrodi
Administrator SRL "Moncomtex"

Vladimir Baghici,
Inginer Consultant UE SARD



Observațiile Comisiei de recepție finală.

Chior Grigori
Primar s. Caracota

Oleg Mavrod
Administrator SRL "Mavrod"

Vladimir Bagric
Inginer Consultant LLC SARD



27

Рекомендательное письмо

Baghici Vladimir подтверждает, что SRL «Moncomtex» реализовало проект «Строительство дорожного участка на улице Пушкина в селе Казаклия, АТО Гагаузия». Стоимость проекта составила: 216 017.88 \$ (3 672 305.00 лей).

Срок работы 2 (два) календарных месяца. Работы были выполнены качественно и в соответствии с графиком производства работ.

Особо хочется отметить высокий профессионализм специалистов SRL «Moncomtex» и высокий уровень организационной работы, проводимой управленческим и инженерно-техническим составом, позволяющие решать задачи повышенной сложности.

Считаю возможным рекомендовать компанию SRL «Moncomtex», как надежного партнера в сфере строительства.

31 января 2018 года

Эксперт проекта



//Baghici V. _____//





Support to Agriculture and Rural Development Project (SARD)
Project financed by the European Union
and implemented by the UN Development Programme



RECOMANDARE

Prin prezenta, confirm că "MONCOMTEX" SRL a participat în calitate de antreprenor general la executarea lucrărilor de construcție în cadrul Programul SARD / UE-PNUD Moldova, **procurarea - ITB17/01531: „Construction works for 9 social infrastructure projects – 4 LOTS”, LOT #4: Congaz and Cairaclia villages, UTA Gagauzia.**

Conform contractului, "MONCOMTEX" SRL a avut în calitate de obiectiv de construcție următoarele două proiecte:

LOT #4: "Reabilitarea și optimizarea sistemului de eliminare stradală", pe circa 30 km de străzi din s. Congaz, raionul Comrat; și

LOT #4: „Reconstrucția acoperișului și schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare la casa de cultură” din s. Cairaclia, raionul Taraclia;

Cu această ocazie, doresc să menționez că lucrările conform contractului au fost executate în termenul propus și agreeat între părți, în mod foarte bine organizat. Managerii și personalul tehnic a companiei au acționat cu profesionalism și promptitudine. De asemenea vreau să menționez că, lucrările în cadrul proiectelor implementate cu PNUD Moldova, au fost executate în corespundere cu specificațiile tehnice solicitate, standardele și normativele în vigoare, ceea ce atestă pregătirea superioară a personalului companiei "MONCOMTEX" SRL.

Din considerentele menționate mai sus, confirmând capacitatea superioară de lucru, profesionalismul, promptitudinea și seriozitatea în executarea sarcinilor contractuale, recomand "MONCOMTEX" SRL în calitate de contractor pentru oricare alt investitor.

Alexandru Ursul

Expert Tehnic al Programului SARD
UE-PNUD Moldova

Data: 05.03.2018





ДОГОВОР ПОДРЯДА № 295
о закупке посредством открытых торгов

«17» ноября 2017

мун. Комрат
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № 17/03431 от 20.10.2017 года, между Примария мун. Комрат

(наименование закупающего органа)
с местонахождением в мун. Комрат
(населенный пункт)

ул. Третьякова, 36, телефон: 0 298 2-26-60, факс: _____, e-mail: comrat.primaria@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1007601000285
от «2» 20 года, в лице Примар мун. Комрат Анастасов С.И.

(фамилия, имя и должность руководителя)
в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL Moncomtex,
(наименование экономического оператора)

с местонахождением в _____ мун. Комрат,
(населенный пункт)

ул. Победа, 26, телефон: 0(298)31717; 0(69)344944, факс: 0(298)31717, e-mail: _moncomtex@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1004611003677 от
«23» сентября 1997 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № 034440 от
«30» апреля 2014 года, выданное Лицензионной Палатой РМ, на 5(пять) лет, для видов
деятельности constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii,
в лице Мавроди О.Л., в качестве директора
(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы:

Тот №3 – Реконструкция улицы Третьякова от ул. Пушкина до магазина «Хозтовары» в мун. Комрат

Тот №4 – Тротуар из тротуарной плитки (брусчатки т. 4см) по ул. Суворова мун. Комрат

Тот №6 – Реконструкция дороги по ул. Матросова мун. Комрат

(краткое описание),

(код CPV: 45233253-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3(три) месяца с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

Мавроди О.Л.



с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально раздельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет: 1 321 010,78 (один миллион триста двадцать одна тысяча десять) молдавских леев, 78 банов, (включая НДС);

4.2. Оплата частично в 2017г., остаток в 2018г. В течении 30 дней после подписания акта выполненных работ и утверждением его техническим надзором.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершённым до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

7.3. Документация, предоставленная в распоряжение Генерального подрядчика, распределяется следующим образом.



13.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потребностями ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов и действует до 31 декабря 2018 года

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «17» ноября 2017 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Третьякова 36

Тел./Факс: 0 (298) 2-26-60

Наименование банка: Министерство Финансов - Государственное Казначейство

Адрес банка: мун. Комрат ул. Ленина, 204а

Код банка: TREZMD 2X

Cod IBAN:

Фискальный код: 1007601000285

«ПОДРЯДЧИК»:

Адрес: мун. Комрат, ул. Победы, 26

Тел./Факс: 0(298)31717,
0(69)344944

Наименование банка: MOLDOVA-AGROINDBANK SA

Адрес банка: фил. Комрат

Код банка: AGRNMD2X761

Расчетный

счет: MD70AG000000225171801467

Фискальный код: 1004611003677

16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

М.П.

«ПОДРЯДЧИК»:

М.П.

ор 5

INVESTITOR *Примария мун. Комрат*

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 11/06/2018

Privind lucrarea :

Устройство дороги и тротуара по ул. Третьякова мун. Комрат (от ул. Пушкина до ул. Ленина)

Executată la obiectul:

ул. Третьякова мун. Комрат (от ул. Пушкина до ул. Ленина)

În cadrul contractului de antrepriză nr. _____ din _____, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între *Примария мун. Комрат и SRL "Moncomtex" в лице директора Мавроди О.Л.*

pentru *Устройство тротуара по ул. Третьякова мун. Комрат (от ул. Пушкина до ул. Ленина)*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr *A MMII 034440* eliberată din *30/04/2018* de *Camera de Licențiere* la _____ cu valabilitate pînă la *29/04/2020*

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов Н.Г. - тех. надзор

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Moncomtex" Мавроди О.Л.



4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei


Сары Г.К.



Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.надзор




TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Moncomtex” Mavrodi O.L. director

11 ИЮНЯ 2018

L.Ş.



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примария мун. Комрат

11 ИЮНЯ 2018

L.Ş.



INVESTITOR Примария мун. Комрат

245

op 5

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 06/06/2018

Privind lucrarea :

Устройство тротуара по ул. Матросова мун. Комрат

Executată la obiectul:

ул. Матросова мун. Комрат

În cadrul contractului de antrepriză nr. 195 din _____, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între Примария мун. Комрат и SRL "Монсомтек" в лице директора Мавроди О.Л.

pentru Устройство тротуара по ул. Матросова мун. Комрат

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. A MMII 034440 eliberată din 30/04/2010 de Camera de Licențiere 29/04/2020 la _____ cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____ Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

Златов В.Г. - архитектор

Златов О.Г. - тех. надзор

3. Au mai participat la recepție:
Директор SRL "Монсомтек" Мавроди О.Л.







4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Сары Г.К.

Membrii Comisiei:

/Златов В.Г. - архитектор

Златов П.Г. - тех.надзор

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Moncomtex” Mavrodi O.L. director

06 _____ ИЮНЯ _____ 2018

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

/Примария мун. Комрат

06 _____ ИЮНЯ _____ 2018

L.Ș.

(semnătura)



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Mavrodi O.L. reprezentant împuternicit al SRL «Moncomtex» (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Mavrodi O.L. reprezentant împuternicit al SRL «Moncomtex» (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura _____ (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect «Lucrări de amenajare a curții blocurilor locative din str. C.Negruzzi nr. 28, M. Frunze nr. 43, I.L.Caragiale nr. 37 și tronsonul din str. M. Frunze cuprins între str. I.L.Caragiale și str. C.Negruzzi, mun. Cahul REPETAT» (denumirea lucrării), codul CPV 45111291-4, la data de 19/02/2019 (zi/luna/an), organizată de Primăria mun. Cahul (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 19/02/2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Mavrodi O.L.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL «Moncomtex»



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 19/02/2019

Numărul procedurii: _____

Către: Primaria mun. Cahul

Subsemnatul, Mavrodi O.L. reprezentant împuternicit al SRL «Moncomtex»
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta
că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 19/02/2019

Semnat: _____

Nume: Mavrodi O.L.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL «Moncomtex»



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale (MDL)
1	Primăria Mun.Comrat	Работы По Ремонту Помещений И Фасада Детского Сада №4 По Ул. Пушкина Мун. Комрат	3 203 694,13
2	PRIMĂRIA MUN.COMRAT	Работы по устройству тротуаров из брусчатки, тротуаров из фибробетона по улицам мун. Комрат.	4.374.034,29

Semnat: _____

Nume: _____ Mavrodi O.L. _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL Moncomtex _____



DECLARAȚIE
privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
1.	Topal Piotr (diriginți de șantier)	Super.	10	Благоустройство улиц и тротуаров, укладке брусчатки в мун.Комрат Работы по устройству тротуаров и дорожного покрытия из брусчатки в мун.Комрат Лот№1-работы по устройству из брусчатки от здания паспортного стола до ул. Советская в мун.Комрат Лот№2-работы по устройству тротуаров из брусчатки от ул.Советская до моста в мун.Комрат Лот№3-работы по устройству тротуаров из брусчатки по ул.Шевченко от ул.Гаврилова до ул.Суворова в мун.Комрат	№2525 din 14/11/2014
2.	Costeanov Vasili (diriginți de șantier)	Super.	31	Lucrari de reparative a cladirii pentru montori a SRR Hincesti Reparatia Casei de Cultura s. Albina r-ul Cimisia Lucrari de reparative a fasadei la Casa de Cultura s. Filipeni r-ul Leova Lucrari de reconstructive Casei de Cultura or. Comrat Altele	№1594 din 14/11/2014
3.	Bubnov Vasili (diriginți de șantier)	Super.	28	Lucrari de reparative sistemul de incalzire in LT s. Dezginga r-ul Comrat Lucrari de reparatie OMF Congazcic Lucrari de reparative capital pentru tabara de copii s. Valea-Perjei r-ul Taraclia Producere si instalare turn de apa in tabara de odihna OLIMPIETS Or. Comrat str. Tretiacov 36 Reparatie capital a fasadelor scolii s. Ciucur-Mingir Altele	№2521 din 14/11/2014 №0540 din 23/03/2012
4.	Triboi Ion (diriginte cu executarea lucrarilor specializate)	Super.	15	Reparatie capital a cladirii blocului administrative nr.1 al Consiliul Raional Hincesti Lucrarile de reparative capital a edificiului SAMU Taraclia Lucrări de reparație capitală a edificiului PAMU Baurci,r.Cedir-Lunga.	
5.	Velcev Ivan (electrician autorizat)	Super.	35	Теоретический лицей с.Дезгинжа Ремонт электрических сетей Замена электропроводки в здании лицея с. Казаклия Reparatie capital a cladirii blocului administrative nr.1 al Consiliul Raional Hincesti UNDP Moldova Оптимизация системы уличного освещения в с. Конгаз, ГАТУ; Капитальный ремонт крыши дома культуры в с. Кайраклия, район Тараclia UNDP Moldova Лот 2 Оптимизация уличного освещения с.Алуату; Оптимизация уличного освещения с.Дезгинжа	№2064 din 28/05/2017
6.	Carp Ion (specialisti)	Super.	21	II Radiocomunicatii - Lucrari de reparative a sistemii de incalzire a cladirii tehnice a SRTV Ungheni Lucrarilor de reparative a sistemii de incalzire in WC a edificiului CR Cantemir Lucrari de reparative sistemul de incalzire in LT Dezginga Altele	№0983 din 10/02/2015
7.	Petcov Alexandru (specialist)	Super.	2	-	№3530 din 03/06/2016
8.	Mavrodi Oleg (specialist)	Super.	13	-	№0033-14 din 05/03/2014
9.	Protiuc Iaroslav (specialiști)	Super.	6	-	№0034-14 din 05/03/2014
10.	Petrovic Savelii (specialiști)	Super.	28	-	№0035-14 din 05/03/2014 №0108 din 20/12/2018
11.	Raileanu Maxim (specialist)	Super.	4	-	№ 0104 din 30/03/2018
12.	Sirbu D. (muncitori auxiliari)	-	7	-	-
	Gagauz A. (muncitori auxiliari)	-	4	-	-
	Cazmal N. (muncitori auxiliari)	-	6	-	-
	Muncitori diverse – 24 persoane	-	-	-	-

Data 14/02/2019

Director SRL „Moncomtex”
Digitally signed by Mavrodi Oleg
Date: 2019.02.14 12:59:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



/Mavrodi O.L./

OFERTANT

SRL „MONCOMTEX” F 3.12

(denumirea, numele, prenumele)

DECLARAȚIE

privind dotările tehnice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Camion Ford (Tranzit), 1996, GE AR 213	buc	1	-
2.	Camion Ford (Tranzit), 2008, HRE 327	buc	1	-
3.	Camion Ford (Tranzit), 2008, GXP 943	buc	1	-
4.	IVECO DAILY, 2002, GE BG 602	buc	1	-
5.	IVECO DAILY, 2006, GE BG 603	buc	1	-
6.	Excavator MTZ-82, 2014, AAG 226	buc	1	-
7.	KAMAZ-5490, 2013, AAE 540	buc	1	-
8.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min	buc	1	-
9.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 – 30,0 kw	buc	1	-
10.	Masina de gaurit electrica	buc	2	-
11.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc	2	-
12.	Compactor pe pneuri 150 – 200 kg	buc	5	-
13.	Dreptar cu nivela	buc	3	-
14.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc	1	-
15.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc	1	-
16.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc	1	-
17.	Malaxor de chituri	buc	1	-
18.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc	2	-
19.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc	2	-
20.	Вальцегибочный станок W11-4x1500	buc	2	-
21.	Сварочный станок ССА-1Ф для ПВХ изделий	buc	1	-
22.	Пила для резки ПВХ профиля СПА-1Ф	buc	1	-
23.	Пила для резки штапика ПТА-1Ф	buc	1	-
24.	Углозачистной станок автоматический СУА-1Ф	buc	1	-
25.	Станок для обработки торца импоста автомат САИ-1Ф	buc	1	-
26.	Копировально-фрезерный станок СКА-1Ф	buc	1	-
27.	Краны на автомобильном ходу	buc	1	-
28.	Домкраты гидравлические	buc	-	1
29.	Masina de perforat cu burghiu vidia	buc	-	1
30.	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	buc	1	-
31.	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	buc	1	-
32.	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	buc	-	1
33.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	buc	-	1
34.	Masara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	buc	1	-
35.	Сгичури гидравлице, capacitate de ridicare 63 t	buc	-	1
36.	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	buc	-	1
37.	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	buc	1	-
38.	Грейдер O&K F156A	buc	1	-
39.	Каток BOMAG BW161AD-2	buc	1	-

Data completării

“14” 02 2019

ANTREPRENOR (OFERTANT)

Director SRL „MONCOMTEX”



//Mavrodi O. L.//

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI
PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Mavrodi O.L.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Moncomtex



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(forma de licitație _____ (denumirea) _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 19/02/2019

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



OFERTANT
SRL "Moncomtex"

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ **F.3.3.**

„Lucrări de amenajare a curții blocurilor locative din str. C.Negruzzi nr. 28, M. Frunze nr. 43, I.L.Sagaiale nr. 37 și tronsonii din str. M. Frunze curșins între str. I.L.Sagaiale și str. C.Negruzzi, mun. Cahul REPUBLICA MOLDOVA”
Grupa de obiecte/deșchimbarea obiectului

	Anul 2019				
	Luna				
	1	2	3	4	5
1. Организационно-подготовительные работы	+				
2. Земляные работы					
2.1 Разработка и транспортировка грунта	+	+			
3. Посадка деревьев и кустарников					
3.1 Посадка и полив		+			
4. Дорожная одежда					
4.1 Слой основания из песка и щебня		+	+	+	
4.2 Слой основания из асфальтобетона			+	+	+
4.3 Устройство бордюров и тротуарной плитки		+	+	+	
5. Устройство дорожных знаков					+
6. Процесс сдачи объекта заказчику					+

Ofertant

