



This project is funded  
by the European Union



Empowered lives.  
Resilient nations.

## CONTRACT

No.

Date: 26/10/2017

Ref.: **ITB17/01555 – Construction of 2 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water**

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction of 2 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water (ITB17/01555) in Falestii Noi, district of Falesti and Chetrosu, district of Drochia** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

### 1. Contract Documents

1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".

1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:

- a) this Contract;
- b) Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works
- c) Annex II – UNDP's Invitation to Bid ref. ITB17/01555 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 10/05/2017, and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
- d) Annex III - the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 16/06/2017, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.

1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

### 2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence work within **2 (two)** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **22/11/2017**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

**Darnic Gaz SA**  
**1a Stefan cel Mare street**  
**Straseni MD-3702, Republic of Moldova**

T.P.

2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **22/11/2017**.

2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

### **3. Price and payment**

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **139,869.21 USD (one hundred thirty-nine thousand eight hundred sixty twenty-nine US Dollars, 21 cents)**.

3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.4 The Contractor shall submit invoices for the work performed and materials utilized every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).

3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

### **4. Special Conditions of Contract**

4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item / modification below, the General Conditions of Contract

*T.P.*

for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

**The following shall be added to section 8 of the GCC:**

**8.4. "As-Built" Drawings**

The Contractor shall prepare, and keep up-to-date, a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built locations, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

**The following shall be added to section 9 of the GCC:**

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

**The following shall be added to section 64 of the GCC:**

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

4.2 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.5%** of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum 30 days of delay after which UNDP may terminate the contract.

**5. Submission of invoices**

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

**6. Time and manner of payment**

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

**NAME OF THE BANK – BC "Moldindconbank" SA fil. Straseni**

**BANK CODE – MOLDMD2X324**

**ACCOUNT NUMBER – MD34ML00000002251524237**

**ADDRESS OF THE BANK – 1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3701, Moldova**

7. **Modifications**

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. **Notifications**

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

**For the UNDP:**

**Tatiana Craciun**

Senior Project Officer, Moldova Energy and Biomass Project

United Nations Development Programme

131, 31 August 1989 str., MD2012, Chisinau, Moldova

Fax: +37322 22 00 41

Email: [tatiana.craciun@undp.org](mailto:tatiana.craciun@undp.org)

**For the Contractor:**

**Mereacre Andrei**

Darnic-Gaz SA

ID No: 1003601006407

1a Stefan cel Mare str., Straseni MD3702, Moldova

Tel/fax: +373 237 25727

Email: [andreimereacre@gmail.com](mailto:andreimereacre@gmail.com)

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru

29, Sfatul Tarii Street, MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova

tel: +373 79 998802, e-mail [vitalie.vieru@undp.org](mailto:vitalie.vieru@undp.org)

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor. If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,

  
**Stefan Liller**

Deputy Resident Representative  
United Nations Development Programme

For Darnic-Gaz SA

Agreed and Accepted:

Signature

Name

Title

Date

  
**Filaret Mereacre**

General Director

27.10.2017

*T.P.*



Empowered lives.  
Resilient nations.

**AMENDMENT TO THE CONTRACT  
BETWEEN  
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)  
AND  
THE DARNIC-GAZ SA**

Reference is made to the contract dated 27/10/2017 signed between the UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP), and the Darnic – Gaz SA, with respect to the scope of the Contract (TOR), and as per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following;

**WHEREAS** Darnic – Gaz SA and UNDP now wish to amend said Contract in order to increase contract amount and extend contract period till 30 May 2018;

**WHEREAS** such Amendment will result in an increase of *923,559.79 US dollars* making this amended Contract total **USD 1,063,429 (one million sixty-three thousand four hundred twenty-nine US Dollars)**;

**NOW THEREFORE**, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

Section 2.1 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The Contractor shall commence work within 2 (two) days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by 30/05/2018, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.

Section 2.2 of the Contract shall be changed to now read as follows:

The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions 30/12/2017.

Section 3.1 of the Contract shall be changed to now read as follows:


The total estimated price of the Contract is contained in the Price Schedule and amounts to **1,063,429 USD (one million sixty-three thousand four hundred twenty-nine US Dollars)**.

**NEVERTHELESS**, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

T.P.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT


For UNDP:

By   
(signature)  
Stefan Liller  
Deputy Resident Representative


Date: 22/11/2017



For the Contractor:

By   
(signature)  
Filaret Metreacre  
General Director

Date: 23.11.2017



T.P.

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_\_ din 13 iunie 2017

Contracte termică pe bază de  
privind lucrarea combustibil la biomasa executată la obiectul  
CT. din s. Busile Ungureni în cadrul contractului nr. 773/17/01555 din  
26 octombrie 2015 încheiat între PEBIT "Danic 2000" SA pentru lucrările de  
Construirea CT. cu arderea biocombustibilului la grad. din s. Busile

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1, eliberată de  
13.12.2017. prin Busile la 13.12.2017, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 iunie 2017, fiind  
formată din: 15 iunie 2017

- Todirică Valeriu - primar, președinte
- Vetrică Adela - contabilă șef a primăriei
- Oboroș Tamara - director a școlii
- Cojocaru Lădu - ințelent
- Fruier Constantin - responsabil tehnic
- Elieș George - reprezentant PEBIT
- Cosmin Ludmila -
- Petru Frunza (numele, prenumele) - specialist în construcții autorizat

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor a CT.  
pe biocombustibil

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

execuția lucrărilor conform document  
de proiect, transmiterea documentației de  
execuție și a echipamentului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția la terminarea lucrărilor, testarea  
și punerea în funcțiune a CT și SI în  
ansamblu, exploatarea CT

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 9225/19093, adresa poștală 3616, destinația  
educativă și sportivă, compus din următoarele construcții capitale, suprafața

la sol 0,613 Fha, suprafața totală, 1274m<sup>2</sup>, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 13.06.19 în 12 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Toadineș Valeriu

Membri: Vetriu Adela

Oprea Tamara

Cojocaru Lidia

Floric Compuțan

Elișu Ovidiu

Costin Lubomir

(numele, prenumele, semnătura)

Petru Finza

Specialisti:

Vetriu

Oprea

Cojocaru

Floric

Elișu

Costin

9. Lucrarea Construcție CT la gard. etc.  
din S. Bucișca

TEHNICIANUL:

FLAM SISTEME 2018

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

FLAM SISTEME 2018

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME



FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME

FLAM SISTEME





PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
nr. \_\_\_\_\_ din 21.06.2018

privind lucrarea de construire a centralei termice pe bază de  
combustibil solid biomasă executată la  
obiectul Gim. Bumbăța în cadrul contractului nr. 53817/0158 din 16 noiembrie 20  
încheiat între PEBH și Dorniqaz SA pentru lucrările de construire  
a centralei termice pe bază de combustibil solid biomasă

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4, eliberată de Permise Bumbăța la 28.12.2017, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.06.2018 fiind format din: \_\_\_\_\_.

Președinte: Paladi Dumitru, primarul s. Bumbăța  
Membri: Nistoreanu Nicolai, specialist pe Bumbăța  
Nistoreanu Mihail, consilier local  
Yadiac Livia, contabil srf pe Bumbăța  
Rădeanu Lucia, directorul primăriei  
Furcu Constantin, responsabil Tehnic  
Elisei Gheorghe, inginer constructor, reprezentantul proiectului

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

Badus ref. J.E. Ungheeni  
O. Blisicac ref. DSE Ungheeni  
R. Popovici ref. CSP Ungheeni

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor  
Centralei termice pe combustibil solid biomasă

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările de construcție au fost executate în  
corespondență cu documentația de execuție și  
costul de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor  
și să se deranjeze beneficiarul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală 2. Ungheni s. Bumbăța  
gimnaziul, destinația producerea ET pe gaze, compus din  
următoarele construcții \_\_\_\_\_

suprafața totală \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, numărul de etaje P conform certificatului despre  
rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezenta proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, este însoțit de anexe numerotate, cu un  
total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 la \_\_\_\_\_ în  
4 exemplare.


Comisia de recepție:

Președinte \_\_\_\_\_

Membrii \_\_\_\_\_

D. Paladi  
N. Năzreanu  
L. Yadiac  
L. Rădeanu  
C. Futoz  
yh. Ercsi

Specialiști:

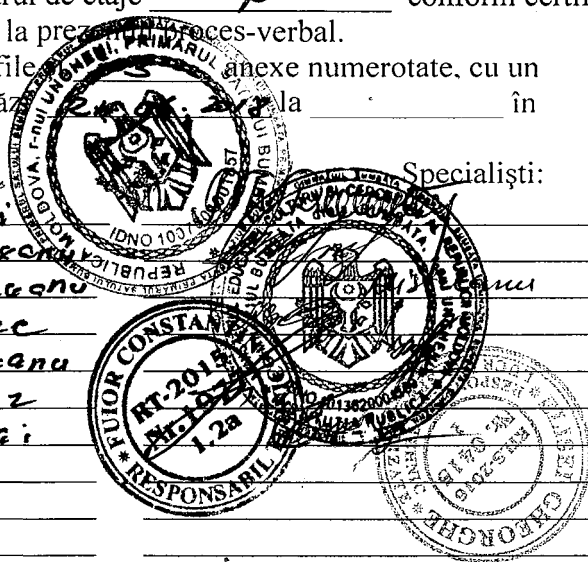


(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

S.A. Darnicgaz

" 21 " \_\_\_\_\_ 2018


L.Ș. \_\_\_\_\_

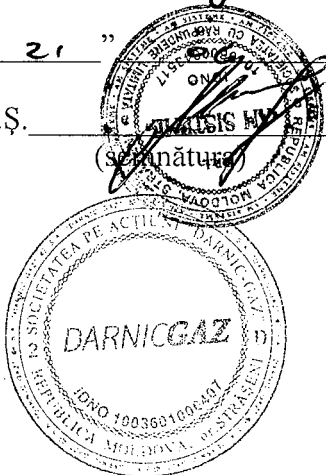

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

Primăria Bumbăța

" 21 " \_\_\_\_\_ 2018



(semnătura)

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 03 aprilie 2018

Privind lucrarea Construcția Centralei termice pe biomasă și instalarea panourilor solare pentru apă caldă menajeră la grădinița de copii din satul Ștefănești executată la obiectul Grădinița de copii din satul Ștefănești în cadrul contractului nr. 978 din 17/01555 din 26.10.17 încheiat între **Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - PNUD și SRL „AMSISTEME”** pentru efectuarea Construcția Centralei termice pe biomasă și instalarea panourilor solare pentru apă caldă menajeră la grădinița de copii din satul Ștefănești.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 eliberată de Primăria

Ștefănești de la 07.12 2017 având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 03 aprilie 2018 până 03 aprilie 2018

2. Fiind formată din:

**Președintele Comisiei**

Zdraguș Ludmila – primar al comunei Ștefănești

**Membrii Comisiei:**

Balan Ion – Contabil

Timuș Gheorghe – Centrul de Sănătate Publică

Ciorbă Vitalie - șeful Inspecției Ecologice

Armaș vladimir – Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale

Lungu Aliona – președintele Agenției de Implementare

Elisei Gheorghe – reprezentant PNUD

Rusu Nicolae – responsabil tehnic

Morari Pavel – responsabil tehnic

Bobeico Serghei – specialist în proiectări

Cegorean Valeriu - șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

3. Au mai participat la recepție:

Lazar Alexei - Reprezentantul firmei „AMSISTEME” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete

piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune: **Recepția obiectului la terminarea lucrărilor**

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

6) Comisia de recepție recomandă următoarele: **Exploatarea obiectului conform destinației**

7) **Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 03 aprilie 2018 în 5 exemplare.**

**Comisia de receptie:**

**Preşedintele Comisiei**

Zdraguş \_\_\_\_\_ primar al comunei Ştefăneşti

**Membrii Comisiei**

Balan Ion –	Contabil
Timuş Gheorghe –	Centrul de Sănătate Publică
Ciorbă Vitalie -	şeful Inspecţiei Ecologice
Armaş vladimir –	Serviciul Protecţie Civilă și Situații
Exceptionale	
Lungu Aliona –	Preşedintele Agenției de Implementare
Elisei Gheorghē –	reprezentant PNUD
Rusu Nicolae –	responsabil tehnic
Morari Pavel –	responsabil tehnic
Bobeico Serghei –	specialist în proiectări
Cegorean Valeriu -	şeful Secției Construcții, Gospodărie
Comunală și Drumuri	

**TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:**

«03» aprilie 2018

Lazar Alexei

L.S.

(semnătura)



**PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:**

2018



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
nr. \_\_\_\_\_ din 21.06 2018

privind lucrarea de construire a centralei termice pe combustibil  
Solid Biomasa executată la  
obiectul gr. s. gr. Bucurmeni în cadrul contractului nr. 151817/01555 din 16 noiembrie 20  
încheiat între PEOM și "Dorogaz" SA pentru lucrările de construire  
a centralei termice pe biomasă de combustibil solid biomasa

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de Primăria Bucurmeni la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.06.2018 fiind format din:
  - Președinte: Patriciu Filip, primarul com. Bucurmeni
  - Membri: Rădu Rădu, contabil șef
  - Ykariac Doru, director general
  - Pavel Măria, directorul școlii nr. 1
  - Furaz Constantin, responsabil tehnic
  - Ciobașă Vera, consilier local
  - Elesci George, inginer constructor, reprezentant al proiectantului

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în listă-anexa nr. 1:
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
 

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor  
a ei pe biomasă
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută printru:
 

Lucrările au fost executate în conformitate cu  
proiectul de execuție și calculul de sarcini
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
 

De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor  
și de a fi transmis beneficiarului

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție;

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală 2. Ungheeni  
s. Bucurmeni, destinația Producere ET pe Biomasa, compus din  
următoarele construcții \_\_\_\_\_

suprafața totală \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>, numărul de etaje P, suprafața la sol \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>,  
conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un  
total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 la \_\_\_\_\_ în  
4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele

Membrii

F. Patzietuc

R. Rădu

D. G. Iordache




M. Păunel

E. Furtuz

V. Erdoș

G. Băscu

Specialiști:



[Signature]

[Signature]

(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

SA Darnicgaz AM Sistemă SRI Peșceia s. Bucurmeni

" 21 "


" 21 "

2018

L.Ș.

(semnătura)

(semnătura)



INVESTITOR Proiectul Energie si Biomasa  
Sin Slobova  
Primăria s. Radeni, z. Căminari

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01/18 din 03.04.2018

privind lucrarea Construcția Centru lei Terapie executată la obiectul  
Primăria Radeni și CC în cadrul contractului nr. JRB 17/01555 din  
26 octombrie 2017 încheiat între PEBM PNUA și Terapie-Căminari pentru lucrările de  
construcție montaj a centrului de terapie

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02, eliberată de  
Primăria s. Radeni la 04.12.2017, cu valabilitate pînă la  
36 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03-10 aprilie 2018, fiind  
formată din:

- Sezgea Constantin - președinte, primarul s. Radeni
  - Jordan Lioba - secretar de consiliu local satesc
  - Păltica Elena - autobuz șef al Primăriei
  - Rosea Silvia - șefa bibliotecii publice satesc
  - Galceru Valeriu - inginer cadastral al Primăriei
  - Tihon Constantin - consilier satesc
  - Trifai Ioana - responsabil tehnic autorizat
  - Elisei Gherghe (numele, prenumele) - consultant PEBM
  - Ere, Elena - consilier satesc
3. Au mai participat la recepție:
- Sieravere Dinis - directorul AM, Sisteme SRL
  - Lazari Alexei - diriginte de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepția la terminarea lucrărilor  
a obiectului cu lichidarea obiectului din anexa nr. 2

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea lucrărilor de teren conform proiectului,  
cu excepția lucrărilor de finisare (umede),  
testarea și punerea în funcțiune în ansamblu a  
Centrului Terapie și sistemelor interconectate de încălzire.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de explere a Centrului Terapie după  
destinatie pe perioada rămasă a termenului  
de incalzire, pentru a se executa lucrările  
umede pe exterior și lichidându-se obiectul.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 4538412001/2538412001, adresa poștală 4435, destinația  
instituții publice, compus din următoarele construcții primăria, centru, suprafața  
comunitar

la sol 542,4, suprafața totală, 583 m<sup>2</sup>, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, confirmat 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12.06 la 2018 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membri: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and names over a circular stamp]*  
\_\_\_\_\_ *[Signature]*  
\_\_\_\_\_ *[Signature]*  
\_\_\_\_\_ *[Signature]*  
\_\_\_\_\_ *[Signature]*  
\_\_\_\_\_ *[Signature]*  
\_\_\_\_\_ *[Signature]*

(numele, prenumele, semnătura)

Specialiști:

\_\_\_\_\_ *[Signature]*  
\_\_\_\_\_ *[Signature]*  
\_\_\_\_\_ *[Signature]*  
\_\_\_\_\_ *[Signature]*  
\_\_\_\_\_

9. Lucrarea Construcția ET pe este.

pentru stabilirea diu bicomarsei

TRANSMISĂ DE  
EXECUTANTUL  
"DARUCCGAZ" S.R.L.  
(semnătura) \_\_\_\_\_ 2017

PRIMITĂ DE  
INVESTITORUL  
(semnătura) \_\_\_\_\_ 2017

*[Handwritten signature]* Președintele V. Prudan



INVESTITOR I.P.Gimnaziul Făleștii Noi  
PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 01 din 26 ianuarie 2018

privind lucrarea Construcția Centralei Termice cu arderea biocombustibilului solid la I.P.Gimnaziul Făleștii Noi executată la obiectul Gimnaziul Făleștii Noi în cadrul contractului nr. 17/01555 din 24 septembrie 2017 încheiat între I.p.Gimnaziul Făleștii Noi, PNUD Moldova și Antreprenorul SRL „AM- Sisteme Moldova, Strășeni pentru lucrările de Construcție a Centralei Termice cu arderea biocombustibilului solid la I.P.Gimnaziul Făleștii Noi. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr .15 din 24 septembrie 2017 , eliberată de Primăria Făleștii Noi la 24 septembrie 2017, cu valabilitate până 6 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26decembrie - 30 ianuarie 2018, fiind formată din:

1. Bejenari Vladimir - primarul satului Făleștii Noi , președintele comisiei
2. Jițari Ion ,directorul gimnaziului Făleștii Noi , membru
3. Elisei Gheorghe ,consultant pentru energie și biomasă ,reprezentant PNUD- specialist
4. Baclu Constantin, responsabil tehnic, construcții civile, membru specialist
5. Leahu Ion ,responsabil tehnic ,construcții civile, industriale și agrozootehnice, specialist
6. Cuschevici Constantin șeful secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Consiliului raional Fălești
7. Cosovan Alexei –specialist cadastru primăria com. Făleștii Noi.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Mereacre Andrei - director AM Sisteme SRL  
Lazari Alexei - inginer, AM Sisteme SRL  
Mocanu Cristina - șef IE Salort.  
Zimbea Vasile - SSE Falesti  
Talmaci Nicolae - med. șef. CSP Falesti

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune;

de recepționat cu observațiile  
din anexa N 3.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

prin finalizare lucrărilor  
principale de termomecanică.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

exploatarea obiectului conform  
destinației.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația cazangerie, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje unu, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând una file și trei anexe numerotate, cu un total de patru file, a fost încheiat astăzi 26 ianuarie 2018 la \_\_\_\_\_ în șase exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: \_\_\_\_\_

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte: Bejenari Vladimir

Specialiști: Elisei Gheorghe

Baclu Constantin

Leahu Ion

Membri: Jitari Ion

Cuschevici Constantin

Cosovan Alexei  
(numele, prenumele,

semnătura)

)

10. Lucrarea Construcția Centralei Termice cu arderea biocombustibilului solid la I.P.Gimnaziul Făleştii Noi este. recepționată la terminarea lucrărilor

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „AM- Sisteme

26 ianuarie 2018

L.Ș. \_\_\_\_\_ A.Mereacre

(semnătura)



PRIMITĂ:


INVESTITORUL:

Primăria Făleştii Noi

26 ianuarie 2018

\_\_\_\_\_ Bejenari Vladimir

(semnătura)



# Republica Moldova

## PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_\_ din 22.06.2018

Privind lucrarea **Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița de copii din s.Cobani r-l Glodeni** în cadrul contractului nr. ITB 17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PNUD și S.A. Darnic Gaz pentru efectuarea **Lucrări de construire a centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița de copii din s.Cobani r-l Glodeni.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 30.11.2017 eliberată de Primăria s.Cobani r-l Glodeni având valabilitatea 12 luni .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 15.06.2018 până 22.06.2018

#### Președintele Comisiei

Pluta Ion - Primarul satului Cobani

#### Membrii comisiei:

Sticiea Lilia – director grădiniță-creșă s.Cobani

Danila Angela – contabil șef

Elisei Gheorghe- inginer consultant în cadrul proiectului de energie și biomasă

Trifailo Marin - responsabil tehnic

Cojocari Artur - diriginte de șantier

Munteanu Lidia – director adjunct grădiniță-creșă s.Cobani

(numele, prenumele)

#### 3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz” Mereacre Filaret – director general

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz” Boța Sergiu - diriginte de șantier

Reprezentantul Inspecției ecologice r-l Glodeni Mahu Vitalii

Reprezentantul Centrului de sănătate publică r-l Glodeni Ailoae Iulia

Reprezentantul Secției situații excepționale Ceban Eduard

#### 4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate:

3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.

5) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

Recepția la terminarea lucrărilor  
a obiectului

6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prin executarea lucrărilor conform  
proiectului REP/01005/30 P

7) Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul la terminarea  
lucrărilor și de exp. conform destinației

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: centrala termică a gradinitei s.Cobani r-l Glodeni

Obiectul cu numărul cadastral 4822105.206, adresa poștală 4918, destinația gradinita-cresă, compus din 2 blocuri, suprafața la sol 472 m.p., suprafața totală, 472 m.p., numărul de etaje unu, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 22.06.2018 în 5 exemplare.

**Comisia de recepție**

**Președintele Comisiei**

Pluta Ion

**Membrii comisiei:**

Sticia Lilia

Danila Angela

Elisei Gheorghe

Trifailo Marin

Cojocaru Artur

Munteanu Lidia

(numele, prenumele)

**Specialiști:** Inspecției ecologice

Secției situații excepționale

Centrului de sănătate publică

Mahu Vitalii

Ceban Eduard

Ailoe Iulia

9. Lucrarea "Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și instalarea panourilor solare la grădinița de copii din s.Cobani r-l Glodeni" este :

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL

« 22 » 2018

L.S.  
(semnătura)

Directir S.A. Darnic Gaz  
Mereacre Filaret

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

« 22 » 2018

L.S.  
(semnătura)

Primarul  
Pluta Ion

# Republica Moldova

## PROCES-VERBAL

### DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_\_ din 28.06.2018

Privind lucrarea **Construcția centralei termice pe bază de biomasă la Școala Profesională Cuhureștii de Sus raionul Florești** în cadrul contractului nr. ITB 17/01555 din 26.10.2017 încheiat între PNUD și S.A. Darnic Gaz pentru efectuarea **Lucrări de construire a centralei termice pe bază de biomasă la Școala Profesională Cuhureștii de Sus raionul Florești.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 03.2018 eliberată de Primăria s. Cuhureștii de Sus raionul Florești având valabilitatea 12 luni .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 28.06.2018 până 28.06.2018

#### Președintele Comisiei

Murea Ion - Directorul ȘP Cuhureștii de Sus

#### Membrii comisiei:

Lupan Valeriu - Primarul satului Cuhureștii de Sus

Ungureanu Maria – Contabil șef ȘP Cuhureștii de Sus

Lazăr Petru – Director adjunct gospodărie ȘP Cuhureștii de Sus

Elisei Gheorghe- inginer consultant în cadrul proiectului de energie și biomasă

Trifailo Marin - responsabil tehnic

Cojocari Artur - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

*Școala Șeriu - diriginta autorizată*

#### 3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz”

Mereacre Filaret – director general

Reprezentantul firmei S.A. „Darnic Gaz”

Boța Sergiu - diriginta de șantier

Reprezentantul Inspecției ecologice r-l Florești

Ciorba Vitalii

Reprezentantul Centrului de sănătate publică r-l Florești

Timuș Gheorghe

Reprezentantul Secției situații excepționale

Foca Eduard

#### 4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5) Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

Recepția la terminarea lucrărilor  
a școlii

#### 6) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prin executarea lucrărilor conform  
proiectului 002116/3 - DV2

#### 7) Comisia de recepție recomandă următoarele:

Șe recepționat proiectul la terminarea  
lucrărilor de executat conform distanțierii

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: centrala termică Școala Profesională s.Cuhurești r-l Florești.

Obiectul cu numărul cadastral 1918209368, adresa poștală 6642, destinația Școala Profesională, compus din următoarele construcții bloc de studii, sala sportivă, teren auxiliar, suprafața la sol 3564 m.p., suprafața totală, 3564 m.p., numărul de etaje 4 (patru), conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 28.06.2018 în 3 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele Comisiei

Mureș Ion

Membrii comisiei:

Lupan Valeriu

Ungureanu Maria

Lazăr Petru

Elisei Gheorghe

Trifailo Marin

Cojocaru Artur

(numele, prenumele)

Scobice Serjicu

Specialiști: Inspecției ecologice

Secției situații excepționale

Centrului de sănătate publică

Clorob Vitalii

Foca Eduard

Timuș Gheorghe

9. Lucrarea "Construcția centralei termice pe bază de biomasă la Școala Profesională Cuhureștii de Sus raionul Florești" este terminată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

28 iunie 2018  
(semnătura)  
Darnic Gaz  
Direcție S.A. Darnic Gaz  
Mereacere Enareț

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

28 iunie 2018  
L.Ș.

(semnătura)  
Directorul Școlii Profesionale de Sus  
Mureș Ion
