

SRL”Acit-Trans”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Contract de antrepriză-Reparația drumului L654 Ceadâr Lunga - Taraclia (km 2,1 - 14,5)**
2. Numărul și data contractului: **3/L/14 din 25.04.2014**
3. Denumirea /numele beneficiarului: **Consiliul Raional Taraclia, Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Sud**
4. Adresa beneficiarului: **or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59**
5. Țara : **R. Moldova**
6. Calitatea în care sa participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului:

	exprimată în moneda care sa încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semn. contr)	43 897 067,00 lei	_____
b) finală (la data finalizării contr)	44 535 269,93 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**
9. Perioada de execuție a lucrării(luni)
 - a) contractată: **16 (șasesprezece) luni**
 - b) efectiv realizată: **20 (douăzeci) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat(dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Includerea lucrarilor suplimentare** confirmate prin Acordurile Adiționale (anexate). Noul termen limită de execuție a fost modificat prin Acordul adițional nr.2 din 10.11.2015. Astfel perioada de execuție contractată devine - 20 luni calendaristice
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.2 din 10.12.2015**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Nu sunt.**

Conducător
SRL „Acit-Trans”

Negura Gh.

L.Ș.



ACHIZITII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 3/L/14

privind achiziția prin Licitatie Publică

n. 25 " aprilie 2014

or. Cimislia

Articolul 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/00723 din 23.04.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 29 din 11.04.2014, între Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimislia, bul. Ștefan cel Mare 12, telefon 0241/2-62-86, fax 0241/2-62-86, e-mail adrsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentat prin Maria Culeșov, director ADR Sud, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Consiliul Raional Taracia, cu sediul, or. Taracia, str. Ștefan cel Mare, 59 tel. 0 (294) 24650, cod fiscal 1007601010312 prin reprezentantul legal dl. Alexandr Garanovschii, președintele raionului Taracia, numit în continuare Beneficiar, altă parte,

și Societatea Comercială S.R.L. "Acit-Trans", cu sediul în s. Gornoe, r-nul Strășeni, telefon/fax +373 /237/ 64 365, cod fiscal 1003600014360 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0027090 din 02.03.2001, licența seria A MMII nr.043455, din 19.02.2009 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la 19.02.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări (lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Gheorghe Negură, director în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Reparația drumului L654 Ceadîr Lunga - Taracia (km 2,1-14,5),

Cod CPV (45233142-6), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **16 (șaisprezece) luni calendaristice** din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a lucrărilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Termenul de execuție poate fi prelungit dacă întârzierea executării lucrărilor de datorează următoarele cauze:

- a) generate de **Co-investitor**, Beneficiar, sau altă autoritate publică de stat;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și care sunt considerate ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului general** sau ca urmare a unor nereguli similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al **Antreprenorului general**;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru **Antreprenorul general**;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și prevederilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului**, **Antreprenorul general** va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care **Co-investitorul** consideră necesar.

3.4. **Antreprenorul general** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul general** vor fi plătite de **Co-investitorul**.

3.5. La executarea definitivă a lucrărilor, **Antreprenorul general** va notifica **Co-investitorul** și **Beneficiarul** că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestor notificări, **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție.

3.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului general**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului general**, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Benef:

Articolul 4 VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **43 897 067 (patruzeci și trei milioane opt sute nouăzeci și șapte mii șazeci și șapte lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA.**

4.2. **Co-investitorul** va achita pentru executarea lucrărilor **Antreprenorului General** în avans 10% din valoarea lucrărilor stipulată în p.4.1 al prezentului contract, în termen de 30 zile lucrătoare, din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. Restul sumei se va achita eșalonat în:

termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3)

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către **Co-investitor**. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de **Co-investitor**, Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodic a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea **Co-investitorului**, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv actele normative care prevăd careva restricții la efectuarea lucrărilor, se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general fără plată, în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. **Co-investitorul** are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora, cât și reprezentanților **Beneficiarului** li se va asigura accesul la locul de muncă, în atelier, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de **Co-investitor** și **Beneficiar** drept confidențiale.

7.17. **Co-investitorul** este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. **Co-investitorului** și **Beneficiarului** trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile **Co-investitorului** sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor **Co-investitorului** se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către **Co-investitor**.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale **Beneficiarului**.

7.20. Pentru verificarea trasării de către **Beneficiar** sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția **Antreprenorului general** de către **Beneficiar** și **Co-investitor** pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. **Antreprenorul general** este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze **Beneficiarul** și **Co-investitorul** cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. **Antreprenorul general** are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de **Co-investitor** pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. **Beneficiarul** are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, **Co-investitor** și **Beneficiarul** are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către **Antreprenor** a dispozițiilor din punctul 7.24., **Co-investitorul**

poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens **Antreprenorul**, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului și **Co-investitorului**, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. **Co-investitorul** va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8

FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9

MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau **Co-investitorul** ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar, sau **Co-investitor** pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, **Co-investitorul** va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, **Co-investitorul** proiectantului sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de material, prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului sau a **Co-investitorului** și va refăce această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție

dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de **Co-investitor**, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

9.7. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția **Co-investitorului**, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a **Co-investitorului**, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu **Co-investitorul**. De asemenea, el răspunde în fața **Co-investitorului** de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței **Co-investitorului**, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție, emis de **Co-investitor**.

Articolul 10

PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract-model este de **5 (cinci) ani**.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări întemeiate, transmise de către **Co-investitor**.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta

poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul leg. de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină în cazul încălcării actelor de protecț.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de **Co-investitor**, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, **Co-investitorului**, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. **Co-investitorul** rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și învârșirile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Beneficiarul este obligat să puna la dispoziția și să informeze Antreprenorul general cu toate restricțiile prevazute pentru efectuarea lucrărilor pe acest teritoriu.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,02% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. **Co-investitorul** nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de **Antreprenorul general**, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina **Co-investitorului** sau a **Beneficiarului**, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13

REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

a) Beneficiarul și/sau **Co-investitorul** nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin

ceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) **Co-investitorul** nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) **Co-investitorul** notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. **Co-investitorul** cîț și Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o
potecă pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările
suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a
refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din
prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, de comun acord cu **Co-investitorul**, în caz de reziliere a contractului, va
convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, **Co-investitorul** de comun acord cu Beneficiarul va întocmi
situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se
vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și
daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, dacă rezilierea a avut loc din vina
Antreprenorul general.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție
(după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.1. din prezentul
articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, **Co-investitorul** poate continua execuția lucrărilor c);
respectarea prevederilor legale.

1.8. **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

COPIA

Articolul 14

DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind
parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat și semnat;

c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse
anexate;

f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă
limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți

14.5. În măturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale aferente acestora.

ANTREPRENOR

S.R.L. „Acif-Trans”

MD-3722 s. Gornoe, r-nul Strășeni
BC „ENERGBANK” SA fil. „CENTRU”
c/b: ENERGMMD22895
c/d: 222403987
c/f: 1003600014360
cod TVA: 86000477
Tel./fax: 0 (237) 64-3-65



(1) Gheorghe NEGURA

BENEFICIAR

Consiliul Raional Taraclia

MD-7401 or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59
c/f 1007601010312
c/d 226612

c/t 220100000009397

TREZMD2X

Tel. 0 (294) 24-6-50



Alexandr GABANOVSCHI

CO-INVESTITOR

Agenția de Dezvoltare Regională Sud


MD-4101 or. Cimișlia, bul. Ștefan cel Mare.12
BC „Moldindconbank” SA, filiala Cimișlia
c/b: MOLDMMD2X315
c/d: 2251915116
c/f: 1009601000290
Tel./fax: 0 (241) 2-62-86



Maria CULESOV



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL nr. 1 la contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014

„10” noiembrie 2015

or. Cimislia

Prezentul acord adițional este încheiat între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimislia, bul. Stefan cel Mare 12, telefon 0/241/2-62-86, fax 0/241/2-62-86, e-mail adrsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 12960 din 18.12.2009 IDNO 1009601000290, reprezentat prin Maria Culesov, director ADR Sud, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Consiliul Raional Taraclia, cu sediul, or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59 tel. 0 (294) 24650, cod fiscal 1007601010312 prin reprezentantul legal dl. Chiril Tatarli, președintele raionului Taraclia, numit în continuare Beneficiar, altă parte, și

Societatea Comercială S.R.L. „Acit-Trans”, cu sediul în s. Gornoe, r-nul Strășeni, telefon/fax +373 /237/ 64 365, cod fiscal 1003600014360 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0027090 din 02.03.2001, licența seria A MMII nr.043455, din 19.02.2009 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la 19.02.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări (lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Gheorghe Negură, director în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

În scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licităției publice nr. 14/00723 din 23 aprilie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 29 din 11.04.2014.

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului Reparația drumului L654 Ceadîr Lunga - Taraclia (km 2,1-14,5), unde pe parcursul implementării acestuia, s-au modificat rechizitele bancare ale Co-investitorului, după cum urmează:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

MD-4101, or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare, 12

Ministerul Finanțelor, Trezoria Teritorială Cimișlia

TREZMD2X

c/b: 2264371002

c/t: 262500000376202

c/f: 1009601000290

Prin urmare, este necesar de a efectua modificările corespunzătoare în Contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014 se aplică următoarele modificări:

1. Rechizitelor bancare ale Co-investitorului indicate în Contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014, vor fi:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

MD-4101, or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare, 12

Ministerul Finanțelor, Trezoria Teritorială Cimișlia

TREZMD2X

c/b: 2264371002

c/t: 262500000376202

c/f: 1009601000290

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 3/L/14 din 25 aprilie 2014.

Prezentul acord se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare la Agenția Achiziții Publice.


ANTREPRENOR

SC „Aer-Trans” SRL
S. Gorcea, r-nul Suceveni
C/ 1008600014860
cod TVA: 8500477
C/ 222408987
BC „ENERGIBANK” SA fil. „CENTRU”
Cod bancar: ENERGM22895
Tel./fax: 0 (237) 643-65

CO-INVESTITOR

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud
MD-4101, or. Cimislia, bul. Stefan cel Mare, 12
MP-TT Cimislia
C/ TREZMD2X
C/ 2264371002
C/ 262500000376202
C/ 1008601000290
Tel./fax: 0 (241) 2-62-86

George NEGURA



L.S.


Maria CULESOV



BENEFICIAR

Consiliul National Tarnabia
MD-7401 or. Tarnabia, str. Stefan cel Mare, 39
C/ 1007601010312
C/ 226612
C/ 2201000000009397
TREZMD2X
Tel. 0 (294) 24-6-50

Chiril TATARU





ACHIZIȚII PUBLICE

Ministerul Economiei și Infrastructurii - Moldova	
AGENCIA ACHIZIȚII PUBLICE	
INREGISTRAT	
Nr. 14/00723/002	Data 09.12.2015
Semnatul	

ACORD ADIȚIONAL nr. 2 la contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014

„10” noiembrie 2015

or. Cimislia

Prezentul acord adițional este încheiat între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimislia, bul. Ștefan cel Mare 12, telefon 0/241/2-62-86, fax 0/241/2-62-86, e-mail adrsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 12960 din 18.12.2009 IDNO 1009601000290, reprezentat prin Maria Culesov, director ADR Sud, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Consiliul Raional Taraclia, cu sediul, or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59 tel. 0 (294) 24650, cod fiscal 1007601010312 prin reprezentantul legal dl. Chiril Tatarli, președintele raionului Taraclia, numit în continuare Beneficiar, altă parte, și

Societatea Comercială S.R.L. „Acit-Trans”, cu sediul în s. Gornoe, r-nul Strășeni, telefon/fax +373 /237/ 64 365, cod fiscal 1003600014360 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0027090 din 02.03.2001, licența seria A MMII nr.043455, din 19.02.2009 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită până la 19.02.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări (lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Gheorghe Negură, director în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

În scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licităției publice nr. 14/00723 din 23 aprilie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 29 din 11.04.2014.

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului Reparația drumului L654 Ceadăr Lunga - Taraclia (km 2,1-14,5), unde pe parcursul implementării acestuia, a fost constatată necesitatea de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor, indicat în Contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014, până la 31.12.2015 – în consecința lipsei temporare de finanțare.

Prin urmare, este necesar de a efectua modificările corespunzătoare în Contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014 se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 3, pct 3.1. va avea următorul conținut:

„Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate este până la **„ 31 ” decembrie 2015.**

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 3/L/14 din 25 aprilie 2014.

Prezentul acord se încheie în **4 (patru)** exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare la Agenția Achiziții Publice.


ANTREPRENOR

CO-INVESTITOR

SC „Acit-Trans” SRL
s. Gornoe. r-nul Strășeni
c/f 1003600014360
cod TVA: 8600477
c/d 222403987
BC „ENERGBANK” SA fil.”CENTRU”
Cod banca: ENERGM22895
Tel./fax. 0 (237) 64-3-65

Agentia de Dezvoltare Regională Sud
MD-4101, or. Cimislia, bul. Stefan cel Mare, 12
MF-TT Cimișlia
c/b: TREZMD2X
c/b: 2264371002
c/t: 262500000376202
c/f: 1009601000290
Tel./fax: 0 (241) 2-62-86

Gheorghe NEGURĂ



L.S.

Maria CULEȘOV



BENEFICIAR

Consiliul Raional Taraclia
MD-7401 or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59
c/f 1007601010312
c/d 226612
c/t 220100000009397
TREZMD2X
Tel. 0 (294) 24-6-50

Chiril TATARU





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL nr. 3 la contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014

“ 10 ” noiembrie 2015

or. Cimislia

Prezentul acord adițional este încheiat între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimislia, bul. Ștefan cel Mare 12, telefon 0/241/2-62-86, fax 0/241/2-62-86, e-mail adrsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 12960 din 18.12.2009 IDNO 1009601000290, reprezentat prin Mar Culesov, director ADR Sud, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Consiliul Raional Taraclia, cu sediul, or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59 tel. 0 (29) 24650, cod fiscal 1007601010312 prin reprezentantul legal dl. Chiril Tatarli, președintele raionului Taraclia, numit în continuare Beneficiar, altă parte, și

Societatea Comercială S.R.L. „Acit-Trans”, cu sediul în s. Gornoe, r-nul Strășeni, telefon/fax +373 /237/ 64 365, cod fiscal 1003600014360 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. M. 0027090 din 02.03.2001, licența seria A MMII nr. 043455, din 19.02.2009 eliberată de Camera Licențiere, prelungită până la 19.02.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări (lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Gheorghe Negură, director în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

În scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licităției publice nr. 14/00723 din 23 aprilie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 29 din 11.04.2014.

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului Reparația drumului L654 Ceadâr Lunga - Taraclia (km 2,1-14,5), unde pe parcursul implementării acestuia, în proiectul de execuție inițial au fost operate modificări ce țin de deplasarea axei drumului de la 1 la 3 m. Ca urmare a dispărut necesitatea de a executa lucrările de defrișare a copacilor și tufarilor prevăzute în devizul ofertă Nr 1-2 „Defrișarea copacilor și a tufarilor”. Valoarea lucrărilor – 69 109, 51 (șaizeci și nouă mii o sută nouă lei, 51 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Prin urmare, este necesar de a efectua modificările corespunzătoare în Contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014 se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 4, pct 4.1. va avea următorul conținut: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului este de **43 827 957,49** (patruzeci și trei milioane opt sute douăzeci și șapte mii nouă sute cincizeci și șapte lei, 49 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 3/L/14 din 25 aprilie 2014.

Prezentul acord se încheie în **4 (patru)** exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare la Agenția Achiziții Publice.

ANTREPRENOR

SC „Acit-Trans” SRL
s. Gornoe. r-nul Strășeni
c/f 1003600014360
cod TVA: 8600477
c/d 222403987
BC „ENERGBANK” SA fil.”CENTRU”
Cod banca: ENERGM22895
Tel./fax. 0 (237) 64-3-65

Gheorghe NEGURĂ

L.S.

BENEFICIAR

Consiliul Raional Taraclia
MD-7401 or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59
c/f 1007601010312
c/d 226612
c/t 220100000009397
TREZMD2X
Tel. 0 (294) 24-6-50


Chiril TATARU



CO-INVESTITOR

Agentia de Dezvoltare Regională Sud
MD-4101, or. Cimislia, bul. Ștefan cel Mare, 12
MF-TT Cimișlia
c/b: TREZMD2X
c/b: 2264371002
c/t: 262500000376202
c/f: 1009601000290
Tel./fax: 0 (241) 2-62-86

Maria CULEȘOV





ACHIZIȚII PUBLICE

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova	
AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE	
ÎNREGISTRAT	
Nr. 4/00723/008	Data 09.12.2015
Semnătura	

ACORD ADIȚIONAL nr. 4 la contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014

“10” noiembrie 2015

or. Cimislia

Prezentul acord adițional este încheiat între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimislia, bul. Ștefan cel Mare 12, telefon 0/241/2-62-86, fax 0/241/2-62-86, e-mail adrsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 12960 din 18.12.2009 IDNO 1009601000290, reprezentat prin Maria Culesov, director ADR Sud, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Consiliul Raional Taraclia, cu sediul, or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59 tel. 0 (294) 24650, cod fiscal 1007601010312 prin reprezentantul legal dl. Chiril Tatarli, președintele raionului Taraclia, numit în continuare Beneficiar, altă parte, și

Societatea Comercială S.R.L. "Acit-Trans", cu sediul în s. Gornoe, r-nul Strășeni, telefon/fax +373 /237/ 64 365, cod fiscal 1003600014360 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0027090 din 02.03.2001, licența seria A MMII nr.043455, din 19.02.2009 eliberată de Camera de Licențiere, prelungită pînă la 19.02.2019, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări (lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin Gheorghe Negură, director în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

În scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014 (numit în continuare Contract), încheiat în rezultatul Licităției publice nr. 14/00723 din 23 aprilie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 29 din 11.04.2014.

Prezentul acord se încheie în cadrul proiectului Reparația drumului L654 Ceadâr Lunga - Taraclia (km 2,1-14,5), unde pe parcursul implementării acestuia, s-a constatat că documentația de proiect și de deviz nu include lucrările de recultivare a gropii de împrumut a solului. Lucrările de recultivare nu sînt prevăzute în proiectul estimat inițial și nici în contractul inițial însă sunt necesare pentru executarea lucrărilor indicate în acestea, de asemenea lucrările respective nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului inițial. Valoarea lucrărilor menționate – 707 313,07 (șapte sute șapte mii trei sute treisprezece lei, 07 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Prin urmare, este necesar de a efectua modificările corespunzătoare în Contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014.

Prin prezentul acord, în Contractul de antrepriză nr. 3/L/14 din „25” aprilie 2014 se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 4, pct 4.1. va avea următorul conținut: „Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul contractului este de 44 535 270, 56 (patruzeci și patru milioane cinci sute treizeci și cinci mii două sute șaptezeci lei, 56 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de antrepriză nr. 3/L/14 din 25 aprilie 2014.

Prezentul acord se încheie în 4 (patru) exemplare originale.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare la Agenția Achiziții Publice.

• ANTREPRENOR

SC „Acit-Trans” SRL
s. Gornoe. r-nul Strășeni
c/f 1003600014360
cod TVA: 8600477
c/d 222403987
BC „ENERGBANK” SA fil.”CENTRU”
Cod banca: ENERGM22895
Tel./fax. 0 (237) 64-3-65

Gheorghe NEGURĂ

L.S.

BENEFICIAR

Consiliul Raional Taraclia
MD-7401 or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 59
c/f 1007601010312
c/d 226612
c/t 220100000009397
TREZMD2X
Tel. 0 (294) 24-6-50

Chiril TATARLI



CO-INVESTITOR

Agentia de Dezvoltare Regională Sud
MD-4101, or. Cimislia, bul. Ștefan cel Mare, 12
MF-TT Cimișlia
c/b: TREZMD2X
c/b: 2264371002
c/t: 262500000376202
c/f: 1009601000290
Tel./fax: 0 (241) 2-62-86

Maria CULEȘOV



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 02 din 10.12.2015

Obiectul: "Reparație a drumului L654 Ceadâr Lunga – Taraclia, km 2,1-14,5"

este executat în cadrul contractului nr. 3/L/14 din 25.04.2014 încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de Co-investitor, Consiliul Raional Taraclia în calitate de Beneficiar și SRL „Acit-Trans” în calitate de Antreprenor general

1. Lucrările au fost executate în baza *autorizației nr.06, eliberată de Consiliul Raional Taraclia la data de 9.07.2014 cu valabilitate până la 24 luni.*
2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.12.2015, fiind formată din:

Președinte: - TATARLÎ Chiril, președintele raionului Taraclia ✓
Membri: - CULEȘOV Maria, director ADR Sud
- LUPAȘCU Eugen, șef-secție management proiecte, ADR Sud,
- TATARESCU Alexandru, șef-secție construcții, Consiliul raional Taraclia, ✓
- LOZOV Ivan, specialist principal Administrația de Stat a Drumurilor
- BOCICOVAR Nicolai, șef AO "Drumuri Cahul, sectorul 3, filiala Taraclia"
- SÎRTMACI Mihail, Vice președintele raionului Ceadâr - Lunga
- CURDOV Ivan, Vice primarul or. Ceadâr - Lunga

3. Au mai participat la recepție:

- Rusnac Andrei – reprezentant supraveghetor tehnic al obiectului
- Gheorghe Negură – director S.R.L."Acit - Trans", antreprenor, executorul lucrărilor

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 26.12.2015;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor la data de 26.12.2015 până în prezent, respectiv pe o durată de 14 zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de **44535269,93 lei**, conform listei-anexă nr. 1.

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul la etapa finală

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate și comportarea corespunzătoare a obiectului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția finală a obiectului cu obiectele din anexă 2.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral —, adresa poștală —, destinația drum local 6654, compus din următoarele construcții —, suprafața la sol 14260m², suprafața totală, —, numărul de etaje —, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi, —, în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: TATARLÎ Chiril

Membri: CULEȘOV Maria

LUPAȘCU Eugen

TATARESCU Alexandru

BACICOVAR Nicolai

LOZOV Ivan

SİRTMACI Mihail

CURDOV Ivan

Specialiști:

Rusnac And




9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea "Reparație a drumului L654 Ceadr Lunga - Taraclia, km 2,1-14,5"

se recomandă spre
recepție finală

" " 2015

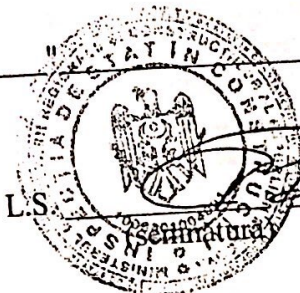

(funcția, numele, prenumele)

948 d/n 17-12-1.

Victor Punga

Lista lucrărilor efectuate

Nr	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor
1	Decaparea pământului vegetal	1336403,23
	Lucări de terasament	10243283,14
	Amenajarea sistemului rutier	30078078,83
	Construcția podețelor tubulare TH80.50-B1 la PC 36+10	69113,46
	Construcția podețelor tubulare TH100.50-B1 la PC 41+49	123568,00
	Construcția podețelor tubulare TH80.50-B1 la PC 77+36	69106,16
	Construcția podețelor tubulare TH80.50-B1 la PC 86+40	69128,00
	Construcția podețelor tubulare TH80.50-B1 la PC 97+80	69113,00
	Construcția podețelor tubulare TH100.50-B1 la PC 143+49	199719,28
	Amenajarea intersecțiilor minore	1336439,82
	Accesoriile drumului	234004,67
	Recultivarea gropii de împrumut a solului	707313,07
	TOTAL	44535269,93

Președintele comisiei

Responsabil tehnic:

Proiectant

Tatarli Chiril

Rusnac Andrei

Cortac Vasile



Observațiile comisiei de recepție finală

Președintele comisiei

Responsabil tehnic:

Proiectant

Tatarli Chiril

Rusnac Andrei

Cortac Vasile



Constatările comisiei de recepție finală

[Handwritten signature]

Președintele comisiei

Tatarli Chiril

Responsabil tehnic:

Rusnac Andrei

Proiectant

Cortac Vasile

