



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/347
privind achiziția prin licitație deschisă

"19" august 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **nr.ocds-b3wdp1-MD-1594722141887 din 05.08.2020**, între Î.S. "**Administrația de Stat a Drumurilor**", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., GENESIS Internațional** cu sediul în mun. Chișinău, str. Albișoara 84/6, MD-2059, tel. 022 290120, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1010600006879, reprezentată de directorul general dl Vitalii Mrug, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2021**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remediilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **55 389 672,69 (cincizeci și cinci milioane trei sute optzeci și nouă mii șase sute șaptezeci și doi lei, 69 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții bancare de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.
- 3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

- 1.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 1.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 1.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 5.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 5.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 5.3. Documentația de executare va fi repartizată astfel:
 - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 5.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 5.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 5.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 5.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 5.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 5.9. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.
- 5.10. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.
- 5.11. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în

quantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.

12. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în quantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.

13. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.

14. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.

15. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

15. Antreprenorul general garantează că, la data recepției finale, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

16. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

17. Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.

18. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

19. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

20. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Antreprenorului general.

21. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

22. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

3. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

14. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

15. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate suta lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.

16. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

17. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

18. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va afișa această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestea. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 (unu) an.

1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
2. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 1.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 1.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 1.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 1.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 1.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 1.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 1.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vîna cîrui s-a rezoluționat contractul.
- După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- Conținuturile documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Căuțul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
F 1003600023559
IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
IF-TR Chișinău-bugetul de stat
TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "GENESIS Internațional"
MD 2059 mun. Chișinău, Albișoara 84/6
c/f 1010600006879
c/ IBAN MD17EN000000222405985895
B.C. "Energbank" S.A. filiala Centru
BIC ENEGMD22
c/TVA 0506120

Director general interimar
Vasilescu POTOP

Director general
Vitalii MRUG



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887

Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/347 din 19.08.2020.

“ 03 ” 111111 2021

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar. dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.R.L., „GENESIS Internațional”**, în persoana directorului general dl Vitalii Mrug, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/347 din 19.08.2020 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.32 din 01.06.2021 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor suplimentare incluse constituie 102 569,51 (una sută două mii cinci sute șazeci și nouă lei, 51 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la mărirea valorii contractului.

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei. 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

**Director general interimar
Veaceslav POTOP**

„Antreprenor general”

S.R.L. „GENESIS Internațional”

MD 2059 mun. Chișinău, Albișoara 84/6
c/f 1010600006879

c/ IBAN MD17EN000000222405985895

B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru

BIC ENEGMD22

c/TVA 0506120

**Director general
Vitalii MRUG**



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887

Содол 0177. 102200000-2

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr. 06-14/347 din 19.08.2020.

„ 08 ” octombrie 2021

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl. Sergiu Bejan, care activează în baza statutului, și **S.R.L. „GENESIS Internațional”**, în persoana directorului general dl. Vitalii Mrug, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/347 din 19.08.2020 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. 61 din 06.10.2021 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. **Punctul II „Perioada de execuție” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:**

„Se stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor până la data de **30.06.2022**”.

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”


S.R.L. „GENESIS Internațional”

MD 2059 mun. Chișinău, Albișoara 84/6
c/f 1010600006879

c/IBAN MD17EN000000222405985895

B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru
BIC ENEGMD22
c/TVA 0506120

Director general
Vitalii MRUG

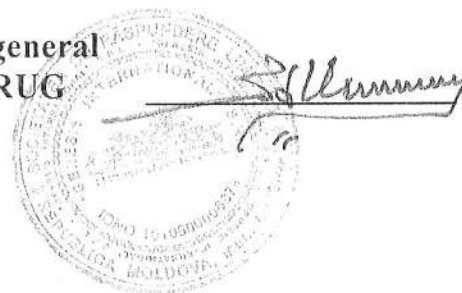



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887

Codul CDP: 45200000-0

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3 la contractul nr. 06-14/347 din 19.08.2020

“16” martie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. “Genesis Internațional”, în persoana directorului general, dl Vitalii Mrug, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/347 din 19.08.2020 în vederea executării **lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici - Morozeni), km 13-18.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887-3 din 15.03.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1 se completează după cum urmează:
-Valoarea lucrărilor excluse constituie 304 524,55 (trei sute patru mii cinci sute douăzeci și patru lei, 55 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

”Beneficiar”

Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



”Antreprenor general”

S.R.L. “Genesis Internațional”

MD 2059 mun. Chișinău, Albișoara 84/6
c/f 1010600006879

c/ IBAN MD17EN000000222405985895

B.C.”Energbank”S.A. filiala Centru
BIC ENEGMD22
c/TVA 0506120

Director general
Vitalii MRUG





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 4 la contractul nr. 06-14/347 din 19.08.2020

„ 30 ” iunie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului adjunct, dl Iurie Pașa, care activează în baza statutului și S.R.L. „Genesis International”, în persoana directorului, dl Vitalii Mrug, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/347 din 19.08.2020 în vederea executării **lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R21 Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici - Morozeni), km 13-18.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887-4 din 29.06.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul II „Perioada de execuție” subpunct 2.1., modificat anterior prin acordul adițional nr. 2 din 08.10.2021, se completează cu următoarea frază:
„Se stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor până la data de **31.08.2022**”.

2. Punctul III „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse constituie **774 968,27** (șapte sute șaptezeci și patru mii nouă sute șazeci și opt lei, 27 bani) lei inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director adjunct
Iurie PAȘA



„Antreprenor general”

S.R.L. „Genesis International”
MD 2059 mun. Chișinău, Albișoara 84/6
c/f 1010600006879
c/ IBAN MD17EN000000222405985895
B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru
BIC ENEGMD22
c/TVA 0506120

Director
Vitalii MRUG





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 5 la contractul nr. 06-14/347 din 19.08.2020

“01” septembrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. „Genesis International”, în persoana directorului, dl Vitalii Mrug, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/347 din 19.08.2020 în vederea executării **lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R21 Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici - Morozeni), km 13-18.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887-5 din 26.08.2022. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul II „Perioada de execuție”, subpunct 2.1 se completează după cum urmează:
„Se prelungește termenul limită de execuție a lucrărilor până la data de 30.09.2022”.
2. Punctul III „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1 se completează după cum urmează:
„Valoarea lucrărilor suplimentare incluse constituie 170 619,64 (una sută șaptezeci mii șase sute nouăsprezece lei, 64 bani) lei inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.R.L. „Genesis International”
MD 2059 mun. Chișinău, Albișoara 84/6
c/f 1010600006879
c/ IBAN MD17EN000000222405985895
B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru
BIC ENEGMD22
c/TVA 0506120

Director
Vitalii MRUG





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocde-b3wdp1-MD-1594722141887

Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 6

la contractul nr. 06-14/347 din 19.08.2020

„07” septembrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. „Genesis International”, în persoana directorului, dl Vitalii Mrug, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/347 din 19.08.2020 în vederea executării **lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici - Morozeni), km 13-18.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocde-b3wdp1-MD-1594722141887-6 din 05.09.2022. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” se completează cu următorul subpunct:

3.1.1. „Ca urmare a acceptării solicitării de ajustare a valorii contractului, valoarea lucrărilor contractate se mărește cu **2 674 796,00** (două milioane șase sute șaptezeci și patru mii șapte sute nouăzeci și șase lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA.

2. Punctul IV. „Ajustarea valorii contractului”, subpunctul 4.1., va avea următorul conținut: „Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice”.

3. Punctul IV. „Ajustarea valorii contractului” se completează cu următorul subpunct:

4.2. „Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua în baza actualizării prețurilor de cost, modalitate care nu poate fi modificată pe durata executării prezentului contract”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN

„Antreprenor general”

S.R.L. „Genesis International”

MD 2059 mun. Chișinău, Albișoara 84/6
c/f 1010600006879

c/ IBAN MD17EN000000222405985895

B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru
BIC ENEGMD22
c/TVA 0506120

Director
Vitalii MRUG





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887

Codul CPV: 45200000-0

ACORD ADIȚIONAL Nr. 7/1 la contractul nr. 06-14/347 din 19.08.2020

"14" noiembrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și **S.R.L. "Genesis Internațional"**, în persoana directorului general, dl Vitalii Mrug, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/347 din 19.08.2020 în vederea executării **lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R21 Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici - Morozeni), km 13-18.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887-7 din 08.11.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor". Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1 modificat anterior prin acordul adițional nr. 1 din 03.06.2021, nr. 3 din 16.03.2022, nr. 4 din 30.06.2022, nr. 5 din 01.09.2022, nr. 6 din 07.09.2022, se completează cu subpunctul 3.1.2.

-Valoarea lucrărilor excluse constituie 207 247,17 (două sute șapte mii două sute patruzeci și șapte lei, 17 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



"Antreprenor general"

S.R.L. "Genesis Internațional"
MD 2059 mun. Chișinău, Albișoara 84/6
c/f 1010600006879
c/ IBAN MD17EN000000222405985895
B.C. "Energbank" S.A. filiala Centru
BIC ENEGMD22
c/TVA 0506120

Director general
Vitalii MRUG





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 7/2
la contractul nr. 06-14/347 din 19.08.2020

"14" noiembrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. "Genesis Internațional", în persoana directorului general, dl Vitalii Mrug, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/347 din 19.08.2020 în vederea executării **lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R21 Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici - Morozeni), km 13-18.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887-7 din 08.11.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor". Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1 modificat anterior prin acordul adițional nr. 1 din 03.06.2021, nr. 3 din 16.03.2022, nr. 4 din 30.06.2022, nr. 5 din 01.09.2022, nr. 6 din 07.09.2022, se completează cu subpunctul 3.1.3.

-Valoarea suplimentară inclusă constituie 46 283,21 (patruzeci și șase de mii două sute optzeci și trei lei, 21 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



"Antreprenor general"

S.R.L. "Genesis Internațional"

MD 2059 mun. Chișinău, Albișoara 84/6
c/f 1010600006879

c/ IBAN MD17EN000000222405985895

B.C. "Energbank" S.A. filiala Centru

BIC ENEGMD22

c/TVA 0506120

Director general

Vitalii MRUG





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887

Codul CPV: 45200000-0

ACORD ADIȚIONAL Nr. 8

la contractul nr. 06-14/347 din 19.08.2020

“25” noiembrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. „Genesis International”, în persoana directorului, dl Vitalii Mrug, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/347 din 19.08.2020 în vederea executării **lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R21 Orhei - Bravicea (tronsonul Vatici - Morozeni), km 13-18.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1594722141887-8 din 23.11.2022. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 modificat anterior prin acordul adițional nr. 1 din 03.06.21, nr. 3 din 16.03.22, nr. 4 din 30.06.22, nr. 5 din 01.09.22, nr. 6 din 07.09.22, nr. 7/1 din 14.11.22 și nr. 7/2 din 14.11.22 se completează cu următorul subpunct:
3.1.4. „Ca urmare a acceptării solicitării de ajustare a valorii contractului, valoarea lucrărilor contractate se mărește cu **3 772 619,95** (trei milioane șapte sute șaptezeci și două mii șase sute nouăsprezece lei, 95 bani) lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.R.L. „Genesis International”

MD 2059 mun. Chișinău, Albișoara 84/6
c/f 1010600006879

c/ IBAN MD17EN000000222405985895

B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru
BIC ENEGMD22
c/TVA 0506120

Director
Vitalii MRUG

