




A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19

privind achiziția prin Licitare Publică

" 23 " noiembrie 2016

or. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitare Publică nr. 16/02625 din data 27.10.2016, între **Ministerul Educației**, cu sediul în or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, e-mail: achizitie @mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016, reprezentat prin **Elena CERNEI, Viceministru**, în calitate de **Investitor**, pe de o parte,

Consiliul raional Căușeni cu sediul: MD-4228 or.Căușeni, str. M.Eminescu 31 Republica Moldova tel/fax: 0-243-2-30-07; 0-243-2-26-50, reprezentat prin **Ion CIONTOLOI, președintele raionului**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte

și **ÎI „Pădureț Alexandru”**, cu sediul: MD-4228, str. Ion Cazacu, 10 s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă, telefon: 024-23-48-88; 0242-34-804, 068507766, fax: 022-53-98-49, e-mail: alex paduret@mail. ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 546 din “27”10.2015 (17.06.2005), autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 040438 din “31”10.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate: *construcțiile de caladiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții*(se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat prin **Alexandru PĂDUREȚ, Director**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a Liceului Teoretic „Meșterul Manole” din s. Sălcuța, r-nul Căușeni**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **7 luni** de la înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către investitor și beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Investitor și Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Investitorului și Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Investitorul și Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Investitor și Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Investitorul și Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **25 997 362,87 lei** (douăzeci și cinci milioane nouă sute nouăzeci și șapte mii trei sute șaiszeci și doi lei 87 bani) MD inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate: se va achita 10% avans și 90% vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Investitor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

**15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților
Semnăturile părților**

INVESTITOR – Ministerul Educației

Adresa: MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02

IBAN: MD35TRPBAA311120C00488433

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000082



Elena CERNEI

BENEFICIAR - Consiliul raional Căușeni

Adresa: or.Căușeni, bd. Mihai Eminescu, 31,

MD-4323, rml Căușeni, Republica Moldova

Telefon: 0-243-2-30-07; 0-243-2-26-50

IBAN:

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Cont trezorerial: 220106033387218

Cod fiscal: 1007601010921



Ion CIONTOLOI

L.S.

ANTREPRENOR – ÎÎ „PĂDUREȚ ALEXANDRU”

Adresa: MD-4228, str. Ion Cazacu, 10, s. Popeasca, r-l Ștefan

Telefon/fax: 024-23-48-88; 068507766

IBAN: MD86ML000000000222424436


Banca: BC „Moldindconbank” SA fil. Căușeni

Cod: MOLDMD2X344

Cod fiscal: 1005608001232

TVA: 8900033

Alexandru PĂDUREȚ

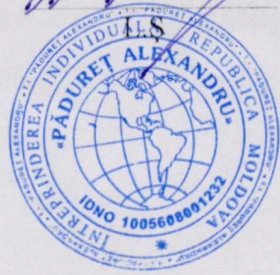



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIŢIONAL Nr. 23

la contractul Nr. 19 din " 23 " noiembrie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi " 04 " 12. 2017, în mun. Chişinău, între **Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării**, în persoana dlui secretarului general de stat Igor Şarov, **Consiliul Raional Căuşeni**, în persoana dlui preşedintelui Nicolae Gorban şi **ÎI "Pădureţ Alexandru"**, în persoana dlui director Alexandru Pădureţ, în scopul modificării Contractului Nr. 19 din " 23 " noiembrie 2016 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 16/02625/001 din " 12 " decembrie 2016.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziţii al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Cod CPV: 45000000-7, procesul-verbal nr. 33 din " 23 " noiembrie 2017.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Contractul nr. 19 din 23 noiembrie 2016, pentru lucrări de reparaţie capitală a Liceului Teoretic „Meşterul Manole” din s. Sălcuţa, r-nul Căuşeni, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.

Se prelungeşte valabilitatea contractului pînă la 31.12.2018.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către Agenţia Achiziţii Publice.

INVESTITOR – Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării

Adresa: MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1

Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02

IBAN: MD87TRPIAA222210A15326AB

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000107



Igor ŞAROV

BENEFICIAR - Consiliul raional Căuşeni

Adresa: or. Căuşeni, bd. Mihai Eminescu

MD-4323, r-nul Căuşeni, Republica Moldova

Telefon: 0-243-2-30-07; 0-243-2-26-50

IBAN:

Banca: Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Cont trezorerial: 220106033387218

Cod fiscal: 1007601010921



Nicolae GORBAN

L.Ş.

ANTREPRENOR – ÎI „PĂDUREŢ ALEXANDRU”

Adresa: MD-4228, str. Ion Cazacu, 10, s. Popeasca, r-nul Ştefan



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 24

privind achiziția prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

“ 18 ” mai 2018

or. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere din data 02.05.2018, între **Ministerul Educației, Culturii și Cercetării** cu sediul în or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, e-mail: achizitie @mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016, reprezentat prin **Igor Șarov**, secretar general de stat, în calitate de **Investitor**, pe de o parte,

Consiliul raional Căușeni cu sediul: MD-4228 or.Căușeni, str. M.Eminescu 31 Republica Moldova tel/fax: 0-243-2-30-07; 0-243-2-26-50, reprezentat prin **Nicolae Gorban**, președintele raionului, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte

și **ÎI „Pădureț Alexandru”**, cu sediul: MD-4228, str. Ion Cazacu, 10 s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă, telefon: 024-23-48-88; 0242-34-804, 068507766, fax: 022-53-98-49, e-mail: alex_paduret@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 546 din “27”10.2015 (17.06.2005), autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 040438 din “31”10.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate: *construcțiile de caladiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții*(se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat prin **Alexandru Pădureț, Director**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație capitală a Liceului Teoretic „Meșterul Manole” din s. Sălcuța, r-nul Căușeni**, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către investitor și beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Investitor și Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmărire a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Investitorului și Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Investitorul și Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Investitor și Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Investitorul și Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 507 684,32 lei (trei milioane cinci sute șapte mii șase sute optzeci și patru lei 32 bani) MD inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocațiilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Investitor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

**15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților
Semnăturile părților**

INVESTITOR – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Adresa: MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02

IBAN: _____

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000107



Igor ȘAROV

BENEFICIAR - Consiliul raional Căușeni

Adresa: or. Căușeni, bd. Mihai Eminescu

MD-4323, rml Căușeni, Republica Moldova

Telefon: 0-243-2-30-07; 0-243-2-26-50

IBAN: _____

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

Cont trezorerial: 220106033387218

Cod fiscal: 1007601010921



Nicolae GORBAN

ANTREPRENOR – ÎÎ „PĂDUREȚ ALEXANDRU”

Adresa: MD-4228, str. Ion Cazacu, 10, s. Popeasca, r-l Ștefan

Telefon/fax: 024-23-48-88; 068507766

IBAN: MD86ML000000000222424436

Banca: BC „Moldindconbank” SA fil. Căușeni

Cod: MOLDMD2X344

Cod fiscal: 1005608001232

TVA: 8900033



Alexandru PĂDUREȚ

L. Jorjani *Dezaf*

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 39**

privind achiziția prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

„ 20 ” septembrie 2018

or. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere din data 07.09.2018, între **Ministerul Educației, Culturii și Cercetării** cu sediul în or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale. 1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, e-mail: achizitie@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016, reprezentat prin **Igor Șarov**, secretar general de stat, în calitate de **Investitor**, pe de o parte,

Consiliul raional Căușeni cu sediul: MD-4228 or.Căușeni, str. M.Eminescu 31 Republica Moldova tel/fax: 0-243-2-30-07; 0-243-2-26-50, reprezentat prin **Nicolae Gorban**, președintele raionului, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte

și **ÎI „Pădureț Alexandru”**, cu sediul: MD-4228, str. Ion Cazacu, 10 s. Popeasca, r-nul Ștefan Vodă, telefon: 024-23-48-88; 0242-34-804, 068507766, fax: 022-53-98-49, e-mail: alex_paduret@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 546 din “27”10.2015 (17.06.2005), autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 040438 din “31”10.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate: *construcțiile de caladiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții*(se permit lucrările conform listei indicate în anexă), reprezentat prin **Alexandru Pădureț, Director**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a Liceului Teoretic „Meșterul Manole” din s. Sălcuța, r-nul Căușeni*, Cod CPV: **45000000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 zile calendaristice** de la înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către investitor și beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Investitor și Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Investitorului și Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Investitorul și Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Investitorul și Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Investitor și Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul și Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Investitorul și Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 373 231,28 lei (trei sute șaptezeci și trei mii două sute treizeci și unu lei 28 bani) MD inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate și în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Investitor și Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Investitor Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.


înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și este semnat astăzi, "20" septembrie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților Semnăturile părților

INVESTITOR – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Adresa: MD-2033, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1
Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02
IBAN: MD87TRPIAA222210A15326AB
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1006601000107



Igor ȘAROV

BENEFICIAR - Consiliul raional Căușeni

Adresa: or. Căușeni, bd. Mihai Eminescu, 31,
MD-4323, rml Căușeni, Republica Moldova
Telefon: 0-243-2-30-07; 0-243-2-26-50
IBAN: _____
Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
Cont trezorerial: 220106033387218
Cod fiscal: 1007601010921



Nicolae GORBAN

ANTREPRENOR – ÎÎ „PĂDUREȚ ALEXANDRU”

Adresa: MD-4228, str. Ion Cazacu, 10, s. Popcașca, r-l Ștefan
Telefon/fax: 024-23-48-88; 068507766
IBAN: MD86ML000000000222424436
Banca: BC „Moldindconbank” SA fil. Căușeni
Cod: MOLDMD2X344
Cod fiscal: 1005608001232
TVA: 8900033



Alexandru PĂDUREȚ

Investitor Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 26 martie 2019

privind lucrarea „Reparația capitală a Liceului Teoretic „Meșterul Manole” din s.Sălcuța raionul Căușeni”

în cadrul contractului nr. 19 din 23 noiembrie 2016

încheiat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

și Î.I. “Pădureț Alexandru” pentru lucrările de „Reparația capitală a Liceului Teoretic „Meșterul Manole” din s.Sălcuța raionul Căușeni”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 04.01.2017 eliberată de Arhitect șef al raionului la 04.01.2017

cu valabilitatea până la 04.01.2019

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 martie 2019 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Gogu Sergiu, vicepreședintele al raionului Căușeni :

Membrii comisiei:

Turtureanu Iurie, șef, Direcția economie, construcții și infrastructură ;

Novac Ion, primar, satul Sălcuța ;

Buga Simion, șef, Direcția Finanțe Căușeni ;

Focșa Victor, arhitect șef, raionul Căușeni ;

Rudenco Boris, specialist cu activități în construcție atestat ;

Perju Nicolae, șef, Oficiul teritorial Sud al ANRE ;

Afanasii Dumitru, șef-interimar secția construcții, gospodărie comunală și drumuri ;

Răilean Vladimir, consultant – inginer lucrări civile în cadrul Proiectului Băncii Mondiale „Reforma Învățământului în Moldova” ;

3. Au mai participat la recepție : Antreprenorul principal, administrator Î.I., Pădureț Alexandru” Pădureț Alexandru, Responsabil tehnic, Clipa Simion, Diriginte de șantier atestat, Doagă Victor

4. Constatările comisiei de recepție :

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista- anexă nr.2 nu au fost executate ;

3) în lucrările cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : recepția lucrărilor a obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : faptul că nu sunt identificate careva obiecții de natură să afecteze utilizarea obiectului conform destinației

7. Comisia de recepție recomandă următoarele ; admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral 2721114136 adresa poștală Liceul Teoretic „Meșterul Manole” sat. Sălcuța r-1 Căușeni str. Pavel Creangă, 45, destinația Educație

compus din următoarele construcții I. Clădirea liceului Bloc (A,B,C),
II. Atelier de instruire profesională și cazangerie III. Stație de epurare pentru L.T., Meșterul Manole “Sălcuța

suprafața la sol _____ suprafața totală, _____ numărul de nivele II, III conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 (una) fișe și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) fișe, a fost încheiat astăzi la “26” martie 2019 în 5 (cinci) exemplare.

9. Concluzia : Agencia pentru Supraveghere Tehnică

recomandă spre recepție finală cu condiția îndeplinirii

L.S. recomandă spre recepție finală / verificată în aceeași

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei :

vicepreședinte al raionului Căușeni

Gogu Sergiu

Membrii comisie

șef, Direcția Economie, Construcții și

Infrastructură

Primar s. Sălcuța

șef, Direcția Finanțe Căușeni

arhitect șef , raionul Căușeni

șef Oficiul teritorial Sud al ANRE

șef-interimar secția construcții,

gospodărie comunală și drumuri

specialist cu activități în construcție

atestat

consultant – inginer lucrări civile în

cadrul Proiectului

Turtureanu Iurie

Novac Ion

Buga Simion

Focșa Victor

Perju Nicolae

Afanasii Dumitru

Rudenco Boris

Răilean Vladimir

10. Lucrarea _____

_____ este.

TRANSMISĂ :

EXECUTANTUL :

„26” martie 2019

L.S. _____

(semnătura)


PRIMITĂ:

INVESTITORUL

„ ” 2019

L.S. _____

(semnătura)

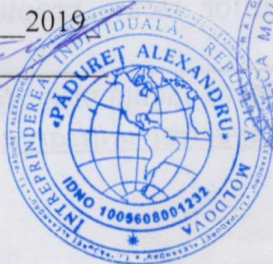

Anexa nr.1 la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor
la obiectul : „Reparația capitală a Liceului Teoretic „Meșterul Manole”
din s.Sălcuța r-l Căușeni”.

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Obiectele nu sunt

Președintele comisiei
Responsabil tehnic
Reprezentantul antreprenorului



Observatiile comisiei de recepție la terminarea
la obiectul „Reparația capitală a Liceului Teoretic
„Meșterul Manole” din s.Sălcuța r-l Căușeni”

ANRE - confirmarea de către reședintele de s.
a modificărilor efectuate în proiect cu referință
la aparatele de protecție instalate în
panoul de evidență a consumului de energie
electrică

Se știe din ANRE N. Popescu N. Popescu
26 03 2019

Președintele comisiei _____
Responsabil tehnic _____
Reprezentantul antreprenorului _____



Anexa nr.3
la procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor la
obiectul: „Reparația capitală
a Liceului Teoretic „Meșterul
Manole “din s.Sălcuța r-l
Căușeni “
din “26 martie 2019

LISTA

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate

Obiectiv nu s-a făcut

Președintele Comisiei
Responsabil tehnic
Reprezentantul antreprenorului

