

CONTRACT DE ASOCIERE

CAPITOLUL I.

Prezentul contract se încheie la data de 11.09.2017, între PĂRȚILE:

1.1. "V.I.V.- TEHNOI" S.R.L., cod fiscal 1008600009439, cu sediul pe adresa: mun. Chișinău or. Cricova str. Chișinăului 97 ap.6 în persoana Directorului Pascaru Viorel, în calitate de Asociat Lider și

1.2. "5AQ INVEST" S.R.L., adresa juridică: bd. Dacia 40/2, mun. Chișinău, MD-2062, cod fiscal 1009606001052, în persoană Directorului Jelescu Andrei, în calitate de Asociat secund.

CAPITOLUL II. OBIECTUL ASOCIERII

2.1. Cei doi asociați "5AQ INVEST" S.R.L și "V.I.V.- TEHNOI" S.R.L. sunt de acord să se asocieze pentru realizarea următoarelor obiective: „Lucrări de reconstrucție a laboratorului de analize microbiologice conform proiectului realizat în conformitate cu cerințele prevăzute de WHO Good Practices for Pharmaceutical Microbiology.”

2.2. Asociația își desfășoară activitatea potrivit următoarelor principii:

- a) principiul bunei-credințe și rezonabilității în procesul exercitării drepturilor și obligațiilor Asociaților pentru executarea prezentului Contract;
- b) principiul depunerii efortului, profesionalismului și capacităților maxime în scopul îndeplinirii obiectului prezentului Contract.
- c) principiul independenței juridice a Asociaților;
- d) principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale a Asociaților;
- e) principiul acordării asistenței calitative de orice tip întru realizarea scopului Asociației.

CAPITOLUL III. DURATA ASOCIERII

3.1. Asocierea începe la data semnării acestui CONTRACT și va continua pe durata executării lucrărilor prevăzute în pct.2.1 al prezentului contract.

CAPITOLUL IV. CONTRIBUTIA PĂRȚILOR

4.1. Asociatul "5AQ INVEST" S.R.L și asociatul "V.I.V.- TEHNOI" S.R.L. vor contribui fiecare cu mecanisme sau alte resurse necesare pentru realizarea scopului asocierii enunțat în acest contract.

4.2. Asociatul lider se obligă să depună din numele Asociației garanția de participare la licitație în mărime de 2% din valoarea ofertei și garanția de bună execuție în mărime de 1% din valoarea contractului adjudecat.

4.3. Asociatul lider va fi responsabil de executarea următoarelor lucrări:

- Antrepriza generală
- Supravegherea executării lucrărilor de către asociatul secund
- Laborator. Rețea de curenti slab (marca TS);
- Laborator. Alimentari cu gaze. Conducte exterioare (marca AGE);
- Laborator. Certificarea și Calificarea;
- Consultanță în procesul de executare a lucrărilor prevăzute în pct.2.1 al prezentului contract;

4.4. Asociatul secund "SAQ INVEST" S.R.L. va fi responsabil de executarea următoarelor lucrări:

- Laborator. Echipament electric de forta/ Iluminatul electric interior (marca EEF/IEI.SU);
- Laborator. Semnalizare de incendiu (marca SI);
- Laborator. Sistemul de control al accesului si sistemul de instiintare;
- Laborator. Izolarea termică a fațadelor
- Laborator. Lucrari de tehnice-sanitare (apa si canalizare) (marca RAC);
- Laborator. Lucrari generale de constructive;
- Laborator. Lucrari de tehnice-sanitare (incalzire si ventilare) (marca IV);
- Laborator. Automatizare (marca AIVC);
- Laborator. Monitorizarea: temperatura, umiditatea si diferenta de presiuni;
- Cazangerie. Lucrari de tehnice-sanitare (apa si canalizare) (marca RAC);
- Cazangerie. Automatizare (marca AIT/AAGI.1);
- Cazangerie. Automatizare (marca AIT/AAGI.2);
- Cazangerie. Echipament de teplomecanice (marca SM);
- Cazangerie. Lucrari generale de constructie;
- Cazangerie. Alimentarea cu gaze.Instalatii interioare (marca AGI);
- Cazangerie. Semnalizare de incendiu (marca SI).
- Cazangerie. Iluminat electric. Echipament electric de forta (marca EEF/IEI);
- Cazangerie. Izolarea termică a fațadei
- Laborator. Echipament de tehnologie;

4.5. Activități economice ce vor realiza în comun părțile, sunt: pregătirea documentației aferente depunerii ofertei pentru participarea la licitație, asigurarea executării corespunzătoare a obligațiilor asumate în temeiul contractelor semnate din numele Asociației, oferirea serviciilor de consultanță în domeniul realizării lucrărilor ținând cont de experiența existentă a fiecărui Asociat, ajutor metodologic, tehnic și administrativ, colaborarea pe parcursul executării lucrărilor și la cerere oferirea suportului necesar unui altuia.

CAPITOLUL V. TRANSFERUL

5.1. Nici un asociat nu poate, fără a avea acordul scris al celuilalt asociat, să vînda, să transfere, să doneze sau să atribuie partea lui sau partea celuilalt asociat. Orice încercare de a transfera partea unui asociat din asociere va fi nula.

5.2. În cazul în care ambii asociați sunt de acord cu transferul către o terță persoană a părții unuia dintre ei, aceasta terță persoană trebuie să-și asume în scris, toate obligațiile pe care autorul său le are în baza prezentului CONTRACT.

CAPITOLUL VI. ADMINISTRAREA

6.1. Asociatul lider "V.I.V.- TEHNOI" S.R.L. preia responsabilitatea și primește instrucțiuni de la Investitor în folosul partenerilor de asociere, primește remunerația pentru lucrările executate de ambii Asociați și le repartizează ulterior între Asociați conform prevederilor prezentului Contract.

6.2. Asociatul lider reprezintă Asociația în raporturi cu terțele persoane, inclusiv autoritatea contractantă.

6.3. Comunicările dintre autoritatea contractantă și membrii asociației cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire, se vor face cu Asociatul lider.

CAPITOLUL VII. MODALITATEA DE ÎMPĂRȚIRE A BENEFICIULUI ȘI PIERDERILOR

7.1. Împărțirea beneficiilor și pierderilor se va efectua trimestrial, proporțional cu cota de participare a fiecărui Asociat.

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA ASOCIERII

8.1. Asociația își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea termenului pentru care s-a încheiat prezentul Contract
- b) hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești cu privire la rezilierea prezentului Contract.

8.2. Asociatul îndreptățit la rezilierea unilaterală a prezentului Contract conform punctului 8.1. al prezentului Contract, expediază celuilalt Asociat o declarație scrisă în acest sens.

8.3. Asociația se desființează de drept, fără îndeplinirea vreunor formalități, în cazul în care în rezultatul licitației oferta comună va fi respinsă definitiv.

CAPITOLUL IX.

9.1. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru execuția obiectivului supus licitației va fi concretizat prin act adițional la contractul de asociere.

CAPITOLUL X. RENUNȚAREA LA DREPTURI

10.1. Faptul că "5AQ INVEST" S.R.L sau "V.I.V.- TEHNOI" S.R.L. nu insistă pentru îndeplinirea exactă a prezentului contract sau nu își exercită oricare din drepturile pe care le are în baza prezentului CONTRACT, nu înseamnă ca respectivă parte renunță la drepturile care îi revin în baza oricăreia din clauzele acestui CONTRACT.

CAPITOLUL XI. FORMA FINALĂ A CONTRACTULUI

11.1. Modificarea acestui CONTRACT poate fi făcută numai în formă scrisă prin acordul ambelor părți.

11.2. Prezentul CONTRACT a fost încheiat astăzi 11.09.2017 în două exemplare.

11.3. Semnăturile asociaților



ASOCIAT LIDER

« V.I.V.- TEHNOI » S.R.L
Adresa Juridică: mun. Chișinău,
or.Cricova str.Chișinăului 97 ap.6
cod fiscal: 1008600009439
IBAN: MD93VI000002224211135MD
c/b: VICBMD2X883
B.C."VICTORIABANK" S.A. fil.nr.11
TVA: 0607554


ASOCIAT SECUND

«5AQ INVEST» S.R.L.
Adresa juridică:MD-2062,
mun. Chișinău, bd.Dacia 40/2
Cod fiscal:1008600004663
IBAN: MD15FT222430300001153498
c/b: FTMDMD2X853
Banca: BC "FinComBank" S.A.
TVA:0505395

Director,
Pascaru Viorel


semnatura


Director,
Jelescu Andrei


semnatura


Am primit personal
Sex. de Proces verbal la terminarea lucrarilor
Toporeț / V. Toporeț / 27.12.18

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR: "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" – 1,0 cotă parte

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 06 decembrie 2018

privind lucrarea: *resistematizarea încăperilor (încăperile nr.: 15; 16 și nr. 17 – nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; încăperile nr.: 12 și 13 – nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" în cadrul contractului nr. 17/02920/01 din 03.10.2017, încheiat între "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" și "V.I.V. TEHNOI" SRL, care a executat lucrările de resistematizare a spațiilor nominalizate în asociere cu "5AQ INVEST" SRL, în baza Contractului de asociere din 11.09.2017, încheiat între "V.I.V. TEHNOI" SRL - în calitate de asociat lider și "5AQ INVEST" SRL - în calitate de asociat secund.*

1. Lucrările au fost executate în baza "Autorizației de Construire" nr. 523-c/17, eliberată de *Primăria mun. Chișinău* la data de 27.11. 2017, cu valabilitate ce nu va depăși 18 luni din momentul începerii lucrărilor de construcție-montaj.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 30 iulie - 06 decembrie a. 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Maevschi Oleg – reprezentant al Administrației Publice Locale, șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău.

Membrii Comisiei:

Ivanov Viorel – administrator din cadrul AMDM;

Soloviov Mihail – șef LCCM din cadrul AMDM;

Ciupac Valentina – medic specialist al LCCM din cadrul AMDM;

Toporeț Victor – responsabil tehnic, reprezentant al AMDM;

3. Au mai participat la recepție:

Pascaru Viorel – administrator "V.I.V. TEHNOI" SRL;

Jelescu Andrei – director tehnic "5AQ INVEST" SRL

Cebotarenco Igor – administrator companie de proiectare "EMS-AC Grup" SRL;

Covbasa Sergiu – proiectant;

Ursu Ion – diriginte de șantier.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) *documentația de proiect și de execuție a lucrărilor de construcție-montaj prezentată Comisiei de recepție, este completă;*

2) *lucrările de construcție-montaj și/sau de resistemizare a încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ, au fost realizate integral;*

3) *lucrările de ree construcție a încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ, au fost executate în corespundere integrală cu prevederile reflectate în Proiectul de execuție, elaborat în conformitate cu cerințele stipulate în "Certificatul de Urbanism pentru*

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările realizate în cadrul resistemizării încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ al "Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale":

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

a) *rezultatele corespunzătoare a calității lucrărilor de construcție-montaj realizate în procesul de resistemizare a încăperilor nominalizate – în particular și corespunderea construcțiilor examinate prevederilor actelor normative în vigoare – în ansamblu;*

b) *calitatea corespunzătoare a materialelor, articolelor, pieselor, utilajelor, echipamentelor, etc. utilizate la lucrările de construcție-montaj, confirmate prin „Certificatele de conformitate a calități”, dispuse spre examinare Comisiei de recepție;*

c) *rezultatele analizei conținutului documentației privind execuția (capitolul "B" a "Cărții Tehnice a Construcției"), prezentate Comisiei de recepție de către Executant;*

d) *avizele pozitive a serviciilor (organelor) de resort, care confirmă/constată corespunderea obiectului examinat prevederilor actelor normative corespunzătoare - la general și/sau funcționalitatea corespunzătoare a obiectului – în particular.*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

a) *lucrările realizate în cadrul resistemizării încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ al "Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale". a recepționa la terminarea acestora;*

b) *încăperile nominalizate, resistemizate în cadrul lucrărilor de reparație se propun spre recepția finală.*


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100214.111.05, adresa poștală: mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1, destinația: laborator de microbiologie, compus din următoarele construcții: clădire administrativă, suprafața la sol: 583,9 m², suprafața totală: 2665,1 m², numărul de nivele: 9, conform "Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil", nr. 0100/18/80017 din 17.08.2018, eliberat de ÎP "Agenția Servicii Publice", anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi, 06 decembrie 2018, în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supravegere Tehnică:

Spse recepție conform prevederilor normelor de aplicare



Nr. 40 din 24.12.2018

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



Maeyschi Oleg

Membri:

Adminstritor din cadrul AMDM

[Signature]
[Signature]

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



[Signature]

Toporeț Victor

10. Lucrarea "resistematizarea încăperilor (încăperile nr.: 15; 16 și nr. 17 – nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; încăperile nr.: 12 și 13 – nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/I", executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" se consideră terminată, fiind transmisă de carte *Executor* și recepționată de *Investitor*.

TRANSMISĂ:
"Executantul":

06 decembrie a. 2018

L. Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
"Investitorul":

06 decembrie a. 2018

L. Ș.

(semnătura)

LISTA-ANEXĂ nr. 1

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție la terminarea lucrărilor de resistemizare a încăperilor (nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

Documentația scrisă și desenată, care a fost perfectată și prezentată "Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor", a fost completă.

Obiecții din partea Comisiei de recepție - nu sunt.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



Maevschi Oleg

Membri:

Admistrutator din cadrul AMDM

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

Ciupac Valentina

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM

"06" decembrie 2018



Toporeț Victor

LISTA-ANEXĂ nr. 2

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție la terminarea lucrărilor de resistemizare a încăperilor (nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

În cadrul reconstrucției încăperilor nominalizate, au fost executate și/sau finalizate toate lucrările de construcție-montaj.

Obiecții din partea "Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor" - nu sunt.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



Maevschi Oleg

Membri:

Administritator din cadrul AMDM

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



Toporeț Victor

06" decembrie 2018

LISTA-ANEXĂ nr. 3

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție la terminarea lucrărilor de resistemizare a încăperilor (nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

"Comisia de recepție la terminarea lucrărilor" a identificat corespunderea integrală prevederilor reflectate în Proiectul de execuție.

Obiecții din partea Comisiei de recepție - nu sunt.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



Maevschi Oleg

Membri:

Administrativ din cadrul AMDM

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



Toporeț Victor

"06" decembrie 2018

3) observații din partea Comisiei de recepție finală nu sunt;

4) "Cartea tehnică a construcției" și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor de reconstrucție a spațiilor nominalizate în luna august a. 2018 până în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni, constatările Comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului constituie: 13 855 391,73 lei;

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală, propune:

De a considera finalizate integral lucrările realizate în cadrul resistemizării încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ al "Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale" și, ca consecință – a recepționa final lucrările nominalizate.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

a) rezultatele corespunzătoare a calității lucrărilor de construcție-montaj realizate în procesul de resistemizare a încăperilor nominalizate – în particular și corespunderea construcțiilor examinate prevederilor actelor normative în vigoare – în ansamblu;

b) calitatea corespunzătoare a materialelor, articolelor, pieselor, utilajelor, echipamentelor, etc. utilizate la lucrările de construcție-montaj, confirmate prin „Certificatele de conformitate a calității”, dispuse spre examinare Comisiei de recepție;

c) rezultatele analizei conținutului documentației privind execuția (capitolul "B" a "Cărții Tehnice a Construcției"), prezentate Comisiei de recepție de către Executant;

d) avizele pozitive a serviciilor (organelor) de resort, care confirmă/constată corespunderea obiectului examinat prevederilor actelor normative corespunzătoare - la general și/sau funcționalitatea corespunzătoare a obiectului – în particular.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

a recepționa lucrările realizate în cadrul resistemizării încăperilor nr.: 15, 16 și nr. 17 de la nivelul parterului; încăperilor de la nivelul IV și încăperilor nr.: 12 și 13 de la nivelul V din clădirea blocului administrativ al "Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale".


6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100214.111.05, adresa poștală: mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenko, nr. 2/1, destinația: laborator de microbiologie, compus din următoarele construcții: clădire administrativă, suprafața la sol: 583,9 m², suprafața totală: 2665,1 m², numărul de nivele: 9, conform "Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil", nr. 0100/18/80017 din 17.08.2018, eliberat de ÎP "Agenția Servicii Publice", anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi, 06 decembrie 2018, în 6 exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recepționează conform prevederilor normative și



OK 40 din 24.12.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



[Signature]

Maevschi Oleg

Membri:

Adminstritator din cadrul AMDM

[Signature]

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Ciupac Valentina


Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



[Signature]

Toporeț Victor

"06" decembrie 2018

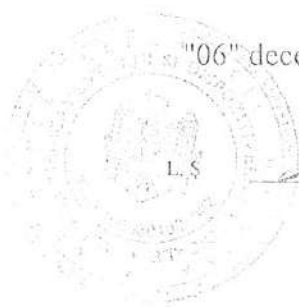

[Signature]

LISTA-ANEXĂ nr. 1

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție finală a lucrărilor de resistemizare a încăperilor (nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenko, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

Lucrările de reconstrucție a încăperilor nominalizate au fost realizate integral și recepționate corespunzător.

Obiecții din partea "Comisiei de recepție finală" - nu sunt.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



[Signature]

Maevschi Oleg

Membri:

Administritator din cadrul AMDM

[Signature]

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



[Signature]

Toporeț Victor

"06" decembrie 2018

LISTA-ANEXĂ nr. 2

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție finală a lucrărilor de resistemizare a încăperilor (nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

Obiecții din partea "Comisiei de recepție finală", privind calitatea lucrărilor realizate în cadrul lucrărilor de reconstrucție, corectitudinea perfectării "Cărții tehnice" etc. - nu sunt.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



[Signature]

Maevschi Oleg

Membri:

Administrator din cadrul AMDM

[Signature]

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

[Signature]

Clupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



[Signature]

Toporeț Victor

06" decembrie 2018

LISTA-ANEXĂ nr. 3

la procesul-verbal nr. 1 din 06 decembrie 2018 de recepție finală a lucrărilor de resistematizare a încăperilor (nr.: 15; 16 și nr. 17 - nivelul parter; încăperile de la nivelul IV; nr.: 12 și 13 - nivelul V) din imobilul cu nr. cadastral: 0100214.111.05, localizat în mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenco, nr. 2/1 executată la obiectul "Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale"

"Comisia de recepție finală" a constatat comportare corespunzătoare a construcțiilor supuse intervențiilor în cadrul lucrărilor de reconstrucție după terminarea acestora, inclusiv, - nu au fost identificate neconformități.

Obiecții din partea "Comisiei de recepție finală" - nu sunt.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Șef al Direcției autorizare și disciplină în construcții din cadrul Primăriei mun. Chișinău



Maevschi Oleg

Membri:

Administrativ din cadrul AMDM

Ivanov Viorel

Șef LCCM din cadrul AMDM

Soloviov Mihail

Medic specialist al LCCM din cadrul AMDM

Ciupac Valentina

Responsabil tehnic, reprezentant al AMDM



Toporeț Victor

"06" decembrie 2018

Scrisoare de recomandare

Către: ”5AQ Invest” S.R.L.
Director general Igor CEBOTARENCO

„V.I.V.-Tehnoi” SRL, cu sediul în *mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chişinăului, nr. 97, of. 6*, a realizat lucrări de reconstrucție a laboratorului de analize microbiologice conform proiectului realizat în conformitate cu cerințele prevăzute de *WHO Good Practices for Pharmaceutical Microbiology*, a executat în asociere cu compania de construcții ”5AQ Invest” S.R.L., în calitate de asociat secund.

”5AQ Invest” S.R.L. a executat lucrări de construcție-montaj valoarea totală de 13 855 391,73 lei, după cum urmează:

- Laborator – instalarea echipamentului electric de forță/iluminatul electric interior (marca EEF/IEI.SU), instalarea echipamentului de semnalizare a incendiilor (marca SI), instalarea echipamentului a sistemul de control al accesului și sistemul de înștiințare, executarea lucrărilor de izolare termică a fațadelor, executarea lucrărilor tehnice-sanitare (apă și canalizare, marca RAC, încălzire și ventilare, marca IV), precum și executarea lucrărilor generale de construcție, instalarea automatizatoare (marca AIVC), precum și instalarea echipamentelor tehnologice de monitorizare a temperaturii, umedității și diferența de presiuni.

- Cazangerie – executarea lucrărilor tehnico-sanitare (apă și canalizare, marca RAC), instalarea sistemeolr de automatizare (marca AIT/AAGI.1 și AIT/AAGI.2), ale echipamentelor termomecanice (marca SM), executarea lucrărilor generale de construcție, alimentarea cu gaze, instalații interioare (marca AGI), instalarea semnalizatoarelor de incendiu (marca SI), efectuarea lucrărilor de iluminare prin instalarea echipamentului electric de forță (marca EEF/IEI), executarea lucrărilor de izolare termică a fațadei.

Lucrările s-au realizat în termen, de înaltă calitate, la prețuri ferme, compania ”5AQ Invest” S.R.L. dovedind înaltă competență și profesionalism.

Pe parcursul întregii activități de construcție am avut deosebită plăcere să constatăm disponibilitatea totală și calitatea ireproșabilă a lucrărilor executate de către ”5AQ Invest” S.R.L.

Fiind foarte mulțumiți de lucrările executate, recomandăm cu toată încrederea colaborarea și altor companii cu ”5AQ Invest” S.R.L.

administrator
„V.I.V.-Tehnoi” SRL
Viorel PASCARU

