

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia trotuarului in s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul**
2. Numărul și data contractului **Nr. 40 din 01.12.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul**
4. Adresa beneficiarului **s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

  - a) inițială(la data semnării contractului ) **198 683,78 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală(la data finalizării contractului) **198 683,78 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni) \_\_\_\_\_
  - a) contractată 30 zile
  - b) efectiv realizată 15 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 18.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **09.02.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**

INVESTITOR  
Primăria Baurci-Moldoveni

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 18.12.2023

privind lucrarea „Reparația trotuarului în s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul,, în cadrul contractului nr.40 din 1 decembrie 2023 încheiat între primăria Baurci-Moldoveni și SRL IMO POST

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. -, cu valabilitate până la -.  
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.12.2023-18.12.2023, fiind formată din:

1. *Enachi Elena, președinte;*
2. *Donici Mihail D., membru, consilier local;*
3. *Donici Mihail Al., membru, consilier local;*
4. *Cavruc Aliona, secretarul comisiei, contabil-șef;*
5. *Crețu Dumitru, șef interimar Direcția Construcții a Consiliului Raional Cahul.*

(numele, prenumele, )

3. Au mai participat la recepție:

***Cubreacov Ion, antreprenor SRL IMO POST***

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;


3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrările de construcție s-au efectuat conform contractului de antrepriză, a caietului de sarcini, a devizelor de cheltuieli și a normele în vigoare.**



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De recepționat lucrarea „Reparația trotuarului în s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul,,**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală **s.Baurci-Moldoveni, r. Cahul**, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi **18.12.2023** la primăria Baurci-Moldoveni în 4 (**patru**) exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

**Comisia de recepție:**

Președinte: **Enachi Elena**, primar/investitor

Membri: **Donici Mihail A.**, consilier local

**Donici Mihail D.**, consilier local

**Cavruc Aliona**, contabil-șef

**Crețu Dumitru**, șef interimar

**Direcția Construcții a Consiliului Raional Cahul**

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

**Specialiști:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Lucrarea **Reparația trotuarului în s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul,,** este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"18"decembrie 2023



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"18"decembrie 2023



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Conectarea rezervoarelor de apa la sistemul de canalizare din s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul**
2. Numărul și data contractului **Nr. 12 din 12.02.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul**
4. Adresa beneficiarului **s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - a) antreprenor asociat
  - b) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

  - a) inițială(la data semnării contractului ) **237 748,07 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală(la data finalizării contractului) **237 748,07 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată 30 zile
  - b) efectiv realizată 15 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 20.02.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **02.02.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 20.02.2024

privind lucrarea „**Conectarea rezervoarelor de apă la sistemul de canalizare din s. Baurci Moldoveni, r. Cahul**”, în cadrul contractului nr.12 din 12 februarie 2024 încheiat între primăria Baurci-Moldoveni și SRL IMO POST

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. -, cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **10.02.2023-20.02.2024**, fiind formată din:

- 1. Enachi Elena, președinte;**
- 2. Donici Mihail D., membru, consilier local;**
- 3. Donici Mihail Al., membru, consilier local;**
- 4. Cavruc Aliona, secretarul comisiei, contabil-șef;**
- 5. Cojocar Oxana, secretar al consiliului local.**

(numele, prenumele, )

3. Au mai participat la recepție:

**Cubreacov Ion, antreprenor SRL IMO POST**

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrările de construcție s-au efectuat conform contractului de antrepriză, a caietului de sarcini, a devizelor de cheltuieli și a normele în vigoare.**



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat lucrarea „, ,Conectarea rezervoarelor de apă la sistemul de canalizare din s. Baurci Moldoveni, r. Cahul”,,

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, adresa poștală **s.Baurci-Moldoveni, r. Cahul**, destinația \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții , suprafața la sol \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi **20.02.2024** la primăria Baurci-Moldoveni în **3 (trei)** exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

**Comisia de recepție:**

Președinte: **Enachi Elena**, primar/investitor

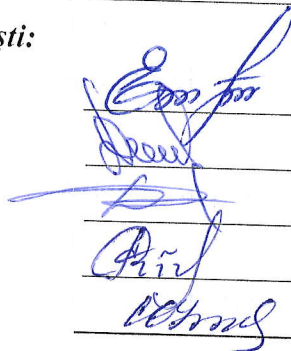
Membri: **Donici Mihail A.**, consilier local

**Donici Mihail D.**, consilier local

**Cavruc Aliona**, contabil-șef

**Cojocaru Oxana**, secretar al consiliului local

**Specialiști:**



(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)


10. Lucrarea , ,Conectarea rezervoarelor de apă la sistemul de canalizare din s. Baurci Moldoveni, r. Cahul,, este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"20"februarie 2024



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"20"februarie 2024



(semnătura)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reconstrucție și modernizare a sistemului de încălzire a blocului de studii, Instituția Publică Gimnaziul „Ion Creangă”, r. Cantemir, s. Cania, str. 31 August”**
2. Numărul și data contractului **Nr. 22 din 15.10.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul „Ion Creangă”, s. Cania, r. Cantemir**
4. Adresa beneficiarului **s. Cania, r. Cantemir**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

  - a) inițială(la data semnării contractului ) **539 760,00 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală(la data finalizării contractului) **539 760,00 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni) \_\_\_\_\_
  - a) contractată 30 zile
  - b) efectiv realizată 30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 03 din 14.11.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **09.02.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**

INVESTITOR  
IPG "Ion Creangă", s. Cania

Anexa nr.2  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ  
Nr. 03 din 14.11.2024

privind lucrarea „**Lucrări de reconstrucție și modernizare a sistemului de încălzire a blocului de studii, Instituția Publică Gimnaziul „Ion Creangă”, r. Cantemir, s. Cania, str. 31 August**”

1. Lucrările au fost executate în baza: contract nr. Nr. 22 din 15.10.2024
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii noiembrie fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Nuca Lilia

L. Nuca

**Membrii comisiei:**

1) Busuioc Aliona

Busuioc

2) Bogdanov A.

Bogdanov

3) Coroi Constantin

Coroi

4) Perju Lidia

Perju

3. Au mai participat la recepție:

Ion Cubreacov

(nume si prenume)

----- Director SRL „IMO POST”

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările s-au desfășurat conform contractului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune :

---

6. Comisia de recepție, motivează propunerea făcută prin :

---

7. Comisia de recepție recomandă următoarele :

---



7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție : Obiectul, Instituția Publică Gimnaziul „Ion Creangă” r. Cantemir, s. Cania, str. 31 August: Lucrări de reconstrucție și modernizare a sistemului de încălzire a blocului de studii.

8. Prezentul proces-verbal conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14 noiembrie 2024 la Instituția Publică Gimnaziul „Ion Creangă” r. Cantemir, s. Cania, str. 31 August în 3 exemplare

**Comisia de recepție:**

Nuca Lilia

\_\_\_\_\_

**Membri :**

Busuioc Aliona

Busuioc

Bogdanov A

[Signature]

Coroi Constantin

[Signature]

9. Lucrarea: se consideră finalizată.


**SRL „IMO POST”**  
**TRANSMISĂ:**  
**EXECUTANTUL:**

” ” 2024

  
(semnătura)

**IPG "Ion Creangă", s. Cania**  
**PRIMITĂ:**  
**INVESTITORUL:**

” ” 2024

  
(semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA  
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CANTEMIR  
INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL "ION CREANGĂ"

MD-7314, r- nul Cantemir, s. Cania, str. 31 August, Tel./fax 273 41-3-61, E-mail: [gimnaziul.cania@gmail.com](mailto:gimnaziul.cania@gmail.com)

Nr. 620 din 22.11.2024

**Scrisoare de recomandare**

Prin prezenta, se confirmă că compania de construcții SRL „IMO POST” a efectuat lucrările de reconstrucție și modernizare a sistemului de încălzire a blocului de studii IP Gimnaziul “Ion Creangă”, s. Cania, Cantemir, în baza Contractului de Antrepriză Nr. 22 din 15.10.2024, în termenii stabiliți în contractul încheiat și în conformitate cu prevederile proiectului tehnic.

Am rămas satisfăcuți de rezultatul obținut în urma lucrărilor, datorită profesionalismului membrilor de lucru care s-au remarcat prin modul și eficiența lucrărilor efectuate.

Din aceste motive, noi recomandăm compania SRL „IMO POST” ca fiind o echipă de lucru competentă, care prin respectarea tuturor exigențelor și reglementărilor în vigoare, realizează lucrări calitative, estetice în termenii stabiliți contractual.

Cu respect,  
Director



*L. Neaga*

Lilia NUCA

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparații curente la acoperișurile centralelor termice ale IMSP Spitalul Raional Cahul**
2. Numărul și data contractului **Nr. 278 din 10.10.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Raional Cahul**
4. Adresa beneficiarului **mun.Cahul str. Ștefan cel Mare, 23**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

  - a) inițială(la data semnării contractului ) **179 983,50 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală(la data finalizării contractului) **179 983,50 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 30 zile
  - b) efectiv realizată 30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 26.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **09.02.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**



**PROCES - VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.**

nr. \_\_\_ din 26.12.2024

Privind lucrarea constructia executata la obiectul „Lucrările de reparații la acoperișurile centralei termice a IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Alexei Mateevici f/n”, în baza contractului nr. 278 din 10.10.2024 încheiate între IMSP Spitalul Raional Cahul, director – V. Rotaru investitor, și SRL „IMO POST” administrator I. Cubreacov, executant, pentru lucrările de construcție a obiectului: „Lucrările de reparații la acoperișurile centralei termice a IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Alexei Mateevici f/n”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_, valabilă până la \_\_\_\_\_, eliberată de către \_\_\_\_\_
2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în data de 26.12.2024, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

**Anna Rotari** – vicedirector IMSP Spitalul Raional Cahul;

**Membrii comisiei:**

**Igor Chirov** – specialist principal profilul chirurgical,  
IMSP Spitalul Raional Cahul;

**Alexandru Nebunu** - șef Secție gospodărie, IMSP Spitalul Raional Cahul;

**Dumitru Crețu** - tehnician constructor, IMSP Spitalul Raional Cahul;

**Albert Gorbatenco** - responsabil principal (Stație generator oxigen),  
IMSP Spitalul Raional Cahul;

Au mai participat la recepție: \_\_\_\_\_

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr.1:
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.





**PROCES - VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.**

nr. \_\_\_ din 26.12.2024

Privind lucrarea constructia executata la obiectul „Lucrările de reparații la acoperișul laboratorului SIDA a IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, nr. 16”, în baza contractului nr. 278 din 10.10.2024 încheiate între IMSP Spitalul Raional Cahul, director – V. Rotaru investitor, și SRL „IMO POST” administrator I. Cubreacov, executant, pentru lucrările de construcție a obiectului: „Lucrările de reparații la acoperișul laboratorului SIDA a IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, nr. 16”

1. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_, valabilă până la \_\_\_\_\_, eliberată de către \_\_\_\_\_
2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în data de 26.12.2024, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

**Anna Rotari** – vicedirector IMSP Spitalul Raional Cahul;

**Membrii comisiei:**

**Igor Chirov** – specialist principal profilul chirurgical,  
IMSP Spitalul Raional Cahul;

**Alexandru Nebunu** - șef Secție gospodărie, IMSP Spitalul Raional Cahul;

**Dumitru Crețu** - tehnician constructor, IMSP Spitalul Raional Cahul;

**Albert Gorbatenco** - responsabil principal (Stație generator oxigen),  
IMSP Spitalul Raional Cahul;


Au mai participat la recepție: \_\_\_\_\_


**3. Constatările comisiei de recepție:**


- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr.1:
- 2) lucrările cuprinse in lista-anexa nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.


4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor;
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului;
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor;
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file a fost semnat astăzi \_\_\_\_\_ în 3 exemplare;


Comisia de recepție:

Președintele: Anna Rotari \_\_\_\_\_ 

Membrii: Igor Chirov \_\_\_\_\_ 

Alexandru Nebunu \_\_\_\_\_ 

Dumitru Crețu \_\_\_\_\_ 

Albert Gorbatenco \_\_\_\_\_ 

8. Lucrarea: „Lucrările de reparații la acoperișul laboratorului SIDA a IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Ștefan cel Mare, nr. 16” se aprobă recepția la terminarea lucrărilor.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

„ \_\_\_\_\_ 2024  
L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL

\_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 2024  
(semnătura)



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia terenului de sport la Liceul Teoretic „M. Sadoveanu” din s. Giurgiulești, r-l Cahul**
2. Numărul și data contractului **Nr. 9 din 07.10.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”**
4. Adresa beneficiarului **s. Giurgiulești, r-l Cahul**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  
încheiat contractul
  - a) inițială(la data semnării contractului ) **317 879,99 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală(la data finalizării contractului) **317 879,99 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 60 zile
  - b) efectiv realizată 60 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 2 din 06.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **09.02.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 06.12.2024

Privind lucrările de reparație executate la obiectul : lucrări de reparații - terenul de sport a liceului teoretic "Mihai Sadoveanu" s. Giurgiulești, r-nul Cahul în cadrul contractului nr. 09 din 07.10.2024 încheiat între S.R.L IMO POST și IP Liceul Teoretic "Mihai Sadoveanu" s. Giurgiulești, r-nul Cahul.

1. Lucrări de reparație - terenul de sport a IP Liceul Teoretic „Mihai Sadoveanu”  
s. Giurgiulești, r. Cahul. au fost executate în baza devizului local în sumă de 317879,99 lei MD..

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii octombrie - noiembrie 2024, fiind formată conform ordinului nr. 168 din 05.12.2024 în următoarea componență:

**Președintele Comisiei:**

Machidon Silvia – Director

**Membrii Comisiei:**

Crețu Dumitru – Șef interimar al Direcției construcții și drumuri, specialist principal

Zeabchin Alexandru – specialist Direcția construcții și drumuri

Cangea Vasile – intendent IPLT „M. Sadoveanu” s. Giurgiulești, r. Cahul

Tornea Nicolae – profesor de educație fizică, IPLT „M. Sadoveanu” s. Giurgiulești, r. Cahul

Nastas Nina – Director adjunct instruire IPLT „M. Sadoveanu” s. Giurgiulești, r. Cahul

Bratco Tatiana – învățătoare, IPLT „M. Sadoveanu” s. Giurgiulești, r. Cahul

3. Au mai participat la recepție :

Cubreacov Ion

(nume, prenume)

administrator al S.R. L IMO POST

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție :

1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de reparație este completă.

2) lucrările au fost executate conform prevederilor devizului local.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul :**

**Lucrări de reparații - terenul de sport al liceului teoretic "Mihai Sadoveanu" s.**

**Giurgiulești, r-nul Cahul.**

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

**Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea „ lucrări de reparații - terenul de sport a liceului teoretic "Mihai Sadoveanu" s. Giurgiulești, r-nul Cahul.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele : **de supus recepției la terminarea „lucrări de reparații - terenul de sport a liceului teoretic "Mihai Sadoveanu" s. Giurgiulești, r-nul Cahul.**

7. „Lucrări de reparații - terenul de sport a Liceului Teoretic „Mihai Sadoveanu” s. Giurgiulești, r-nul Cahul se consideră terminată.

8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 06.12.2024 în 3 exemplare cu anexa Proces –verbal de recepție a lucrărilor executate în sumă de 317879,99 lei.

**Comisia de recepție la terminarea lucrărilor :**

**Președintele Comisiei:**

Silvia Machidon

  
(semnatura)

Director

**Membrii Comisiei:**

Crețu Dumitru

  
(semnatura)


Șef interimar al Direcției construcții și drumuri CR Cahul,  
specialist principal

Zeabchin Alexandru

  
(semnatura)


specialist Direcția construcții și drumuri

Nastas Nina

  
(semnatura)


Director adjunct instruire IPLT „M. Sadoveanu”

Tornea Nicolae

  
(semnatura)


profesor de educație fizică, IPLT „M. Sadoveanu”

Cangea Vasile

  
(semnatura)

intendent IPLT „M. Sadoveanu”


Bratco Tatiana

  
(semnatura)

învățătoare, IPLT „M. Sadoveanu”

**Participanți la recepție la terminarea lucrărilor :**

Cubreacov Ion

  
(semnatura)

administrator al S.R.L. IMO POST

TRANSMIS :

PRIMIT :

EXECUTANT:

INVESTITOR/ Proprietar :

„06 decembrie 2024”



„06 decembrie 2024”

