

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**Lista obiectelor executate 2012-2017**

Nº	Datele proiectului	Denumirea obiectelor
1.	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. A.Iulia, 85 mun. Chișinău</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
2	<i>Lucrări(Complex de lucrări) de reparații interioare la Hotelul "FLOWERS" mun.Chișinău str.Anestiade,7</i>	SC"Domax-con Prim"SRL Hotelul "FLOWERS" dir.Donciu Stepan
3	<i>Lucrări de reparații interioare la Dormitorul N1 a Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești</i>	Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești director Țenu Tudor
4	<i>Lucrări de reparații a acoperișului stației de pompare a apei IMSP Spitalul rational Cimișlia</i>	IMSP Spitalul Cimișlia str,Alexandru cel Bun,135 dir.Florea MarianaTel.0241/2-21-93
5	<i>Lucrări de reparații a acoperișului la stația de alimentare N73 PETROM mun.Chișinău str.Petricani</i>	SC"LUMINTODE" SRL Dir. Mogîldea Galina
6	<i>Lucrări de reparație a fașadei Liceului theoretic P.Stefănuță r-ul Ialoveni</i>	Liceul theoretic P.Stefănuță
7.	<i>Lucrari de finisare a Garajelor din mun. Chișinău str. Pietrarilor 10 SA "Ago-Dacia"</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27
8	<i>Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/4 SA Ago-Dacia</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
9	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. Pietrarilor 10/2 mun. Chișinău</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
10	<i>Lucrari de replanificare a școlii nefuncționale în grădiniță de copii din s.Micleușeni r-ul Strășeni</i>	Consiliul Raional Strășeni
11	<i>Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1</i>	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110
12	<i>Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/3 SA Ago-Dacia</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
13	<i>Lucrări de finisare a Parcării subterane din str.Pietrarilor,10/4 SA Ago-Dacia</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27 dir.Rușesco Mihail
14	<i>Reparația acoperișului căminului și cazangeriei LT Vătămanu or.Strășeni</i>	Aparatul președintelui rational Strășeni
15	<i>Lucrări de finisare interioare si exterioare a Casei de Locuit Blocul N3 din mun. Chișinău str. Pietrarilor</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27
16	<i>Lucrari de reparație a trotuarelor" din com.Micauți r-ul Straseni</i>	Primăria Micăuți Strășeni
17	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit N4 din str. Pietrarilor 10 mun. Chișinău</i>	SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27
18	<i>Lucrări de reparație la sala festivă" a gimnaziului din com.Micăuți r-ul Strășeni(pardosele,tavane,peretii)</i>	Primăria Micăuți Strășeni
19	<i>Lucrari de reparație interioară și exterioare a grădiniții de copii din s.Țigănești r-ul Strășeni (încălzire,iluminat,canalizare,apă,finisări,ventilare)</i>	Primăria s.Țigănești r-ul Strășeni

20	Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gimnaziul din s.Micauti r-ul Strasenii	Aparatul preşedintelui raional Străşeni
21	Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Ha r-ul Causeni(fasada uşi ,ferestre,termoizolare,finisari toclu)	Gimnaziului "Ioan Voda" Hagimus
22	Lucrari de reparaţie a trotuarelor din faţa Grădiniţei com.Micauti r-ul Strasenii)(pavaj,finisarea fatadei,finisar interioare)	Primăria Micăuţi Străşeni
23	"Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la postul de transformatoare" la Tabara de odihna pentru copii "Codru"	Direcţia Învăţămînt Străşeni
24	"CONSTRUCŢIA CANTINEI SOCIALE" din s.Măgdăceşti r-ul Criuleni(lucrari interioare si exterioare) (încălzire,iluminat,apeduct şi canalizare,finisări,utilaje,pavaje,)	Primăria Măgdăceşti r-ul Criuleni
25	Lucrări de construcţie a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri" la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Străşeni, etapa nr. 1	Direcţia Învăţămînt Străşeni
26	„Lucrari de reparatie curenta a blocului "B " la Centrul de odihna si agrement pentru tineret si copii "Divertis" din or.Strasenii	Direcţia Învăţămînt Străşeni din cadrul Consiliului raional Străşeni
27	Construcţia si montarea unei scene pentru festivitati în satul Micăuţi r-ul Străşeni	Primăria Micăuţi Străşeni
28	Lucrări de reparaţie la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chişinău	Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău- IMSP SCM de Copii nr.1
29	“Lucrări de reparaţie a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chişinău	INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI
30	Lucrări de reparaţie la sala sportivă si vestiar la Liceul Teoretic "M.Eminescu" din or. Străşeni	Consiliul raional Străşeni Preşedinte Popa Mihail
31	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gimnaziului din st. Decebal 3, s.Cojusna, r-nul Strasenii"	Direcţia Învăţămînt Străşeni
32	„Lucrări de pavare,reparaţia partiala a scărilor interioare si exterioare la Grădiniţa din s.Măgdaceşt”	Primăria Măgdăceşti r-ul Criuleni
33	Lucrări de reparaţie curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviaţiei Civile de pe bul. Dacia,70/1-2017	ÎS Centrul de Medicină a Aviaţiei Civile Dir.Larisa Şicanova tel.022/525110
34	“Construcţia depozitului frigorific din mun.Chişinău com.Grătieşti ”	G.T „Cojocarul Gheorghe Nicolae”
35	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si blocurilor sanitare la LT "Aleco Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii"	Consiliul raional Străşeni
36	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT"Zubresti" din satul Zubresti r-ul Strasenii	Consiliul raional Străşeni
37	Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3	IP USMF "Nicolae Testemitanu"
38	Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau	IMSP SCM SfintaTreime
39	Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hînceşti	Direcţia Scolii tip Internat Carpineni
40	Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
41	Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Strasenii	Primaria s.Tiganesti r-ul Strasenii
42	"Lucrari de amenajare a teritoriului "la gradinita din satul Micauti"	Primaria comunei Micauti r-ul Strasenii

Nume: Ion SECRIERU /

Funcţia în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei şi sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chişinău**

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.17/02822/01 din 16.10.2017	"Schimbarea acoperisului blocude studii la LT "Alec Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii"	antreprenor	1104899,02	2	28.12.2017
2	Nr.17/02822/03 din 16.10.2017	"Lucrari de reparatie capitala a blocurilor sanitare la LT "Alec Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii"	antreprenor	345469,15	2	28.12.2017
3	Nr.28/11/17 din 28.11.2017	Lucrări de amenajare a teritoriului la grădinița din s.Micăuți	antreprenor	199827,85	1	25.12.2017
4	Nr.17/03079/01 din 13.11.2017	"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT "Zubresti" din satul Zubresti r-ul Strasenii	antreprenor	945372,51	2	27.12.2017
5	Nr.70 din 06.06.2017	Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3	antreprenor	2 591 866,10	4	Nr.61T din 21.10.2017
6	Nr.171 AAP 17/00354/004 din 18.04.2017	Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime" str.Alec Russo,11 mun.Chisinau	antreprenor	1773464,20 263050,57	3,5	30RT din 10.10.2017
7	Nr.60 din 10.05.2017	Lucrări de reparație la acoperișul transformatorului la Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis din or.Strășeni	antreprenor	76422,58	1	20.06.2017
8	Nr.1/32 din 21.06.2017	Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hîncești	antreprenor	1158560,77 237926,94	3.5	Nr.1 din 20.10.17
9	Nr.45 din 09.11.2017	Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau	antreprenor	237169,26	5	Nr.21 din 17.10.2017
10	Nr.17/01786/001 din 25.07.2016	Lucrări de reparație a sălii sportive la LT "M.Eminescu" din or.Strășeni		1 592 533,49	3,5	30RT din 10.10.2017
11	Nr.18 din 18.02.2017	Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Strasenii	antreprenor	231388,73	1	24.03.2017

12	Nr.38/3 30.01.2018	USMF "N.Testemițeanu" "Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișului întrărilor Căm. 16, din str.M.Sadoveanu 26/3"	antreprenor	74 112,86	1	Nr.80-T din 14.09.2018
13	Nr.11 01.02.2018	G.Ț. "Cojocar George Nicolae" "Lucrări de construcție a depozitului și a ANEXEI la Depozitul frigorific din mun.Chișinău cîm.Grătiești"	antreprenor	681 076,63	6	01.08.2018
14	Nr.59/44 11.07.2018	Primăria Peresecina "Reparația capitală a acoperișului Școlii primare a LT "Alexandru Donici"	antreprenor	1 355 565,40	2	-----
15	Nr.93/54 25.09.2018	Inspectoratul General de Poliție "Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr.1" al Inspectoratului de poliție Basarabeasca"	antreprenor	1 551 179,68	3 solicitat	-----
16	Nr.94/55 25.09.2018	Inspectoratul General de Poliție "Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr.1" al Inspectoratului de poliție Cîmășlia"	antreprenor	529 174,56	70 zile solicitat	-----
17	Nr.95/56 25.09.2018	Inspectoratul General de Poliție "Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr.1" al Inspectoratului de poliție Dondușeni"	antreprenor	2 489 538,57	120 zile solicitat	-----
18	Nr.96/57 25.09.2018	Inspectoratul General de Poliție "Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr.1" al Inspectoratului de poliție Șoldănești"	antreprenor	2 129 656,17	120 zile solicitat	-----
19	Nr.32/59 01.10.2018	Aparatul Președintelui raionului Strășeni "Reparația capitală la etajul III și blocului sanitar la LT "Alecu Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni"	antreprenor	2 448 822,94	90 zile solicitat	-----
20	Nr.22/63 02.10.2018	Aparatul Președintelui raionului Strășeni "Schimbarea geamurilor la gimnaziul din s.Micăuți, r-nul Strășeni"	antreprenor	387 618,77	30 zile	-----

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**

OFERTANT



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Lista obiectelor executate 2012-2017

Nº	Datele proiectului	Denumirea obiectelor
1.	„Lucrări de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Cminului nr.16 din str.M.Sadoveanu 26/3, mun.Chișinău” Acoperiș, Amenajare	IP USMF ”Nicolae Testimițeanu
2.	„Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la Tabăra de odihnă pentru copii ”Codru” din s.Căpriana r-nul Strășeni, etapa nr.1”	Aparatul Președintelui r-nului Strășeni
3.	„Construcția Cantinei Sociale”	Primăria s.Măgdăcești r-nul Criuleni

Nume: **Ion SECRIERU** /

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrările de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Căminului nr.16 din str.M.Sadoveanu 26/3"**

2. Numărul și data contractului Nr.70 din 06 iunie 2017 și contractul nr.38 din 30.01.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP USMF "Nicolaie Testemițanu"**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfnt, 165**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr.70 (la data semnării contractului)	2517753,24	
aa) inițială contractul nr.38	74112,86	
b) finală (la data finalizării contractului)	2 591 866,10	152462,71

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **90 zile-lucrătoare**

b) efectiv realizată **78 zile-lucrătoare**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.61T din 21.10.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor proiect, graficul executării lucrărilor în terminite stabilite.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Termoizolare fatada, timplarii PVC, Lucrari tehnico sanitare, sistemul de încălzire Acoperis, Amenajare

Data completării

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU** / _____

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 70/59 privind achiziția prin Licitatie Publică

“06” ianuarie 2017

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/01239 din data 16.05.2017, între Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 165, telefon: 022 20-52-65, fax: 022 20-52-65, e-mail: achizitii@usmf.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, reprezentată prin Ion Ababii, Rector, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “Proiect Gabion”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mihai Sadoveanu 12/1, of. 106, telefon: 022 60-88-60, fax: 022 60-60-77, e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1010600016641 din “07” mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 042606 din “03” iunie 2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin Ion Secieru, director, în calitate, de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. Mihai Sadoveanu 26/3, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 68 zile lucrătoare de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Căminului nr. 16 din str. Mihai Sadoveanu 26/3, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 517 753,24 (două milioane cinci sute șaptesprezece mii șapte sute cincizeci și trei,24) lei, inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate: 10% prealabil, 90% în baza proceselor-verbale și a facturilor fiscale în termen de 20 zile.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" ianuarie 2017.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

Tel./Fax: 022 20-52-65; 20-52-67

Denumirea BC "MoldovaAgroindbank" SA,

Băncii: fil. Chișinău Centru

Adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 182

Băncii:

Cod AGRNMD2X723

Bancar:

Cont de MD19AG000000022512015544

decontare:

Cod fiscal: 1007600000794

"ANTREPRENOR":

SRL "Proiect Gabion"

Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 12/1, of. 106

Tel./Fax: 022 60-60-77; 60-88-60

Denumirea BC "Energbank" SA

Băncii:

Adresa Băncii: str. Tighina 23/3

Cod Bancar: ENEGMD22

Cont de MD90EN000000222435308845

decontare:

Cod fiscal: 1010600016641

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Ion Ababii


L.Ș.



"ANTREPRENOR":

SRL "Proiect Gabion"

Ion Secieru





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT 38 / 3

de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică

" 30 " ianuarie 2018

mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie publică de valoare mică, în corespundere cu planul de achiziţii aprobat pentru an.2018

Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 165, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, fax 20-52-65, reprezentată prin **Ion Ababii**, Rector, care acţionează în baza Cartei Universitare, în calitate de Beneficiar pe de o parte, şi

„Proiect Gabion” S.R.L., reprezentată prin Director, **Ion Secrieru**, care activează în baza statutului, denumit în continuare Antreprenor.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajare a teritoriului adiacent şi reparaşia acoperişurilor intrărilor Căm. 16 din str. M.Sadoveanu 16/3, Cod CPV: _____, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 74112,86 (șaptezeci și patru mii una sută doisprezece,86 lei MD). Achitarea lucrărilor se va efectua 100% în baza procesului verbal de recepție și a facturii fiscale în termen de 20 zile.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

“ BENEFICIAR ”:

IP USMF “Nicolae Testemițanu”

c/f 1007600000794

c/d MD19AG000000022512015544

BC “MoldovaAgroindbank” SA

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

tel: 20-52-65

Ion Ababii

L.Ș.



“ ANTREPRENOR ”:

SC “Proiect Gabion” SRL

c/f1010600016641

cod bancar: ENEGMD22

BC Energ Bank” SA

c/d:MD90EN000000222435308845

Ion Secieru



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 61-T din 26.10.2017

privind „**Lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**” executate la Căminul nr. 16 în cadrul contractului nr. 70 din 06.06.2017 încheiat între IP USMF „Nicolae Testemițanu” și „Proiect Gabion” SRL pentru „**Lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24-25. 10. 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Marcel Abraș, prorector pentru educație și probleme sociale,

Membrii comisiei:

Valentina Șpac,	șef Departament Administrarea Patrimoniului,
Svetlana Lupașco,	șef Departament Economie, Buget și Finanțe,
Rodica Harabagiu,	șef-adjunct Departament Evidență și Gestiune Contabilă,
Ion Șișianu,	șef Secție construcții capitale și reparații curente,
Victor Șchiopu,	director Campusul studentesc,
Valentin Babin,	șef Secție de asistență tehnică,
Victor Covalciuc,	tehnician Secția de asistență tehnică,
Sergiu Panțîri,	intendent căminul nr. 16.

2. Au mai participat la recepție:
Ion Secrieru – director „Proiect Găbion” SRL.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă este prezentată complet;
- 2) toate lucrările de reparație au fost executate;
- 3) obiecțiile comisiei de recepție – nu sunt.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea „**Lucrărilor de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**” să fie admisă.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea tuturor lucrărilor de reparație.

Lipsa obiecțiilor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările au fost executate la imobilului cu numărul cadastral – 0100312237.01, adresa poștală – str. M. Sadoveanu, 26/3, destinația – locativă.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 26.10. 2017 la sediul beneficiarului în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Marcel Abraș

Membrii comisiei:

Valentina Șpac

Svetlana Lupașco

Rodica Harabagiu

Ion Șişianu

Victor Șchiopu

Valentin Babin

Victor Covalciuc

Sergiu Panțîri

Specialiști:

Ion Secieru

Ion Secieru

Marcel Abraș
Valentina Șpac
Svetlana Lupașco
Rodica Harabagiu
Ion Șişianu
Victor Șchiopu
Valentin Babin
Victor Covalciuc
Sergiu Panțîri

8. „Lucrările de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3” sînt:

TRANSMISE:

„Proiect Gabion” SRL



2017

(semnătura)

PRIMITE:

**IP Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”**



2017

(semnătura)



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiu mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE"**
2. Numărul și data contractului **Nr.14 din 8 aprilie 2014** (Construcția cantinei sociale) și contractul **nr.46/21 din 11 mai 2015** (Construcția Anexei Cantinei sociale) și Acordul adițional nr.47 din 11 noiembrie 2015 la contractul nr 46/21
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Măgdăcești r-ul Crîuleni**
4. Adresa beneficiarului **s.Măgdăcești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr.14 (la data semnării contractului)	1 420 900,45	125 743,40
aa) Anexa contractul nr.46/21	707 030,59	62 569,08
aaa) Acord adițional nr.47	212 012,75	18 762,19
b) finală (la data finalizării contractului)	2 339 943,79	207 074,67

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 11 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 22.01.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise - *Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în termenele stabilite*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

(*Reparații interioare, exterioare, amenajare teritoriului. Lucrări tehnico sanitare, Lucrări electrice, Încălzire și ventilare, Utilaj, Rețele electrice, sanitare exterioare*)

Data completării


Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU** / _____

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



ACHIZITII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achizitia prin Licitatie Publică

"8" aprilie 2014

s. Magdacesti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 565 din data 27 aprilie 2014, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

s. Magdacesti

(localitatea)

str. M. Eminescu, telefon: 0248-34-236, fax: 0248-34-236,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din "___" _____ 20___, reprezentat prin Cojocaru Liuba primar,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. Proiect Gabion,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisinau,

(localitatea)

str. M. Sadoveanu, telefon: 022-60-60-77, fax: _____,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0102541

din "07" mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606

din "13" august 2013, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de ___ ani, pentru genurile de activitate construcții clădiri,

reprezentat prin Ion Secieru director, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare a cantinei sociale (descrierea succintă),

Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție/distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1420900.45 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respecta prevederilor legale.
- 13.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în și limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acest vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract, data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plății integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Primăria s. Magdacești

Adresa: s. Magdacești
Tel./Fax: 0248-34-236
Denumirea: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Băncii: Criuleni
Adresa Băncii: Criuleni
Cod: 226629
Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009934

" ANTREPRENOR": S.R.L. Proiect Gabion

Adresa: Or. Chisinau
Tel./Fax: 022-60-60-77
Denumirea: Energbank
Băncii: Chisinau
Adresa Băncii: Chisinau
Cod: 222435308
Bancar: ENEGMD22
Cont de decontare: ENEGMD22
Cod fiscal: 1010600016641/0404155


16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

" ANTREPRENOR":



ACHIZITII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.15

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "14" iulie 2014, în s.Magdacesti, între Primaria s.Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui Ion Secieru, în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-3351/14 din "22" mai 2014

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții AAP s.Magdacesti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.10 din "14" iulie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2 al Contractului de antrepriză nr.14 din 8 aprilie 2014 se modifică obiectul contractului care este: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare și cantinei sociale care se va câștiga în domeniul noua: CONSTRUCTIA CANTINEI SOCIALE.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":




[Signature]

[Signature]



ACHIZITII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.16

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "9" septembrie 2014, în

între _Primaria s.Magdacești_, în persoana dlui
(denumirea autorității contractante)

și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui
(denumirea operatorului economic)

în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr. 3351/14 din "22" mai 2014.

s.Magdacești,

(localitatea)

Cojocaru Laura

(numele, prenumele și funcția)

Ion Secieru

(numele, prenumele și funcția)

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al
s.Magdacesrti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.2 din "9" septembrie 2014

Primarie

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:


1. Majorarea sumei contractului cu suma de 368584.38 lei în baza devizului de
cheltuieli Nr.2LP 565/14

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC "

" AUTORITATE CONTRACTANTĂ "

L.S.



L.S.



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 46/21 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"11" mai 2015

s. Magdacesti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1457-op15 din 08 mai 2015 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 32/15 din 28 aprilie 2015, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în s. Magdacesti
str. Mihai Eminescu __, telefon: 0248-34236, fax: 0248-34236,
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. __,
, reprezentat prin Cojocaru Liuba-+ primar,
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. PROIECT GABION,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisnau ,
str. M. Sadoveanu, telefon: 022606077, fax: 022606077,
e-mail: proiectgabion@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. __ MD 0102541
din "07 mai 2010 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606
din "03 iunie 2010 eliberată de
pe un termen de ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri
reprezentat prin Ion Secrieru - director, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările construcție a anexei la Cantina sociala (descrierea succintă),
Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar, ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de...

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 707030.59 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13 din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și unelaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Primaria Magdacești
Adresa: Rn-ul Criuleni s. Magdacești
Tel./Fax: 0248-34236
Denumirea
Băncii: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Adresa
Băncii: Criuleni
Cod
Bancar: 226629
Cont de
decontare: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009934
230100000002034


"ANTREPRENOR": S.R.L. PROIECT
GABION
Adresa: Chișinău
Tel./Fax: 022-606077
Denumirea
Băncii: Energbank
Adresa
Băncii: Chișinău
Cod
Bancar: 222435308
Cont de
decontare: ENEGMD22
Cod fiscal: 1010600016641

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":





ACHIZITII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.47

la contractul Nr.46 din "11" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "04" noiembrie 2015, în s. Magdacesti, între Primăria s. Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.A. Proiect Gabion, în persoana dlui [] în scopul modificării Contractului Nr. 46 din "11" mai 2015 (numit în continuare Contract) înregistrat de către AAP cu Nr.201509132 din "11" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Municipiului de construcție a anexei la cantina socială Primărie s. Magdacesti, Cod CPV 45215200-9 N. 46 din "03" noiembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
1. Majorarea contractului initial cu suma de 212012,75 lei în baza devizului de executare a lucrarilor adaugatoare.


Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



[Handwritten signature]



Investitor

APL sat. Măgdăcești

REGISTRAR
nr. 030106 din 30/11/2015
nr. 22220/2013
Anexa Nr. 2
Regulamentului de recepție
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din "22" 01 2016

Obiectul „„Cantina sodala (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni este executat de APL sat. Măgdăcești.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de schimbare-ajustament nr. din eliberată de către primăria sat. Măgdăcești.

Comisia de recepție finală a lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul ianuarie 2016 fiind formată din:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Cojocaru Liuba | - | primarul sat. Măgdăcești |
| Solotchi Feodosie | - | specialist în reglementarea regimului funciar |
| Strulea Gheorghe | - | arhitect șef r-nul Criuleni |
| Gherman Mircea | - | centru de sănătate publică r-nul Criuleni |
| Rusu Dumitru | - | inspecția teritorială ecologică Criuleni |
| Manoli Ștefan | - | unitatea de pompieri și salvatori Criuleni |
| Tverdohleb Mihail | - | biroul de proiectări SRL „SimProiect” |
| Secieru Ion | - | antreprenorul general „Proiect Gabron” SRL |

2. Au mai participat la recepție -

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de " " 2016
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și întreținere a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de " " până în prezent, respectiv pe o durată de luni.

7) valoarea obiectului este de lei conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepție
construcția și de permis exploatarea.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor
de construcție-montaj și comportarea lor corespunzător în perioada de garanție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de recepționat final de
recepționat lucrările de construcții Obiectul cu numărul cadastral 31292202013 adresă:
poștală sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni destinația - socială, compus din următoarele
construcții: cu numărul de etaje parter, Construcția de bază Cămină socială cu
suprafața - 416.4 m.p. conform certificat din 23.11.2015 privind parametrii de bază a
construcției pentru darea în exploatare bonului imobil anexat la prezentul proces -
verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu
total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____
_____ exemplare.

Comisia de recepție

Cojocaru Liub

Solotehi Feodosie

Sirulea Gheorghe

Gherman Mircea

Rusu Dumitru

Manoli Ștefan

Tverdohleb Mihail

Secrieru Ion

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea „Cămină socială (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni Lucrările
de construcție — montaj sunt executate în volumul prevăzut de documentația de
proiect.

(semnătura)


S. Mîrcea

Inspector de Stat în Construcții

(funcția, numele)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRIULENI
PRIMĂRIA MĂGDĂCEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ МЭГДЭЧЕШТЬ

MD -4829 , s. Măgdăcești str., M.Eminescu

tel . 24834236, fax 24834236

MD-4829, с. Мэгдэчешть, ул. М. Еминеску

тел. 24834236, факс 24834236

№20 05.02.2016

Prin prezenta, Primaria s. Magdacesti confirma faptul ca Firma S.R.L. "Proiect Gabion " c/f 1010600016641 a efectuat lucrari de constructie a Cantinei Sociale din s. Magdacesti.

Clauzele contraactuale s-au respectat cu strictete. Lucrarile sau efectuat calitativ, fapt demonstrat in timp.

Recomandam autoritatilor contraactate , cointerestate in reparatia (constructia) imobililor sa selcteze acest agent economic pentru asigurarea calitatii lucrarilor si indeplinirii in termenii contraactuali a acestora.

Primar  Cojocarui Liuba



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1484/14 data 13.11.2014

Semnătura

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 56/84
din 28 octombrie 2014

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1996/14 din 27 octombrie 2014, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cont de virament 220114071679837, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax: 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin Petru VOLOȘCIUC, în calitate de Beneficiar, și S.R.L. „Proiect Gabion”, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4, cont de virament 222435308, deschis la BC „Energbank” SA, cod bancar ENEGMD22, telefon: (022)-60-60-77, cod fiscal 1010600016641, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010, autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A-MMII nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă până la 03 iunie 2015), pentru genurile de activitate: *Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, *, reprezentată prin Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute: Lucrărilor de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1 Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, transferarea avansului conform legislației în vigoare, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 619 414,34 lei (Trei milioane șase sute nouăsprezece mii patru sute paisprezece lei, 34 bani) inclusiv TVA 603 235,72 lei.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până 31 decembrie 2016.

BENEFICIAR

APARATUL PREȘEDINTELUI
raionului Strășeni
or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28
cont trezorerial 220114071679837
cod fiscal 33828860
cont bancar 226632
c/b TREZMD2X

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



cepa corespunde conform originalului

ANTREPRENOR

S.R.L. „Proiect Gabion”
Mun. Chișinău,
str. Mihail Sadoveanu, nr. 16 ap. 4
cont de decontare 222435308
cod fiscal : 1010600016641
c/b ENEGMD22
B.C. „Energbank” S.A.,





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-2432/14 data 08.12.2014
Semnătura Cuiz

ACORD ADIȚIONAL nr. 56-LP/AA din 27 noiembrie 2014 la contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 27 noiembrie 2014, în or. Strășeni, de către Aparatul Președintelui raionului, Consiliul raional Strășeni (beneficiar), în persoana Președintelui raionului Strășeni dlui Petru VOLOȘCIUC, S.R.L. „Proiect Gabion” în persoana dlui Ion SECRIERU și Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni (cobeneficiar), în persoana doamnei Iulia CERTAN, șeful direcției în scopul modificării contractului prin includerea ca cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni, prin acord adițional la contractul de achiziție publică nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni cu S.R.L. „Proiect Gabion” pentru achiziționarea : Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1 înregistrat de Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-7874 din 13.11.2014 Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, nr. 56-LP/AA 27 noiembrie 2014, Cod CPV: 45453000-7.

Prin prezentul Acord, se modifică punctul 1.1 din contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014 în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013 și Legii privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, cu modificările ulterioare și se introduce ca parte contractantă, avînd calitatea de cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni pentru a fi posibilă continuarea Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui.

“OPERATOR ECONOMIC”:



1400.000
“BENEFICIAR”

“COBENEFICIAR”





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-9014/15 data 11.06.15

Semnătura _____

ACORD ADIȚIONAL Nr. 56/AA la contractul Nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 01 iunie 2015, în or. Strășeni, între **Aparatul Președintelui raionul Strășeni**, în persoana dlui **Petru VOLOȘCIUC**, **Președintele Raionului Strășeni, Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni** (cobeneficiar), în persoana doamnei **Iulia CERTAN**, șeful direcției și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, în persoana dlui director **Ion Secrieru**, în scopul modificării Contractului Nr. 56/AA din 28 octombrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu Nr. 1-7874/14 din 13 noiembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, Cod CPV: 45453000-7, procesul-verbal Nr. 56/AA din 06 mai 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se majorează suma contractului 1 084 402,84 lei (Un milion optzeci și patru mii patru sute doi lei, 84 bani) inclusiv TVA, ce reprezintă suma neplanificată pentru lucrările suplimentare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



INVESTITOR

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 16 din 20 iulie 2016

privind lucrarea *"Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I"* în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07, din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriană.
2. 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza *Dispoziției președintelui raionului nr. 80 din 11 iulie 2016* în intervalul de o zi, fiind formată din:

POPA Mihail

- președinte al raionului, președintele Comisiei

Membrii comisiei:

BUDU Nicolae

- vicepreședinte al raionului

URSU Ion

- vicepreședinte al raionului

SÎRBU Nicolae

- șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, secretar al Comisiei

CERTAN Iulia

- șef al Direcției învățământ

AMPAVA Ion

- șef –adjunct al Direcției învățământ

CIOBANU Iurie

- director al taberei de odihnă pentru copii "Codru"

CIOCHINĂ Ion

- șef al Centrului de Sănătate Publică Strășeni

SĂNDUȚĂ Oleg

- șef al Secției Situații Excepționale Strășeni

DIACENCO Rita

- șef al Inspecției Ecologice Strășeni

AGHENIE Tudor

- inspector, Inspecția de Stat teritorială în construcții Centru

BUGA Vasile

- consilier raional

ANGHEL Veaceslav

- consilier raional

CUBE Ludmila

- consilier raional

MAROLA Constantin

- consilier raional

GANEVA Valentin

- consilier raional

TOPOR Iurie

- consilier raional.

3. Au mai participat la recepție:

SECRIERU Ion

- director SRL "PROIECT GABION"

HOMIȚCHI Alexei

- director SRL "GLOBAL - MAX"

TORLAC Nicolae

- responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea lucrărilor de construcție – montaj au fost executate conform contractului de antrepriză și a documentației de proiect cu respectarea normativelor în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor terminate

8. Prezentul proces-verbal, conținînd două file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **20 iulie 2016** în cinci exemplare.

Comisia de recepție

POPA Mihail

BUDU Nicolae

URSU Ion

SÎRBU Nicolae

CERTAN Iulia

AMPAVA Ion

CIOBANU Iurie

CIOCHINĂ Ion

SĂNDUȚĂ Oleg


DIACENCO Rita

AGHENIE Tudor

BUGA Vasile

ANGHEL Veaceslav

TORLAC

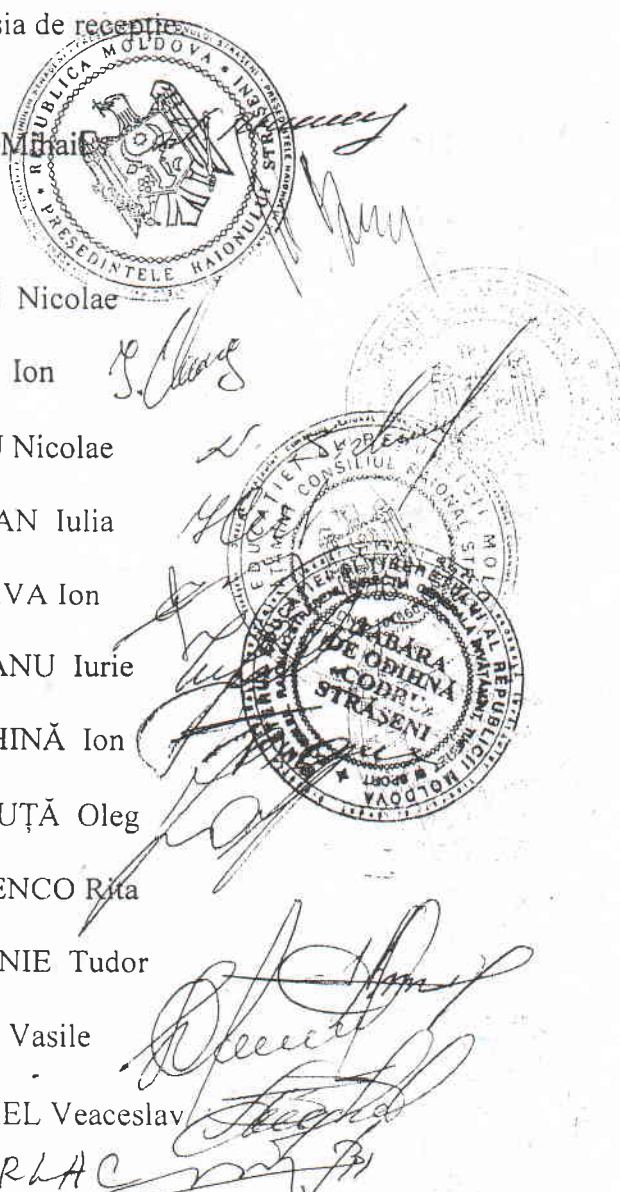

CUBE Ludmila

MAROLA Constantin

GANEVA Valentin

TOPOR Iurie

Homitchi Alexei



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea "Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I"

" " 2016

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " "Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I" este.


TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2016

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



2016



Anexa nr. I
la procesul – verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr.16 din 20.07.2016

Lista documentației scrise și desenate, care trebuia prezentată,
au lipsit sau sunt incomplete piesele:

Președinte al Comisiei

Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMIȚCHI



Lista lucrărilor ce urmau a fi executate:

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. 1". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07 din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriană.

Președinte al Comisiei


Responsabil tehnic

Proiectant

Mihail POPA

Nicolae TORLAC

Alexei HOMIȚCHI



Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr.16 din 20.07.2016

Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție

Președinte al Comisiei

Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMITCHI



Republica Moldova

Președintele Raionului

STRĂȘENI

MD-3701, or, Strășeni, str.M.Eminescu, 28
tel. (237) 2-36-30



Республика Молдова

Председатель Района

СТРЭШЕНЬ

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28
тел.(237) 2-36-30

16 martie 2017 nr. 145

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2015 „PROIECT GABION” SRL a câștigat dreptul de execuție a lucrărilor de construcție la obiectului „Pavilionul de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din r-nul Strășeni, în anul 2016 a executat lucrări de reparație capitală la sala de sport și vestiare la LT „M. Eminescu” din or. Strășeni.

În cadrul execuției lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectate normele în construcții, termenii și volumele prevăzute în contract, confirmând un nivel ridicat al profesionalismului. Pe parcursul executării și a recepției finale a lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „PROIECT GABION” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor credibil și profesionist.

Președinte al raionului



Mihail POPA
Mihail POPA



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 " cu 112 locuri la tabara de odihna pentru copii "Codru" din s. Capriana, raionul Strasenî, etapa nr. 1**
2. Numărul și data contractului **Nr.56/84 din 28.10.2014** și acordul adițional nr.56/AA din 11.06.2015 conform (procesul verbal) **nr.56/AA din 06.05.2015 la contractul nr.56 din 28 octombrie 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul Presedintelui raionului Strasenî)Directia Invatamint din cadrul Consiliului raional Strasenî**

4. Adresa beneficiarului **or.Strășeni str.M.Eminescu,28**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

antreprenor
antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr.56/84 (la data semnării contractului)	3 619 414,34	320 302,15
aa) Acordul adițional nr.56AA	1 084 402,84	95 964,85
b) finală (la data finalizării contractului)	4 703 817,18	416 267,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **19 luni**

b) efectiv realizată **11 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.16 din 20 iulie 2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în terminile stabilite mai bine.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **(Lucrări de terasament, zidării, beton armat, pereți dispărțitori, acoperiș șarpant, montarea blocuri din beton subsol, perete de sprijin, scări din beton armat)**

Data completării

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**



ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1484/14 data 13.11.2014

Semnătura

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 56/84
din 28 octombrie 2014

Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1996/14 din 27 octombrie 2014, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cont de virament 220114071679837, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax: 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin Petru VOLOȘCIUC, în calitate de Beneficiar, și S.R.L. „Proiect Gabion”, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4, cont de virament 222435308, deschis la BC „Energbank” SA, cod bancar ENEGMD22, telefon: (022)-60-60-77, cod fiscal 1010600016641, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010, autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A-MMII nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă până la 03 iunie 2015), pentru genurile de activitate: *Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, *, reprezentată prin Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute: Lucrărilor de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1 Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3

PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, transferarea avansului conform legislației în vigoare, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 619 414,34 lei (Trei milioane șase sute nouăsprezece mii patru sute paisprezece lei, 34 bani) inclusiv TVA 603 235,72 lei.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14

DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până 31 decembrie 2016.

BENEFICIAR

APARATUL PREȘEDINTELUI
raionului Strășeni
or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28
cont trezorerial 220114071679837
cod fiscal 33828860
cont bancar 226632
c/b TREZMD2X

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



cepa corespunde conform originalului

ANTREPRENOR

S.R.L. „Proiect Gabion”
Mun. Chișinău,
str. Mihail Sadoveanu, nr. 16 ap. 4
cont de decontare 222435308
cod fiscal : 1010600016641
c/b ENEGMD22
B.C. „Energbank” S.A.,





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-2432/14 data 08.12.2014

Semnătura Cuiz

ACORD ADIȚIONAL nr. 56-LP/AA din 27 noiembrie 2014 la contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 27 noiembrie 2014, în or. Strășeni, de către Aparatul Președintelui raionului, Consiliul raional Strășeni (beneficiar), în persoana Președintelui raionului Strășeni dlui Petru VOLOȘCIUC, S.R.L. „Proiect Gabion” în persoana dlui Ion SECRIERU și Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni (cobeneficiar), în persoana doamnei Iulia CERTAN, șeful direcției în scopul modificării contractului prin includerea ca cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni, prin acord adițional la contractul de achiziție publică nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni cu S.R.L. „Proiect Gabion” pentru achiziționarea : Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1 înregistrat de Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-7874 din 13.11.2014 Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, nr. 56-LP/AA 27 noiembrie 2014, Cod CPV: 45453000-7.

Prin prezentul Acord, se modifică punctul 1.1 din contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014 în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013 și Legii privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, cu modificările ulterioare și se introduce ca parte contractantă, avînd calitatea de cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni pentru a fi posibilă continuarea Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui.

“OPERATOR ECONOMIC”:



1400.000
“BENEFICIAR”

“COBENEFICIAR”





ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-9014/15 data 11.06.15

Semnătura _____

ACORD ADIȚIONAL Nr. 56/AA la contractul Nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 01 iunie 2015, în or. Strășeni, între **Aparatul Președintelui raionul Strășeni**, în persoana dlui **Petru VOLOȘCIUC**, **Președintele Raionului Strășeni**, **Direcția Învățământ** din cadrul **Consiliului raional Strășeni** (cobeneficiar), în persoana doamnei **Iulia CERTAN**, șeful direcției și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, în persoana dlui director **Ion Secrieru**, în scopul modificării Contractului Nr. 56/AA din 28 octombrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu Nr. 1-7874/14 din 13 noiembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, Cod CPV: 45453000-7, procesul-verbal Nr. 56/AA din 06 mai 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se majorează suma contractului 1 084 402,84 lei (Un milion optzeci și patru mii patru sute doi lei, 84 bani) inclusiv TVA, ce reprezintă suma neplanificată pentru lucrările suplimentare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



INVESTITOR

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 16 din 20 iulie 2016

privind lucrarea *"Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I"* în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07, din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriană.
2. 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza *Dispoziției președintelui raionului nr. 80 din 11 iulie 2016* în intervalul de o zi, fiind formată din:

POPA Mihail

- președinte al raionului, președintele Comisiei

Membrii comisiei:

BUDU Nicolae

- vicepreședinte al raionului

URSU Ion

- vicepreședinte al raionului

SÎRBU Nicolae

- șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, secretar al Comisiei

CERTAN Iulia

- șef al Direcției învățământ

AMPAVA Ion

- șef –adjunct al Direcției învățământ

CIOBANU Iurie

- director al taberei de odihnă pentru copii "Codru"

CIOCHINĂ Ion

- șef al Centrului de Sănătate Publică Strășeni

SĂNDUȚĂ Oleg

- șef al Secției Situații Excepționale Strășeni

DIACENCO Rita

- șef al Inspecției Ecologice Strășeni

AGHENIE Tudor

- inspector, Inspecția de Stat teritorială în construcții Centru

BUGA Vasile

- consilier raional

ANGHEL Veaceslav

- consilier raional

CUBE Ludmila

- consilier raional

MAROLA Constantin

- consilier raional

GANEVA Valentin

- consilier raional

TOPOR Iurie

- consilier raional.

3. Au mai participat la recepție:

SECRIERU Ion

- director SRL "PROIECT GABION"

HOMIȚCHI Alexei

- director SRL "GLOBAL - MAX"

TORLAC Nicolae

- responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea lucrărilor de construcție – montaj au fost executate conform contractului de antrepriză și a documentației de proiect cu respectarea normativelor în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor terminate

8. Prezentul proces-verbal, conținînd două file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **20 iulie 2016** în cinci exemplare.

Comisia de recepție

POPA Mihail

BUDU Nicolae

URSU Ion

SÎRBU Nicolae

CERTAN Iulia

AMPAVA Ion

CIOBANU Iurie

CIOCHINĂ Ion

SĂNDUȚĂ Oleg


DIACENCO Rita

AGHENIE Tudor

BUGA Vasile

ANGHEL Veaceslav

TORLAC

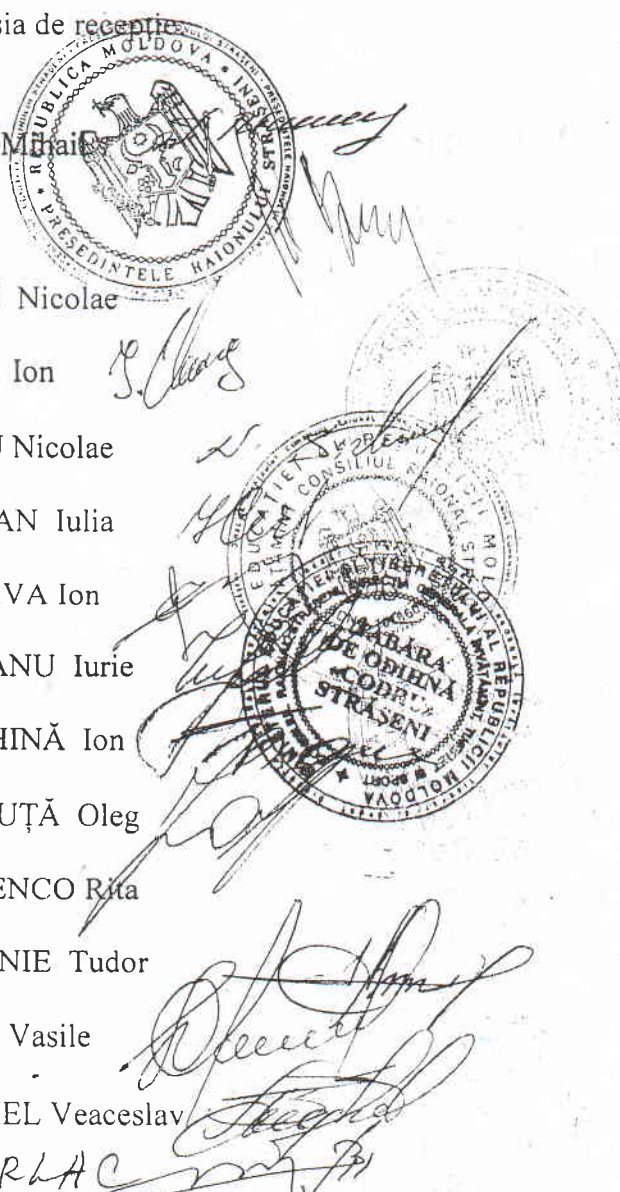

CUBE Ludmila

MAROLA Constantin

GANEA Valentin

TOPOR Iurie

Homitchi Alexei



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea "Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I"

" " 2016

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " "Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:


" " 2016

L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



2016



Anexa nr. I
la procesul – verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr.16 din 20.07.2016

Lista documentației scrise și desenate, care trebuia prezentată,
au lipsit sau sunt incomplete piesele:

Președinte al Comisiei

Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMIȚCHI



Lista lucrărilor ce urmau a fi executate:

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. 1". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07 din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriană.

Președinte al Comisiei


Responsabil tehnic

Proiectant

Mihail POPA

Nicolae TORLAC

Alexei HOMIȚCHI



Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
nr.16 din 20.07.2016

Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate
cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție

Președinte al Comisiei


Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMITCHI



Republica Moldova

Președintele Raionului

STRĂȘENI

MD-3701, or, Strășeni, str.M.Eminescu, 28
tel. (237) 2-36-30



Республика Молдова

Председатель Района

СТРЭШЕНЬ

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28
тел.(237) 2-36-30

16 martie 2017 nr. 145

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2015 „PROIECT GABION” SRL a câștigat dreptul de execuție a lucrărilor de construcție la obiectului „Pavilionul de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din r-nul Strășeni, în anul 2016 a executat lucrări de reparație capitală la sala de sport și vestiare la LT „M. Eminescu” din or. Strășeni.

În cadrul execuției lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectate normele în construcții, termenii și volumele prevăzute în contract, confirmând un nivel ridicat al profesionalismului. Pe parcursul executării și a recepției finale a lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „PROIECT GABION” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor credibil și profesionist.

Președinte al raionului



Mihail POPA
Mihail POPA
