

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lot#2 - ITB17/01488:SARD "Crearea accesului populației din sat la sistemul urban de canalizare, s. Copceac, UTAG" și
Construcția unei surse noi de apă pentru localitățile și asigurarea grădinițelor și școlilor din sat cu apă potabilă, s. Chirsova, UTAG

2. Numărul și data contractului:

F/N din 7.06.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului

UNDP, Moldova

4. Adresa beneficiarului:

str. 31 august 1989, nr. 31, Chișinău

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 510 259,42	192 554,00
b) finală (la data finalizării contractului)	3 974 468,14	218 018,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

4 luni

b) Efectiv realizată:

4 luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din 14.09.2017 și Nr. 1 din 14.09.2017

1. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnat

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.





CONTRACT FOR WORKS

Date: 7th June 2017

Dear Sir/Madam,

Ref.: **ITB17/01488: SARD/ Construction works for 8 social infrastructure projects (LOT – 2)**

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage "VALDCONGRUP" LLC, duly incorporated under the Laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform: **Site 1: Access to urban sewerage system in the Copceac village, UTA Gagauzia; Site 2: Development of new water access point and connection to the community kindergartens and schools, Chirsova, UTA Gagauzia** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a. this Contract;
 - b. Annex I – The General Conditions of Contract for Civil Works;
 - c. Annex II – Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 07 April 2017, including the Technical Design Documentation for this lot, not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
 - d. Annex III - the Contractor's Offer including the Price Schedule and Bills of Quantities submitted by the Contractor as part of its Bid dated 27 April 2017, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

"VALDCONGRUP" LLC

#171/2, Uzinelor Street, Chisinau mun.
Republic of Moldova

2. Obligations of the Contractor

2.1 The Contractor shall commence the Works within **5 (five) days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and Substantially complete the Works in not more than **120 calendar days**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labor and other services necessary to that end.

2.3 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **17/06/2017**.

2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **US\$ 192,554.00 (One hundred ninety-two thousand five hundred fifty-four US dollars, 00 cents)**.

3.2 The price of this Contract is not subject to any adjustment or revision because of price or currency fluctuations or the actual costs incurred by the Contractor in the performance of the Contract.

3.3 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.

3.4 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.

3.5 Invoices for the work performed and materials utilized shall be submitted every 20 days; and a final invoice within 20 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer. Payments will be made in MDL at UNORE on the day of payment.

3.6 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 10 days of their receipt, when no objections for the performed works exist.

Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

Payment of the final invoice in the amount of not less than 5% (five) of the total estimated price of the contract shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

All funds paid to the Contractor for works performed under this contract are carried out under the EU funded technical assistance Project "Support in Agricultural and Rural Development in ATU Gagauzia and Taraclia" implemented by UNDP.



3.10 All the financial facilities and exemptions received from authorities, from which the Contractor will benefit in order to perform works under the present contract shall remain the property of UNDP and shall be used for other tasks established by UNDP under the purpose of the present contract.

4. Special conditions

4.1 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.2 The **Performance Guarantee** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **10% (ten percent)** of the total estimated price of the contract.

4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.15%** of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum of 60 days, after which UNDP may terminate the contract.

4.4 The liability insurance referred to in Clause 23 of the General Conditions shall be taken out by the Contractor for an amount required by the local legislation.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the UNDP Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

Bank Name: ENERBANK SA, Botanica Branch

Bank Code: ENEGMD22858

Account#: MD47EN000000222404607858

Contractor Fiscal Code: 100960000374

7. Modifications

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor as follows:

For the UNDP:

Anatolie TERZI

SARD Project Manager, UNDP Moldova

#131, 31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova

Tel: (+373 22) 839 932

e-mail: anatolii.terzi@undp.org

For the Contractor:

Denis TURCAN, Director

#171/2, Uzinelor Street, Chisinau mun. Moldova

Tel: (+373 22) 42 80 62

GSM: (+373) 69 251 598

e-mail: valdcongrup@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Alexandru URSUL

Le Roi Business Center, #29 Sfatul Tarii Street, off. 403, Chisinau, Moldova

e-mail: alexandru.ursul65@gmail.com

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor. If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,



For "VALDCONGRUP" LLC

Agreed and Accepted:

Signature

Name **Denis TURCAN**

Title **Director**

Date **8 June 2017**





Empowered lives.
Resilient nations.

Ref: ITB16/01488-Lot#2

**AMENDMENT#1 TO THE CONTRACT FOR CIVIL WORKS
BETWEEN
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
AND
"VALDCONGRUP" LLC**

Date: August 29, 2017

Reference is made to the contract for works dated June 7, 2017 signed between the **UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)**, and the **"VALDCONGRUP" LLC**, in order to perform **Construction works for social infrastructure projects: Site 1: Access to urban sewerage system in the Copceac village, UTA Gagauzia; Site 2: Development of new water access point and connection to the community kindergartens and schools, Chirsova, UTA Gagauzia.**

As per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following:

WHEREAS "VALDCONGRUP" LLC and UNDP now wish to amend said Contract in order to:

- include additional works to the project **Site 1: Access to urban sewerage system in the Copceac village, UTA Gagauzia** as per Annex I+TB-1531-Lot-2-Valdcongrup-Additional-Works;

WHEREAS such Amendment will result in an increase of **USD 25,464.00** (twenty-five thousand four hundred sixty-four dollars and zero cents) making this amended Contract total **USD 218,018.00** (two hundred eighteen thousand eighteen dollars and zero cents), following the breakdown below:

NOW THEREFORE, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

Clause 1.2 shall be changed to now read as follows:

- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
- a. this letter;
 - b. the Contractor's Bill of Quantities for additional works attached hereto as Annex I;
 - c. the letter confirming that Contractor will comply with the volume of work estimated in the Bill of Materials published within ITB17/01488, Lot #2, Site 1: Access to urban sewerage system in the Copceac village UTA Gagauzia; Site 2: Development of new water access point and connection to the community

kindergartens and schools, Chirsova, UTA Gagauzia, not attached hereto but in the possession of both parties.

Clause 3.1 shall be changed to now read as follows:

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to USD **USD 218,188.00** (two hundred eighteen thousand one hundred eighty-eight dollars and zero cents).

Clause 47.1 of the General Conditions of Contract shall be changed to now read as follows:

47.1 The expression "Defects Liability Period" shall mean the period of three (3) months, calculated from the date of completion of the Works stated in the Certificate of Substantial Completion issued by the Engineer or, in respect of any Section or part of the Works for which a separate Certificate of Substantial Completion has been issued, from the date of completion of that Section or part as stated in the relevant Certificate. The expression "the Works" shall, in respect of the Defects Liability Period, be construed accordingly.

NEVERTHELESS, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT

For UNDP:

By [Signature]
(signature)

Stefan Liller
Deputy Resident Representative



For "Valdcongrup" LLC:

By [Signature]
(signature)

Denis Turcan,
Director



Date: 29/08/2017



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.



Garizan Oleg
Primarul s. Copeac

Turcan Denis,
Administrator SRL Valdcongrup

Vladimir Baghici,
Inginer Consultant UE SARD

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Проектная документация представлена в полном комплекте



Garizan Oleg
Primarul s. Copeac

Turcan Denis,
Administrator SRL Valdcongrup

Vladimir Baghici,
Inginer Consultant UE SARD

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Anexanr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

INVESTITOR (SARD, UNDP Moldova)
BENEFICIAR (Primaria s. Chirsovo)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 Din 14.09.2017

Privind lucrarea: "Строительство нового источника воды для жителей села Кирсово", executată la obiectul în satul Chirsovo, în cadrul contractului ITB17 / 01488 SARD lot-2 din 07.07.2017, încheiat între: SARD, UNDP Moldova și SRL „Valdcongrup”, pentru lucrările de: Строительство нового источника воды для жителей села Кирсово

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.23, din 20.05.2017 eliberată de Primaria s. Chirsovo cu valabilitate până la 20.05.2018
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.09.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Sapunji Serghei - Primar s. Chirsovo

Membrii comisiei:

Tanasoglo Fiodor – Responsabil Tehnic;
Stoinov Veaceslav – Director „Eni - Canal”;
Catranji Iliia – Consilier s. Chirsovo
Vladimir Baghici – Inginer Consultant UE/SARD

3. Au mai participat la recepție:

Administrator „Valdcongrup SRL” – Turcan Denis
Diriginte de santier „Valdcongrup SRL” – Turcan Anatolie

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor « Строительство нового источника воды для жителей села Кирсово », sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal:

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;
Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);
3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.



Garizan Oleg
Primarul s. Copceac

Turcan Denis,
Administrator SRL Valdcongrup

Vladimir Baghici,
Inginer Consultant UE SARD

Comisia de recepție recomandă următoarele:
Принема обекта по оканчанию строительства-монтажных работ.

7¹. Descrierea obiectului reținerii comandatului de recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală: s. Copeac, UTA, destinația la sol _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 14.09.2017, la ora 14-00, în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Sapunji Serghei

Membrii comisiei:

Tanasoglo Fiodor

Stoinov Veaceaslav

Vladimir Baghici

Au mai participat la recepție:

Turcan Denis

Turcan Anatolie

9. Concluzia inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

L.S. _____ 2017

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea: *Строительство нового источника воды для жителей села Кирсово* este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL „Valdcongrup”,

_____ 14 " 09 " 2017

L.S. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

BENEFICIAR

Primăria s. Chirsovo

_____ 14 " 09 " 2017

L.S. _____

(semnătura)



Sapunji Serghei
Primarul s. Chirsovo


Turcan Denis,
Administrator SRL Valdcongrup

Vladimir Baghici,
Inginer Consultant UE SARD

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Проектная документация представлена в полном комплекте

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.




Sapunji Serghei
Primarul s. Chirsovo

Turcan Denis,
Administrator SRL Valdcongrup

Vladimir Baghici,
Inginer Consultant UE SARD

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.




Sapunji Serghei
Primarul s. Chirsovo
Turcan Denis,
Administrator SRL Valdcongrup
Vladimir Baghici,
Inginer Consultant UE SARD



Support to Agriculture and Rural Development Project (SARD)
Project financed by the European Union
and implemented by the UN Development Programme



RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim să confirmăm că în anul 2017 compania "VALDCONGRUP" SRL a continuat să participe activ în calitate de antreprenor general la executarea lucrărilor de construcție în cadrul Programul SARD/ UE-PNUD Moldova. În acest an "VALDCONGRUP" SRL a executat cu succes lucrările: **ItB17/01488 SARD / Construction works for 8 social infrastructure projects-2 LOTs.**

În anul curent, "VALDCONGRUP" SRL, a avut în calitate de obiective de construcție pe următoarele loturi/șantiere:

LOT #2:

- 2.1 Crearea accesului populației din sat la sistemul urban de canalizare, s. Copceac, UTAG*
- 2.2 Construcția unei surse noi de apă pentru localitățile și asigurarea grădinițelor și școlilor din sat cu apă potabilă, s. Chirsova, UTAG*

LOT #3:

- 3.1 Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială, s. Budăi, r. Taraclia*
- 3.2 Construcția unei surse publice noi de apă potabilă, s. Chiriet Lunga, UTAG*

Cu această ocazie, în special, doresc să menționez că lucrările solicitate conform contractelor, ca și în anii precedenți, au fost executate în termenii agreeți între părți, în mod foarte bine organizat. Managerii și personalul tehnic a companiei au acționat, ca de obicei, cu profesionalism și promptitudine. De asemenea vreau să menționez că, lucrările în cadrul proiectelor implementate cu PNUD Moldova, au fost executate în corespundere cu specificațiile tehnice solicitate, standardele și normativele în vigoare, ceea ce atestă pregătirea superioară a personalului societății "VALDCONGRUP" SRL.

Din considerentele menționate mai sus, confirmând capacitatea superioară de lucru, profesionalism, promptitudine și seriozitate în executarea sarcinilor contractuale, recomand fără îndoială, "VALDCONGRUP" SRL în calitate de contractor pentru oricare alt investitor.

Alexandru Ursul

Expert Tehnic al Programului SARD
UE-PNUD Moldova

Data: 11.12.2017



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lot#3 - ITB17/01488:SARD "Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială, s. Budăi, r. Taraclia" și "Construcția unei surse publice noi de apă potabilă, s. Chiriet Lunga, UTAG"

2. Numărul și data contractului:

F/N din 7.06.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului

UNDP, Moldova

4. Adresa beneficiarului:

31 august 1989, nr. 31, Chișinău

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 098 316,11	169 957,00
b) finală (la data finalizării contractului)	3 098 317,11	169 957,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

4 luni

b) Efectiv realizată:

4 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din 29.09.2017 și F/N din 29.08.2017

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:


Director

Semnat

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.





Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT FOR WORKS

Date: 7th June 2017

Dear Sir/Madam,

Ref.: ITB17/01488: SARD/ Construction works for 8 social infrastructure projects (LOT - 3)

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage "VALDCONGRUP" LLC, duly incorporated under the Laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform: **Site 1: Construction of sewerage network connected to the wastewater treatment plant and social buildings Budai village, UTA Gagauzia; Site 2: Development of new underground water sources and providing drinking water to the community, Chiriet Lunga, UTA Gagauzia** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a. this Contract;
 - b. Annex I - The General Conditions of Contract for Civil Works;
 - c. Annex II - Schedule of Requirements and Technical Specifications dated 07 April 2017, including the Technical Design Documentation for this lot, not attached hereto but known to and in the possession of both parties;
 - d. Annex III - the Contractor's Offer including the Price Schedule and Bills of Quantities submitted by the Contractor as part of its Bid dated 27 April 2017, not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

"VALDCONGRUP" LLC

#171/2, Uzinilor Street, Chisinau mun.
Republic of Moldova

2. Obligations of the Contractor

- 2.1 The Contractor shall commence the Works within **5 (five) days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and Substantially complete the Works in not more than **120 calendar days**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labor and other services necessary to that end.
- 2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **17/06/2017**.
- 2.3 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.
- 2.4
3. **Price and payment**
- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **US\$ 169,957.00 (One hundred sixty-nine thousand nine hundred fifty-seven US dollars, 00 cents)**.
- 3.2 The price of this Contract is not subject to any adjustment or revision because of price or currency fluctuations or the actual costs incurred by the Contractor in the performance of the Contract.
- 3.3 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.4 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.5 Invoices for the work performed and materials utilized shall be submitted every 20 days; and a final invoice within 20 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer. Payments will be made in MDL at UNORE on the day of payment.
- 3.6 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 10 days of their receipt, when no objections for the performed works exist.



Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.

Payment of the final invoice in the amount of not less than 5% (five) of the total estimated price of the contract shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.

3.9 All funds paid to the Contractor for works performed under this contract are carried out under the EU funded technical assistance Project "Support in Agricultural and Rural Development in ATU Gagauzia and Taraclia" implemented by UNDP.

3.10 All the financial facilities and exemptions received from authorities, from which the Contractor will benefit in order to perform works under the present contract shall remain the property of UNDP and shall be used for other tasks established by UNDP under the purpose of the present contract.

4. Special conditions

4.1 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.

4.2 The **Performance Guarantee** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **10% (ten percent)** of the total estimated price of the contract.

4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **0.15%** of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum of 60 days, after which UNDP may terminate the contract.

4.4 The liability insurance referred to in Clause 23 of the General Conditions shall be taken out by the Contractor for an amount required by the local legislation.

5. Submission of invoices

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the UNDP Engineer's address specified in clause 8.2.

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

Bank Name: ENERBANK SA, Botanica Branch

Bank Code: ENEGMD22858

Account#: MD47EN000000222404607858

Contractor Fiscal Code: 100960000374

7. Modifications

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Anatolie TERZI

SARD Project Manager, UNDP Moldova

#131, 31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova

Tel: (+373 22) 839 932

e-mail: anatolie.terzi@undp.org

For the Contractor:

Denis TURCAN, Director

#171/2, Uzinelor Street, Chisinau mun. Moldova

Tel: (+373 22) 42 80 62

GSM: (+373) 69 251 598

e-mail: valdcongrup@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Alexandru URSUL

Le Roi Business Center, #29 Sfatul Tarii Street, off. 403, Chisinau, Moldova

e-mail: Alexandru.ursul65@gmail.com

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor. If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,



For "VALDCONGRUP" LLC

Agreed and Accepted:

Signature

Name

Title

Date

Denis TURCAN

Director

08 June 2017



INVESTITOR (UNDP Moldova)
BENEFICIAR (Primaria Budai)

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afiliate

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 01 din 29.09.2017

Privind lucrarea «Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială: grădinița de copii, școala, punctul medical, din satul Budai rn. Taraclia»

Execută la obiectul «Sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială în satul Budai rn. Taraclia» în cadrul contractului nr. ITB 17/01488 din 07.06.2017 încheiat între **UNDP Moldova și Antreprenor „VALDCONGRUP” SRL**, pentru lucrările de: Construcție a sistemului local de canalizare cu conectarea la stația de epurare a obiectelor: grădiniței de copii, școlii, punctului medical din satul Budai rn. Taraclia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 19 din 17.04.2017, eliberată de Primăria s. Budai, cu valabilitate până la 17.04.2018.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.09.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei

Terzi Galina – Primar s. Budai

Membrii Comisiei

Buzuian Aliona – contabil sef Primăria s. Budai

Moldovan Natalia - ing. Cadastral Primăria s. Budai

Andrei Tanov - responsabil tehnic

Ion Ceban - ing. Consultant UE SARD

Au mai participat la recepție:

Administratorul SRL „VALDCONGRUP” – Denis Turcan
Diriginte de santier SRL „VALDCONGRUP” - Anatol Turcan

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor «Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială în satul Budai rn. Taraclia» sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;
Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sînt așa lucrări);
Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.


5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor de construcție - montaj prevăzute în contract

10. Lucrarea: «Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială în satul Budai rn. Taraclia»

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
„VALDCONGRUP” SRL

PRIMITĂ:
BENEFICIAR
Primăria Budai



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

1. Составить законченный комплектный чертеж и проект
- Центр общ. згоровых
- Схематический
- Схематический
2. Доукомплектовать техническим проектом
- раздел Б. и горючего.
3. Проверить и внести в соответствие
- схем и проектных сетей канализации.

4

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.

Terzi Galina – Primar s. Budai

Terzi Galina – Primar s. Budai

Denis Turcan Administratorul VALCONGRUP SRL

Ion Ceban ing. Consultant UE - SARD

Denis Turcan Administratorul VALCONGRUP SRL
Ion Ceban ing. Consultant UE - SARD



INVESTITOR (UNDP Moldova)
BENEFICIAR (Primaria Chiriet Lunga)

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărate

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____
din 29.08.2017

Privind lucrarea «Construcția unei surse noi de apă în s. Chiriet Lunga UTAGC»

Execută la obiectul « Construcția unei surse noi de apă în s. Chiriet Lunga UTAGC » în cadrul contractului nr. ITB 17/01488-LOT-3 din 07.06.2017, încheiat între **UNDP Moldova și Antreprenor SRL „VALCONGRUP”**, pentru lucrările de: **Construcția unei surse noi de apă în s. Chiriet Lunga UTAGC.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.04 din 04.04.2017, eliberată de Primăria s. Chiriet Lunga, cu valabilitate până la 04.04.2018.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.08.2017, fiind formată din:

Președintele comisiei

Caica Valentina – Primar s. Chiriet Lunga

Membrii Comisiei

Ielezogl Galina – contabil sef Primăria s. Chiriet Lunga
Burguji Dmitrii – ing. Cadastral Primăria s. Chiriet Lunga
Chirietci Piotr – Președintele consiliului satese
Dan Olga – contabil sef, i.f. sef IM CHIRIETPRIM
Rudenco Boris – responsabil tehnic
Ion Ceban – ing. Consultant UE SARD

3. Au mai participat la recepție :

Administratorul SRL “VALCONGRUP” – Denis Turcan
Diriginta de santier SRL “VALCONGRUP” – Anatol Turcan


4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor « Construcția unei surse noi de apă în s. Chiriet Lunga UTAGC » sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal:

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;
Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sînt așa lucrări);
Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
anularea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
realizarea lucrărilor de construcție montaj prevăzute în contract
Comisia de recepție recomandă următoarele:
Expunerea obiectivului conform destinației

3. ...
пов неясности сооружения:
4. Договорные условия в проекте не записаны
отчетных сооружений и привести в соответствие
с законодательством:
-технические измерения
-экспертная оценка
-Устранить проект на этапе в соответствии с
5. Разрешить проект и одобрить работу.
6. Привести разрешение на строительство в соответствие
с установленными нормами.
7. Восстановить нормативные акты.

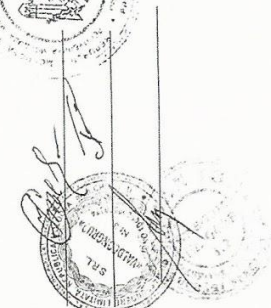

Terzi Galina – Primar s. Budai

Denis Turcan Administratorul VALCONGRUP SRL

Ion Ceban ing. Consultant UE - SARD



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral, adresa poștală: s. Chiriet Lunga UTAGC, destinația: publică, compus din următoarele construcții: Fântâna arteziană, turn de apă de tip Rujnov, zona sanitară, suprafața la sol, suprafața totală, numărul de etaje, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29.08.17, la ora 15:00, în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Caica Valentina

Membrii comisiei

Jelezoglo Galina

Burguji Dmitrii

Chiruceti Piotr

Dan Olga

Rudenco Boris

Ion Ceban

Reprezentantii antreprenorului:

Denis Turcan

Anatol Turcan

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Se recomandă

CE 2017

(funcția, numele, prenumele)

10. Lăcătarea: « Construcția unei surse noi de apă în s. Chiriet Lunga UTAGC »

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

SRL „VALDCONGRUP”

„49” 08.08.2017

L.S. (semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIAR

Primăria Chiriet Lunga

„29.08.2017

L.S. (semnătura)

ANEXĂ nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. din 29.08.2017

Lista pieselor din documentația scrisă și deservată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.



Caica Valentina – Primar s. Chiriet Lunga

Denis Turcan Administrator SRL VALCONGRUP

Chiriet ing. Consultant UE SARD

ANEXĂ nr.2
La procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrarilor nr. din 29.08.2017

ANEXĂ nr.3
La procesul-verbal de recepție la terminarea
lucrarilor nr. din 29.08.2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Caica Valentina – Primar s. Chirnet Lunga

Denis Turcan Administratorul SRL VALCONGRUP

Ion Ceban ing. Consultant UE SARD



Caica Valentina – Primar s. Chirnet Lunga

Denis Turcan Administratorul SRL VALCONGRUP

Ion Ceban ing. Consultant UE SARD





Support to Agriculture and Rural Development Project (SARD)
Project financed by the European Union
and implemented by the UN Development Programme



RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim să confirmăm că în anul 2017 compania "VALDCONGRUP" SRL a continuat să participe activ în calitate de antreprenor general la executarea lucrărilor de construcție în cadrul Programul SARD/ UE-PNUD Moldova. În acest an "VALDCONGRUP" SRL a executat cu succes lucrările: **ItB17/01488 SARD / Construction works for 8 social infrastructure projects-2 LOTs.**

În anul curent, "VALDCONGRUP" SRL, a avut în calitate de obiective de construcție pe următoarele loturi/șantiere:

LOT #2:

2.1 Crearea accesului populației din sat la sistemul urban de canalizare, s. Copceac, UTAG

2.2 Construcția unei surse noi de apă pentru localitățile și asigurarea grădinițelor și școlilor din sat cu apă potabilă, s. Chirsova, UTAG

LOT #3:

3.1 Construcția sistemului de canalizare cu conectarea la stația de epurare și obiectelor de menire socială, s. Budăi, r. Taraclia

3.2 Construcția unei surse publice noi de apă potabilă, s. Chiriet Lunga, UTAG



Cu această ocazie, în special, doresc să menționez că lucrările solicitate conform contractelor, ca și în anii precedenți, au fost executate în termenii agreeați între părți, în mod foarte bine organizat. Managerii și personalul tehnic a companiei au acționat, ca de obicei, cu profesionalism și promptitudine. De asemenea vreau să menționez că, lucrările în cadrul proiectelor implementate cu PNUD Moldova, au fost executate în corespundere cu specificațiile tehnice solicitate, standardele și normativele în vigoare, ceea ce atestă pregătirea superioară a personalului societății "VALDCONGRUP" SRL.

Din considerentele menționate mai sus, confirmând capacitatea superioară de lucru, profesionalism, promptitudine și seriozitate în executarea sarcinilor contractuale, recomand fără îndoială, "VALDCONGRUP" SRL în calitate de contractor pentru oricare alt investitor.

Alexandru Ursul

Expert Tehnic al Programului SARD
UE-PNUD Moldova

Data: 11.12.2017

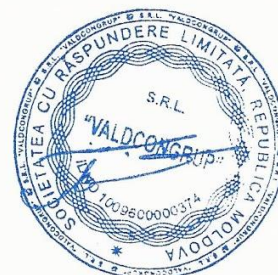

FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de instalare a dispozitivelor de reglare a presiunii în rețele interne de aprovizionare cu apă în punctele de conectare la rețelele de apă a blocului Maternitate, clădirii Departamentului Specializat Integrat și clădirii laboratorului patomorfologic, inclusiv renovarea nodurilor de conectare	I.M.S.P. Institutul Mamei și Copilului	contractant unic	116 945	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
2	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din s. Bursuc, r-nul Nisporeni	Primăria s. Bursuc, r-nul Nisporeni	contractant unic	5 895 695	6	Nr. 1 din 24 noiembrie 2018
3	Lucrări de montare a nodului de evidență a apei potabile în s. Porumbesti, r-nul Cantemir	Primăria s. Porumbesti, r-nul Cantemir	contractant unic	33 382	10 zile	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
4	Reparația capitală a acoperișului la cantina gimnaziului Susleni (Tranșa I)	Instituția Publică Gimnaziul Vasile Lupu Susleni	contractant unic	711 368	3	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1997
5	Lucrări de reparație și restabilire (tehnic-sanitare) a sistemului antiincendiar în blocul A, B și C (Maternitate, Policlinica și Laboratorul patomorfologic) din cadrul I.M. și C	Acvan Plus S:R:L:	Subcontractor	66 358	2	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1999
6	Construcția sistemului de alimentare cu apă s. Chiriet-Lunga, r-nul Ceadr-Lunga	Î.S. SUD-A-CONS	contractant unic	3 239 557	4	Nr. 12-10/18 din 12 octombrie 2018
7	Lucrările de reparație a postului salvatori și pompieri Leușeni, r-nul Hîncești	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	contractant unic	391 553	2	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1997
8	Lucrări de reparație capitală a încăperilor clădirii DCSI	I.M.S.P. Institutul Mamei și Copilului	contractant unic	975 000	1,5	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2000

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
9	Lucrări de construcție a unei porțiuni de apeduct în scopul înălțării sistemului de alimentare cu apă și conectarea unor case în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	92 666	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1998
10	Conectarea caselor individuale la sistemul de apeduct din s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	234 000	3	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1999
11	Construcția rețelei de alimentare cu apă și rețea de canalizare din s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca	Primăria s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca	contractant unic	24 450 085	24	în execuție
12	Lucrări de reparație capitală a construcțiilor existente ale Unității militare 1003 a DTC al MAI din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 140 A, mun. Bălți, (etapa I)	Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne	contractant unic	3 043 025	6	în execuție
13	Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor clădirii Filarmonicii Naționale "Serghei Lunchevici" din str. Mitropolit Varlaam, nr.78 mun. Chișinău	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării	contractant unic	1 618 027	3	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1999
14	Construcția sistemului de alimentare cu apă s. Chiriet-Lunga, r-nul Ceadr-Lunga	Primăria s. Chiriet-Lunga, r-nul Ceadr-Lunga	contractant unic	115 937	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2001
15	Alimentarea cu apă a locuitorilor din s. Mălăiești, Mălăieștii Noi, com. Bălăbănești	Primăria com. Bălăbănești, r-nul Criuleni	contractant unic	3 570 684	6	în execuție
16	Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare pentru evacuarea apelor uzate de la abatorul S.R.L. Floreni	S.R.L. Floreni	contractant unic	238 703	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2001
17	Sistem de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra, r-nul Orhei	Primăria com. Vatici, r-nul Orhei	contractant unic	5 662 212	10	în execuție
TOTAL				50 455 197		

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de

Semnătura:



(semnătura)

Nume:

Denis TURCAN

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	4	5	7
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Ateliere de producere	m2	368	Proprie
2	Depozit tip deschis	m2	988	Proprie
3	Depozit tip închis	m2	305	Proprie
MECANISME				
1	MAN TGL 8.180	buc	1	Proprie
2	Iveco Ford	buc	1	Proprie
3	Mercedez AXOR 2528	buc	1	Proprie
4	Mercedes Sprinter 213 CDI	buc	1	Proprie
5	Mercedes Sprinter 311 CDI	buc	1	Proprie
6	TEREX HR 18	buc	1	Proprie
7	Komatsu PC 75 UU	buc	1	Proprie
8	CAT 432E	buc	1	Proprie
9	CAT 432E	buc	1	Proprie
10	CAT 307C	buc	1	Proprie
11	CAT 307C	buc	1	Proprie
12	Zil ГЯ 133	buc	1	Chirie
13	URAL ORB 2.5	buc	1	Chirie
14	URAL ORB 3AM	buc	1	Chirie
15	KAMAZ ORB 2.5	buc	1	Chirie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrări, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	4	5	7
UTILAJE				
1	Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
2	Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
3	Techodue PT160	buc	1	Proprie
4	-	buc	1	Proprie
5	Lombardini	buc	2	Proprie
6	FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
7	STIHL BT 150	buc	1	Proprie
8	Honda	buc	1	Proprie
9	Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
10	Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
11	-	buc	2	Proprie
12	-	buc	1	Proprie
13	-	buc	1	Proprie
14	-	buc	2	Proprie
15	Makita, Bosch	buc	4	Proprie
16	DeWalt	buc	1	Proprie
17	Einhell TC-RH 900	buc	1	Proprie
18	Einhell TC-ID 720E	buc	1	Proprie
19	Einhel TC-MX 1400-2E	buc	1	Proprie
20	Bosch PLT-2	buc	1	Proprie
21	DWT BH-850	buc	1	Proprie
22	Bosch PST 650	buc	1	Proprie
23	Stark AG2500	buc	3	Proprie
24	Stark AG850R	buc	3	Proprie
25	Stark AG750	buc	1	Proprie
26	Stark RH 1350	buc	1	Proprie
27	Stark RH 1110	buc	2	Proprie
28	Stark CD 12-2 Li-Ion	buc	1	Proprie
29	Hitachi DS 18DBSL	buc	1	Proprie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	4	5	7
30	Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
31	Hitachi G 23SW2	buc	1	Proprie
32	-	buc	2	Proprie
33	-	buc	2	Proprie
34	Mondial	buc	1	Proprie
35	Makita, Bosch	buc	4	Proprie
36	-	buc	4	Proprie
37	-	buc	1	Proprie
38	-	buc	1	Proprie
39	Makita, Bosch	buc	3	Proprie
40	-	buc	3	Proprie
41	2H-10KJI	buc	1	Proprie
42	3H-5JI	buc	1	Proprie
43	H3-3	buc	1	Proprie
44	PH3-3000C	buc	1	Proprie
45	Bosch GR500	buc	1	Proprie
46	Kapro 603-5M	buc	1	Proprie
47	Silverline	buc	1	Proprie
48	Bosch	buc	1	Proprie
49	-	buc	1	Proprie
50	-	m2	500	Proprie
51	-	m2	700	Proprie

Semnătura:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:




(semnătura)

TURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL
CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**




DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării ”Valdcongrup” SRL la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat în FORUMARUL F3.11 ”Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului” se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator CAT 432 – an. 2011

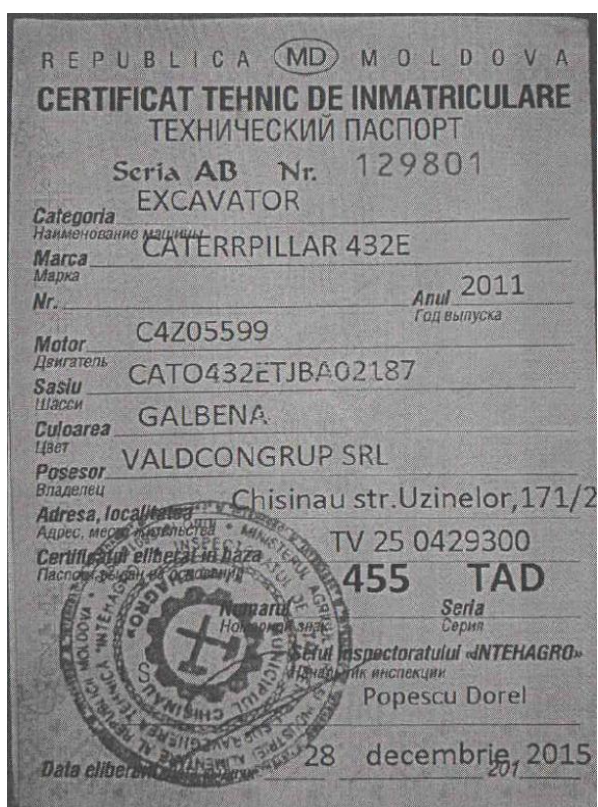

**Figura 2. Certificat de înmatriculare
CAT432E**



Figura 1. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E

2. Buldoexcavator CAT 432 E – an. 2008


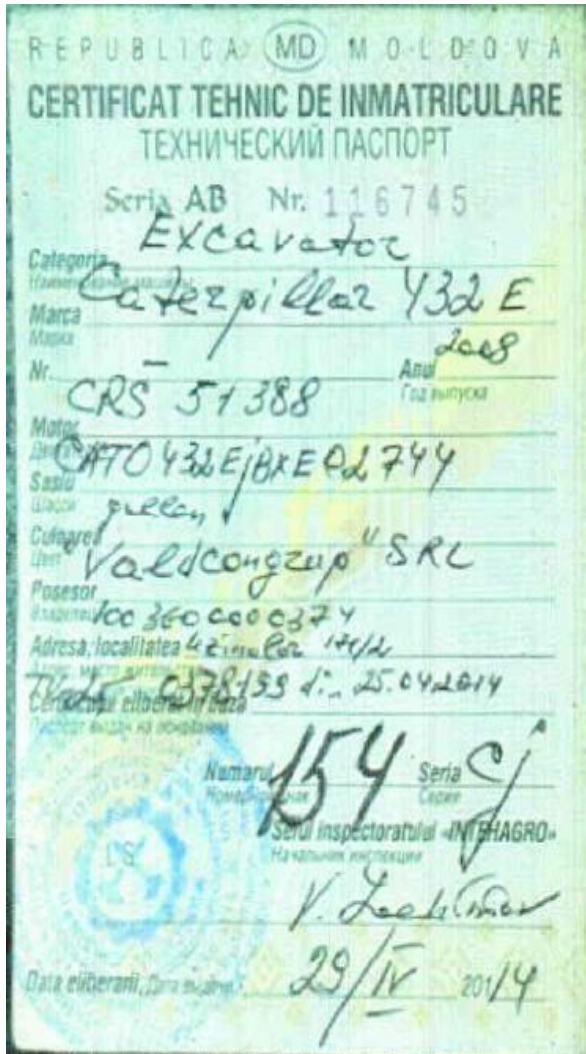


Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

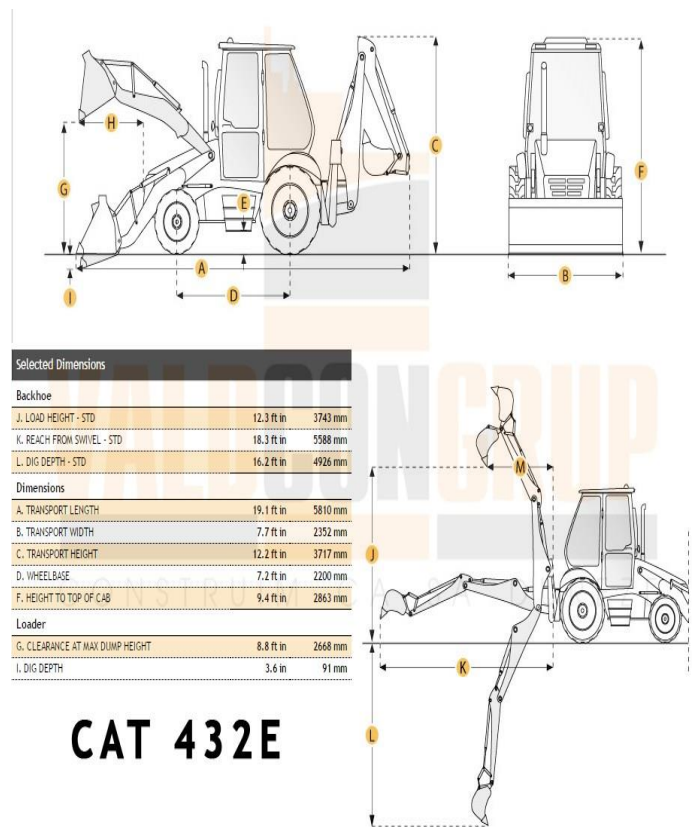

CAT 432E

Figura 4. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 6. Vedere Nr.1 CAT432E




3. Excavator CAT 307C – an. 2008

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Тамонія

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pașaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможи

Primit
Получил

Drăgule Marian

Stampa de imprimare: 01/01/2016, 10:00:00, 1.54/0.02/0.02

I 82


Figura 7. Adeverință CAT 307C



Figura 8.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 9. Vedere Nr.2 CAT307C



INVOICE

MORRIS LESLIE PLANT LTD

Errol Airfield, Errol, By Perth, PH2 7TB

Telephone (01821) 642940

Fax (01821) 641053

THE MORRIS LESLIE GROUP

Vat Registration No GB 945 9111 10

Plant Sales, Modular Building Sales and Self Drive Hire

Invoice to:

Waldcong SRL
Republica Moldova
Or chisinau
Sos. Muncesti 605

Deliver to:

VAT No: 0306389 cod TVA

Account Number	Proforma Invoice	Invoice Date	Customer Order No	Hire Reference
	Proforma	12/01/2011		
Description	Amount	VAT Rate	VAT Amount	Total Value
To sale of: TEREX HR18 EXCAVATOR(2004)(4R043) sn: 180/1693 STKP0633 Phone number 0037322507132	£10,910.00	exempt	£0.00	£10,910.00

Bank details:

Royal Bank of Scotland
Rakeld Road, Perth, PH1 5RB
rt Code: 83 47 00
c No: 10419189 A/c Name: Morris Leslie Plant Ltd
ban: GB94RBOS83470010419189
C RBOS GBIL

Terms And Conditions

Payment is due upon presentation of invoice

All plant and equipment hired out is subject to the Model conditions of the Construction Plant-Hire Association

All used equipment is sold as seen, tried and approved

no warranty given or implied

the title in these goods does not pass until your payment

been cleared through our bank

interest is added to overdue accounts at the rate of 2% month

goods carried under R.H.A. Conditions (1982)

as Oil must not be used as Road Fuel

NETT

TOTALS

£10,910.00	exempt	£0.00	£10,910.00
------------	--------	-------	------------

Figura 6 Vederea Nr. 2 TERLEX HR18

5. Excavator KOMATSU PC75UU-2- an. 2004



Figura 14. Adeverință KOMATSU PC75UU-2



Figura 7. Vedere Nr.1 KOMATSU PC75UU-2



Figura 16. Vedere Nr.2 KOMATSU PC75UU-2



6. Autobasculantă 26 tone - Mercedes AXOR 2528- an. 2005



Figura 17. Certificat de înmatriculare MB AXOR 2528



Figura 8. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528



Figura 9. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 20. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



7. Autobasculantă 7.5 tone – Man TGL 8.180 – an. 2011

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE PROVIZORIU (MD)

REPUBLICA MOLDOVA

A IDA571 B 2011

J1 N2

J2 BA 10

D1 MAN D2 <

D3 TGL 8.180 4X2 BB

E WMAN03ZZ0BY261046

E1 X

E2 WMAN03ZZ0BY261046

G 4400 F1 7490

P1 4580

P3 MOTORINĂ

R ALB

Q X

I 02.11.2018

Semnătura autorității

B 00097403




C1.1 "VALDCONRUP" S.R.L.

X

C1.2 1009600000374

C1.3 MDA CHIȘINĂU

C4 PROPRIETAR

Z ASP

X1 X

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă

IDNV

(Codul vehiculului în RST)

RADIERE DIN EVIDENȚĂ SAU DIN EXPLOATARE

Motivul

Data radierii

Semnătura autorității

L.Ș.

Notă: Certificatul servește pentru circulația vehiculului pe teritoriul țării, precum și pentru scoaterea vehiculului din țară, în caz de export.

Figura 21. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 22. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

8. Autobasculantă 18 tone - IVECO – an. 2002

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE REGISTRATION CERTIFICATE		REPUBLICA MOLDOVA (MD)	
03MTH 189918		03MTH 189918	
CPJ238		"VALDCONRUP" SRL	
A Numărul de înmatriculare Registration number	IVECO FORD	C Deținătorul Belonging	
D Marca, modelul Mark, Model	CAMION		
B Tipul vehiculului Type of the vehicle	2002	Număr de identificare IDNP/IDNO	40593091
Anul fabricației Production year	C11000030271	Raionul (orașul) District	CHIȘINĂU
Motorul Nr. Engine		Localitatea Location	HUNCEȘTI
Caroseria Nr. Body No.	ZCFALTJ0102	Strada Street	605
E Șasiul Nr. Chassis		Casa House	bl. ap.
Culoarea Color		BET CHIȘINĂU NR.6	
5880		Eliberat de Issued by	
		La data de Date of issue	
		Semnatura și stampila Signature and mark	
		MENTIUNI MENTIONS:	

Figura 23. Certificat de înmatriculare IVECO FORD



Figura 24. Vedere Nr 1 IVECO-FORD


9. Bus 2.5 tone - Mercedes Sprinter 213 CDI an. 2002



Figura 25. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 26. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

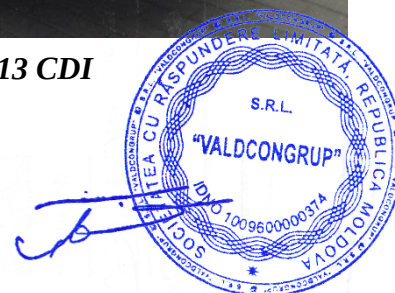

10. Bus 2.5 tone - Mercedes Sprinter 311 CDI – an. 2006



Figura 27. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 28. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI



UTILAJE

În vederea confirmării posesiei utilajelor prezentate în FORMULARUL F3.12 "Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului", "Valdcongrup" SRL vă invită la sediul întreprinderii, unde sunt depozitate acestea.

Cu respect,
Director S.C."VALDCONGRUP" S.R.L
Țurcan Denis

