

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, rețele electrice 0,4/6/10kV, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfint, bd. Negruzzi, str. V. Alecsandri mun.Chîșinău

2. Номер и дата договора № 15/01408/001 от 31.07.2015

3. Наименование/фамилия бенефициара Главное управление общественного транспорта и путей сообщения мун.Кишинэу

4. Адрес бенефициара муниципий Кишинев, Ул. Сергея Лазо, 18

5. Страна Республика Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора Подрядчика
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор, лей	выраженная в эквиваленте в долларах США
a) первоначальная (на момент подписания договора)	<u>63 170 766,50</u>	<u>3 367 563,00</u>
b) финальная (на момент завершения договора)	<u>55 782 609,55</u>	<u>2 973 709,00</u>

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: не было никаких споров

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору 22 месяца

b) эффективно выполненный 22 месяца

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром Дополнительное соглашение прилагается №1 от 22.12.2016.

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 14.12.18

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки без возражений.

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

без возражений.



Дата заполнения: _____

Подписано: _____

Фамилия/имя: Ени Мария

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: S.A."COMPANIA ELECTRICA"



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/15. privind achiziția prin Licitație Publică

08 iulie 2015

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 15/01408, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 15/01408/001 din data de 03.07.2015, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Igor Gamrețki, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrica", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă pînă la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații inginerești și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului


Antreprenorul se obligă să execute lucrările reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfînt mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2).
Cod CPV: 45222000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfașurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 63 170 766, 50 lei (șaiszeci și trei milioane o sută șaptezeci mii șapte sute șaiszeci și șase lei, 50 bani). (inclusiv TVA).
- 4.2. Lucrările se vor executa în II etape:
I. Etapă – 30 000 000 lei pînă la 31.12.2015.
II. Etapă – 33 170 766, 50 lei pînă la 31.12.2016.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd grîmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, acestea se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice și reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate



- din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) Extrasul eliberată de Camera Înregistrării de Stat;
 - c) Licența eliberată de Camera de Licențiere;
 - d) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - e) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - f) caietele de sarcini (specificațiile tehnice).
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

DGTPCC

Adresa: Mun. Chișinău, str. S.Lazo 18.

Tel./Fax: 022-20-46-90,
fax: 022-20-46-58,

Denumirea: Trezorăria de stat

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

TREZMD2X

Bancar:

Cont de decontare: 220114071670184 art. 132.11

Cod fiscal: 10076001009657 *€ 30000000 lei*

“ ANTREPRENOR ”:

SA “Compania Electrica”

Adresa: Mun. Chișinău, str. Plaiului 2.

Tel./Fax: 022-50-50-47,
fax: 022-52-15-94

Denumirea: BC “Moldindconbank” SA

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

MOLDMD2X309

Bancar:

Cont de decontare: 222492500705

Cod fiscal: 1003600092733

16. Semnăturile părților


“ BENEFICIAR ”:


Director:  Igor GAMREȚKI

Șef-interimar DEF:  D. Popescu

“ ANTREPRENOR ”:

Director:  Maria ENI

Contabil: 





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr. 1. la Contractul nr. 26/15 din 08 iulie 2015.

22 decembrie 2016.

mun. Chișinău

Prezentul Acord este semnat astăzi 22 decembrie 2016, între Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a Consiliului municipal Chișinău, cu sediul în mun. Chișinău str. S. Lazo 18, reprezentată de Directorul Igor Gamrețki și

ICS „Compania Electrica” SA, cu sediu în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, reprezentată de Administrator Maria Eni, în scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 26/15 din 08 iulie 2015 privind executarea lucrărilor de reabilitare a utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt din mun. Chișinău, (obiect 3069 DV2), bd. Negruzii din mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri din mun. Chișinău (obiect 3073 DV2).

Prin prezentul Acord părțile contractante convin asupra următoarelor modificări ale punctelor 4.2. și 14.5. din Contractul de antrepriză nr. 26/15 din 08 iulie 2015, în baza demersului, notei informative, procesului-verbal al grupului de lucru cu privire la prelungirea termenului contractului:

- Se prelungeste termenul de executare și valabilitate a contractului până la 31.05.2017.

Prezentul Acord se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLATĂ ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

ICS „Compania Electrica” SA


DGTPCC

IDNO 1003600092733
MOLDMD2X309.
BC „Moldindconbank” SA.
IBAN MD20ML000000222492500705

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF Trezoreria de Stat
IBAN MD50TRPDAK222500B09746A6

Director  M. Eni

Director  I. GAMREȚKI

Șef interimar DEF  D. POPESCU



INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.12.2018

Obiectul „Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfin mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. Vasile Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2)” este executat în cadrul contractului nr. 26/15 din 08 iulie 2015.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 161-C/14 din 23.07.14, de către S.A. „Compania Electrica”

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14,12,2018, fiind formată din:

Președinte

Nistor Grozavu – viceprimarul municipiului Chișinău

Membri:

Vitalie Butucel – șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație

Oleg Caraman – șef adjunct al DGTP și CC

Veaceslav Buț – director al Î.M. „Lumteh”

Anatolii Aparatu – director adjunct al Î.M. „Lumteh”

Dorin Ciornii – director al Î.M. „RTEC”

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Sofroniuc Mihail – reprezentant S.A. „Compania Electrica”

Cebanu Viorel – diriginte de șantier S.A. „Compania Electrica”

Ion Paciu – director adjunct I.M.P. „Chișinăuproiect”

Anatolie Brusnic – proiectant I.M.P. „Chișinăuproiect”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități au fost executate, recepționate puse în funcțiune, Anexă 18 file;

b) lucrările au fost complet terminate la data de 05 aprilie 2017;

c) observațiile comisiei de recepție finală sânt prezentate în lista-anexă nr. 1;

d) documentația tehnică de execuție a obiectului au fost completate;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului în posesia utilizatorului;



f) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de
terminarea ei până în prezent;

g) valoarea obiectului este de 55 782 609,55 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

admiterea recepției finale.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările corespund din punct de vedere
tehnic și calitativ cerințelor caietului de
sarcini și proiectului tehnic.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de primit în recepție finală.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total
de 21 file, a fost încheiat astăzi 14.12.18 la în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Nistor Grozavu

Membri: Vitalie Butucel

Oleg Caraman

Veaceslav Buț

Anatolii Aparatu

Dorin Ciornii

Sofroniuc Mihail

Cebanu Viorel

Ion Paciu

Anatolie Brusnic

(numele, prenumele, semnătura)

"14" 12 2018

L.Ș.



Anexa nr.1
la proces verbal de recepție
finală nr.1 din 14.12.2018

„Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd.
Ștefan cel Mare și Sfîn mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd .Negruzzi mun. Chișinău
(obiect 3071 DV2), str. Vasile Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2)“

Observațiile comisiei de recepție finală

NU SUNT

Comisia de recepție finală:

Președinte: *Nistor Grozavu*

Membri: *Vitalie Butucel*

Oleg Caraman

Veaceslav Buț

Anatolii Aparatu

Dorin Ciornii

Sofroniuc Mihail

Cebanu Viorel

Ion Paciu

Anatolie Brusnic

(numele, prenumele, semnătura)



Orașul Chișinău
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
Obiectivul Reconstrucția rețelelor de contact pe bd. Stefan cel Mare
Data 05.04.2017

ACT Nr. 05/04-2017
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc Veaceslav
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Melnic Anatolie
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc Mihail
(funcția, nume, prenume)
a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Reconstrucția rețelelor de contact pe bd. Stefan cel Mare, RC.
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-RC elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"
(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect nu-s.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.1).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală nu-s.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.1.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 22 164 416, 45 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „05” 04 anul 2017.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
(evaluare)



[Signature]
(semnatura, nume, prenume)

Primit:

[Signature]
(semnatura, nume, prenume)

(semnatura, nume, prenume)

data _____



Oraşul Chişinău
Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău

Obiectivul Reconstrucţia reţelei electrice REE pe str. V. Alexandri

Data 02.06.2016

ACT Nr. 02/06/2016

de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc Veaceslav
(funcţia, nume, prenume)

întreprinderea de exploatare Noviŝotchi Alexandru, Puscin Ion
(funcţia, nume, prenume)

organizaţia de electromontaj Sofroniuc Mihail
(funcţia, nume, prenume)

a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Reconstrucţia reţelei electrice REE pe str. V. Alexandri :
(lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)

La PT-25: reţele de alimentare în cablu a CC-11910, CC-11911, CC-11912, la PT-263: reţele de alimentare în cablu a CC-11907, CC-11906, CC-11908, CC-11909, la PT-61: reţele de alimentare în cablu a CC-11967, CC-251A, CC-11969, CC-11970, la PT-46: reţele de alimentare în cablu a CC-11962, CC-11963, CC-11964, CC-11965, CC-11966, CC-11960, CC-11960/1, CC-11961, CC-11959, la PT-430: reţele de alimentare în cablu a CC-11955, CC-11954, CC-11953, CC-11956, CC-11957, CC-11958, la PT-787: reţele de alimentare în cablu a CC-11952, CC-11951, CC-11947, CC-11948, CC-11950, CC-11944, CC-11945, CC-11946, CC-11943, CC-11942, la PT-134: reţele de alimentare în cablu a CC-11938, CC-11937, CC-11936, CC-11935, CC-11934, CC-11939, CC-11940, CC11941,

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3073-REE elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 6782120,39 lei.

CONCLUZIA COMISIEI


8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „06” 06 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
(evaluare)



Primit:



data _____

data _____ 2

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe str. V. Alexandri
 Data 22.04.2016

ACT Nr. 22/04-2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc Veaceslav
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Crihan Vasile
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc Mihail
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

- La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 2(Nº118), DCR-3(Nº37), DCR-4(Nº28), DCR-5(Nº54), DCR-6(Nº149).
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
- Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3073-DCR elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

- Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
- Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.

- Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
- Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
- Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 4 245 642,68 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

- Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „02” 06, anul 20 16.

- Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

bine
 (evaluare)

Președinte:



09-06-2016

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/16-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-1 (№52 – str. M. Viteazul)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-1 elaborat de _____

IMP "CHISINAUPROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.


3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1181240,36 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)



data 26.12.2016

data _____

Orașul Chisinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chisinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 2(Nº176 – str. T. Ciorba)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-2 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1038 603,95 lei.


CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:

 (semnătura, nume, prenume)
 data 26.12.2016


 (semnătura, nume, prenume)

Primit:
bine
 (evaluare)

 (semnătura, nume, prenume)
 (semnătura, nume, prenume)
 data _____

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/3-2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 3(Nº51 – str. Mt. P. Movilă)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-3 elaborat de _____

ÎMP "CHIŞINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.


7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 983 012,44 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite



data 26.12.2016

data _____

Orașul Chisinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chisinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/4-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 4(Nº50 – str. S. Lazo)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-4 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric _____ sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1070549,27 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____



data 26.12.2016

data _____

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ştefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/5-2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 5(№152 – str. Sf. Tării)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-5 elaborat de _____

ÎMP "CHIŞINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1159414,68 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____




(semnatura, nume, prenume)

data 26.12.2016



(semnatura, nume, prenume)

data _____



Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/16-2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 6(Nº49 – str. M. Cibotari)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-6 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНІП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1100 003, 66 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНІП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____



Predat:

(semnatura, nume) _____
 (semnatura, nume) _____
 «COMPANIA ELECTRICA» S.A.

data 26.12.2016

Bine
 (evaluare)
 Primit:
 (semnatura, nume) _____
 (semnatura, nume) _____



data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/7-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 7(Nº48 – str. Mt. Bănulescu-Bodoni)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-7 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric _____ sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)


a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 85994,87 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite



data 26.12.2016

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ştefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/8-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 8(Nº46 – str. A. Puşkin)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-8 elaborat de _____

ÎMP "CHIŞINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНИП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1146540,86 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)



data 26.12.2016

data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/9-2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 9(Nº174 – str. V. Pîrcălab)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-9 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 558 632,55 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.


9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)



(semnătura, nume, prenume)



(semnătura, nume, prenume)

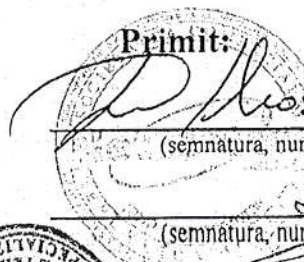

(semnătura, nume, prenume)

(semnătura, nume, prenume)

data 26.12.2016

data _____

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/10-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 10(Nº45 – str. M. Eminescu)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-10 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"
 (organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНІП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 998 343,13 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНІП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)



Predat:


(semnătura, nume, prenume)



Primit:

(semnătura, nume, prenume)

(semnătura, nume, prenume)

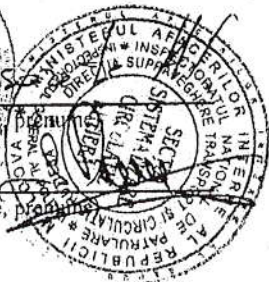

data 26.12.2016

data _____

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ştefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/11-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 11(№44 – str. V. Alexandri)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-11 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 998 340,26 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____



Predat:



data 26.12.2016

Bine
 (evaluare)

Primit:



(semnatura, nume, prenume)

(semnatura, nume, prenume)

Data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/12-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 12(Nº43 – str. Armeneacă)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-12 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂUPROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 987 046,46 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)



Predat:

(semnatura, nume, prenume)

data 26.12.2016




Primit:

(semnatura, nume, prenume)

(semnatura, nume, prenume)

data



Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/13-2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 13(Nº173 – str. Bulgară)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-13 elaborat de _____

ÎMP "CHIŞINĂU PROIECT"
 (organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
 6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
 7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 529208,22 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.
9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

(evaluare)

Primit:

(semnatura, nume, prenume)

(semnatura, nume, prenume)

data

Predat:

(semnatura, nume, prenume)

data 26.12.2016



Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/14-2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 14(№42 – str. Tighina)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-14 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1054942,41 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____



Predat:

(semnatura, nume propriu)

data 26.12.2016



Primit:

(semnatura, nume propriu)

data _____



Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ştefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/15-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-15(Nº175 – str. Tricolorului)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-15 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 542.532,05 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.


9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____
 (evaluare)



Predat:

(semnatura, nume, prenume)

data 26.12.2016



Primit:

(semnatura, nume, prenume)

(semnatura, nume, prenume)

data _____

REPUBLICA



MOLDOVA

Consiliul municipal Chișinău

**Direcția generală
transport public și căi de comunicație**

Chișinău, MD 2004, str. S. Lazo, 18, Tel 20-46-90, Fax 20-46-66, 20-46-58
E-mail: dirtrans@mail.md

La nr. 37 16-2016 nr. 61-2-540
din _____

ORGANELOR COMPETENTE

Scrisoare de recomandare

S.A. „Compania Electrica” a executat lucrările de reabilitare a utilităților str. V. Alecsandri, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințele de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă S.A. „Compania Electrica” beneficiarilor pentru colaborare.

Șef al Direcției



Igor Gamrețki



ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

3. 1. Наименование и предмет договора Lucrări privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or.Rezina, r-l Rezina

2. Номер и дата договора № 57 от 10.04.2017

3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия г.Резина

4. Адрес бенефициара г.Резина, ул.27 Августа, № 1

5. Страна Республика Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора Подрядчика
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор, лей	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	<u>5 404 362,95</u>	<u>278 611,31</u>
б) финальная (на момент завершения договора)	<u>5 352 201,26</u>	<u>275 922,22</u>

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: не было никаких споров

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору 5 месяцев

б) эффективно выполненный 4 месяца

с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром -

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 1 от 12.12.2017

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки Возражения не были выдвинуты.

12. Другие аспекты, на основании которых oferantul подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Объекты были выполнены качественно

Дата заполнения:

Подписано: _____

Фамилия/имя: Ени Мария


Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: S.A. "COMPANIA ELECTRICA"





ACHIZIȚII PUBLICE



2017-0000007 863

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54 privind achiziția prin Licitație Publică

10 aprilie 2017

or.Rezina

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitației Publice nr. 17/00570 din 17 martie 2017 publicată în BAP Nr.16 din 24 februarie 2017, între Primăria or.Rezina, cu sediul în or.Rezina str. 27 August ,nr.1 telefon: 025421653, 025421650, fax: 02542844, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.23580 din 13.07.2011, reprezentat prin primarul or.Rezina dl. Tatarov Simion, în calitate de Beneficiar, și SA "Compania Electrică", cu sediul în mun. Chișinău, str. str.Plaiului, nr.2 , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600092733,, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 015041 seria A MMII din 22.02.2005 eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin directorul Eni Maria , în calitate de antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări privind implementarea măsurilor de eficiența energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-l Rezina, Cod CPV: 45316110-9**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este în furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;



- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

2. Valoarea Lucrărilor privind implementarea măsurilor de eficiența energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-l Rezina

ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5404362,95 (cinci milioane patru sute patru mii trei sute șasezeci și doi lei 95 bani (inclusiv TVA))**.

- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.



- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.


15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

<p>“ BENEFICIAR”:Primăria or.Rezina</p> <p>or.Rezina str.27 August ,nr.1</p> <p>025421653,025421648</p> <p>Min.Fin.Trez.de Stat</p> <p>or.Rezina</p> <p>c/b 226639</p> <p>TREZMD2X</p> <p>IBAN</p> <p>MD27TRPDBB30000001094700</p> <p>c/f 1007601006391</p>	<p>“ ANTREPRENOR”: SA”Compania Electrica”</p> <p>Adresa: Mun. Chișinău, str. Plaiului, nr. 2</p> <p>Tel./Fax: 022505047</p> <p>Denumirea BC „Moldindconbank,,SA, fi-la</p> <p>Băncii: Centru</p> <p>Adresa Mun. Chișinău, str.</p> <p>Băncii: Armenească, nr.38</p> <p>Cod MOLDMD2X</p> <p>Bancar:</p> <p>Cont de MD07ML000000222400901705</p> <p>decontare:</p> <p>Cod fiscal: 1003600092733</p>
--	---

16.Semnăturile părților



“ BENEFICIAR”:

 S.Tatarov

L.Ș.

“ ANTREPRENOR”:



Eni Maria

L.



Investitor: Primăria or. Rezina

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 12.12 2017

Privind lucrarea „Măsurile de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina”, executată la obiectul Sistemul de Iluminat public din or. Rezina, în cadrul contractului nr.57 din 10.04.2017, încheiat între primăria or. Rezina și SA „Compania Electrică”, din mun. Chișinău, str. Plaiului, nr.2, pentru executarea lucrărilor „Măsurile de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.15, eliberată de primăria or. Rezina la 17.05.2017 cu valabilitate până la 17.04.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul : 12.12.2017 _____ 2017, fiind formată din:

Tatarov Simion – **Președintele comisiei**, primarul or. Rezina

Membrii comisiei:

Balan Ion – manager-șef Î.M., Servicii Comunal Locative, Rezina

Morari Pavel – specialist în CGCD, arhitect primăria or. Rezina,

Gîncu Gheorghe – viceprimarul or. Rezina, specialist atestat în construcții,

Movileanu Alexandru – responsabil tehnic,

Iftodi Ala – contabil-șef primăria or. Rezina,

Salii Mihai – diriginte de șantier SA „Compania Electrică”,

Druță Petru – consilier al consiliului orașenesc Rezina

3. Au mai participat la recepție :

Ghenadii Moiseenco – șeful secției Situații Excepționale Rezina,

Sofroniuc Mihai – director general SA „Compania Electrică”, antreprenor.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Examinarea lucrărilor documentației de execuție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executatrea totală a lucrărilor de construcție conform documentației de proiect, regulamentelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: _____, adresa poștală: **or. Rezina**, _____, compus din următoarele construcții: Sisteme de iluminat, suprafața la sol: - **m2**, suprafața totală interioară - **m** numărul de etaje – _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat procesul verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5, a fost încheiat astăzi 12.12.2017 la 11.00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:



Președintele

Simion Tatarov

Membrii comisiei

Balan Ion _____

Morari Pavel _____

Gîncu Gheorghe _____

Movileanu Alexandru _____

Iftodi Ala _____

Salii Mihai _____

Druță Petru _____

10. Lucrarea „Măsurile de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului iluminat public din or. Rezina”, este

TRANSMIS:
EXECUTANTUL:

_____ 2017
Sofroniuc Mihai



PRIMIT:
INVESTITORUL:

_____ 2017
Tatarov Simion

Anexa nr.1 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor

nr. ____ din _____ 2017

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Președintele comisiei



Simion Tatarov

Simion Tatarov

Responsabil tehnic

Alexandru Movileanu

Alexandru Movileanu



Anexa nr.2 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. ___ din ____ .2017

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate.


A large section of the document is crossed out with a large, diagonal scribble, indicating that the list of technical documentation items has not been executed.

Președintele comisiei

Simion Tatarov

Responsabil tehnic

Alexandru Movileanu



Anexa nr.3 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. ___ din ____ .2017

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat
prevederile proiectului.

A large section of the document consisting of horizontal lines, which has been completely crossed out with a large, diagonal scribble, indicating that the list of work items is empty or has been removed.

Președintele comisiei



Simion Tatarov

Responsabil tehnic



Alexandru Movileanu



RAIIONUL REZINA
PRIMĂRIA ORAȘULUI REZINA
MD 5400, or. Rezina, str. 27 August 1
Tel. 2-28-44, tel./fax 2-16-48



РЕЗИНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ Г. РЕЗИНА
МД 5400, г. Резина, ул.27 Августа 1
Тел.2-28-44, тел.факс 2-16-48

nr. 350 din 03.03 2018

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria orașului Rezina, vă informează că SA"COMPANIA ELECTRICA", în urma executării lucrărilor la obiectivul "Lucrări privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-nul Rezina", a dat dovadă de profesionalism și calitate cu încadrarea în termenii contractuali stabiliți.

În cadrul perioadei de efectuare a lucrărilor, personalul de conducere și de execuție al SA"COMPANIA ELECTRICA" a dovedit promptitudine și competență relațională, cu tratarea flexibilă a sarcinilor impuse și totodată cu respectarea strictă a cerințelor înaintate și încheierea obiectivului cu succes.

Sperăm la o bună conlucrare și pe viitor.

Recomandăm SA"COMPANIA ELECTRICĂ" pentru capacitatea tehnică și experiența de care a dat dovadă în execuția lucrărilor de profil indiferent de mărimea și complexitatea acestora

Primarul orașului Rezina



Simion Tatarov



ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

2. 1. Наименование и предмет договора Reabilitarea capitala a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor", mun.Chisinau

2. Номер и дата договора № 32/18 от 31.07.2018

3. Наименование/фамилия бенефициара Главное управление общественного транспорта и путей сообщения мун.Кишинэу

4. Адрес бенефициара муниципий Кишинев, Ул. Сергея Лазо, 18

5. Страна Республика Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора Подрядчика
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор, лей	выраженная в эквиваленте в долларах США
a) первоначальная (на момент подписания договора)	<u>5 682 875,08</u>	<u>342 771,40</u>
b) финальная (на момент завершения договора)	<u>5 585 255,00</u>	<u>336 883,30</u>

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: не было никаких споров

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору 6 месяцев

b) эффективно выполненный 2 месяца

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром -

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ находится в процессе исполнения

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки находится в процессе исполнения.

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах без возражений.



Дата заполнения: _____

Подписано: _____

Фамилия/имя: _____

Ени Мария

Должность в рамках фирмы: _____

Директор

Наименование фирмы и печать: _____

S.A. "COMPANIA ELECTRICA"



ACHIZIȚII PUBLICE

18/02146/001.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32/18. privind achiziția prin Licitație Publică

Reabilitarea capitală a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor" mun. Chișinău.

Cod CPV: 45316000-5.

31 iulie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 18/02146, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 18/02146/001 din data de 19.07.2018, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Vitalie BUTUCEL, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
SA "Compania Electrica", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații inginerești și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de: Reabilitarea capitală a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor" mun. Chișinău.

Cod CPV: 45316000-5. în conformitate cu prevederile proiectului tehnic de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează



următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5682875,08 lei** (cinci milioane șase sute optzeci și două mii opt sute șaptezeci și cinci lei, 08 bani), inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală și de terminare a lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului prin majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



- nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la **02 mai 2019**.



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor
ICS „Compania Electrica” SA

IDNO 1003600092733
MD07ML000000222400901705
BC ”Moldindconbank” SA
Sucursala Centru
MOLDMD2X309

Autoritatea contractantă
DGTPCC

IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF-TR Centru Chișinău
IBAN MD90TRPDAK312120B09746AB



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate
 pe luna decembrie 2018

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) "Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie"	1007601009657
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract № 32/18 din 31 iulie 2018
 Denumirea obiectului de executat si adresa
**Reabilitarea capitala a iluminatului public din parcul "Valea
 Trandafirilor", mun.Chisinau**

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorului general -
 beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2018			
Reabilitarea capitala a iluminatului public din parcul "Valea Trandafirilor", mun.Chisinau	4 654 379,17	535 069,94	
TVA 20%	930 875,83	107 013,99	
TOTAL spre achitare incl. TVA	5 585 255,00	642 083,93	

ANTREPRENOR GENERAL

(functia, numele, semnatura)

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

an. 2018
