

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/299**
privind achiziția prin Licitație Publică"27" Junie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/02284 din 14.06.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.A. "Lusmecon" cu sediul în mun. Chişinău, str. Uzinelor 205/1, MD-2023, tel. 022455554, fax. 022473922, înregistrat Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul general dl Alexandru Ghilaş în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Telenești, Cod CPV: 45233141-9** în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

Ușă pe 12

- necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
 - 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **59 699 044,74 (cincizeci și nouă milioane șase sute nouăzeci și nouă mii patruzeci și patru lei 74 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "24" unie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.A. "Lusmecon"
MD 2023 mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/ IBAN MD53AG000022517010131321
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083


16. Semnăturile părților

Director general
Gheorghe Cuzneac



"Antreprenor general"
Director general
Alexandru Ghilaș

LUSMECON
2018



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 5 din 29 Mai 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Telenești, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Telenești, executate în cadrul contractului nr.11-18/299 din 27.06.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 02.07.2018, nr.2 din 25.10.2018, nr.3 din 03.12.2018, nr.4 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SA. „Lusmecon” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 27-29 Mai 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotrușă* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
I.Stegărescu - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Telenești
V.Macari - director S.A. „Drumuri Orhei”
I.Zgardan - S.A. „Drumuri Orhei” sector Telenești
A.Ghilaș - director SA „Lusmecon”
V.Morgoci - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SA. „Lusmecon”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iunie 2018* sfârșitul lucrărilor *aprilie 2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **57,12 mln. lei, inclusiv LCM - 55,54 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **60639410,29 lei, inclusiv LCM - 59650507,52 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Miercuri 29 Mai 2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația necomunităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan



I. Stegărescu

V. Morgoci

I. Zgardan

A. Ghilaș

V. Morgoci



Primar or. Telenesti, inclusiv s. Mihălaşa
- V. Lelie

Primar s. Codru Nou Golovataia

Primar s. Băneşti, inclusiv Băneştil Vechi
- V. Popovici

Primar s. Coroboceni

Primar s. Buda - V. Drăgan

Primar s. Căşla - I. Bă

Primar s. Cişluţeni - A. Cişlaru

Primar s. Ineşti - L. Manol

Primar s. Hirişeni - I. Petica

Primar s. Ghiliceni, inclusiv
- M. Vleju

Primar s. Leuşeni - A. Paşat

Primar s. Negureni - G. Munteanu

Primar s. Mîndreşti, inclusiv s. Codru
- V. Socolovschi

Primar s. Nucăreni - M. Ombun

Primar s. Ordaşeni - Moldovan

Primar s. Ratus, inclusiv s. Mîndreşti
- T. Ţurcanu

Primar s. Pistruieni - M. Mihalcenco

Primar s. Sărăteni - I. Puşgăra

Primar s. Brînzanii Noi, inclusiv Brînzanii
Vechi - V. Teariuc

Primar s. Scorţeni - T. Verejan

Primar s. Bogzeşti - V. Ozun

Primar s. Suhuluceni, inclusiv
s. Ghermăneşti - M. Că

Primar s. Căzăneşti, inclusiv Vadul - Ieca
Vadul - Ieca Nou - V. Sîrbu

Primar s. Injăreni - S. Stoica

Primar s. Chişelniţa - Ciobanu


Primar s. Tîrşitei - I. Vălbure

Primar s. Chişcani Vechi, inclusiv Chişcanii
Noi - A. Aburceanu

Primar s. Verejani - S. Bîrcă

Primar s. Văsieni - Gh. Morgoc

Primar s. Zgărdeşti - Ş. Roşca



SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-ul Telenеști

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|---|
| | Fară obiecții |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Președinte V.Cotruța



V. Cotruța

Membri: Gh.Tonu

Gh. Tonu

I.Zgardan



G.Parvan



G. Parvan

A.Ghilaș



I.Stegărescu

I. Stegărescu

V.Morgoci

V.Macari



Lista cheltuielilor
Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice
amplasate teritorial în raionul Telenești

a.2019

TOTAL

mun. Chișinău

| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Lusmecon" Contract nr. 11-18/299 din 27.06.18 2018 | 59 650 507,52 59 650 507,52 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 1,53% | 912 652,77 912 652,77 |
| 3 | Întocmirea devizului ASD, martie 2018 | 76 250,00 76 250,00 |
| | TOTAL: | 60 639 410,29 |

Deviz: 57,12 mln. lei
 incl. LCM 55,54 mln. lei

Începutul lucrărilor
 Finalizarea lucrărilor

iunie 2018
 aprilie 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/2019 privind achiziția prin licitație deschisă

"14" unie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1556008050583-EV-1557748508528** din **04.06.2019**, între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.A. „Lusmecon”** cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, tel. 022473382, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaș în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Telenești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **64 661 853,14 (șaizeci și patru milioane șase sute șaizeci și una mii opt sute cincizeci și trei lei, 14 bani) cu TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans pînă la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301


Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general" S.A. "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/ IBAN MD53AG000022517010131321
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ





Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”
IDNO 1003600023559

Rep Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
internet: <http://www.asd.md>, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

06.08.2019 Nr. 08.04/2662

Către: **S.A. „Lusmecon”**
În atenția: Domnului Alexandru GHILAȘ, Director,
Subiect: Instrucțiuni pentru începerea lucrărilor
Referință: Contract nr. 06-14/220 din 14 iunie 2019

Lucrări de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzilor, amplasate teritorial în raionul Telenești.

Stimate Domnule Director,

În conformitate cu sub - clauza 1.1 a Contractului 06-14/220 din 14 iunie 2019, **Lucrări de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzilor, amplasate teritorial în raionul Telenești**, prin prezenta sunteți instrucți să **începeți** lucrările în cuantumul realocat, conform scrisorii MEI nr. 11-4991 din 02.08.2019 (*se anexează*).

Urmează să conlucrați cu Autoritățile Publice Locale, în vederea stabilirii de comun acord a segmentului de drum din cadrul sectorului solicitat inițial, cu executarea integrală a constructivului sistemului rutier, stabilit în caietul de sarcini, în limitele financiare conform anexei (*se anexează*).

Data de începere a lucrărilor menționate este **”06” august 2019.**

Termenul de execuție a contractului este de **4 luni**, calculat de la data începerii lucrărilor.

Director adjunct

Iurie PAȘA

Anexă la ordinul de începere a lucrărilor

Limitele
alocațiilor pentru reparația periodică a drumurilor naționale (în limitele localităților),
locale, comunale și străzi pe anul 2019

| Nr. crt | Denumirea drumurilor | Localitatea | Volumul alocațiilor, (mii lei) | Sursa de finanțare |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Raionul Telenești | | | | |
| 1 | Reparația unor străzi în localitate | or. Telenești | 2 035,92 | BS/MEI |
| 2 | Reparația unor străzi în localitate | s. Bănești | 703,39 ✓ | BS/MEI |
| 3 | Reparația unor străzi în localitate | s. Bogzești | 0,00 | BS/MEI |
| 4 | Reparația unor străzi în localitate | s. Brînzanii Noi | 0,00 | BS/MEI |
| 5 | Reparația unor străzi în localitate | s. Budăi | 542,19 ✓ | BS/MEI |
| 6 | Reparația unor străzi în localitate | s. Căzănești | 527,47 ✓ | BS/MEI |
| 7 | Reparația unor străzi în localitate | s. Chiștelnița | 922,63 ✓ | BS/MEI |
| 8 | Reparația unor străzi în localitate | s. Chițcanii Vechi | 610,95 ✓ | BS/MEI |
| 9 | Reparația unor străzi în localitate | s. Ciulucani | 417,98 ✓ | BS/MEI |
| 10 | Reparația unor străzi în localitate | s. Cișla | 0,00 | BS/MEI |
| 11 | Reparația unor străzi în localitate | s. Codrul Nou | 0,00 | BS/MEI |
| 12 | Reparația unor străzi în localitate | s. Coropceni | 391,70 ✓ | BS/MEI |
| 13 | Reparația unor străzi în localitate | s. Crăsnășeni | 314,28 | BS/MEI |
| 14 | Reparația unor străzi în localitate | s. Ghiliceni | 473,16 | BS/MEI |
| 15 | Reparația unor străzi în localitate | s. Hirișeni | 442,25 | BS/MEI |
| 16 | Reparația unor străzi în localitate | s. Inești | 644,46 | BS/MEI |
| 17 | Reparația unor străzi în localitate | s. Leușeni | 514,18 | BS/MEI |
| 18 | Reparația unor străzi în localitate | s. Mîndrești | 1 101,44 | BS/MEI |
| 19 | Reparația unor străzi în localitate | s. Codru, com. Mîndrești | 0,00 | BS/MEI |
| 20 | Reparația unor străzi în localitate | s. Negureni | 777,91 | BS/MEI |
| 21 | Reparația unor străzi în localitate | s. Nucăreni | 0,00 | BS/MEI |
| 22 | Reparația unor străzi în localitate | s. Ordășei | 0,00 | BS/MEI |
| 23 | Reparația unor străzi în localitate | s. Pistruieni | 0,00 | BS/MEI |
| 24 | Reparația unor străzi în localitate | s. Ratuș | 0,00 | BS/MEI |
| 25 | Reparația unor străzi în localitate | s. Sărătenii Vechi | 698,76 | BS/MEI |
| 26 | Reparația unor străzi în localitate | s. Scorțeni | 677,39 | BS/MEI |
| 27 | Reparația unor străzi în localitate | s. Suhuluceni | 371,19 | BS/MEI |
| 28 | Reparația unor străzi în localitate | s. Ghermănești, com. Suhuluceni | 0,00 | BS/MEI |
| 29 | Reparația unor străzi în localitate | s. Tîrșiței | 411,92 | BS/MEI |
| 30 | Reparația unor străzi în localitate | s. Țințăreni | 493,67 | BS/MEI |
| 31 | Reparația unor străzi în localitate | s. Văsieni | 370,61 | BS/MEI |
| 32 | Reparația unor străzi în localitate | s. Verejeni | 849,27 | BS/MEI |
| 33 | Reparația unor străzi în localitate | s. Zgărdești | 0,00 | BS/MEI |
| Total pe raionul Telenești: | | 33 | 14 292,72 | |

[Signature]



Aprob.

PROCES - VERB
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21 din 29 ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Telenești, conform Programului anului 2019 (zona centru)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Telenești, executate în cadrul contractului nr. 06-14-220 din 14.06.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor. or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 23-29 ianuarie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte I. Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh. Ionu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
S. Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
I. Ciabani - șef interimar, secția construcții arhitectură gospodărie comună și drumuri al Consiliului Raional Telenești
I. Macari - director S.A. „Drumuri Orhei”
I. Zgardan - S.A. „Drumuri Orhei” sector Telenești
A. Ghilay - director S.A. „Lusmecon” - antreprenor
I. Morgoci - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Prima - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu fără rezerve și poate fi dată în folosință

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Lusmecon”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor 11 ianuarie 2019 sfârșitul lucrărilor decembrie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu grosimea H = 15 cm

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, h 10 cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H 20 cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H 18cm
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H 6,0 cm
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II 2 3, cu grosimea H 4,0cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, h 10 cm
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H 28cm(50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H 6,0 cm
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II 2 3, cu grosimea H 4,0cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald până la 100% din suprafața totală)
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea H 5,0 cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - 1694419,77 lei, inclusiv LCM - 16604392,56 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective
6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi 11.06.2020 în 6 exemplare
- Anexe
- 1 Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente lucrării de întocmire a devizelor - întreținerea beneficiarului
 - 2 Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz (2020) - file inclusiv localitățile fără obiectiv

Comisia:

Președinte

Membri



Gh. Tomu

1 Zgurdan

S. Godiac

A. Ghilay - antreprenor

I. Ciobanu

I. Morgoci

I. Macari



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21 din 29 01 2020.
r-ul Telenеști

Primar or. Telenеști V. Kefc

Primar s. Bănești - V. Popovici

Primar s. Bogzești - V. Ozi

Primar s. Brînzenei Noi - V. Teaciu

Primar s. Buda

Primar s. Căzănești - V. Sîrbu

Primar s. Chiștelniț - C. Ciobanu

Primar s. Chișcanii Vechi

Primar s. Ciulocani - L. Gorman

Primar s. Cișla - I. Borș

Primar s. Cădălești Nou - I. Albu

Primar s. Coropeeni - B. Bălan

Primar s. Crăciunășeni - V. Cazacu

Primar s. Ghiliceni - N. Rotaru

Primar s. Hirșeni - I. Peșca

Primar s. Inești - Gh. Buneșcu

Primar s. Ieșeni - V. Lazarencu

Primar s. Mîndrești
I. Gus (S. Codrești) - Gazun

Primar s. Nucăreni - M. Ombur

Primar s. Negureni - I. Popa

Primar s. Pistruceni - M. Mihalenco

Primar s. Orleni - A. Moldovanu

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21 din 29 ianuarie 2020.
r-ul Telenești

Primar s. Sărățenii Vechi – V. Cupcea

V. Cupcea

Primar s. Ratus – I. Turcan



Primar com. Suhulești, raionul Telenești
s. Ghermănești – S. Ghergheș

S. Ghergheș

Primar s. Scorțeni – I. Turcan

Primar s. Tîrșitei – N. Sirbu

N. Sirbu

Primar s. Iințăreni – S. Popa



Primar s. Vășieni – I. Memciuc

I. Memciuc

Primar s. Verejeni – S. Popa



Primar s. Zgârdești – S. Roșca





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/2019 privind achiziția prin licitație deschisă

"14" iunie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1557748732963-EV-1557749756159 din 04.06.2019, între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.A. „Lusmecon” cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, tel. 022473382, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaș în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **83 621 309,35 (optzeci și trei milioane șase sute douăzeci și una mii trei sute nouă lei, 35 bani) cu TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans pînă la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general" S.A. "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/ IBAN MD53AG000022517010131321
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru CHILAS





Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”
IDNO 1003600023559

Rep Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
internet: <http://www.asd.md>, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

06. 08. 2019 Nr. 08-04/2661

Către: **S.A. „Lusmecon”**
În atenția: **Domnului Alexandru GHILAȘ, Director,**
Subiect: **Instrucțiuni pentru începerea lucrărilor**
Referință: **Contract nr. 06-14/221 din 14 iunie 2019**

Lucrări de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzilor, amplasate teritorial în raionul Orhei.

Stimate Domnule Director,

În conformitate cu sub - clauza 1.1 a Contractului 06-14/221 din 14 iunie 2019,
Lucrări de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzilor, amplasate teritorial în raionul Orhei, prin prezenta sunteți instrucți să începeți lucrările în cuantumul realocat, conform scrisorii MEI nr. 11-4991 din 02.08.2019 (se anexează).

Urmează să conlucrați cu Autoritățile Publice Locale, în vederea stabilirii de comun acord a segmentului de drum din cadrul sectorului solicitat inițial, cu executarea integrala a constructivului sistemului rutier, stabilit în caietul de sarcini, în limitele financiare conform anexei (se anexează).

Data de începere a lucrărilor menționate este **”06” august 2019.**

Termenul de execuție a contractului este de **4 luni**, calculat de la data începerii lucrărilor.

Director adjunct

Iurie PAȘA

Anexă la ordinul de începere a lucrărilor

Limitele
alocațiilor pentru reparația periodică a drumurilor naționale (în limitele localităților),
locale, comunale și străzi pe anul 2019

| Nr. crt | Denumirea drumurilor | Localitatea | Volumul alocațiilor, (mii lei) | Sursa de finanțare |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Raionul Orhei | | | | |
| 1 | Reparația unor străzi în localitate | s. Berezlogi | 391,41 | BS/MEI |
| 2 | Reparația unor străzi în localitate | s. Biești | 366,86 | BS/MEI |
| 3 | Reparația unor străzi în localitate | s. Bolohan | 423,47 | BS/MEI |
| 4 | Reparația unor străzi în localitate | s. Brăviceni | 560,40 | BS/MEI |
| 5 | Reparația unor străzi în localitate | s. Bulăiești | 404,41 | BS/MEI |
| 6 | Reparația unor străzi în localitate | s. Chiperceni | 614,42 | BS/MEI |
| 7 | Reparația unor străzi în localitate | s. Ciocîlteni | 635,50 | BS/MEI |
| 8 | Reparația unor străzi în localitate | s. Clișova | 312,55 | BS/MEI |
| 9 | Reparația unor străzi în localitate | s. Crihana | 0,00 | BS/MEI |
| 10 | Reparația unor străzi în localitate | s. Cucuruzeni | 461,03 | BS/MEI |
| 11 | Reparația unor străzi în localitate | s. Donici | 0,00 | BS/MEI |
| 12 | Reparația unor străzi în localitate | s. Isacova | 494,53 | BS/MEI |
| 13 | Reparația unor străzi în localitate | s. Mălăiești | 317,46 | BS/MEI |
| 14 | Reparația unor străzi în localitate | s. Mitoc | 795,53 | BS/MEI |
| 15 | Reparația unor străzi în localitate | s. Morozeni | 374,37 | BS/MEI |
| 16 | Reparația unor străzi în localitate | s. Neculăieuca | 383,33 | BS/MEI |
| 17 | Reparația unor străzi în localitate | s. Peresecina | 2 329,70 | BS/MEI |
| 18 | Reparația unor străzi în localitate | s. Piatra | 551,44 | BS/MEI |
| 19 | Reparația unor străzi în localitate | s. Podgoreni | 305,33 | BS/MEI |
| 20 | Reparația unor străzi în localitate | s. Pohomiceni | 0,00 | BS/MEI |
| 21 | Reparația unor străzi în localitate | s. Pohrebeni | 576,86 | BS/MEI |
| 22 | Reparația unor străzi în localitate | s. Puținței | 0,00 | BS/MEI |
| 23 | Reparația unor străzi în localitate | s. Sămănanca | 0,00 | BS/MEI |
| 24 | Reparația unor străzi în localitate | s. Seliște | 596,50 | BS/MEI |
| 25 | Reparația unor străzi în localitate | s. Step-Soci | 551,44 | BS/MEI |
| 26 | Reparația unor străzi în localitate | s. Susleni | 1 277,65 | BS/MEI |
| 27 | Reparația unor străzi în localitate | s. Teleșeu | 349,82 | BS/MEI |
| 28 | Reparația unor străzi în localitate | s. Trebujeni | 378,99 | BS/MEI |
| 29 | Reparația unor străzi în localitate | s. Vișcăuți | 414,52 | BS/MEI |
| 30 | Reparația unor străzi în localitate | s. Zahoreni | 422,03 | BS/MEI |
| | Total pe raionul Orhei: | 30 | 14 289,55 | |

J. Bruc

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 9 din 22 Ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Orhei, conform Programului anului 2019 (zona centru)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Orhei, executate în cadrul contractului nr. 06-14/221 din 14.06.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor. or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 11 - 22 Ianuarie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh. Tomu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
S. Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
P. Cucuruzean - șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Orhei
V. Macari - director S.A. „Drumuri Orhei”
V. Brăilă - S.A. „Drumuri Orhei” sector Orhei
A. Ghilag - director S.A. „Lusmecon” - antreprenor
N. Severin - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Lusmecon”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iunie 2019 sfârșitul lucrărilor decembrie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- 1: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H = 15 cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, h=10 cm.
- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=20 cm.
 - III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafaţa totală).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.
 - IV: - Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea H=18cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
 - V: - Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică, h=10 cm.
- Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea H=28cm (50% din material decupat).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
 - VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafaţa totală).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea H=5,0 cm.
5. Costul lucrărilor recepţionate (conform anexei) constituie – 14498477,99 lei, inclusiv LCM – 14207266,80 lei, care vor fi direcţionate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conţinând 4 file şi 2 anexe a fost încheiat astăzi miercuri 20 iunie 2020 în 6 exemplare.

- Anexe
1. Costul lucrărilor executate conform Programului şi alte cheltuieli aferente lucrării de întocmire a devizelor, întreţinerea beneficiarului
 2. Situaţia neconformităţilor în localităţile raionului respectiv, după caz 0 (zero) file, inclusiv localităţile:
Faza obiectii

Comisia:

Preşedinte



Membri

Gh. Tomu

V. Brăilă

S. Godiac

A. Ghilaş - antreprenor

P. Cucuruzean

N. Severin



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 9 din 22 ianuarie 2020,
r-ul Orhei

Primar s. Berezlogi – P. Uștechi

Primar com. Biești – Gr. Stecla

Primar s. Bolohan – Z. Păuca

Primar s. Brăviceni – A. Cocorova

Primar s. Bulaiești – M. Măruș

Primar com. Șniperești – S. Șelbu

Primar s. Ciocăreni – D. D. D.

Primar s. Clisova – Y. Clonitș

~~Primar Crihana – S. Străluțai~~

Primar s. Găuruzeni – I. Pranețchi

~~Primar com. Dăbârlă – S. Guzun~~

Primar s. Isacova – S. Cyashii

Primar s. Mălișești – V. Coban

Primar s. Mitoc – A. Cojocari

Primar s. Morozeni – I. Turcan

Primar s. Neculăieuca – V. Biscu

Primar s. Peteseșcina – V. Buzu

Primar s. Piatra – M. Turgai

Primar s. Podgoreni – A. Șternovec

Primar s. Pohorniceni – I. Corobciuc

Primar s. Pohrebeni – R. Sarcăruț

~~Primar s. Puținței – E. Iar~~

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 9 din 22 Ianuarie 2020,
r-ul Orhei

~~Primar s. Sămănanca - A. Zbirnea~~

Primar com. Selia

Primar s. Ștef Suci - S. Josan

Primar s. Susleni


Primar s. Teleșeu - I. Dediu

Primar s. Trebujeni

Primar s. Vișcăuți - V. Niță

Primar s. Zahareș

V. Coșbuc





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/437
privind achiziția prin licitație deschisă

12 noiembrie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024-EV-1570088340589 din 27.10.2019, între Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.A."Lusmecon" cu sediul în mun. Chișinău, str.Uzinelor 205/1, tel. 022473382, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaș în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reparație a drumului M1 Frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 71,00-81,00 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este octombrie 2020, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

- va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 46 542 461,74 (patruzeci și șase milioane cinci sute patruzeci și două mii patru sute șaiszeci și unu lei, 74 bani) inclusiv TVA.
- 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.
- 3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CUREL



"Antreprenor general"

S.A. "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842

c/ IBAN MD53AG000022517010131321

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru PHILAS





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr.06-14/437 din 12.11.2019.

"15" mai 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și S.A., "Lusmecon", în persoana directorului dl. Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/437 din 12.11.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km71,00-81,00".

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți, ca rezultat al faptului că în procesul de execuție a lucrărilor de frezare s-a depistat că adâncimea casetelor este mai mare decât cea prevăzută în proiect, în mediu cu 3 cm. Astfel pentru suplینirea casetelor este necesară majorarea volumului de beton asfaltic pentru toată suprafața. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. "Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată" subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 3 397 161,50 (trei milioane trei sute nouăzeci și șapte mii una sută șaiszeci și unu lei, 50 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la mărirea valorii contractului.

"Beneficiar"

Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP

"Antreprenor general"
S.A., "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/IBAN MD53AG000022517010131321
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ

Copie



ACHIZIȚII PUBLICE

Licităția publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr.06-14/437 din 12.11.2019.

"16" iulie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și S.A., "Lusmecon", în persoana directorul dl Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/437 din 12.11.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km71,00-81,00".

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. 12 din 16.07.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor". Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse constituie 2 331 041,11 (două milioane trei sute treizeci și una mii patruzeci și unu lei, 11 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

"Beneficiar"

Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"
S.A., "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/ IBAN MD53AG000022517010131321
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3 la contractul nr.06-14/437 din 12.11.2019.

“ *dd* ” *octombrie* 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și S.A., „Lusmecon”, în persoana directorului dl. Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/437 din 12.11.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km71,00-81,00”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.27 din 09.10.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor excluse constituie 1 506 841,00 (un milion cinci sute șase mii opt sute patruzeci și unu lei) cu TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

”Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău – bugetul de stat
c/TVA 0500000000

Director general interimar
Veaceslav POTOP




”Antreprenor general”

S.A., „Lusmecon”

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/IBAN MD53AG000022517010131321
B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ

Aprob.



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 48 din 16 Octombrie 2020

Privind lucrările de reparație a drumului „M1 frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 71,00 – 81,00”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/437 din 12 noiembrie 2019 și acordurilor adiționale AA nr.1 din 25.05.2020, AA nr.2 din 16.07.2020, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 239 din 6 octombrie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 12 - 16 Octombrie 2020 fiind formată din:

| | | |
|--------------|--|--|
| Președinte: | Iu. Pașu | - director adjunct, Î.S. „ASD” |
| membri: | R. Rogovei | - șef, direcția infrastructură de transport a MEI |
| | V. Cotruță | - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| | P. Triboi | - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD” |
| | I. Grosu | - șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD” |
| | I. Alexa | - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | P. Spînu | - șef, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
| | Ș. Caunov | - director S.A. „Drumuri Ialoveni” |
| V. Corabieru | - S.A. „Drumuri Ialoveni”, sector Ialoveni | |

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

- executant A. Ghilaș - director, S.A. „Lusmecon”
- proiectant V. Lujanschii - inginer șef proiect, S.A. „Intexnauca”
- responsabil tehnic T. Vartolomei - specialist principal, Î.S. „ASD”

3. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexa nr.1;
- lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- în lucrările cuprinse în lista - anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cufără rezerve și poate fi dată în folosință

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezența neconformităților la obiect.
(anexa nr 3)

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

- a.) Lucrarea a fost executată de către S.A. „Lusmecon”
b.) Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de către S.A. „Intexnauca”
c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *noiembrie 2019* sfârșitul lucrărilor *septembrie 2020*

7. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:
Lungimea tronsonului - 10 000 m.l. a) lățimea platformei drumului b - 11.0 m.l. b) lățimea părții carosabile b - 7.0 m.l. c) lățimea acostamentelor consolidate cu piatră spartă b - 1,5 m, h - 0, 15 m.

Construcția sistemului rutier :

- a) Frezarea casetelor a părții carosabile din ambele părți cu h med - 8 cm și o lățime de 1,2 m - 2,2 m. L - 9244 m.l., strat de beton asfaltic SKBg - II, h med 8 cm, S - 30444 m²;
b) Strat de bază din beton asfaltic SKPg I, h 6 cm, S - 73560 m²;
c) Strat de uzură din beton asfaltic SMBg - II, h 4 cm, S - 73560 m²;
d) Reparația podețelor tubulare D - 1 m - 5 bucăți.

8. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 59,46 mln. lei, inclusiv LCM - 57,13 mln. lei.

9. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 52 319 008,42 lei, inclusiv LCM - 50 763 808,07 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.


10. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexa, a fost încheiat, astăzi 16 octombrie 2020 în 6 exemplare.


Comisia de recepție:


Președinte

membri:



P. Păsa


V. Cotruță


P. Triboi


I. Grosu


I. Alexa




Official stamps and signatures of the receiving commission members, including: Sectia Sistematiizare Circulatie Rutiera, P. Spina; S. Ciambv IALOVENI; DRUMURI IALOVENI; V. Corabieru; A. Ghita; ITN; I. Vartolomei.

12. Reparații drumului „M1 frontiera cu România Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina km 71,00 - 81,00”, în baza recomandărilor comisiei este

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL.

S.A. „Lusmecon”

Octombrie 2020

PRIMITĂ - INVESTITORUL


Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Octombrie 2020




V. Cotruță

Din documentația scrisă și desenată lipsește
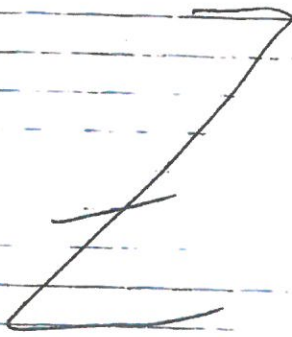
| Nr. do | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|--------|--|
| | <i>Documentația scrisă și desenată a proiectului este completă.</i> |
| |  |
| | |

Președinte *Iu.Pașa*

Membri: *R Rogovei*

V. Cotruță

P.Triboi

I.Grosu

I.Alexa


P.Spînu

V. Corabieru

A. Neduș

V. Juncușchi

V. Pădăloamei



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrării

Nr. 48 din 16 octombrie

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|---|
| 1 | <p>Înălțimea și compactarea pietrișului pe acostamente Drumul N.E. KM 41+00 - KM 81+00 Lucrările menționate nu s-au executat de satisfacție din punct de vedere al dimensiunii</p> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Președinte Iu. Pașa

Membri: R. Rogovei

V. Cotruță

P. Triboi

I. Grosu

I. Alexa

P. Spînu



V. Corabien

A. Ghilaș

V. Lujanschi

T. Vartolomei



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/314
privind achiziția prin licitație deschisă

“31” iulie 2020

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591786193866** din 17.07.2020, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.A.”Lusmecon” cu sediul în mun. Chişinău, str.Uzinelor 205/1, tel (022)42-88-14, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600050842, reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaş în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în mun. Chişinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor susținute de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **135 116 289,89 (una sută treizeci și cinci milioane una sută șaisprezece mii două sute opt zeci și nouă lei, 89 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții bancare de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subantreprize.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
 - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.
- 6.10 Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.
- 6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.

- 6.12 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.13 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.14 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.15 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.16 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 6.17 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.18 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.19 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.20 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.21 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.22 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.23 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.24 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.25 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate bună.

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.26 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.

6.27 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.28 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.29 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comdate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"



S.A. "Lusmecon"

MD 2036 mun. Chișinău str. Uzinelor 205/1
C/f 1002600050842

IBAN MD82ML000000225112900172

BC „Moldindconbank” S.A. filiala Invest
MOLDMD2X329
Cod TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ



Grafic de execuție a lucrărilor

Lucrări de reparație periodică/menținere a drumurilor publice locale, comunde și străzi amplasate teritorial în mun. Chișinău


| Grupa de obiecte Denumirea obiectului | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|------|---------|------|--------|
| | VIII | | | | IX | | | | X | | | | XI | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| com. Băcioi, s. Băcioi, str. Chisinaului, L-879 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| com. Bubuieci, s. Bubuieci, str. Dumbravei, L-542 m | | | 762,0 | 761,1 | | | | | | | | | | 1687 | | |
| com. Ciocănești, s. Ciocănești, str. Măgurel, L-436 m | | | | | | | | | 1449,3 | | | | | | | |
| com. Cruzești, s. Cruzești, str. Internațională, L-429 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| com. Gratiștii, L-449 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| com. Stăuceni, s. Stăuceni, str. Salcimirilor, L-375 m | | | | | 1347,7 | | | | | | | | | | | |
| com. Tohatic, s. Cheltuiitor, str. Sf. Gheorghe, L-440 m | | | | | | | 1423,2 | | | | | | | | | |
| com. Truseni, s. Truseni, de la str. Frunze(Leiba) pînă la str. Miron Costin, 2 sectoare cu L-381 m și L-285 m | | | 1541,8 | | | | | | | 1239,7 | | | | | | |
| mun. Chișinău | | | | | | | | | | | | | | | | |
| reparația îmbrăcăminții rutiere pe str. Albisoara | 4690 | 4690 | 4700 | 4700 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 |
| reparația trotuarului pe str. Bănuțescu Bodoni | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| reparația trotuarului pe str. Pușkin | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| reparația capitală a str. Mitropolit Dosoftei din s. Revaca, or. Singera, mun. Chișinău | | | | | | | | | | | | | | | | |
| or. Codru, Strada 2 Schinoasa Deal, L-575 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| or. Cricova, str. Ungureanu, L-655 m | | | | | | | | 1398,3 | | | | 1540,6 | | | | |
| or. Durești, str. Ștefan Voda de la nr.147 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| or. Singera | | | | 1511,2 | | | | | | | | | | | | |
| or. Vadu lui Voda, str. Bucovinei, L-449 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| or. Vatra, str. Alexandru cel Bun, L-508 m | | | | | | | | | | 1347,7 | | 1627,8 | | | | |
| s. Budești, str. Vasile Alexandri, L-570 m | | | 1133,4 | | | | | | | | | | | | | |
| s. Colonița, s. Tohatic - str. Budești, L-570 m | | | | | | | | | 1233,1 | | | | | | | |
| s. Condrița, str. Teilor, L-595 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| s. Ghidighici, str. Ghiocelor, L-306 m | 1227,3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7812,3 | 7718,4 | 8898,8 | 8867,3 | 9007,8 | 7932,7 | 8008,2 | 7983,3 | 8972,3 | 9172,4 | 9336,9 | 8125,6 | 9602 | 7907,5 | 7895 | 7875,8 |
| Total | | | 33296,8 | | | | 32932,0 | | | 35607,2 | | | | 33280,3 | | |

Semnat: 16.07.2020

Numele: Ghițaș Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigla S.A. "LUSMECON"



Aprobat

Director general / interimar
"Administrația de Stat a Drumurilor
Veaceslav Potop



Grafic de confirmare cu acte de receptie a lucrarilor si
conform contractului nr 06-14/314 din 31.07. 2020

| | | Repartizarea pe luni | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------------|----|-----|----|---|----|-----|---------|---------|---------|----|-----|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Suma avansului | | | | | | | | | | | | | |
| Derectionate la acoperirea | 68000000 | | | | | | | | 1000000 | 2900000 | 2900000 | | |

Antreprenor general
SA Lusmecon





Director general
Alexandru Ghilas



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591786193866
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/314 din 31.07.2020

“30” noiembrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**”, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului și S.A.”Lusmecon”, în persoana directorului dl. Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/314 din 31.07.2020 în vederea executării **lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în mun. Chișinău.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei grupului de lucru nr.45 din 27.11.2020, cu consimțământul ambelor părți.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 2 „Perioada de execuție” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:
„Se stabilește prelungirea termenului limită de execuție a lucrărilor până la data de **21.12.2020**,”

Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



S.A.”Lusmecon”

MD 2036 mun. Chișinău str. Uzinelor
205/1

C/f 1002600050842

IBAN MD82ML000000225112900172

BC „Moldindconbank” S.A. filiala Invest

MOLDMD2X329

Cod TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ



Alexandru Ghilaș

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 06-14/314 din 31.07.2020

“01” decembrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor**”, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului și S.A.”Lusmecon”, în persoana directorului dl. Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/314 din 31.07.2020 în vederea executării **lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în mun. Chișinău.**

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu consimțământul ambelor părți în vederea modificării formei garanției de bună execuție a lucrărilor, din rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora, în garanție bancară de bună execuție în valoare de 5% din suma contractului.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

- Punctul VI. „Drepturile și obligațiunile Antreprenorului General și ale Beneficiarului” subpunctele 6.11 și 6.12 vor avea următorul conținut:

6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin scrisoare de garanție bancară, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

6.12 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa cu un Amendament, proportional sumei de modificare a contractului.

Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP

S.A.”Lusmecon”

MD 2036 mun. Chișinău str. Uzinelor
205/1

C/f 1002600050842

IBAN MD82ML000000225112900172

BC „Moldindconbank” S.A. filiala Invest

MOLDMD2X329

Cod TVA 7800083

Director

Alexandru GHILAȘ



02/12/20



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591786193866
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3
la contractul nr. 06-14/314 din 31.07.2020

“ 31 ” decembrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului și S.A. „Lusmecon”, în persoana directorului dl. Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/314 din 31.07.2020 în vederea executării **lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în mun. Chișinău.**

Acordul adițional se încheie în baza deciziei grupului de lucru nr.73 din 31.12.2020, cu consimțământul ambelor părți.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor excluse constituie 6 993 162,29 (șase milioane nouă sute nouăzeci și trei mii una sută șaiszeci și doi lei, 29 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

S.A. „Lusmecon”

MD 2036 mun. Chișinău str. Uzinelor
205/1

C/f 1002600050842

IBAN MD82ML000000225112900172

BC „Moldindconbank” S.A. filiala Invest

MOLDMD2X329

Cod TVA 7800083

Director general interimar
Veaceslav POTOP

Director
Alexandru GHILAȘ



Pobovici

Lista Procesele verbale de receptive a lucrărilor finalizate

| Nr. | Denumirea drumului | Procesele verbale de receptive a lucrărilor finalizate | Valoarea |
|-----|--|--|---------------|
| 1 | mun. Chișinău str. Albișoara, str. Puschin, str. B. Bodoni, str. Grigore Vieru | Nr.97/1 din 31.03.2021 | 30 129 213.60 |
| 2 | mun. Chișinău str. Albișoara | Nr.97/1.1 din 11.08.2021 | 68 572 549.20 |
| 3 | s. Băcioi | Nr.97/2 din 31.03.2021 | 1 686 956.40 |
| 4 | or. Singera s. Revaca | Nr.97/3 din 31.03.2021 | 4 782 760.80 |
| 5 | or. Singera | Nr.97/4 din 31.03.2021 | 1 627 816.80 |
| 6 | s. Budești | Nr.97/5 din 31.03.2021 | 1 233 100.80 |
| 7 | com. Colonița | Nr.97/6 din 31.03.2021 | 1 124 107.20 |
| 8 | com. Cruzești | Nr.97/7 din 31.03.2021 | 1 154 161.20 |
| 9 | com. Tohatin s. Cheltuiitorii | Nr.97/8 din 31.03.2021 | 1 401 298.80 |
| 10 | or. Codru | Nr.97/9 din 31.03.2021 | 1 540 592.40 |
| 11 | s. Condrita | Nr.97/10 din 31.03.2021 | 967 477.20 |
| 12 | or. Vadu lui Voda | Nr.97/11 din 31.03.2021 | 1 347 692.40 |
| 13 | com. Ciorescu | Nr.97/12 din 31.03.2021 | 1 449 332.40 |
| 14 | or. Cricova | Nr.97/13 din 31.03.2021 | 1 398 312.00 |
| 15 | s. Bubuieci | Nr.97/14 din 31.03.2021 | 1 523 094.00 |
| 16 | com. Grătiești | Nr.97/15 din 31.03.2021 | 1 347 692.40 |
| 17 | com. Stăuceni | Nr.97/16 din 31.03.2021 | 1 423 248.00 |
| 18 | s. Trușeni | Nr.97/17 din 31.03.2021 | 1 541 787.60 |
| 19 | or. Durlăști | Nr.97/18 din 25.05.2021 | 1 511 191.20 |
| 20 | or. Vatra | Nr.97/19 din 25.05.2021 | 1 133 389.20 |
| 21 | mun. Chișinău trotuare: str. Puschin, str. B. Bodoni, str. Grigore Vieru | Nr.97/20 din 02.07.2021 | |
| 22 | s. Ghidighici | Nr.97/21 din 18.08.2021 | 1 227 354.00 |

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 97/3 din 31 martie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în municipiul Chișinău conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020, modificată prin HG nr.925 din 22.12.2020).

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în municipiul Chișinău, (or.Sîngera, s.Revaca) executate în cadrul contractului nr.06-14/314 din 31.07.2020 încheiat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” Beneficiar și S.A. „Lusmecon” Antreprenor, or.Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 26-31 martie 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Druceac* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *Gh.Tonu* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
- S.Godiac* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
- A.Ghilaș* - *director S.A. „Lusmecon” - antreprenor*
- V.Coliban* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – mun.Chișinău (or.Sîngera, s.Revaca)*
- V.Popa* - *Primar al or.Sîngera*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cufără rezerve și poate fi dată în folosință.
- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Lusmecon”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *august 2020* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2020*

4. Drumurile supuse recepției au fost reparate în baza proiectului tehnic elaborat de primăria or. Sîngera, cuprinzînd următoarele:

Construcția sistemului rutier:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=6,0 cm.
- Strat de egalizare din piatră spartă anrobată, cu așternere mecanică, cu împanare, H=8cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=14cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=16cm.

Amenajarea acceselor laterale – 2 buc.

Amenajarea intrărilor în curți – 9 buc.

Construcția trotuarului - 389 m.l.

5. Costul total a lucrărilor executate în baza contractului constituie – **130 129 141,32 lei inclusiv LCM – 128 123 127,60 lei**, dintre care or. Sîngera, s.Revaca – **4 856 593,56 lei inclusiv LCM – 4 782 760,80 lei**

6. Prezentul proces - verbal, conținînd 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi miercuri 31 martie 2021 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților depistate de comisie, 1 (una) file inclusiv străzile:

fără obiecții

Comisia:

Președinte I. Drucec



Membri: Gh. Tonu



S. Godiac




V. Coliban



A. Ghilaș



V. Popa



Costul lucrărilor executate conform programului

(Pentru procesul-verbal de recepție)

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi
(în limita localității) amplasate teritorial în mun. Chișinău.

a.2020

mun. Chișinău

| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Lusmecon" Contract nr. 06-14/314 din 31.07.2020 s. Revaca, or. Sângera | 4 782 760,80 4 782 760,80 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 1,43% s. Revaca, or. Sângera | 68 393,48 68 393,48 |
| 3 | Elaborarea documentației de proiect și deviz ASD, decembrie 2020 s. Revaca, or. Sângera | 5 439,28 5 439,28 |
| | TOTAL: | 4 856 593,56 |

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

august 2020
decembrie 2020

Șef serviciul monitorizare proiecte




S. Petrușanco

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 97/3 din 31 martie 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în mun.Chișinău, or.Sîngera, s.Revaca
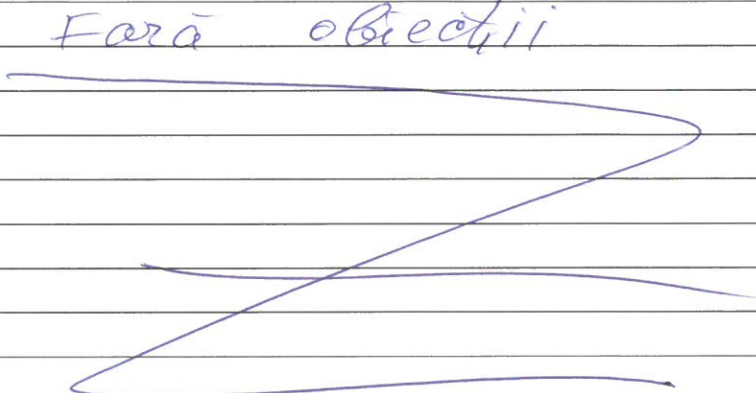
| Nr. d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC) |
|---------|---|
| | <p style="text-align: center;"><i>Fără obiecții</i></p>  |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Președinte I.Drucec _____



Membri: Gh.Tonu _____

Gh.Tonu

A.Ghilaș _____

S.Godiac _____

S.Godiac

V.Coliban _____



A.Ghilaș _____

A.Ghilaș

V.Popa _____

V.Popa



Costul lucrărilor executate conform programului

(Pentru procesul-verbal de recepție)

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi
(în limita localității) amplasate teritorial în mun. Chișinău.

a.2020

mun. Chișinău

| № | Denumirea cheltuielilor | Costul lucrărilor, lei |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | <i>Lucrări de antrepriză LCM</i> <i>S.A. "Lusmecon"</i> <i>Contract nr. 06-14/314 din 31.07.2020</i> mun Chișinău | 128 123 127,60 128 123 127,60 |
| 2 | Întreținerea beneficiarului 1,43% mun Chișinău | 1 832 160,72 1 832 160,72 |
| 3 | Elaborarea documentației de proiect și deviz ASD, decembrie 2020 mun Chișinău S.R.L. "Universinj" <i>Contract nr. 06-15/413a din 15.10.2020</i> | 173 853,00 79 720,00 94 133,00 |
| | TOTAL: | 130 129 141,32 |

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

august 2020
decembrie 2020

Șef serviciul monitorizare proiecte



S. Petrușanco

