

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparatia unui sector a strazii Stefan cel Mare si Sfint in s.Voinescu**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 16 din 16.05.2024 si nr.20 din 27.06.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Voinescu**
4. Adresa beneficiarului **s.Voinescu r-ul Hincesti str. Stefan cel Mare si Sfint -184**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 1 119 795,94 /
b) Final	1. / 1 119 795,94 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	2 luni
b) efectiv realizată	1 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a strazii 1 Mai din satul Borogani r-nul Leova**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 30 din 21 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Borogani, r-nul Leova**
4. Adresa beneficiarului **MD-6335, r-nul Leovai, s. Borogani**
5. Țara **R.Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 829 686,42 /
b) Final	1. / 829 686,42 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	2 luni
b) efectiv realizată	40 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Crearea infrastructurii sportive în satul Crețoaia, com. Tîntăreni ca pentru un sat cu adevărat european**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 04/LP din 11 ianuarie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com Tîntăreni, r-nul Anenii -Noi**
4. Adresa beneficiarului **MD-6538, com Tîntăreni, r-nul Anenii -Noi**
5. Țara **R.Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 1 879 137,71 /
b) Final	1. / 1 879 137,71 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	6 luni
b) efectiv realizată	180 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a străzii în s. Lărguța r. Cantemir**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 17 din 07 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Lărguța r. Cantemir**
4. Adresa beneficiarului **MD-7328, s. Lărguța r. Cantemir**
5. Țara **R.Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 763 561,74 /
b) Final	1. /763 561,74 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	1 luni
b) efectiv realizată	30 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de renovare a unui tronson, la drum L211 R20 s. Cinișeuți - s. Bucișca (s. Bucișca, beton armat).**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 43 din 29 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul raional or. Rezina**
4. Adresa beneficiarului **MD-5400, Consiliul raional or. Rezina**
5. Țara **R.Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 1 270 864,90 /
b) Final	1. /1 270 864,90 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	1 luni
b) efectiv realizată	30 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumurilor locale sat.Crasnoarmeiscoe, r-nul Hîncești**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 19 din 08 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Crasnoarmeiscoe**
4. Adresa beneficiarului **MD-3423, s. Crasnoarmeiscoe, r-nul Hîncești**
5. Țara **R.Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 1 061 658,23 /
b) Final	1. /1 061 658,23 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	2 luni
b) efectiv realizată	60 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie , pregatirea si reamenajarea terenului castel de apa , parte componenta , cu extindere a sistemului de alimentare cu apa existent a localitatii sat.Badiceni, r.Soroca.**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 52 din 15 decembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria sat.Badiceni**
4. Adresa beneficiarului **MD-3011, s. sat.Badiceni, r.Soroca**
5. Țara **R.Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 1 041 763.97 /
b) Final	1. /1 041 763.97 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	6 luni
b) efectiv realizată	180 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie, pregatire si reamenajare a terenului castel de apa , parte componenta , cu extindere a sistemului de alimentare cu apa existent a localitatii sat.Dingeni, r-nul Ocnita**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 20 din 08 decembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria sat.Dingeni**
4. Adresa beneficiarului **MD-7119, sat.Dingeni, r-nul Ocnita**
5. Țara **R.Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 1 036 995.64 /
b) Final	1. / 1 036 995.64 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	6 luni
b) efectiv realizată	180 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul **Lucrări de construcție a drumului din beton asfaltic or. Drochia**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020 din 07 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **„Polimer Gaz Conducente” SRL**
4. Adresa beneficiarului **MD-2023, str. Varnița 18, or. Chișinău**
5. Țara **R.Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 5 502 662,97 /
b) Final	1. 5 502 662,97 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	4 luni
b) efectiv realizată	120 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga"**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 20 din 1 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Onițcani, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului **MD-4833, r-nul Criuleni, s. Onițcani**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 821 414,05 /
b) Final	1. / 821 414,05 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	1 lună
b) efectiv realizată	20 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația drumurilor locale din s. Caracui, r-nul Hîncești**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 27 din 6 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Caracui, r-nul Hîncești**
4. Adresa beneficiarului **MD-3419, r-nul Hîncești, s. Caracui**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 615 661,93 /
b) Final	1. / 615 661,93 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	2 luni
b) efectiv realizată	20 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a strazii "Gheorghe Greco" din satul Cruglic, r-nul Criuleni**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 23 din 12 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Cruglic, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului **MD-4819, r-nul Criuleni, s. Cruglic**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 666 533,95 /
b) Final	1. / 666 533,95 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	1 lună
b) efectiv realizată	25 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului public în s. Maximovca**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 24 din 28 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Maximovca**
4. Adresa beneficiarului **MD-6525, str. Renasterii, 2, r-nul Anenii Noi**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 839 850,18 /
b) Final	1. / 839 850,18 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	2 luni
b) efectiv realizată	25 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația unei porțiuni de drum de pe strada Stefan Neaga din s. Dorotcaia r-nul Dubăsari.**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 21/23 din 14 martie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Dorotcaia**
4. Adresa beneficiarului **MD-4573, MOLDOVA, Dubăsari, s.Dorotcaia, s. Dorotcaia**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 779 986.68 /
b) Final	1. / 779 986.68 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	2 luni
b) efectiv realizată	40 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Crearea infrastructurii sportive in satul Crețoaia.**
2. Numărul și data contractului **Crearea infrastructurii sportive in satul Crețoaia**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Tințereni**
4. Adresa beneficiarului **MD-4573, MOLDOVA, Dubăsari, s.Dorotcaia, s. Dorotcaia**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 779 986.68 /
b) Final	1. / 779 986.68 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	2 luni
b) efectiv realizată	40 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

Investitor: Primăria satului Maximovca

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 6 din „23” decembrie 2021

Privind lucrările de Construcția unei porțiuni de drum în satul Maximovca executate în cadrul contractului nr. 30 din „23” noiembrie 2021, încheiat între Primăria satului Maximovca și SRL „VIG HOUSE”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din „____” _____ 202.

1. Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Ala Bruma, primar s. Maximovca.

Membrii comisiei:

1. Natalia Sprinsean, contabil-sef;
2. Lucia Luceac, specialist;
3. Pavel Sîrbu, consilier;
4. Dimitrii Jelic, locuitor al satului;
5. Mihail Anatii, locuitor al satului.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG HOUSE”;
- Cepoi Sergiu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru recepția finală.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotate, a fost semnat (încheiat) astăzi „____” decembrie 2021 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Ala Bruma



Membrii comisiei:

Natalia Sprinsean



Lucia Luceac



Pavel Sirbu



Dimitrii Jelic



Mihail Anatii



Participanți la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG HOUSE”



- Cepoi Sergiu, diriginte de șantier



8. Lucrarea Construcția unei porțiuni de drum în satul Maximovca este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

Ivan Gradinari
Director SRL „VIG HOUSE”

Ala Bruma
Primar s. Maximovca

„ ____ ” decembrie 2021

____ decembrie 2021

L.S.

(semnătură)


(semnătură)


DS-2021
Nr. 1218
1,2a,b
INGINIER SANTIÉR

Republica Moldova
Raionul Anenii Noi
Primăria satului Maximovca



Республика Молдова
Район Новые Анены
Примария села Максимовка

c/f 1008601001164
cod IBAN MD31TRPDV20000001075700
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat
Raionul Anenii Noi s. Maximovca tel. 0-22-359-341, fax 359-340
www.primariamaximovca@mail.ru

Nr. 01/12-22

Din "30" decembrie 2021

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria s. Maximovca, ca beneficiar, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții **SRL "VIG HOUSE"** pe care am contractat-o în anul 2021 pentru executarea lucrării:

1. **Construcția unei porțiuni de drum în s. Maximovca.**

Menționăm receptivitatea conducerii **"VIG HOUSE" SRL** la toate problemele legate de lucrările de construcție și reparații.

Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice.

În concluzie, recomandăm compania **SRL "VIG HOUSE"** pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Cu respect,
/ Primăria s. Maximovca
Primar



Ala Bruma

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitor: Primăria s. Onițcani, r-nul Criuleni

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din „08” august 2022

Privind lucrările de Reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duc spre izvorul "Larga" în s. Onițcani, r-nul Criuleni executate în cadrul CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 20 din 01 iunie 2022, încheiat între Primăria s. Onițcani și SRL „VIG - HOUSE”.

1. Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Maria Țîrgola, primarul satului

Membrii comisiei:

1. Irina Duca, secretarul consiliului local;
2. Ludmila Lupașcu, contabil-șef al primăriei;
3. Ion Iacub, consilier local;
4. Stefan Bejan, responsabil tehnic.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”;
- Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru darea în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotate, a fost semnat astăzi „08” august 2022 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Maria Țîrgola




Membrii comisiei:

Irina Duca



Ludmila Lupașcu



Ion Iacub



Ștefan Bejan




Participanți la recepție:

• Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”



• Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier



8. Lucrarea Reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" în s. Onițcani, r-nul Criuleni este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

Ivan Gradinari
Director SRL „VIG - HOUSE”

Maria Țîrgola
primarul satului Onițcani

„ 08 ” august 2022

„ 08 ” august 2022


I.S. (semnătura)



(semnătura)


REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRIULENI
PRIMĂRIA ONIȚCANI
MD – 4833 s. Onițcani, r. Criuleni,
tel. 0(248) 79-236, Fax: 0(248) 79-238
e-mail: primariaonitcani@vandex.ru,
C/f 1007601010002



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ ОНИЦКАНЬ
МД - 4833 с. Оницкань, р. Криулень
тел. 0(248) 79-236, факс 0(248) 79-238
e-mail: primariaonitcani@vandex.ru,
Ф/к 1007601010002

Nr. 302

din " 20 " septembrie 2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria satului Onițcani, r. Criuleni, ca beneticiar, își exprimă aprecierea, satisfacerea și plăcerea față de colaborarea cu Compania de construcții SRL "VIG-HOUSE" pe care a contractat-o în anul 2022, în baza Contractului de antrepriză pentru executarea lucrării:

1. Lucrări de reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga".

Menționăm receptivitatea conducerii "VIG-HOUSE" SRL la toate obligațiunile contractuale și operativitatea specialiștilor de execuție a lucrărilor de construcție și reparații.

Lucrările au fost executate calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii.

În concluzie, recomandăm compania SRL "VIG-HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova, drept un colaborator profesionist și credibil.

Primarul s. Onițcani



Maria TÎRGOLA

INVESTITOR: Primaria s. Caracui Raionul Hincesti.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afecte

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 19.08.2022

privind lucrarea „Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu „din s. Caracui r-nul. Hincesti, în cadrul contractului nr. 27 din 06.iulie 2022 încheiat între_ Primaria s. Caracui Raionul Hincesti si SRL "Vig House"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ 19.08.2022 ora 9:00, fiind formată din:

Președintele comisiei

Anatolie Duceac – primarul s. Caracui;

Membrii comisiei

Chironda Grigore- inginer cadastral

Niculescu Alexandru – cosilier local s.Caracui,

Timus Victor- consilier local s.Caracui;

Tudor Vartolomei– responsabil tehnic.

Invitat

Antreprenor SRL "Vig Hause".

3. Constatările comisiei de recepție:

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: **Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu, din s. Caracui r-nul. Hincesti.** cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____ str. Nicolae Corlateanu, din s. Caracui r-nul. Hincesti.

_____, destinația _____, compus din
următoarele _____ construcții

_____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 19.08.2022 la 10:00 în
3 (trei)exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

Anatolie Dupeac – primarul s. Caracui,

Membrii comisiei

Chironda Grigore- inginer cadastral,

Niculescu Alexandru – cosilier local s.Caracui,

Timus Victor- consilier local s.Caracui,

Tudor Vartolomei – responsabil tehnic.

8. Lucrarea: **Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu,
din s. Caracui r-nul. Hincești.**

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL "Vig House "

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primaria s. Caracui Raionul Hincesti

" " 2022



REPUBLICAMOLDOVA

Raionul Hîncești

Primăria Caracui

Tel: (0269) 31-236, 31-036

Fax:(0269) 31-259

e-mail: primaria-s.caracui@inbox.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Хынчештский район

Примэрия Каракуй

Тел: (0269) 31-236, 31-036

Факс:(0269) 31-259

Nr. 136

Din "20" septembrie 2022

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria satului Caracui, r-nul Hîncești, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu SRL "VIG-HOUSE" în baza contractului de antrepriză pentru lucrarea „Reparația drumurilor locale din satul Caracui, r-nul Hîncești”.

Menționăm că toate lucrările au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor. Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiunilor contractuale reprezintă criteriile determinabile de caracterizare satisfăcătoare ceia ce ne motivează să recomandăm compania SRL "VIG-HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

În concluzie, pentru orice companie – autoritate cu care va relaționa, recomandăm SRL "VIG-HOUSE" drept un colaborator profesionist și credibil, compania distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, fapt care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitori.

Primarul satului Caracui



Anatolie Dubceac

Investitor: Primăria s. Cruglic, r-nul Criuleni

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din „30” septembrie 2022**

Privind lucrările de reparație a străzii Gheorghe Grecu din satul Cruglic, r-nul Criuleni executate în cadrul CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 23 din 12 iulie 2022, încheiat între Primăria s. Cruglic și SRL „VIG-HOUSE”.

Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Iurie Neculai, primarul satului

Membrii comisiei:

1. Dumitru Roșca, secretarul consiliului local;
2. Gheorghe Druță, specialist în aparatul primăriei;
3. Ion Popa, președinte al comisiei Buget, Economie și Finanțe;
4. Victor Ciorba, președinte al comisiei Agricultură, dezvoltarea Socială, protecția Mediului și amenajarea Teritoriului;
5. Ștefan Bejan, responsabil tehnic.

Membrii supleanți:

1. Ghenadii Jorneac, consilier local;
2. Lidia Chetorean, contabil-șef al primăriei.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG-HOUSE”;
- Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru darea în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotată, a fost semnat astăzi „30” septembrie 2022 în 4 exemplare.


Comisia de recepție:

Președintele: Iurie Neculai



Membrii comisiei:

Dumitru Roșca



Gheorghe Druță



Ion Popa



Victor Ciorba



~~Stenadie~~
Dan Jorneac



Lidia Chetrean



Stefan Bejan



Participanți la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”
- Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier







8. Lucrarea Reparația străzii Gheorghe Grecu din satul Cruglic, r-nul Criuleni este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Ivan Gradinari
Director SRL „VIG - HOUSE”

PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

Iurie Neculai
primarul satului Cruglic

„30” septembrie 2022



(semnătura)

„30” septembrie 2022



(semnătura)

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 20 septembrie 2023

Privind obiectul : **Reabilitarea a doua portiuni de drum de pe strada "1 mai" in s. Borogani raionul Leova, în cadrul contractului nr. 30 din 21 Iulie 2023, încheiat între Primaria Borogani și SRL „Vig House” pentru efectuarea lucrărilor de construcție.**

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini, și care nu necesită autorizație de construcție.
2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea în intervalul 20.09 2023, ora - , fiind formata din:

Președintele comisiei: Elena Savitki - Primarul sat.Borogani ;

Membrii comisiei: Sofia Casu - Contabil- secretar
Sofia Botnarcuic - Specialist în perceperea fiscală ;
Natalia Coitan - Secretarul consiliului ;
Nadejda Răileanu - Contabil ;
Piotr Zlatov - Responsabil Tehnic.

3. Au mai participat la recepție: **Ivan Grădinari**- antreprenor, director SRL „Vig-House”
Gheorghe Știrbu - diriginte șantier SRL „Vig-House”

4. Constatările comisiei de recepție:

Lucrări de reparație au fost executate în conformitate cu documentația de deviz. Pretenții din partea comisiei nu sunt.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute , propune:

De recepționat construcția la finalizarea lucrărilor în sumă de **829 686,42** lei (Opt sute doua zeci si noua mii sase sute optzeci si sase lei 42 bani) inclusiv TVA.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție conform documentației de deviz.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se accepta recepția la finalizarea lucrărilor: "Reabilitarea a doua porțiuni de drum de pe strada "1 mai" în s. Borogani raionul Leova "

8. Concluzia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

Lucrarea „ Reabilitarea a doua porțiuni de drum de pe strada "1 mai" în s. Borogani raionul Leova „, este executată în totalitate , în conformitate cu devizul de cheltuieli . Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 6 file, a fost încheiat astăzi . 20 09 2023 în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Elena Savitki

E. Savitki

- Primarul sat.Borogani;



Membrii comisiei :

Sofia Cașu

Căci

- Contabil- secretar;

Sofia Botnariuc

Beif

- Specialist în perceperea fiscală ;

Natalia Coitan

Coitan

- Secretarul consiliului ;

Nadejda Răileanu

Nadejda


- Contabil ;

Piotr Zlatov

Piotr Zlatov

- Responsabil Tehnic;

Participanți la recepție :



• Ivan Grădinaru

Ivan Grădinaru

- Director SRL "VIG-HOUSE"

• Gheorghe Știrbu

Gheorghe Știrbu

- Diriginte de Șantier;



10. "Reabilitarea a doua portiuni de drum de pe strada "I mai" in s. Borogani raionul Leova " finalizata

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Director SRL „Vig House”

20. 09. 2023

PRIMITĂ:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Primaria sat. Borogani, r-nul Leova

20. 09. 2023

L.S.  Ivan Grădinari



 Elena Savițki

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 13 Septembrie 2023

Privind lucrarea: „Crearea infrastructurii sportive în satul Crețoaia, comuna Țințăreni, ca pentru un sat cu adevărat european” localizat în s. Crețoaia, com. Țințăreni, r-nul Anenii-Noi” în cadrul contractului nr. 04/LP din 11.01.2023, încheiat între Primăria Țințăreni, r-nul Anenii Noi și SRL „Vig House” pentru efectuarea lucrărilor de construcție.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini, și care necesită autorizație de construcție nr. 2 din 14 martie 2023
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 septembrie 2023, ora 14.00, fiind formată din:

Președintele comisiei: Bulgaru Vadim

- Primar com. Țințăreni :

Membrii comisiei: Burlacu Tina

Moroș Tatiana

Burlacu Iurie

Specialiști : Novicov Serghei

Afanasii Oleg

3. Au mai participat la recepție:

Ivan Grădinari- antreprenor, director SRL „Vig-House”

Dumbrava Pavel -diriginte de șantier SRL „Vig-House”

Reprezentantul ONDRL

Inspekția pentru Protecția Mediului, r-nul Anenii Noi

Medicina Preventivă, r-nul Anenii Noi

IGSU Raionul Anenii Noi

4. Constatările comisiei de recepție:

Lucrări de reparație au fost executate în conformitate cu legislația în vigoare. Pretenții din partea comisiei nu sunt.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat construcția la finalizarea lucrărilor în sumă de 1 879 137,71 lei (Un milion opt sute șaptezeci și nouă mii una sută treizeci și șapte lei 71 bani) inclusiv TVA.

6. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție conform legislației.

7. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Se accepta recepția la finalizarea lucrărilor: „Crearea infrastructurii sportive în satul Crețoaia, comuna Țințăreni, ca pentru un sat cu adevărat european” localizat în s. Crețoaia, com. Țințăreni, r-nul Anenii-Noi”

8. Concluzia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

„Crearea infrastructurii sportive în satul Crețoaia, comuna Țințăreni, ca pentru un sat cu adevărat european” localizat în s. Crețoaia, com. Țințăreni, r-nul Anenii-Noi”, este executată în totalitate, în conformitate cu devizul de cheltuieli. Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file, a fost încheiat astăzi, miercuri, 13 Septembrie 2023 în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Bulgaru Vadim

Primar com. Țințăreni

(funcția)



(semnătura)

Membrii comisiei :

Burlacu Tina

Contabil șef

(funcția)

Burlacu

(semnătura)

Moroi Tatiana

Secretar Consiliului

(funcția)

Moroi

(semnătura)

Burlacu Iurie

Director S.M. „Țințăreni-Servis”

(funcția)

Burlacu

(semnătura)

Afanasii Oleg

RT

(funcția)

Afanasii

(semnătura)

Novicov Serghei

RT

(funcția)

Novicov

(semnătura)

Participanți la recepție :

• Ivan Gradinari

Director Vig- House SRL

(funcția)

Ivan Gradinari

(semnătura)

• Pavel Dumbrava

Diriginte de Șantier

(funcția)

Pavel Dumbrava

(semnătura)

10. Lucrările de „Crearea infrastructurii sportive în satul Crețoaia, comuna Țințăreni, ca pentru un sat cu adevărat european” localizat în s. Crețoaia, com. Țințăreni, r-nul Anenii-Noi” este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL/BENEFICIARUL:

Director SRL „Vig House”

Primăria Țințăreni, r-nul Anenii Noi

13 septembrie 2023

13 septembrie 2023

L.S:

Ivan Grădinari



Bulgaru Vadim

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 07 din 13. XII. 2023

Privind lucrări de renovare a unui tronson la drumul L 211.R 20-Cinișeuți-Buciușca executat în cadrul contractului nr. 43 din 29 august 2023 încheiat între Consiliul raional Rezina și SRL "VIG HOUSE" pentru lucrările de renovare a unui tronson la drumul L211 R20-Cinișeuți-Buciușca.(s.Buciușca, beton armat), valoarea contractului -1152074,29 lei, inclusive TVA 20%.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. 896/23 din 03 martie 2023, eliberată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a RM, Agenția de supraveghere tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate, reprezentat prin D-l Ivan Grădinari în calitate de antreprenor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza dispoziției președintelui raionului Nr. 88 din 26.10. 2022, în intervalul 13.XII.23, fiind formată din membrii:

Teodor Cuculescu - președintele comisiei

Secretarul comisiei: Alexandru Negară

Membrii comisiei:

Marcel Rusu – secretarul comisiei, șef SCGCD

Eugen Postu – Șeful secției economie

Radu Didenco – Arhitect-șef

Alexandru Ucrainciuc - Specialist al secției CGD

3. A participat la recepție: Ivan Grădinari- antreprenor, Victor MACRII- Primarul comunei Saharna.

4. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările sunt executate conform caietului de sarcini, a volumelor de lucrări și devizului de cheltuieli.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De respectat termenul de garanție a lucrărilor și de înlăturat neajunsurile parvenite în acest timp.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările fiind finisate.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi 13.XII.2023 la în 3 exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte

Teodor Cuculescu__

Secretarul comisiei:
Alexandru Negară

Membrii comisiei:

Marcel Rusu

Eugen Postu

Radu Didenco

Alexandru Ucrainciuc

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 13 " XII. 2023



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 13 " XII. 2023



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajarea teritoriului la L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020-20/PGC**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
4. Adresa beneficiarului **Str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 3 127 810-00 /
b) Final	1. / 3 127 810-00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	12 luni
b) efectiv realizată	5 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări la Liceului Teoretic "Alexei Mateevici"**
din orașul Șoldănești
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2021-18/PGC din 19.07. 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Lucrări la Liceului Teoretic "Alexei Mateevici"**
din orașul Șoldănești
4. Adresa beneficiarului **Str. 31 August, nr. 2, orașul Șoldănești, r-nul Șoldănești**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 3 471 357,00 /
b) Final	1. / 3 471 357,00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	12 luni
b) efectiv realizată	11 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C și D la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 17 din 8 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina**
4. Adresa beneficiarului **MD-5400, MOLDOVA, r-nul Rezina, or. Rezina, str. 1 Mai**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 448 380,72 /
b) Final	1. / 448 380,72 /
7. Litigii și modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	1 lună
b) efectiv realizată	20 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri și completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de pavare la IP Gimnaziul din s. Olișcani**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 34/22 din 14 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul din satul Olișcani, r-nul Soldanești**
4. Adresa beneficiarului **MD-7224, MOLDOVA, r-nul Olișcani, satul Olișcani**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 992 811,17 /
b) Final	1. / 992 811,17 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	1 lună
b) efectiv realizată	40 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de de restabilire a pavajului,**
la solicitarea SA "TERMOELECTRICA"
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2022096 din 24.05.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SA "TERMOELECTRICA"**
4. Adresa beneficiarului **MD-2024, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 4 618 470,64 /
b) Final	1. / 4 618 470,64 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	6 luni
b) efectiv realizată	6 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL HÎNCEȘTI
PRIMĂRIA VOINESCU



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ХЫНЧЕШТСКИЙ РАЙОН
ПРИМАРИЯ ВОЙНЕСКУ

MD-3452 r-l Hîncești s. Voinescu
telefon/fax (269)45-236; (269)45-238
e-mail: voinescu.primaria@mail.ru
str. Ștefan cel Mare Nr.184

МД-3452 Хынчештский р-н с. Войнеску
телефон/факс (269)45-236; (269)45-238
e-mail: voinescu.primaria@mail.ru
стр.Штефан чел Маре нр.184

Nr. 371

Din "01" august 2024

RECOMANDARE

Primaria sat. Voinescu ,în calitate de beneficiar, își exprimă aprecierea față de Compania SRL "VIG-HOUSE" pe care a contractat-o în anul 2024, în baza CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ nr.16 din 16.05.2024 privind achiziția **Reparatia unui sector a strazii Stefan cel Mare si Sfint in s.Voinescu(lucrări de asfaltare)** în valoare de 880168.11 lei și contractul nr.20 din 27.06.2024 **Reparatia unui sector a strazii Stefan cel Mare si Sfint in s.Voinescu etapa II (lucrări de asflatare)** în valoare de 239 627,83 lei .

Menționăm receptivitatea conducerii "VIG-HOUSE" SRL la toate obligațiunile contractuale și operativitatea specialiștilor de execuție a lucrărilor de construcție și reparații.

Lucrările au fost executate calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vre-o unor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor.

În concluzie, recomandăm compania SRL "VIG-HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova, drept un colaborator profesionist și credibil.

Primăria s. Voinescu, r-nl Hîncești
D-nul Primar – Sandu Dionisie



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afecente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 01 decembrie 2021

privind lucrarea Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova, executată la obiectul Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova, în cadrul contractului nr. 2020-20/PGC; din 27 august 2020 încheiat între SRL Polimer Gaz Conduțe și SRL Vig-House pentru lucrările de construcții pentru anul 2020-2021.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.11.2021 - 29.11.2021, fiind formată din:

Valentin Doglea - (diriginte de șantier SRL Polimer Gaz Conduțe)

Dumbravă Pavel - (diriginte de șantier SRL Vig House)

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan

director Vig-House SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

Cocîrlă Serghei

director Polimer Gaz Conduțe SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finisarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 01 decembrie 2021 la Leova în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membri: Valentin Doglea



(numele, prenumele, semnătura)

Dumbrăvă Pavel

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"01" "12" 2021

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " " 2021

L.Ș. _____

(semnătura)



Din "04" octombrie 2021

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Instituția Publică Liceul Teoretic "Constantin Spătaru" din str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova, ca beneficiar, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții **SRL "VIG HOUSE"** pe care am contractat-o în anul 2020 pentru executarea următoarelor lucrări:

1. **Lucrări de Finisarea interioară** a L.T. "Constantin Spătaru" din orașul Leova în valoare de **4 422 898 lei**;
2. **Lucrări de Amenajarea teritoriului** L.T. "Constantin Spătaru" din orașul Leova în valoare de **3 127 810 lei**.

Menționăm receptivitatea conducerii **"VIG HOUSE" SRL** la toate problemele legate de lucrările de construcție și reparații.

Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice.

În concluzie, recomandăm compania **SRL "VIG HOUSE"** pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Cu respect,
Director al L.T. "Constantin Spătaru"



Dorin Marin

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din "12" noiembrie 2022

Obiectul **Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Oliscani, s.Oliscani, r-l Soldanesti**, în cadrul contractului nr. 34/22 din "14" iulie 2022, încheiat între **IP Gimnaziul Oliscani, r-l Șoldănești** și **„VIG HOUSE” SRL** pentru lucrările de **“Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Oliscani, s.Oliscani, r-l Soldanesti”**

1. Lucrările au fost executate cu valabilitate până la 5 ani.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12. 11.2022, fiind formată din:

- Boțan Vera - președintele comisiei
- Mișcov Irina - membru comisiei
- Taban Lucia - secretarul comisiei
- Taban Mihail - membru comisiei
- Pisarenco Olga - membru comisiei

3. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan - antreprenor
Croitoru Constantin - diriginte de șantier
Negară Alexandru - responsabil tehnic
Popa Violeta - șef DI Șoldănești
Șaptefrați Adela - reprezentat APL Olișcani
Mindru Nicolae - președintele Consiliului Raional Șoldănești
Iurcu Victor – șef secție construcții, gospodării comunale și drumuri

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8324106004, adresa poștală s.Olișcani, r.Șoldănești, destinația, Construcție de învățământ și educație, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 12 noiembrie 2022, în 3 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

• Președinte: Boțan Vera _____

Membrii comisiei:

- Mișcov Irina - _____
- Taban Lucia - _____
- Taban Mihail - _____
- Pisarenco Olga - _____

Invitați:

Gradinari Ivan - _____
Croitoru Constantin - _____
Negară Alexandru - _____
Popa Violeta - _____
Șaptefrați Adela - _____
Mindru Nicolae - _____
Iurcu Victor - _____

10. Lucrarea "-Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Olișcani, s.Olișcani, r-l Soldanesti" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"VIG HOUSE" SRL

"12" noiembrie 2022

L.S. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

IP Gimnaziul Olișcani, r-l Șoldănești

"12" noiembrie 2022

L.Ș. _____

(semnătura)



IP Gimnaziul Oliscani

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2_ din 09.12.2022

Obiectul **Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Oliscani, s.Oliscani, r-l Soldanesti**, în cadrul contractului nr. 34/22_ din "14" iulie 2022, încheiat între **IP Gimnaziul Oliscani, r-l Șoldănești** și **„VIG HOUSE” SRL** pentru lucrările de **“Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Oliscani, s.Oliscani, r-l Soldanesti”**

1. Lucrările au fost executate cu valabilitate până la 5 ani.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.12.2022_, fiind formată din:

- Bojan Vera - președintele comisiei
- Mișcov Irina - membru comisiei
- Taban Lucia - secretarul comisiei
- Taban Mihail - membru comisiei
- Pisarenco Olga - membru comisiei

2. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan - antreprenor
Croitoru Constantin - diriginte de șantier
Negară Alexandru - responsabil tehnic
Popa Violeta -șef DI Șoldănești

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 12.11.2022_;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 12.11.2022_ până în prezent, respectiv pe o durată de 1_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 992 811,17_ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: _____

Obiectul cu numărul cadastral 8324106004, adresa poștală s.Olișcani, r.Șoldănești, destinația , Construcție de învățământ și educație,, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file a fost încheiat astăzi la 09.12.2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Boțan Vera

Semnatura

Membrii comisiei

- Mișcov Irina -
- Taban Lucia -
- Taban Mihail -
- Pisarenco Olga -

Reprezentantul antreprenorului:

"VIG HOUSE" SRL

"09" decembrie 2022

L.Ș.

(semnătura)



IP Gimnaziul Olișcani, r-l Șoldănești

"09" decembrie 2022

L.Ș.

(semnătura)





Diplomă

DE MULȚUMIRE

SRL "VIG HOUSE"

Prin prezenta, Vă adresăm cel mai cald cuvânt de mulțumire pentru implicarea directă în realizarea proiectului instituțional "Lucrări de pavare la IP Gimnaziul Olișcani", contribuind astfel la edificarea unei școli moderne.

Suntem profund recunoscători pentru calitatea lucrărilor realizate.

Vă exprimăm respectul și admirația pentru colaborarea sinceră manifestată constant pe parcursul acestui proiect.

Sperăm că relațiile de parteneriat dintre IP Gimnaziul Olișcani și SRL "VIG HOUSE" să fie o oportunitate nouă pentru noi, elevii, deoarece această conjugare a eforturilor ne oferă șansa de a beneficia de cea mai bună educație.

Cea mai mare mulțumire a vieții e să

Vă cunoaștem de Oameni cu Suflet Mare!



Cu deosebită considerațiune

IP Gimnaziul Olișcani

ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

Contract: „VIG HOUSE” S.R.L., nr. 2022096 din 24.05.2022;




Obiectul prezentului contract îl constituie: “Executarea lucrărilor de restabilire a pavajului”;

Comisia în componența:




Șef SRT Ciocana	Berezan Sergiu
Șef SRT Centru	Rusu Andrei
Șef SRT Rîșcani	Buzila Petru
Șef SRT Botanica	Țiganu Leonid
Șef SRT Buiucani	Buruian Vladimir
Inginer SPOM	Dimitriu Larisa
Inginer SPOM	Borodco Nicolai
Inginer SPOM	Condrea Marcel
Inginer SPOM	Vozian Valeriu
Inginer SPOM	Lisnic Tatiana
Antreprenor „VIG HOUSE”	Gradinari Ivan

confirmă faptul că toate lucrările conform prezentului contract au fost executate în termen și în volumele preconizate, obiecții nu sunt.

Gestionar:

Șef SRT Ciocana	„Berezan Sergiu” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	03 (data)	03 (luna)	2023
Șef SRT Centru	„Rusu Andrei” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	03 (data)	03 (luna)	2023
Șef SRT Rîșcani	„Buzila Petru” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	03 (data)	03 (luna)	2023
Șef SRT Botanica	„Țiganu Leonid” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	03 (data)	03 (luna)	2023
Șef SRT Buiucani	„Buruian Vladimir” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	06 (data)	03 (luna)	2023

Responsabili SPOM:

Inginer SPOM	„Dimitriu Larisa” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	03 (data)	martie (luna)	2023
Inginer SPOM	„Borodco Nicolai” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	03 (data)	martie (luna)	2023
Inginer SPOM	„Condrea Marcel” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	03 (data)	martie (luna)	2023
Inginer SPOM	„Vozian Valeriu” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	03 (data)	martie (luna)	2023
Inginer SPOM	„Lisnic Tatiana” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	03 (data)	martie (luna)	2023

Responsabil Antreprenor:
S.R.L. „VIG HOUSE”

„Gradinari Ivan” (Nume Prenume)	„  ” (Semnătura)	03 (data)	03 (luna)	2023
------------------------------------	---	--------------	--------------	------







"VIG HOUSE" SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții

MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Timișoara 25, C/f 1018600024334, c/TVA 0610932
Tel. +373 76009742, cel. +373 79003842. E-mail: vighouse@mail.ru

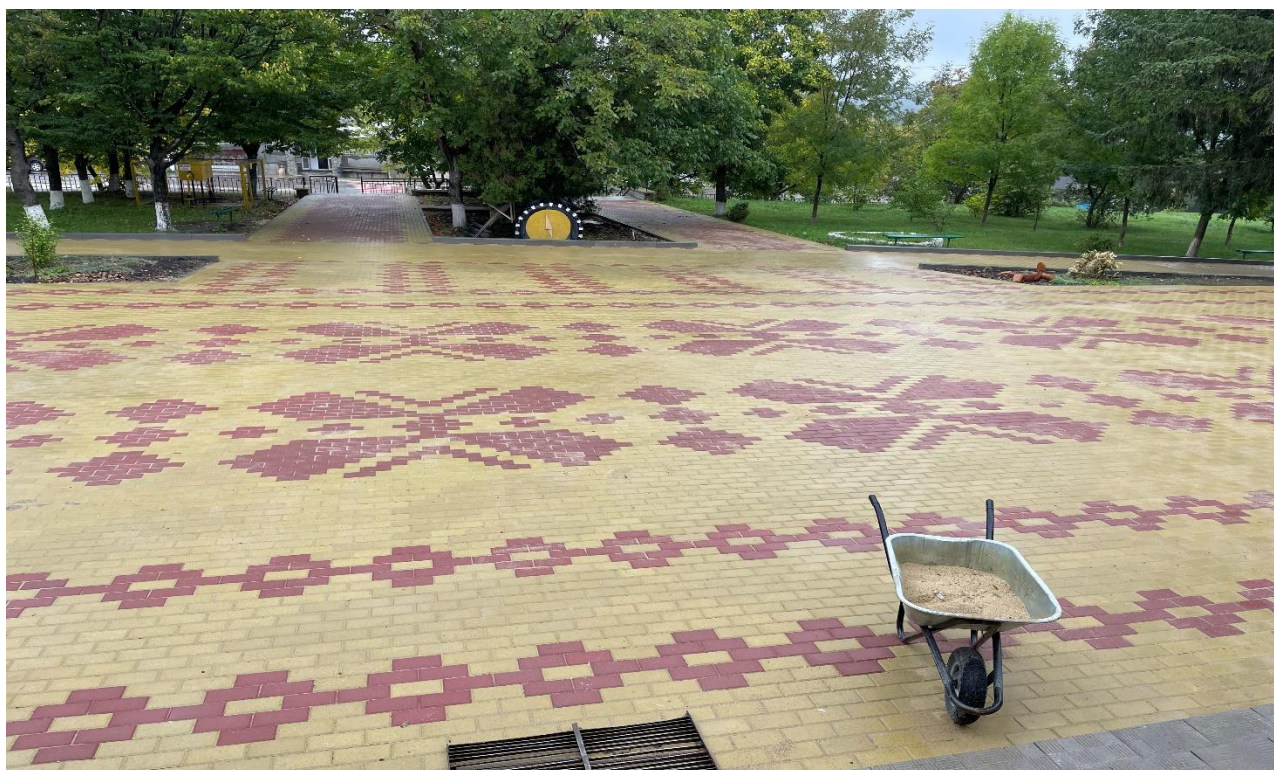



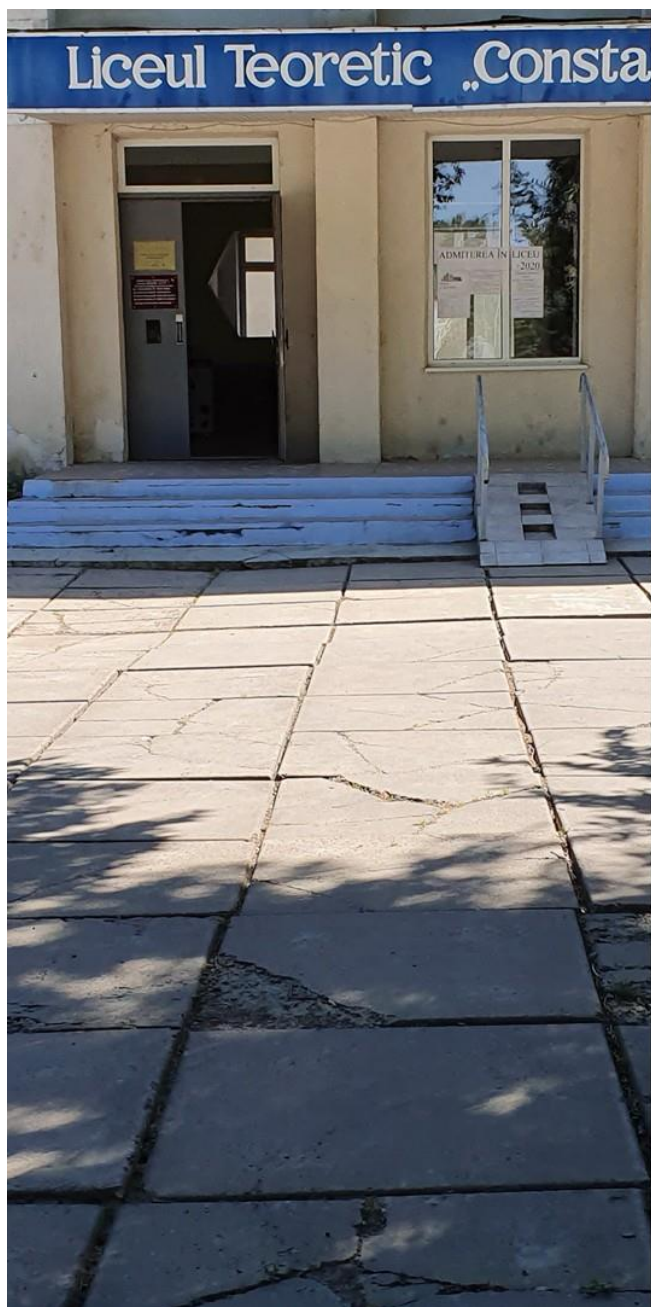

Liceul Teoretic
Constantin Spătaru
or.Leova
finanțator GIZ




până după







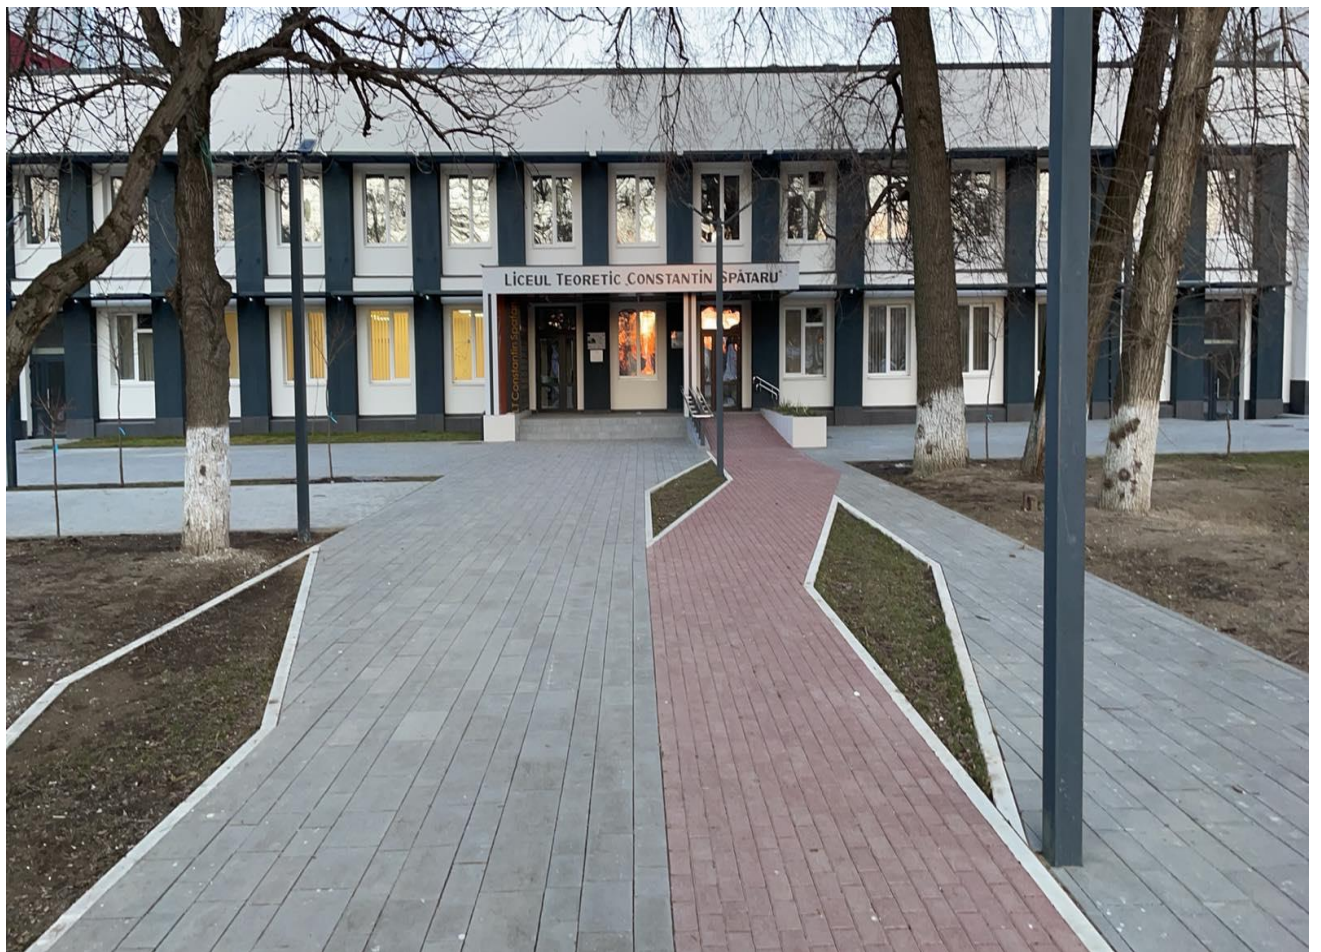














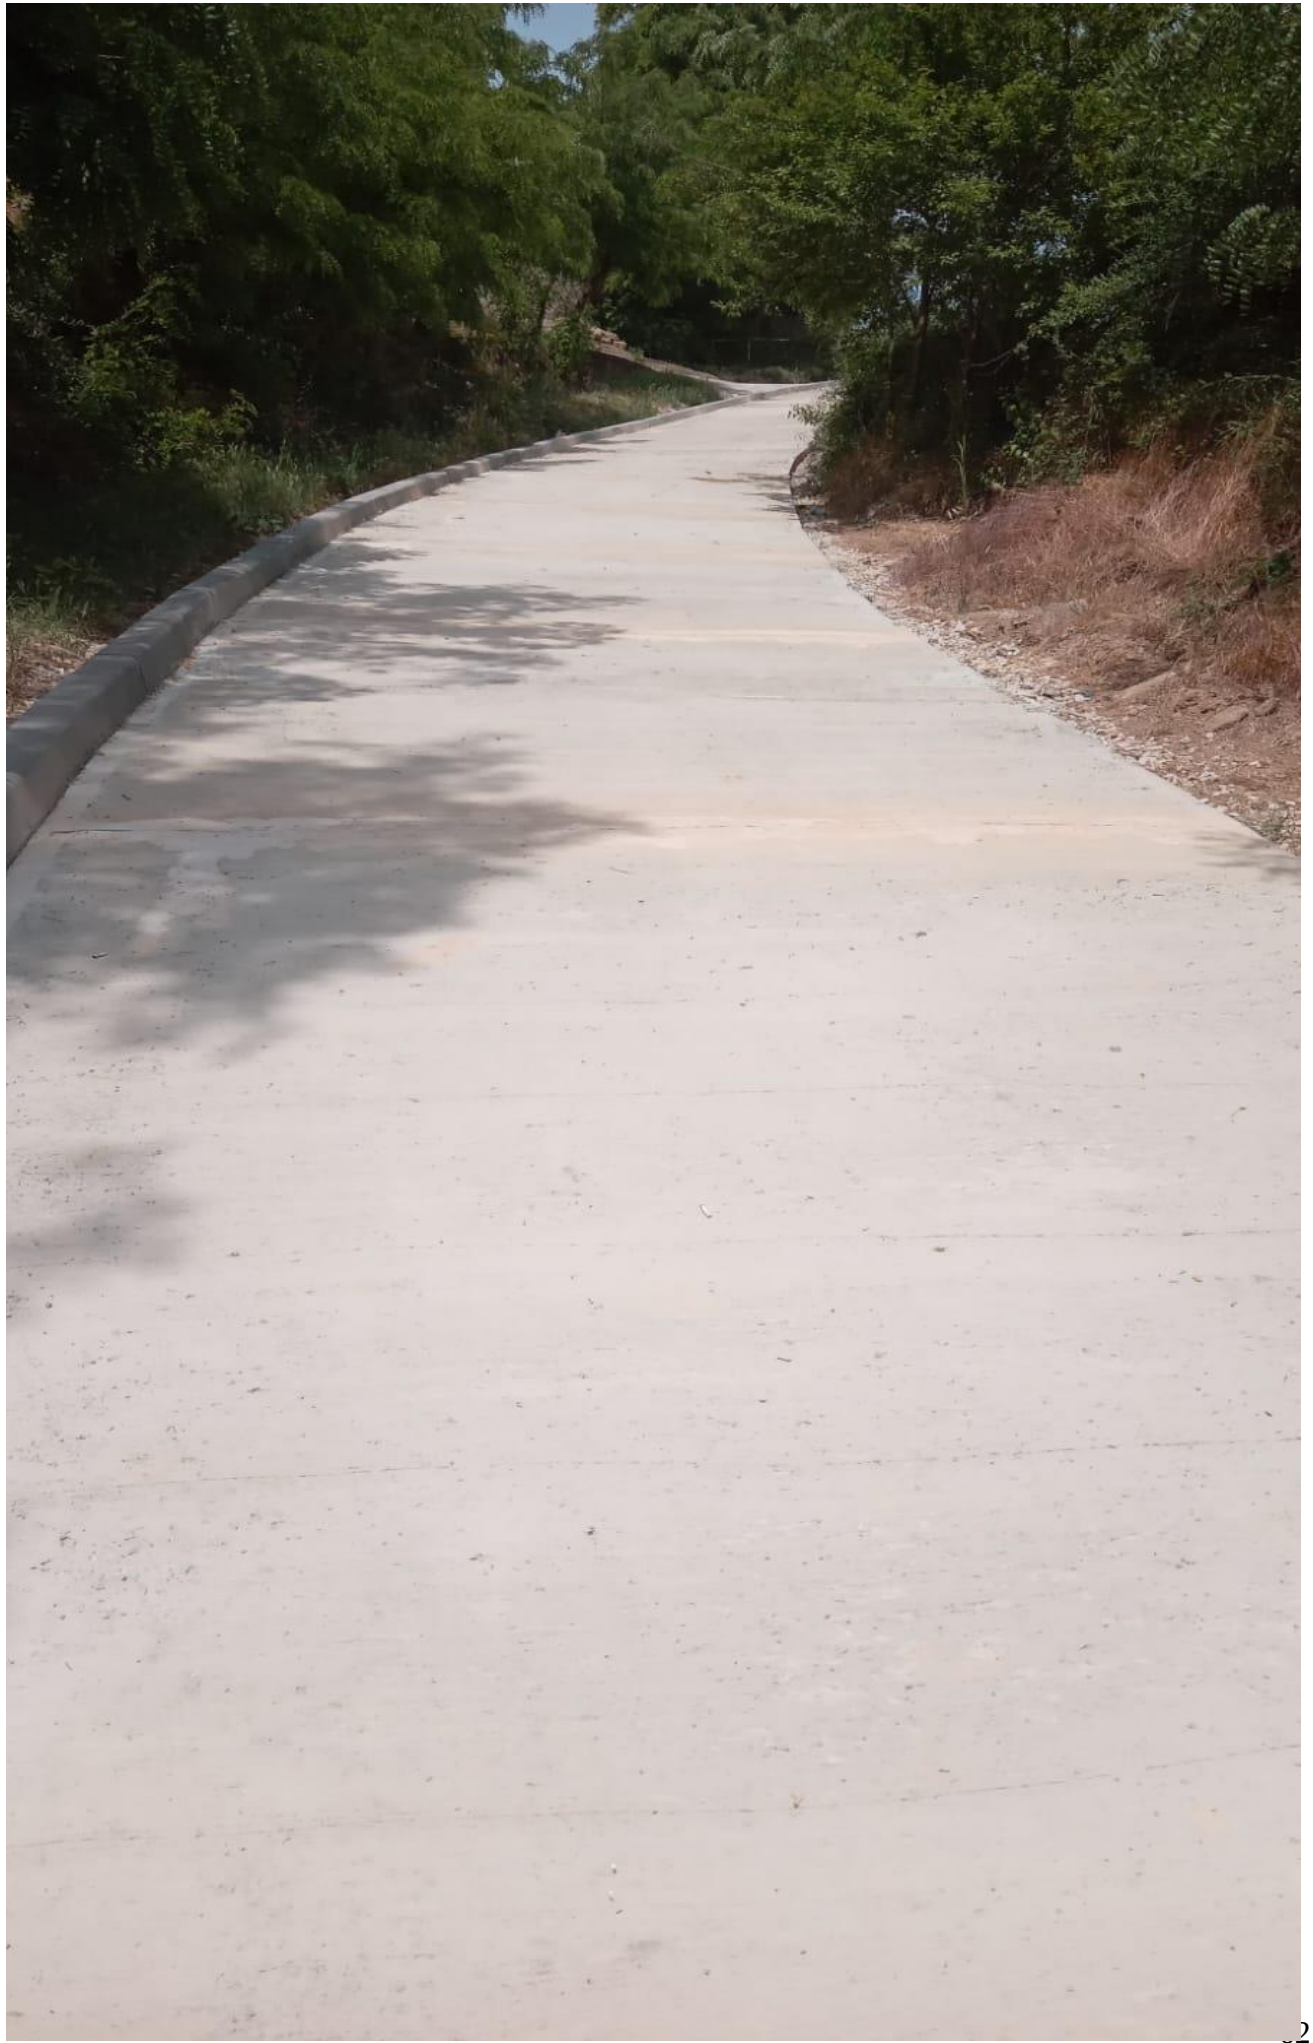



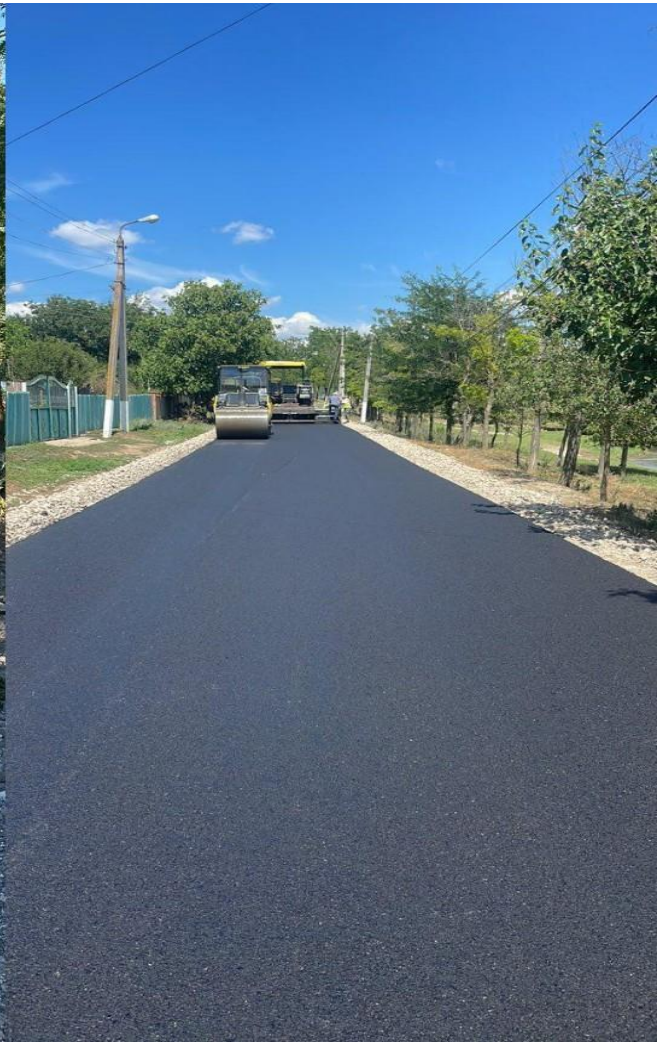

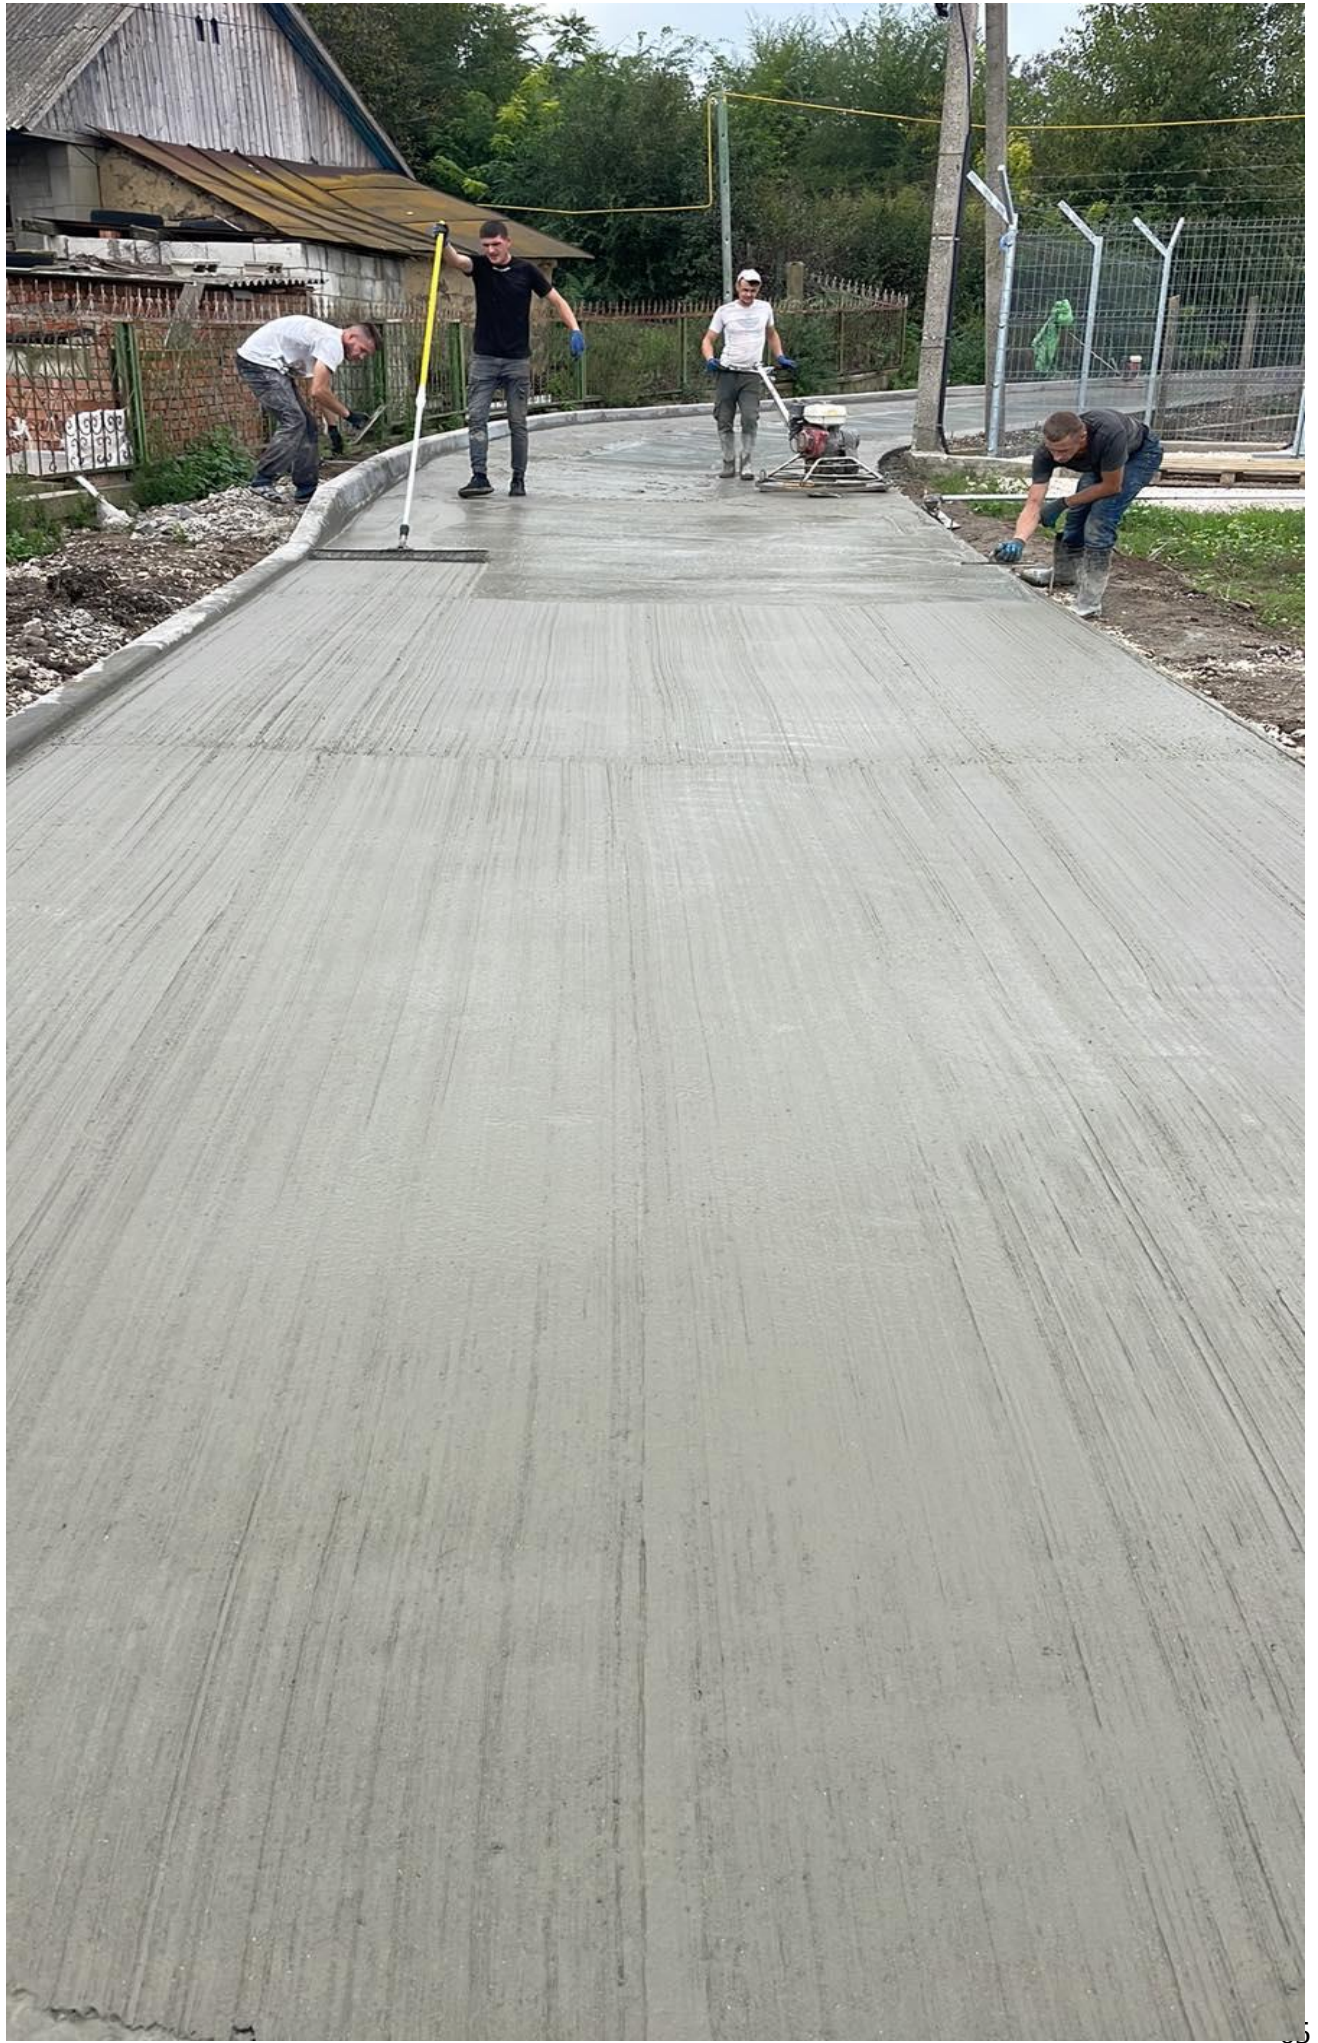



Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)
