

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Татар Н.А.

представители офертанта АО «Друмурь-Комрат»
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной

документации, выполнить Работы по ремонту и содержанию местных дорог

общего пользования на территории АТО Гагаузии

(наименование работ)

за сумму без НДС 9960127,00 (девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч сто двадцать семь лей) 00 бан леев,

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 1992025,40 (один миллион девятьсот девяносто две тысячи двадцать пять лей) 40 бан леев.

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 7 (семь) календарных месяцев.

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (шестьдесят) дней, соответственно до 21 июль 2019 года г.

(продолжительность цифрами и прописью) и она останется обязательной для нас и
(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливает договор между нами.

5. Наряду с основной офертой:

подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 21 / май / 2019

_____, в качестве Директор,
уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени АО
«Друмурь-Комрат»
(наименование/фамилия офертанта)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком ____ - ____ (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме банковская гарантия
в размере 3 % (от общей стоимости в оферте) и составляет 358,6 тысяч леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ 12 календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 7 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 5 календарных дней.

Офертанта,



(уполномоченная подпись)



ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(наименование работ)


№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2019							2020
		Месяц							
		06	07	08	09	10	11	12	01
1.	Организация строительного участка	✓							
2.	Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Подписано: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы и печать: _____

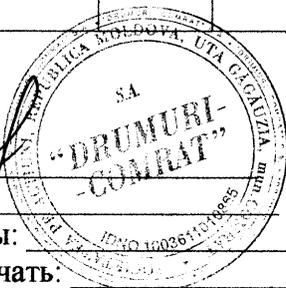

ФОРМУЛЯР F3.5

ДЕКЛАРАЦИЯ

о невовлечении в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Нижеподписавшийся, Татар Н.А. уполномоченный представитель АО «Друмурь-Комрат» (наименование экономического оператора) в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, заявляю под собственную ответственность, под угрозой исключения из процедуры государственной закупки и под угрозой наказания за ложь в публичных документах, что не нахожусь в ситуации, предусмотренной ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года о государственных закупках, соответственно за последние 5 лет не был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Нижеподписавшийся, Татар Н.А. уполномоченный представитель АО «Друмурь-Комрат» (наименование экономического оператора), в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, в процедуре открытые торги (указывается процедура) по присуждению договора о государственной закупке с предметом **Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузии** (наименование работы), код CPV 45200000-9, от 22.05.2019 года (день/месяц/год), организованной Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии (наименование закупающего органа), заявляю под собственную ответственность, что:

- a) не входил в процесс несостоятельности вследствие судебного решения;
- b) выполнил обязательства по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны регистрации до запрошенной даты;
- c) не был осужден, за последние 3 года, на основании окончательного решения судебной инстанции, за деяние, которое привело к нарушению профессиональной этики или за совершение ошибки в профессиональной области;
- d) не включен в Список запрещенных экономических операторов.

Нижеподписавшийся заявляю, что информация, предоставленная в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора, является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Дата заполнения: 21.05.2019

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н.А.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: АО «Друмурь-Комрат»



ФОРМУЛЯР F3.7

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование / имя АО «Друмурь-Комрат»
 2. Фискальный код 1003611010865
 3. Адрес центрального офиса мун. Комрат ул. Танкистов 2а
 4. Телефон 0 298 2 34 08
 Факс 0 298 2 49 56
 Телекс _____

E-mail comrat_drum@asd.md

5. Сертификат о регистрации MD0011923 от 30.12.1992 г.
 (номер, дата регистрации)

Camera Inregistrari de Stat

(institutiya emitentă)

6. Предмет деятельности: ремонт и содержание автодорог
 7. Лицензия (сертификат) А ММП № 050768 от 11.02.2016 г.
 8. Офисы, филиалы/местные отделения, если необходимо: --

(полные адреса, телефон/телекс/факс, сертификаты о регистрации)

9. Основной рынок деятельности: _____

10. Валовый оборот за последние 3 года:

№ п/п	Год	Валовый годовой оборот на 31 декабря, тыс.леев	Валовый годовой оборот на 31 декабря, эквивалент долларам США
1.	2016	24347,4	
2	2017	46014,7	
3	2018	64248,5	
Среднегодовой:		44870,2	

Общая ликвидность = $\frac{\text{Текущие активы}}{\text{Краткосрочные обязательства}} \times 100 \% = \frac{19404988}{6226496} \times 100 \% = 311,6\%$

Дата заполнения: 21.05.2019

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н.А.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: АО «Друмурь-Комрат»



ФОРМУЛЯР F3.9

1. Наименование и предмет договора Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия.

2. Номер и дата договора № 17/02237/001 от 05.09.2017 г.

3. Наименование/фамилия бенефициара I.S. "Sud-A-Con"

4. Адрес бенефициара мун. Комрат ул. Котовского 93

5. Страна Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора

Подрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**

7. Стоимость договора 12613874,97 Лей выраженной в деньгах в которой выраженной эквиваленте в Лей в долларах США

а) первоначальная

(на момент подписания договора) 12613874,97 Лей

б) финальная

(на момент завершения договора) 12613874,97 Лей

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: ---

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору 5 месяцев

б) эффективно выполненный 5 месяцев

в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром ---

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 22-06/18 22.06.2018 от 22.06.2018

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки ---

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах ---


Дата заполнения: 21.08/2018

Подписано: [Подпись]

Фамилия: Татар Н.А.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: АО «Друмурь-Комрат»



ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ крт .	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/ адрес	Качество подрядчика*	Цена договора/ стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Lucrari de intretinerea periodica si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Gagauziei	IS Administrația de Stat a Drumurilor mun. Chisinau str. Bucuriei 12	Подрядчик	37031299,71 lei	30.11.2018	Lunar
2	Работы по содержанию местных дорог общего пользования на территории Гагаузии	IS Sud-A-Con, mun. Comrat str. Lenin 204/b	Подрядчик	9838617,00 lei	31.12.2018	Lunar

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Дата заполнения: 21.05.2019

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н.А.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: АО «Друмурь-Комрат»



ФОРМУЛЯР F3.11

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора


№ d/o	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из других источников
0	1	2	3	4
1.	Автогрейдер	шт	5	
2.	Каток	шт	7	
3.	Бульдозер	шт	2	
4.	Автомобиль	шт	9	
5.	Экскаватор	шт	4	
6.	Погрузчик	шт	3	
7.	Компрессор	шт	2	
8.	Трактор	шт	14	
9.	Фреза дорожная	шт	3	
10.	Машина для пломбирования ям	шт	1	
11.	Асфальтоукладчик	шт		1

Подписано: _____

Фамилия: Татар Н. А.

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: АО «Друмурь-Комрат»

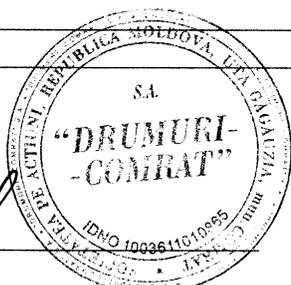


ФОРМУЛЯР F3.12

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименования схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1		2	3	4	
	Главный инженер Руководитель проекта	Дорожное строительство	34		2018-DȘ № 0103 din 30.03.2018
	Руководитель проекта	Дорожное строительство	36		2014-DȘ № 2531 din 14.11.2014
	Руководитель проекта	Дорожное строительство	26		2015-DȘ № 2915 din 11.04.2015
	Мастера		7		
	<u>Автогрейдерист</u>		42		
	<u>Автогрейдерист</u>		11		
	<u>Тракторист</u>		31		
	<u>Тракторист</u>		23		
	<u>Тракторист</u>		25		
	<u>Тракторист</u>		27		
	<u>Водитель</u>		38		
	<u>Водитель</u>		26		
	-				

Подписано: 

Фамилия: Татар Н.А.


Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: АО «Друмурь-Комрат»





2014-0000002535

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 17/02237/001**

о закупке посредством открытых торгов

«05» сентября 2017 г

м.Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № 17.02237 от 29 августа 2017 года, между **И.С. «SUD-A-CON»**, с местонахождением в м.Комрат, ул. Котовского, 93, тел.: 2-40-41, 2-34-75, факс: 2-35-06, e-mail: sudacon@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, под № 137019588 от «12» декабря 1997 года, в лице **и.о. директора Болгар Сергея Михайловича**, в качестве **Бенефициар**,

SA «Drumuri-Comrat», с местонахождением в г.Комрат, ул.Танкистов, 2а, телефон: 0 (298) 2-34-08, моб.: 079221527, факс: _____, e-mail: _____, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № МД 0011923 от «__» ____ 20__ года, уполномоченный для строительной деятельности: лицензия серии АММII № 050768 от «10» февраля 2016 года, выданное Лицензионной палатой РМ, на 5 лет, для видов деятельности строительно-монтажные, в лице **директора Татар Николая Антоновича**, в качестве **Подрядчика**, другой стороны

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия.

Код CPV: 45233000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и спецификациями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет **5 (пять) месяцев** с момента подписания договора, получения распоряжения о начале выполнения работ и обеспечения ритмичной работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Бенефициара;
- б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технически

условии.

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приёма и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончании работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

1. Стоимость работ и способы оплаты

1.1. Стоимость строительно-монтажных работ, которые являются объектом настоящего договора, составляет

14 384 696,85 (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто шесть лей 85 бань. (включая НДС).

Лот №1. Комратский район

✓ **4 506 339,74 (Четыре миллиона пятьсот шесть тысяч триста тридцать девять лей 74 бани). (включая НДС).**

Лот 2. Чадыр-Лунгский район

6 586 556,29 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят шесть лей 29 бань). (включая НДС.)

✓ **в 2017 году – 4 815 734,41 (Четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч семьсот тридцать четыре лея 41 бань).**

в 2018 году – 1 770 821,88 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать один лей 88 бань).

✓ *Лот №3. Вулканештский район*

3 291 800,82 (Три миллиона двести девяносто одна тысяча восемьсот лей 82 бани). (включая НДС).

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появятся несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до «31» декабря 2018 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «05» сентября 2017 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон:

I.S. «SUD-A-CON» :

Адрес: м.Комрат, ул. Котовского, 93

Тел./Факс: 2-40-41, 2-34-75

Название Банка: Министерство-
Финансов

Адрес Банка: Казначейство м.Комрат


Банковский Код: TREZMD2X

Расчетный счет:

MD98TRPBA6222500114740 A1

Фискальный Код: 1003611151021

Подпись

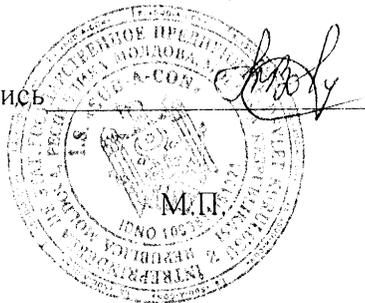

SA «DRUMURI-COMRAT» :

Адрес: м.Комрат, ул.Танкистов, 2а

тел./Факс: 0 (298) 2-34-08

Название Банка:

BC MOLDINDCONBANK SA

Адрес Банка: Fil. Comrat

Банковский Код:

Расчетный счет:

MD55ML000000002251150118

Фискальный Код: 1003611010865

Подпись



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 20-06/18 от «20» июня 2018 г.

Privind lucrarea: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Вулканештского района.

В отношении работы: в пределах выделенной суммы из дорожного фонда на 2017 год.

executata la obiectul : «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 17/02237/001 от 05 сентября 2017 года.

согласно контракта № :

oncheiat ontre: IS «SUD-A-CON» и SA «DRUMURI-COMRAT»

заклученному между:

pentru uscararii de: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Вулканештского района.

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: , eliberata de:

Работы выполнены на основании разрешения №: выданного:

cu valabilitate pina la:

со сроком действия до:

1. Comisia de reexpertise si-a desfasurat activitatea on intervalul 20 июня 2018 г., find formata din в составе
Приемочная комиссия проводила работу в сроки

Председатель комиссии: Константинов Н.Ф. – И.О. Начальника Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии

Члены комиссии:

Паня В.А. – Главный специалист по строительству
отдела развития территории ГУС и И Гагаузии
Болгар С.М. – И.О. директора ГП «SUD-A-CON»
Ротару И.Г. – И.О. Председателя Вулканештского района
Янак П.И. – Технадзор объекта

2. Au mai participatt la receptie: Константинов Н.Ф., Паня В.А., Болгар С.М., Ротару И.Г., Янак П.И.

Принимали участие в приемке:

3. Constatariile comisiei de receptie: Документация в комплекте.
Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:
Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:
Нарушения требований проекта при производстве строительного-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает:

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим:

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:
Приемочная комиссия рекомендует следующее:

7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile,
a fost onchieat
Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astez «20» «июня» 2018 г. on 5 exemplare
Сегодня _____ в экземплярах

Presedinte: Константинов Н.Ф.
Председатель:

Membri:
Члены:

Паня В.А.

Болгар С.М.

Ротару И.Г.

Янак П.И.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:
Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией.
Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

« _____ » _____ 20 _____ г.

L.S.
М.П.

(semnatura / подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор SA «DRUMURI-
COMRAT»

Татар Н.А.

«20» июня 2018 г.

(semnatura / подпись)

МП

ПРИНЯЛ:

И.О. Начальника Главного
Управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии

Константинов Н.Ф.

«20» июня 2018 г.

(semnatura / подпись)

МП

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 22-06/18 от «22» июня 2018 г.

Privind lucrarea: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Комратского района.

В отношении работы: в пределах выделенной суммы из дорожного фонда на 2017 год.

executata la obiectul : «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 17/02237/001 от 05 сентября 2017 года.

согласно контракта № :

oncheiat ontre: IS «SUD-A-CON» и SA «DRUMURI-COMRAT»

заклученному между:

pentru uscrarili de: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Комратского района.

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного: _____

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до: _____

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 22 июня 2018 г., find formata din _____ в составе
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____

Председатель комиссии: Константинов Н.Ф. – И.О. Начальника Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии

Члены комиссии:

Паня В.А. – Главный специалист по строительству отдела развития территории ГУСиИ Гагаузии

Болгар С.М. – И.О. директора ГП «SUD-A-CON»

Камильчу С.А. – Председатель Комратского района

Янак П.И. – Инженер ПТО (технадзор) ГП «SUD-A-CON»

2. Au mai participatt la receptie: Константинов Н.Ф., Паня В.А., Болгар С.М., Камильчу С.А., Янак П.И.

Принимали участие в приемке:

3. Constatarile comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительного-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: _____

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: _____

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:
Приемочная комиссия рекомендует следующее:

7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astez «22» «июня» 2018 г. on 5 exemplare

Сегодня

в _____ экземплярах

Presedinte: Константинов Н.Ф.

Председатель:

Membri:

Члены:

Паня В.А.

Болгар С.М.

Камильчу С.А.

Янак П.И.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«__» _____ 20__ г.

L.S.

М.П.

(semnatura / подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор SA «DRUMURI-
COMRAT»

Татар Н.А.

«22» июня 2018 г.

ПРИНЯЛ:

И.О. Начальника Главного
Управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии

Константинов Н.Ф.

«22» июня 2018 г.

(semnatura / подпись)

(semnatura / подпись)

МП

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 20-06/18 от «20» июня 2018 г.

Privind lucrarea: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Вулканештского района.

В отношении работы: в пределах выделенной суммы из дорожного фонда на 2017 год.

executata la obiectul : «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 17/02237/001 от 05 сентября 2017 года.

согласно контракта № :

oncheiat ontre: IS «SUD-A-CON» и SA «DRUMURI-COMRAT»

заклученному между:

pentru ucrarili de: Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории Вулканештского района.

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного: _____

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до: _____

1. Comisia de rexeptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 20 июня 2018 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе _____

Председатель комиссии: Константинов Н.Ф. – И.О. Начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии

Члены комиссии:

Паня В.А. . – Главный специалист по строительству
отдела развития территории ГУСиИ Гагаузии
Болгар С.М. – И.О. директора ГП «SUD-A-CON»
Ротару И.Г. – И.О. Председателя Вулканештского района
Янак П.И. – Технадзор объекта

2. Au mai participatt la receptie: Константинов Н.Ф., Паня В.А., Болгар С.М., Ротару И.Г., Янак П.И.

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.
Приемочная комиссия установила: _____

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:
Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:
Нарушения требований проекта при производстве строительного-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:
Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: _____

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :
Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: _____

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astez «20» «июня» 2018 г. on 5 exemplare

Сегодня

в _____ экземплярах

Presedinte: Константинов Н.Ф.

Председатель:

Membri:

Члены:

Паня В.А.

Болгар С.М.

Ротару И.Г.

Янак П.И.

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

« _____ » _____ 20 _____ г.

L.S.

М.П.

(semnatura / подпись)

(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор SA «DRUMURI-COMRAT»

Татар Н.А.

«20» июня 2018 г.

ПРИНЯЛ:

И.О. Начальника Главного
Управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии

Константинов Н.Ф.

«20» июня 2018 г.

(semnatura / подпись)

МП

(semnatura / подпись)

МП
