

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea, (tronsonul Vatici - Morozeni) km 21,2 – 27,83".**
2. Numărul și data contractului **nr. 10/01-05/137 din 19.05.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **or.Chisinau, str.Bucuriei, 12 a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 75 067 435,97 lei | 4 415 731,44 dolari |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 80 896 015,20 lei | 4 758 589,12 dolari |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu e cazul**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată **12**
- b) efectiv realizată **12**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu a avut loc**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.58 din 07.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu e cazul**

Data completării: 15.09.2025

Semnat: _____

Nume: Vitalii Mrug

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "Genesis International" SRL

Digitally signed by Mrug Vitalii
Date: 2025.09.15 16:12:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **_ Reabilitarea strazii Alexandru cel Bun din or. Chișinău.**
2. Numărul și data contractului Contract Agreement din 24 noiembrie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia generala Transport public si cai de comunicatie**
4. Adresa beneficiarului **2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. S.Lazo,18 mun. Chișinău**
5. Țara **_ Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **_ antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 57 926 466 lei 2 970 588 EURO
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 57 926 466 lei 2 970 588 EURO
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu e cazul
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată
20
 - e) efectiv realizată 18
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a avut loc
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.MD-CURSP/012 din 16.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu e cazul

Data completării: 15.09.2025

Semnat: _____

Nume: Vitalii Mrug

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "Genesis International" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 11, „Drum L313 M2-Drum de acces spre satul Miclești km 0+000 – km 5+000” și „Drum L314 M2 - Peresecina – Hîrtopul Mare - Ohrincea km 1+640 - km 15+390”.**
2. Numărul și data contractului **Nr. LRIP/W3/01 din data de 29 mai 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chisinau, str.Bucuriei, 12 a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **99 875 975,99 lei**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **99 875 975,99 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu e cazul**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată **18**
 - h) efectiv realizată **18**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu a avut loc**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.25 din 19.06.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu e cazul**


Data completării: 15.09.2025

Semnat: _____

Nume: Vitalii Mrug

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: “Genesis International” SRL



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ MOBILITATE URBANĂ

nr. 109/2-01-126 din 25.03.2024

la nr. _____ din _____

„Genesis International” SRL

drumuri.gi@gmail.com

Prin prezenta, Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului Municipal Chișinău, denotă că conform contractului de antrepriză, încheiat cu SC ”Genesis International” SRL, Nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021 ”Reabilitarea străzilor secundare: Tighina, Alexandru cel Bun și 31 August 1989 (trei loturi), Lot 1: Reabilitarea străzii Tighina, Lot: 3 Reabilitarea străzii Alexandru cel Bun” – în valoare de 5 813 047 EURO fără TVA.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate accidente tehnice din vina exclusivă a antreprenorului, neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate. Totodată, recepția lucrărilor a avut loc în termen cu obiecții ce nu afectează exigențele esențiale. Obiectul menționat a fost date în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu toată documentația corespunzătoare.

Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului Municipal Chișinău caracterizează compania "Genesis International" SRL drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante (inclusiv uzina de beton asfaltic pentru producerea mixturilor asfaltice) ce corespund tuturor cerințelor actuale privind construcția, reparația și reabilitarea drumurilor.

Reieșind din cele expuse, Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului Municipal Chișinău recomandă compania ”Genesis International” SRL pentru execuția lucrărilor în cadrul obiectelor similare.

Șef al DG MU

Vitalie MIHALACHE

Ex. D. Ceban
(022-204-686)

Contract Agreement

THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the 24th day of November, 2021.

BETWEEN

- (1) **CITY OF CHISINAU**, a local public authority of Chisinau and having its principal place of business at, 83, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Chișinău, MD-2012, Republic of Moldova (hereinafter called "the Employer"), and
- (2) **GENESIS INTERNATIONAL LLC**, a corporation incorporated under the laws of the Republic of Moldova and having its principal place of business at 84/6 Albișoara Str., Chișinău, MD-2005, Republic of Moldova (hereinafter called "the Contractor").

WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as **RECONSTRUCTION OF SECONDARY STREETS: TIGHINA, ALEXANDRU CEL BUN AND 31 AUGUST 1989 (THREE LOTS) - LOT 1: RECONSTRUCTION OF TIGHINA STREET** and has accepted a Tender by the Contractor for the execution and completion of these Works and the remedying of any defects therein, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
2. The following documents, in order of precedence, shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
 - (a) the Letter of Acceptance.
 - (b) the Letter of Tender;
 - (c) the Addenda No's 1 and the Answers to the Requests of Clarifications
 - (d) the Particular Conditions;
 - (e) the General Conditions;
 - (f) the Specification/Employer's Requirements;
 - (g) the Drawings;
 - (h) the Contractor's Technical Proposal;
 - (i) The Contractor's corrected **Bill of Quantities** and
 - (j) the completed Schedules and any other documents forming part of the Contract.
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
4. The Accepted Contract Amount, as reflected in the Letter of Tender and in the Contractor's corrected **Bill of Quantities is EUR 2,970,588.37 (two million nine hundred seventy thousand eighty-eight EUR and thirty-seven Euro cents), excluding the Value Added Tax ("VAT").**
5. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

MDL Account

Payee's Account Name: Genesis International LLC

Payee's Account No. (IBAN): MD32 AG00 0000 0225 1370 5438



Payee's Bank Name: Commercial Bank "Moldova - Agroindbank" S.A.
Payee's Bank Address: 182 Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova
SWIFT CODE: AGRNMD2X

EUR Account

Payee's Account Name: Genesis International LLC
Payee's Account No. (IBAN): MD32 AG00 0000 0225 1392 4726
Payee's Bank Name: Commercial Bank "Moldova - Agroindbank" S.A.
Payee's Bank Address: 182 Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova
SWIFT CODE: AGRNMD2X
Correspondent Bank: Landesbank Baden-Wurttemberg
Stuttgart, Germany
SWIFT: SOLADEST

6. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

Agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Signed by: CEBAN ION

Signed by: MRUG VITALII

For and on behalf of the Employer in the presence of

For and on behalf the Contractor in the presence of
GENESIS INTERNATIONAL LLC

Witness: _____

Witness: _____

Name: _____


Name: _____

Address: 83, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Chișinău

Address: 84/6 Albișoara Str., Chișinău

Date: 24th of November, 2021

Date: 24th of November, 2021



Aprob:

**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 17.10. 2023

privind lucrarea reabilitarea străzii executată la obiectul str. Tighina în cadrul contractului nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021 încheiat între Direcția Generală Mobilitate Urbană și S.R.L. „Genesis Internațional” & S.R.L. „Compania Electrică” pentru lucrările de Reabilitare a străzii Tighina.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000127, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 04.04.2023, cu valabilitate pînă la 03.11.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.10.2023, fiind formată din

Președinte:	Ilie Ceban	- viceprimarul municipiului Chișinău
Membri:	Igor Vrabie	- director adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare
	Dumitru Ceban	- șef adjunct, Direcția Generală Mobilitate Urbană
	Valentin Șvaga	- șef Direcția lucrări edilitare, DGMU
	Iulian Severin	- expert tehnic drumuri, UIP, Primăria mun. Chișinău
	Sergiu Cotoman	- șef al Serviciului sistematizare a circulației rutiere din cadrul Secției supraveghere transport și circulație rutieră a Direcției de Poliție a mun. Chișinău
	Lilian Copaci	- șef Direcția management transport, DGMU
	Alina Popovici	- vicepreședinte al sectorului Centru
	Pavel Movilă	- vicepreședinte al sectorului Buiucani
	Tudor Buzu	- vicepreședinte al sectorului Rîșcani
	Ghenadii Zadeseneț	- director interimar Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
	Dorin Ciornîi	- director Î.M. „Regia Transport Electric”
	Sergiu Tomiță	- administrator Î.M. Regia „Exdrupo”
	Alexandru Bajura	- vicedirector Î.M. „Regia Autosalubritate”
	Vasile Efros	- șef Direcția amenajare și Mediu, DGLCA
	Inga Badrajan	- director adjunct, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”
	Vitalie Lungu	- inginer-șef, Î.M.R.E.I. „Lumteh”

La recepție au participat în calitate de invitați:

Valentina Fluieraș	- inginer-șef, I.M.P. „Chișinăuproiect”
Luminița Manole	- Egis Internațional
Andrei Rusnac	- Egis Internațional

4. Constatările comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul și autorizația de construire

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea la terminarea lucrărilor cu îndeplinirea
lucrărilor menționate în anexa nr. 1 și nr. 2.

7¹. Descrierea obiectului „Reabilitarea străzii Tighina”:

Drumul supus recepției are următorii indici de baza:

1. Categoria tehnica - Secundara
2. Lungimea – 1.628 km;
3. Benzi de încadrare - 2 x 3.30/4.50 m;
4. Lățimea părții carosabile – 6.60 – 9.00 m;
5. Lățimea trotuarelor – 2 - 3,5 m;

Sistemul rutier:

1. Executarea stratului Fundație = 10 982 m²
2. Executarea stratului de fundație din amestec reciclat la rece, h = 10 cm – 12 900.00 m²
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulație mare BAD 22.4, h = 6 cm – 12 900.00 m²
4. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h = 4 cm – 12 900 m²

Trotuare pietonale:

1. Amenajare parcarii auto din pavaj, h = 8 cm – 2 068.00 m²
2. Amenajare intrării în curți și cartiere din pavaj, h = 8 cm – 1707.00 m²;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm – 12 587.00 m²
4. Montare Bordura mare Br 100x30x18 – 3 324.00 m.l
5. Montare Bordura mare Br 100x30x15 – 2 134.00 m.l
6. Amenajare zone verzi – 2 400.00 m²

Canalizare pluviala:

1. Construcția canalizării pluviale Pc 01+15 – Pc 05+75 – 455.00 m.l
2. Construcția canalizării pluviale Pc 08+20 – Pc 10+30 – 219.00 m.l

Siguranța Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere – 174.00 buc
2. Marcaj rutier – 550.00 m²
3. Parapet pietonal – 301.00 m.l

Iluminat stradal:

1. Corpuri de iluminat de 102 W – 60 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W – 60 buc
3. Corpuri de iluminat “Treccerile pentru Pietoni” 51 W – 20 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 17.10. 2023 la DBMU în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte I. Ceban

Membri: I. Vrabie

D. Ceban

V. Șvaga

I. Severin

P. Copaci

A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zadesene

S. Cotoman

D. Ciornii

S. Tomiță

A. Bajura

V. Efros

I. Badrajan

V. Lungu

Invitați: V. Flueraș

L. Manole

A. Rusnac

10. Lucrarea „Reabilitarea str. Tighina” este:

TRANSMISĂ:

Executantul: S.R.L. „Genesis Internațional”
& S.R.L. „Compania Electrică”

" " 2023

Nume/Prenume

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

Investitorul: Direcția Generală Mobilitate
Urbană

" " 2023

Nume/Prenume


L.Ș.

(semnătura)



Din documentația scrisă și desenată lipsește


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1)	Reorganizarea circulației rutiere, inclusiv prin modificarea semnalizării rutiere pe sectorul Bernardazzi - M. Kogălniceanu; Intersecția str. Tighina cu str. M. Verlaam, termen de finalizare 30.11.2023.
2)	Revizuirea proiectului de execuție (marșaj și indicațoare rutiere) cu includerea stațiilor de transport public, finalizare conform legislației în vigoare.
3)	Revizuirea proiectului de execuție (adaugarea spații verzi) cu includerea plantării copacilor, termen de finalizare 30.11.2023.
-	Beneficiarul va pune la dispoziția Inginerului și Antreprenorului proiectul revizuit conform celor de mai sus; Beneficiarul va pune la dispoziția Inginerului și Antreprenorului caietul de sarcini pentru plantarea copacilor.

Președinte  I. Ceban


Membri:  I. Vrabie

 D. Ceban


 V. Șvaga

 I. Severin

 L. Copaci


 A. Popovici


 P. Movilă

 T. Buzu


 G. Zadesene

 S. Cotoman


 D. Ciornii


 S. Tomiță


 A. Bajura

 V. Efros

 I. Badrajan

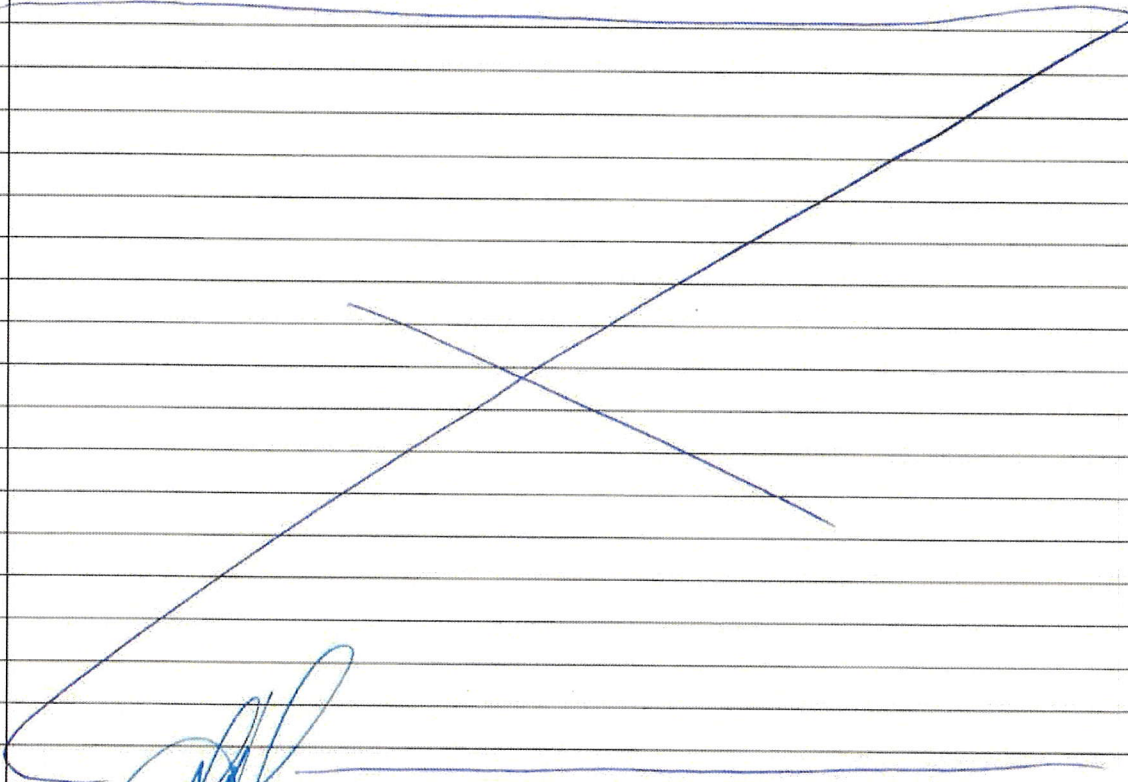
 V. Lungu

Invitați:  V. Flueraș

 L. Manole

 A. Rusnac

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Finalizarea marelui rutier orizontal la treceri auto, termen de finalizare 30.11.2023. 

Preşedinte

I. Ceban

Membri:

I. Vrabie

D. Ceban

V. Svaga

I. Severin

A. Copaci

A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zadesenety

S. Cotoman

D. Ciornîi

S. Pomîță

A. Bajura

V. Efros

I. Badrajan

V. Lungu

V. Flueras

L. Manole

A. Rusnac

Invitați:

Contract Agreement

THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the 24th day of November, 2021.

BETWEEN

- (1) ***CITY OF CHISINAU***, a local public authority of Chisinau and having its principal place of business at, 83, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfint, Chișinău, MD-2012, Republic of Moldova (hereinafter called “the Employer”), and
- (2) ***GENESIS INTERNATIONAL LLC***, a corporation incorporated under the laws of the Republic of Moldova and having its principal place of business at 84/6 Albișoara Str., Chișinău, MD-2005, Republic of Moldova (hereinafter called “the Contractor”).

WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as ***RECONSTRUCTION OF SECONDARY STREETS: TIGHINA, ALEXANDRU CEL BUN AND 31 AUGUST 1989 (THREE LOTS) - LOT 3: RECONSTRUCTION OF ALEXANDRU CEL BUN STREET*** and has accepted a Tender by the Contractor for the execution and completion of these Works and the remedying of any defects therein, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

- 1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.*

- 2. The following documents, in order of precedence, shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.**

- (a) the Letter of Acceptance.
- (b) the Letter of Tender;
- (c) the Addenda No's 1 and the Answers to the Requests of Clarifications
- (d) the Particular Conditions;
- (e) the General Conditions;
- (f) the Specification/Employer's Requirements;
- (g) the Drawings;
- (h) the Contractor's Technical Proposal;
- (i) The Contractor's corrected ***Bill of Quantities*** and
- (j) the completed Schedules and any other documents forming part of the Contract.

3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

4. The Accepted Contract Amount, as reflected in the Letter of Tender and in the Contractor's corrected **Bill of Quantities is EUR 3,396,714,20 (three million three hundred ninety-six thousand seven hundred fourteen EUR and twenty Euro cents), excluding the Value Added Tax ("VAT").**

5. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

MDL Account

Payee's Account Name: Genesis International LLC

Payee's Account No. (IBAN): MD32 AG00 0000 0225 1370 5438



Payee's Bank Name: Commercial Bank "Moldova - Agroindbank" S.A.
Payee's Bank Address: 182 Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova
SWIFT CODE: AGRNMD2X

EUR Account

Payee's Account Name: Genesis International LLC
Payee's Account No. (IBAN): MD32 AG00 0000 0225 1392 4726
Payee's Bank Name: Commercial Bank "Moldova - Agroindbank" S.A.
Payee's Bank Address: 182 Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova
SWIFT CODE: AGRNMD2X
Correspondent Bank: Landesbank Baden-Wuerttemberg
Stuttgart, Germany
SWIFT: SOLADEST

6. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

Agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Signed by: CEBAN ION



For and on behalf of the Employer in the presence of
CITY OF CHIȘINĂU

Witness: _____

Name: _____

Address: 83, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Chișinău

Date: 24th of November, 2021

Signed by: MRUG VITALII

For and on behalf the Contractor in the presence of
GENESIS INTERNATIONAL LLC

Witness: _____

Name: _____

Address: 84/6 Albișoara Str., Chișinău

Date: 24th of November, 2021



Aprob:

**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 17.10 2023

privind lucrarea reabilitarea străzii executată la obiectul str. Alexandru cel Bun în cadrul contractului nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021 încheiat între Direcția Generală Mobilitate Urbană și S.R.L. „Genesis Internațional” & S.R.L. „Compania Electrică” pentru lucrările de Reabilitare a străzii Alexandru cel Bun.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000126, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 21.03.2023, cu valabilitate pînă la 20.10.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.10.2023, fiind formată din

Președinte:	Ilie Ceban	- viceprimarul municipiului Chișinău
Membri:	Igor Vrabie	- director adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare
	Dumitru Ceban	- șef adjunct, Direcția Generală Mobilitate Urbană
	Valentin Șvaga	- șef Direcția lucrări edilitare, DGMU
	Iulian Severin	- expert tehnic drumuri, UIP, Primăria mun. Chișinău
	Sergiu Cotoman	- șef al Serviciului sistematizare a circulației rutiere din cadrul Secției supraveghere transport și circulație rutieră a Direcției de Poliție a mun. Chișinău
	Lilian Copaci	- șef Direcția management transport, DGMU
	Alina Popovici	- vicepreședinte al sectorului Centru
	Pavel Movilă	- vicepreședinte al sectorului Buiucani
	Tudor Buzu	- vicepreședinte al sectorului Rîșcani
	Ghenadii Zadeseneț	- director interimar Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”
	Dorin Ciornîi	- director Î.M. „Regia Transport Electric”
	Sergiu Tomiță	- administrator Î.M. Regia „Exdrupo”
	Alexandru Bajura	- vicedirector Î.M. „Regia Autosalubritate”
	Vasile Efros	- șef Direcția amenajare și Mediu, DGLCA
	Inga Badrajan	- director adjunct, Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”
	Vitalie Lungu	- inginer-șef, Î.M.R.E.I. „Lumteh”

La recepție au participat în calitate de invitați:

Valentina Fluieraș	- inginer-șef, I.M.P. „Chișinăuproiect”
Luminița Manole	- Egis International
Andrei Rusnac	- Egis International

4. Constatările comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

- b) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul și autorizația de construire

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea la terminarea lucrărilor cu îndeplinirea lucrărilor menționate în anexa nr. 1 și nr. 2.

7¹. Descrierea obiectului „Reabilitarea străzii Alexandru cel Bun”:

Drumul supus recepției are următorii indici de baza:

1. Categoria tehnica - Secundara
2. Lungimea – 2.184 km;
3. Benzi de incadrare - 2 x 3.50/4.50 m;
4. Lățimea părții carosabile – 7.00 – 9.00 m;
5. Lățimea trotuarelor – 2 - 3,5 m;

Sistemul rutier:

1. Executarea stratului Fundație = 18 012.00 m²
2. Executarea stratului de fundație din amestec reciclat la rece, h = 10 cm – 16 376.00 m²
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulație mare BAD 22.4, h = 6 cm – 16 376.00 m²
4. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h = 4 cm – 16 376.00 m²

Trotuare pietonale:

1. Amenajare parcări auto din pavaj, h = 8 cm – 3 229.00 m²
2. Amenajare intrări în curți și cartiere din pavaj, h = 8 cm – 2 484.00 m²;
3. Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm – 12 062.00 m²
4. Montare Bordura mare Br 100x30x18 – 4 191.00 m.l
5. Montare Bordura mare Br 100x30x15 – 3 719.00 m.l
6. Amenajare zone verzi – 3 100.00 m²

Canalizare pluviala:

1. Construcția canalizării pluviale Pc 19+80 – Pc 21+84 – 204.00 m.l

Siguranța Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere – 285.00 buc
2. Marcaj rutier – 590.00 m²
3. Parapet pietonal – 73.00 m.l

Iluminat stradal:

1. Corpuri de iluminat de 102 W – 83 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W – 83 buc
3. Corpuri de iluminat “Trecerile pentru Pietoni” 51 W – 21 buc

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 17.10. 2023 la DGBU în 6 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte _____ I. Ceban

Membri: _____ I. Vrabie

_____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ L. Copaci

_____ A. Popovici

_____ P. Movilă

_____ T. Buzu

_____ G. Zadeseneț

_____ S. Cotoman

_____ D. Ciornîi

_____ S. Tomiță

_____ A. Bajura

_____ V. Efros

_____ I. Badrajan

_____ V. Lungu

Invitați: _____ V. Flueraș

_____ L. Manole

_____ A. Rusnac

10. Lucrarea „Reabilitarea str. Alexandru cel Bun” este:

TRANSMISĂ:

Executantul: S.R.L. „Genesis Internațional”
& S.R.L. „Compania Electrică”

_____ 2023

Nume/Prenume _____ V. Măruș

L.Ș. _____
(semnătura)


PRIMITĂ:

Investitorul: Direcția Generală Mobilitate
Urbană

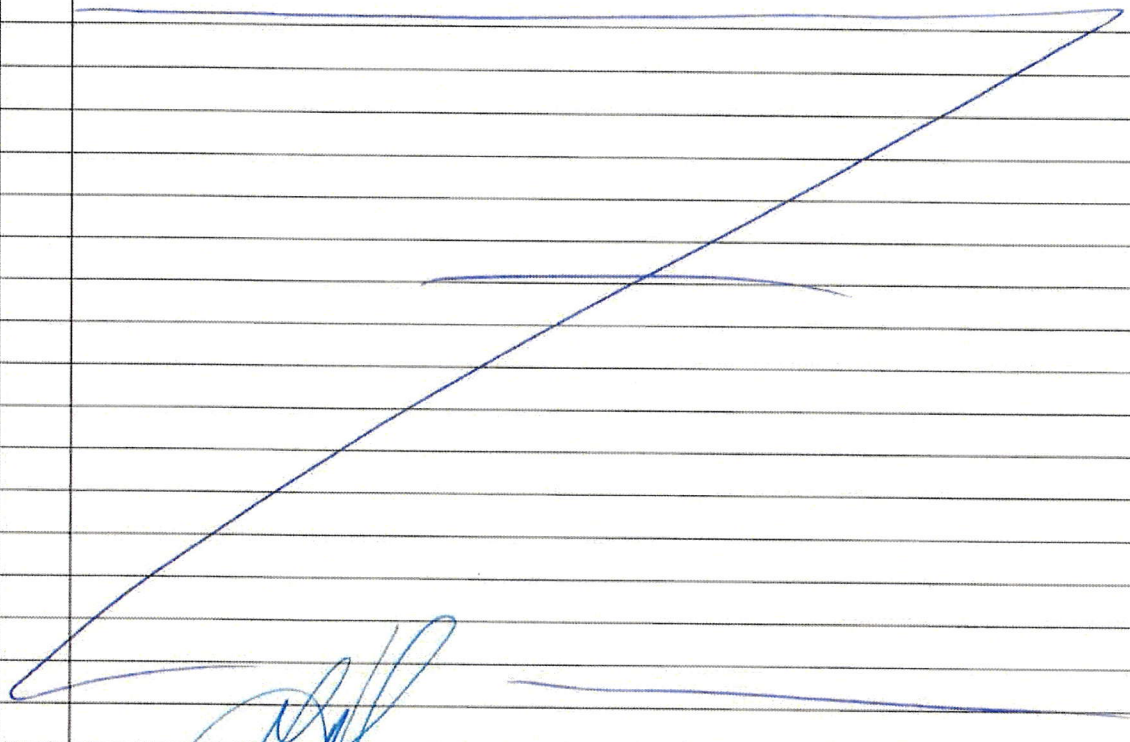
_____ 2023

Nume/Prenume _____ Ceban I.

L.Ș. _____
(semnătura)



Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiectelor și adresa (km și PC)
	Execuția rigolei carosabile la adresa Alexandru cel Bun nr. 8. termen de finalizare 30.11.2023
	

Președinte  I. Ceban

Membri: I. Vrabie

D. Ceban

V. Şvaga

I. Severin

L. Copaci

A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zadesenet

S. Cotoman

D. Ciornîi

S. Tomiță

A. Bajura

V. Efros

I. Badrajan

V. Lungu

V. Flueras

L. Manole

A. Rusnac

Invitați:

Pagina 4 din 6

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	Finalizarea marcajului rutier orizontal la percări , termen de finalizare 30.11.2023

Preşedinte

I. Ceban

Membri:

I. Vrabie

D. Ceban

V. Şvaga

I. Severin

L4Copaci

A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zadesenet

S. Cotoman

D. Ciornîi

S. Tomiță

A. Bajura

V. Efros

I. Badrajan

V. Lungu

V. Flueras

~~L.~~ Manole

A. Rusnac

Lista lucrărilor neconforme

[illegible]

Preşedinte

I. Ceban

Membri:

I. Vrabie

D. Ceban

V. Şvaga

I. Severin

L. Copaci

A. Popovici

P. Movilă

T. Buzu

G. Zadesenę

S. Cotoman

D. Ciornîi

S. Tămiță

A. Bajura

V. Efros

I. Badrajan

V. Lungu

V. Flueraş

L. Manole

A. Rusnac

Invitați:



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/01-05/134 privind achiziția prin licitație publică

"19" mai 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1680678658147 din 27.04.2023**, între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentată prin directorul executiv, dl Mîndra Nicolai, care acționează în baza ordinului nr.19 din 07.02.2023, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și SRL „Genesis International” cu sediul în mun. Chișinău, str. Albișoara 84/6, MD 2059, tel. 0699 82 057, IDNO 1010600006879, reprezentată de directorul general, dl Vitalii Mrug, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute, **lucrările de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Calarași, km 21,2 - 27,83**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a proiectului de execuție, respectând prevederile actelor normative, standarde și prescripții tehnice din domeniul construcțiilor, precum și cu respectarea graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul contract.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la **31.07.2024**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Notificarea trebuie să fie avizată de către responsabilul tehnic. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare (remediarea obiecțiilor) și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **75 067 435,97 lei (șaptezeci și cinci milioane șaizeci și șapte mii patru sute treizeci și cinci lei, 97 bani) lei MD, inclusiv 12 511 239,33 lei (douăsprezece milioane cinci sute unsprezece mii două sute treizeci și nouă lei, 33 bani) TVA lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **20** de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate terminate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenii stabiliți în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, prevederile proiectului de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,
- b) iar celălalt va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar aceasta nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul

este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să le adune și să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii, și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.

4.26. Antreprenorul general răspunde de îndeplinirea următoarei obligații principale referitoare la calitatea construcției: remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuție, cât și în termenul de garanție postrecepție de 5 ani.

4.27. Antreprenorul general răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite în termenul de garanție postrecepție de 5 ani, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție în vigoare la data realizării ei.

4.28. În cazul în care Antreprenorul general va fi vinovat de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa atât pe perioada de execuție, cât și în termenul de garanție postrecepție de 5 ani.

4.29. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau deflației/în baza actualizării prețurilor de cost, modalitate selectată de Antreprenor care nu poate fi modificată pe durata executării prezentului contract, potrivit Regulamentului pentru ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin HG nr. 1129 din 21.11.2018.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul este obligat să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în acest caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **1 (unu) an**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;
- 12.3. Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
- 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va fixa data începerii recepției cantitative și calitative a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
- 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
- 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la *recepția finală a lucrărilor*.

I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.9.1. din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

3.6.3. Procesul - verbal de recepție finală a lucrărilor constituie dovada executării integrale a contractului de achiziție publică.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin garanție bancară/transfer pe contul autorității contractante.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor-verbale ale lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general, fie se va prezenta garanție bancară suplimentară.

4.30. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.31. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent, orice obstacol aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

4.32. Antreprenorul are obligația de a proteja lucrările executate pe toată perioada execuției lucrărilor. În cazul apariției degradărilor la lucrările executate anterior, Antreprenorul le va remedia din cont propriu.

4.33. Antreprenorul are obligația întreținerii drumurilor de ocolire prevăzute în proiectul de execuție, pe toată perioada execuției lucrărilor și asigurarea securității circulației rutiere.

4.34. Antreprenorul va răspunde de comiterea accidentelor rutiere produse din cauza asigurării necorespunzătoare a condițiilor de circulație pe drumurile de ocolire prevăzute în proiectul de execuție.

4.35. Antreprenorul va întreține drumurile de ocolire prevăzute în proiectul de execuție pentru perioada rece a anului, prin îndepărtarea zăpezii și gheții.

4.36. Antreprenorul are deplina responsabilitate a organizării lucrărilor, conform metodologiei proprii de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.37. Antreprenorul are obligația de a prezenta Beneficiarului, la sfârșitul fiecărei luni, graficul de plăți pentru luna viitoare, necesare execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.38. Antreprenorul are obligația de a procura și întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului la trafic.

4.39. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altor asemenea, Antreprenorul are obligația de a despăgubi proprietarul împotriva tuturor avarierilor respective.

4.40. Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție a lucrărilor, inclusiv la cererea Beneficiarului va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție prezentate pe parcursul executării contractului, sunt parte integrantă a contractului.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la pct. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform proiectului de execuție, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor, Antreprenorul se obligă să organizeze și să asigure siguranța circulației rutiere pe segmentul de racordare a șantierului cu drumul public, în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și respectarea tuturor măsurilor de siguranță rutieră.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit termenului limită de execuție.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată spre achitare de Antreprenor.

10.9.5. În cazul rezoluțiunii contractului din motivele indicate în pct.12.2, alit. a) – g) din Contract, Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11.1. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contract și/sau documentele normative în vigoare, lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, precum și defectele calitative apărute din vina acestuia, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Operatorul economic a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 de zile, potrivit pct. 10.9.5. al Condițiilor Speciale ale Contractului.

g) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1.f) Proiectul de execuție a lucrărilor.

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

13.5. Orice comunicare între părți, referitor la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele de contact oficiale ale părților.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Antreprenor

SRL ”Genesis International”

MD 2059 mun. Chișinău, str. Albișoara 84/6

c/f 1010600006879

c/ IBAN MD17EN000000222405985895


B.C. ”Energbank” S.A. filiala Centru

BIC ENEGMD22

c/TVA 0506120

Director executiv

Nicolai MINDRA



Director general

Vitalii MRUG



Semnat

Nume: Mrug Vitalii

Functia în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: GENESIS International SRL

Digitalized by: Mrug Vitalii
Date: 2020-04-26 14:40:30 UTC
Location: Chișinău, Moldova

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1680678658147
din 05.04.2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Calarași, km 21,2 - 27,83

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului	anul 2023								anul 2024						
		05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
1.	Lucrari pregatitoare															
2.	Lucrari de terasament															
3.	Lucrari de consolidare															
4	Sistemul rutier															
5	Lucrari de arta															
4.	Amenajarea drumului															

Semnat: _____
Nume: Mrug Vitalii
Funcția în cadrul întreprinderii: Director general
Denumirea întreprinderii: GENESIS International SRL



Digitally signed by Mrug Vitalii
Date: 2023.04.26 10:48:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR**

Nr.” 58 ” din 07 Noiembrie 2024

Privind ”*Lucrări de reparație a drumul R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,2-27,83*”, executate în cadrul contractului nr. nr. 10/01-05/137 din 19 mai 2023, încheiat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și ”GENESIS International” S.R.L. antreprenor mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 15 februarie 2022 eliberată de Consiliul Raional Orhei cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 207 din 05 noiembrie 2024 și-a desfășurat activitatea în perioada 07 noiembrie 2024 fiind formată din:

Președinte:	Serghei GALUȘCA	- director adjunct, Î.S. ”ASD”;
Membri:	Nicolai MÎNDRA	- secretar de stat a MIDR;
	Artur CIOBANU	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. ”ASD”;
	Andrei ERMURACHI	- șef, direcție implementare proiecte, Î.S. ”ASD”;
	Dumitru CALIN	- șef, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. ”ASD”;
	Sergiu GODIAC	- șef, serviciu drumuri, Î.S. ”ASD”;
	Pavel CUCURUZEAN	- șef, secția construcții, gospodărie comună și drumuri, Consiliul Raional Orhei;
	Ion DELINSCHI	- șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;
	Efim VÎRCOLICI	- director, S.A. ”Drumuri – Orhei”;

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant - Vitalii MRUG – *director, ”GENESIS International” S.R.L.*;
- b) proiectant - Victor CALITIN – *director, S.A. ”Intexnauca”*;
- c) responsabil tehnic – Andrei ROGUT – *responsabil tehnic, Î.S. ”ASD”*;

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - *că lucrarea este definitivată de construcție cu rezerve și poate fi dată în folosință*:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea integrală a lucrărilor. Prezența unor obiecții ne semnificative, care nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției cu obiectiile prevăzute în Anexa nr.3

7¹. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

Parametrii tehnic principali a drumului:

1. Categoria tehnică – a III-a
2. Lungimea – 6,63 km
3. Benzi de încadrare – 2 x 3,5 m
4. Lățimea părții carosabile -8,0 m
5. Lățimea acostamentelor– 2x1.0 m
6. Lățimea trotuarelor – 1-1,5 m

Lucrări executate:

Decapare structuri din piatră, decapare structuri rutiere din beton asfaltic, decapare îmbrăcăminte rutiere intrări în curte, decapare strat vegetal

Lucrări de terasament – săpătură mecanică 16625 mc

Nivelarea cu autogreder 45194 mp

Planificarea taluzurilor 2358 mc

Consolidarea acostamentelor cu piatră 2474,3 mp

Casete de supralărgire (strat de egalizare din balast h=15 cm - 204,07 mc,

strat de fundație din piatră spartă h=20 cm - 113,11 mc,

strat din material stabilizat cu ciment C3/4 h= 15 cm – 48,86 mc,

îmbrăcăminte de beton asfaltic BAD 22,4 6,0 cm grosimea+geocompozit+strat de uzură MAS 16 50/70 – 282,5 mp)

Drumul principal (strat de egalizare din balast h=15 cm – 3489,23 mc,

Strat de fundație din piatră spartă h=20 cm – 1935,17 mc,

Strat de fundație din piatră fracția 16-32 mm h=10 cm – 2187,82 mc,

Strat din piatră fracția 32-63mm h=20 cm – 5590,41 mc,

Strat din material stabilizat cu ciment C3/4 h= 15 cm – 6757,74 mc,

Îmbrăcăminte de beton asfaltic BAD 22,4 6,0 cm grosimea și amorsare – 44526 mp)

Sistem rutiere BAD 22,4 – 44526 mp

Sistem rutier (strat de uzură) -12600 mp

Lucrări artă/podețe în proporție –

Construcția podetului 2 x diam.1.0m, de la PC223+50,

Construcția podetului 2 x diam.1,0m, la acces PC224+25,

Construcția podetului 2d1,5m la PC237+48,

Construcția podetului 2d1,2m la PC247+61,

Construcția podetului d1,2m la PC264+79,

Reparatia podetelor tubulare cu diam. 1,0m, de la PC213+70, PC217+89, PC243+02, PC249+24, PC254+60, PC268+51, PC272+69 (7 buc.),

Reparatia podetelor tubulare 2 x diam. 1,0m, de la PC 225+99 si PC 231+47,

Reparatia podetului tubular 2 x diam. 1,5m, de la PC 258+11

Construcția rigolei la PC 260+52 – 18 metri

Amenajarea trotuarelor – borduri mici 1394, pavaje 6 cm - 965 mp

Reamenajarea fântânilor la PC 260+38, PC 262+30, PC 264+89,

Amenajarea intrări în curți – borduri mici 10x20 cm – 673 m, 767 mp pavaje

Amenajarea drumurilor laterale cu așternerea beton asfaltic BAD 22,4 cu grosimea 6 cm – 936,24 mp

Amenajarea stațiilor de oprire (borduri prefabricate 30x15 cm – 75 m, borduri mici 10x20 cm – 77 m,

Montare pavaje 20x10x6 – 107 mp, îmbrăcăminte din beton asfaltic BAD 22,4 – 540 mp)

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – 82 286 426,22 lei, inclusiv LCM – 80 896 015,20 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. Prezentul proces - verbal, conținând 3(trei) file și 3(trei) anexe, a fost încheiat, astăzi " 07 " noiembrie 2024 în 1 exemplar, semnat electronic.

Comisia de recepție

Digitally signed by Galușca Serghei
Date: 2025.01.30 07:57:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Președinte: Serghei GALUSCA

Digitally signed by Mindra Nicolai
Date: 2025.01.24 17:52:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membri: Nicolai MINDRA

Digitally signed by Vircolici Efim
Date: 2025.01.02 10:41:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Efim VIRCOLICI



Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2024.12.26 11:51:46 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Artur CIOBANU

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Delinschi Ivan
Date: 2025.01.20 08:58:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ivan DELINSCHI

Digitally signed by Mrug Vitalii
Date: 2025.01.24 15:02:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Vitalii MRUG



Digitally signed by Ermurachi Andrei
Date: 2025.01.24 15:36:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Andrei ERMURACHI

MOLDOVA EUROPEANĂ



Vitalii MRUG

Digitally signed by Godiac Sergiu
Date: 2024.12.31 08:35:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sergiu GODIAC

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Calitin Victor
Date: 2024.12.23 10:53:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Victor CALITIN

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2024.12.20 14:52:36 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dumitru CALIN

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Rogut Andrei
Date: 2024.12.26 11:57:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Andrei ROGUT

MOLDOVA EUROPEANĂ



Pavel CUCURUZEAN Nu sa prezentat

10. Concluzia Inspectoratului national de Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

" "

2024

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

11. "Lucrări de reparație a drumul R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,2-27,83, în baza recomandărilor comisiei este :

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

"GENESIS International" S.R.L.

07.11.2024

Vitalii MRUG

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

07.11.2024

Andrei ERMURACHI

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 58 din 07 noiembrie 2024

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Documentația este completă

Comisia de recepție:**Președinte:** *Serghei GALUȘCA* _____**Membri:** *Nicolai MÎNDRA* _____*Artur CIOBANU* _____Digitally signed by Vircolici Efim
Date: 2025.01.02 10:43:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova*Efim VÎRGOLICI* _____*Andrei ERMURACHI* _____*Ion DELINSCHI* _____*Sergiu GODIAC* _____*Vitalii MRUG* _____*Dumitru CALIN* _____*Victor CALITIN* _____*Pavel CUCURUZEAN* Nu sa prezentat*Andrei ROGUT* _____

[illegible]

Preşedinte: *Serghei GALUSCA*

Membri: Nicolai MÎNDRA

Digitally signed by Vircolici Efim
Date: 2025.01.02 10:45:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Efim VIRCOLICI
Localitatea Moldova



Artur CIOBANU

Ion DELINSCHI

Andrei ERMURACHI

Vitalii MRUG

Sergiu GODIAC

Victor CALITIN

Dumitru CALIN

Andrei ROGUT

Pavel CUCURUZEAN Nu sa prezentat

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 58 din 07 noiembrie 2024

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	Compactarea acostamentelor și amenajarea cu sol fertil pe sectoarele care prezintă neconformități
2.	Verificarea ancorării în beton a tuturor indicatoarelor rutiere
3.	Monitorizarea pe perioada ploilor a casului de evacuare a apelor pluviale, amplasat la ieșirea din localitatea Hulboaca.
4.	La podețele tubulare la care au fost efectuate lucrări de alungire, refacerea lucrărilor de tencuire (lecuire cu mortar) a elementelor vechi din beton armat.

Președinte: *Serghei GALUȘCA* _____**Membri:** *Nicolai MÎNDRA* _____

Digitally signed by Vircolici Efim
Date: 2025.01.02 10:46:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Efim VÎRCOLICI _____*Artur CIOBANU* _____*Ion DELINSCHI* _____*Andrei ERMURACHI* _____*Vitalii MRUG* _____*Sergiu GODIAC* _____*Victor CALITIN* _____*Dumitru CALIN* _____*Andrei ROGUT* _____*Pavel CUCURUZEAN* Nu sa prezentat
