

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚA SIMILARA

1. Denumirea și obiectul contractului: Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, rețele electrice 0,4/6/10kV, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Negruzzi, str. V. Alecsandri mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului: Nr. 15/01408/001 din 31.07.2015, înregistrat Agenția Achiziții Publice
3. Denumirea/numele beneficiarului: DGTPCC
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str.Lazo, 18
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor .
7. Valoarea contractului:
 - a) inițială – 63 170 766,50 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 3 367 563,00 \$ (la data semnării contractului)
 - b) finală – 55 782 609,55 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 2 973 709,00 \$ (la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată - 22 luni
 - b) efectiv realizată : 22 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – se anexează Acordul adițional Nr.1 din 22.12.2016.
10. Numarul și data procesului verbal de recepție finala: Nr.1 din 14.12.18.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: fără obiecții.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.
Obiectele s-au îndeplinit calitativ: fără obiecții.

Data completării : 15.10.2019

Semnat: 

Nume : Eni M.

Functia în cadrul firmei : Director

Denumirea firmei si sigiliu: SA"COMPANIA ELECTRICA"





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr. 1. la Contractul nr. 26/15 din 08 iulie 2015.

22 decembrie 2016.

mun. Chișinău

Prezentul Acord este semnat astăzi 22 decembrie 2016, între Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a Consiliului municipal Chișinău, cu sediul în mun. Chișinău str. S. Lazo 18, reprezentată de Directorul Igor Gamrețki și

ICS „Compania Electrica” SA, cu sediu în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, reprezentată de Administrator Maria Eni, în scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 26/15 din 08 iulie 2015 privind executarea lucrărilor de reabilitare a utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfint din mun. Chișinău, (obiect 3069 DV2), bd. Negruzii din mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri din mun. Chișinău (obiect 3073 DV2).

Prin prezentul Acord părțile contractante convin asupra următoarelor modificări ale punctelor 4.2. și 14.5. din Contractul de antrepriză nr. 26/15 din 08 iulie 2015, în baza demersului, notei informative, procesului-verbal al grupului de lucru cu privire la prelungirea termenului contractului:

- *Se prelungeste termenul de executare și valabilitate a contractului până la 31.05.2017.*

Prezentul Acord se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLATĂ ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

ICS „Compania Electrica” SA

DGTPCC

IDNO 1003600092733

IDNO 1007601009657

MOLDMD2X309.

TREZMD2X

BC „Moldindconbank” SA.

MF Trezoriaria de Stat

IBAN MD20ML000000222492500705

IBAN MD50TRPDAK222500B09746A6

Director  M. Eni


Director  I. GAMREȚKI

Șef interimar DEF  D. POPESCU





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/15. privind achiziția prin Licitație Publică

08 iulie 2015

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 15/01408, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 15/01408/001 din data de 03.07.2015, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Igor Gamrețki, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrica", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații inginerești și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2).

Cod CPV: 45222000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- cauzate de forță majoră;
- cauzate de interdicții temporare impuse de autoritatea competentă în materie de securitate națională datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.


4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 63 170 766, 50 lei (șaizeci și trei milioane o sută șaptezeci mii șapte sute șizeci și șase lei, 50 bani). (inclusiv TVA).
- 4.2. Lucrările se vor executa în II etape:
 I. Etapă – 30 000 000 lei pînă la 31.12.2015.
 II. Etapă – 33 170 766, 50 lei pînă la 31.12.2016.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate



- din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
 - Extrasul eliberată de Camera Înregistrării de Stat;
 - Licența eliberată de Camera de Licențiere;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificatiile tehnice).
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

DGTPCC

Adresa: Mun. Chișinău, str. S.Lazo 18.
 Tel./Fax: 022-20-46-90,
 fax: 022-20-46-58,
 Denumirea
 Băncii: Trezoreria de stat
 Adresa
 Băncii:
 Cod
 Bancar: TREZMD2X
 Cont de
 decontare: 220114071670184 art. 132.11
 Cod fiscal: 10076001009657 *€ 10000000 lei*

“ ANTREPRENOR ”:

SA “Compania Electrica”

Adresa: Mun. Chișinău, str. Plaiului 2.
 Tel./Fax: 022-50-50-47,
 fax: 022-52-15-94
 Denumirea
 Băncii: BC “Moldindconbank” SA
 Adresa
 Băncii:
 Cod
 Bancar: MOLDMD2X309
 Cont de
 decontare: 222492500705
 Cod fiscal: 1003600092733

16. Semnăturile părților


“ BENEFICIAR ”:

Director  Igor GAMREȚKI

Șef-interimar  D. Popescu

“ ANTREPRENOR ”:

Director  Maria ENI

Conducător 



Abi

INVESTITOR: Direcția generală transport public și căi de comunicație

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.12.2018

Obiectul „Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfin mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. Vasile Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2)” este executat în cadrul contractului nr. 26/15 din "08" iulie 2015.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 161-C/14 din 23.07.14, de către S.A. „Compania Electrica”

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.12.2018, fiind formată din:

Președinte

Nistor Grozavu – viceprimarul municipiului Chișinău

Membri:

Vitalie Butucel – șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație

Oleg Caraman – șef adjunct al DGTP și CC

Veaceslav Buț – director al Î.M. „Lumteh”

Anatolii Aparatu – director adjunct al Î.M. „Lumteh”

Dorin Ciornii – director al Î.M. „RTEC”

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Sofroniuc Mihail – reprezentant S.A. „Compania Electrica”

Cebanu Viorel – diriginte de șantier S.A. „Compania Electrica”

Ion Paciu – director adjunct I.M.P. „Chișinăuproiect”

Anatolie Brusnic – proiectant I.M.P. „Chișinăuproiect”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități au fost executate, recepționate puse în funcțiune, Anexă 18 file;

b) lucrările au fost complet terminate la data de 05 aprilie 2017;

c) observațiile comisiei de recepție finală sânt prezentate în lista-anexă nr. 1;

d) documentația tehnică de execuție a obiectului au fost completate;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sânt în

posesia utilizatorului;



„Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd.
Ștefan cel Mare și Sfîn mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd .Negruzzi mun. Chișinău
(obiect 3071 DV2), str. Vasile Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2)“

Observațiile comisiei de recepție finală

NU SUNT

Comisia de recepție finală:

Președinte: Nistor Grozavu

Membri: Vitalie Butucel

Oleg Caraman

Veaceslav Buț

Anatolii Aparatu

Dorin Ciornii

Sofroniuc Mihail

Cebanu Viorel

Ion Paciu

Anatolie Brusnic

(numele, prenumele, semnătura)



Handwritten signature

Handwritten signature

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Reconstrucţia reţelelor de contact pe bd. Stefan cel Mare
 Data 05.04.2017

ACT Nr. 05/04-2017
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc Veaceslav
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Melnic Anatolie
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc Mihail
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Reconstrucţia reţelelor de contact pe bd. Stefan cel Mare, RC.
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-RC elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect nu-s.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.1).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală nu-s.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.1.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 164 416, 45 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „05” 04 anul 20 17.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)



[Signature]
 (semnatura, nume, prenume)


Primit:

[Signature]
 (semnatura, nume, prenume)

data 05.04.2017



data _____

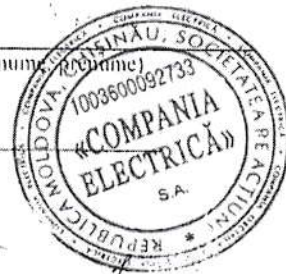

Orașul Chișinău
Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău

Obiectivul Reconstrucția rețelei electrice REE pe str. V. Alexandri

Data 02.06.2016

ACT Nr. 02/06-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc Veaceslav
(funcția, nume, prenume)
întreprinderea de exploatare Novișotchi Alexandru, Puscin Ion
(funcția, nume, prenume)
organizația de electromontaj Sofroniuc Mihail
(funcția, nume, prenume)

a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Reconstrucția rețelei electrice REE pe str. V. Alexandri :
(lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

La PT-25: rețele de alimentare în cablu a CC-11910, CC-11911, CC-11912, la PT-263: rețele de alimentare în cablu a CC-11907, CC-11906, CC-11908, CC-11909, la PT-61: rețele de alimentare în cablu a CC-11967, CC-251A, CC-11969, CC-11970, la PT-46: rețele de alimentare în cablu a CC-11962, CC-11963, CC-11964, CC-11965, CC-11966, CC-11960, CC-11960/1, CC-11961, CC-11959, la PT-430: rețele de alimentare în cablu a CC-11955, CC-11954, CC-11953, CC-11956, CC-11957, CC-11958, la PT-787: rețele de alimentare în cablu a CC-11952, CC-11951, CC-11947, CC-11948, CC-11950, CC-11944, CC-11945, CC-11946, CC-11943, CC-11942, la PT-134: rețele de alimentare în cablu a CC-11938, CC-11937, CC-11936, CC-11935, CC-11934, CC-11939, CC-11940, CC11941,

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3073-REE elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНІП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 6782.120,39 lei.


CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНІП și conform proiectului.


Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de 06 06 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
(evaluare)

Primit:

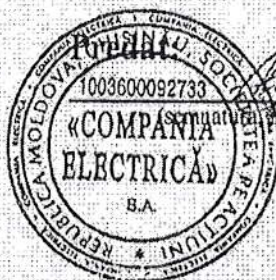

(semnatura, nume, prenume)



(semnatura, nume, prenume)



(semnatura, nume, prenume)

data _____

data _____

2

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe str. V. Alexandri
 Data 22.04.2016

ACT Nr. 22/04 2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc Veaceslav
 (funcția: nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Crihan Vasile
 (funcția: nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc Mihail
 (funcția: nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 2(Nº118), DCR-3(Nº37), DCR-4(Nº28), DCR-5(Nº54), DCR-6(Nº149).
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3073-DCR elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 4 245 642,68 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "01" 06, anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)



data _____

09-06-2016

3

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/14-2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorette A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 1(Nº52 – str. M. Viteazul)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-1 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1181240,36 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” „12” anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:

(semnatura, nume) _____
 data 26.12.2016

COMPANIA ELECTRICĂ S.A.
 1003600092733

Primit: _____
 (semnatura, nume, funcție)
 data _____

Butuc Venceslav
 Nr. 0231

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-2 (№176 – str. T. Ciorba)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-2 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1038603,95 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____
 (evaluare)

Predat:

[Signature]
 (semnătura, nume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.

Primit:

[Signature]
 (semnătura, nume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.
 data _____

data 26.12.2016



[Signature]

[Signature]

5

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/3-2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

- La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 3(Nº51 – str. Mt. P. Movilă)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
- Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-3 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

- Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
- Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.


- Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
- Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
- Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 983 012,24 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

- Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

- Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:

(Semnatura, nume, prenume)


data 26.12.2016

Primit:

(evaluare)

(Semnatura, nume, prenume)

(Semnatura, nume, prenume)

data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/16-2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 4(№50 – str. S. Lazo)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-4 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1040549,84 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____
 (evaluare)

Predat:

[Semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)

data 26.12.2016

Primit:

[Semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)

data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 20/12/16 - 2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

- La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 5(№152 – str. Sf. Tărilor)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
- Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-5 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr. 1.

- Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
- Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune; sub sarcină)

a durat 72 ore.


- Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
- Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
- Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1159114,68 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

- Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 20 16.

- Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:

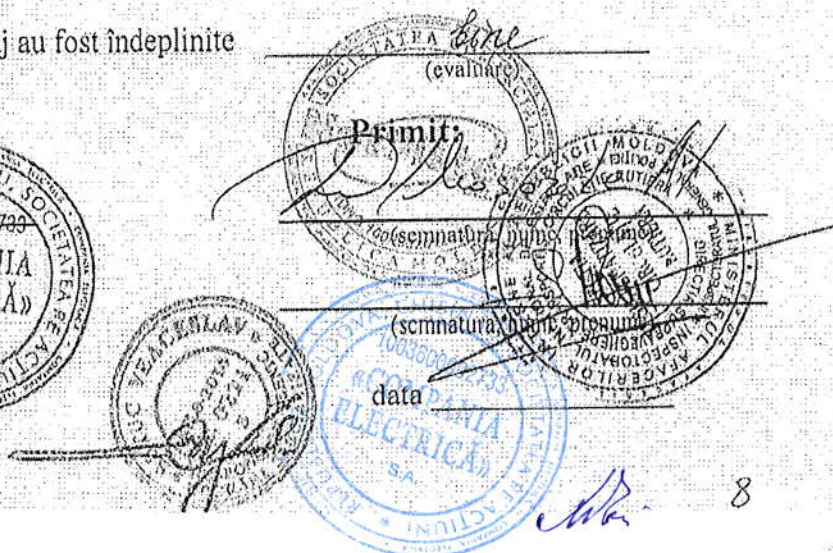

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/16-2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

- La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 6(№49 – str. M. Cibotari)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
- Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-6 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

- Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
- Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

- Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
- Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
- Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1100 003, 66 lei.



CONCLUZIA COMISIEI

- Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 20 16.

- Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:

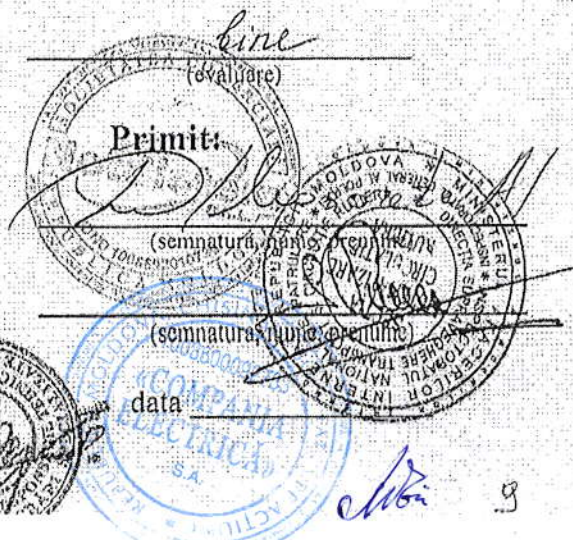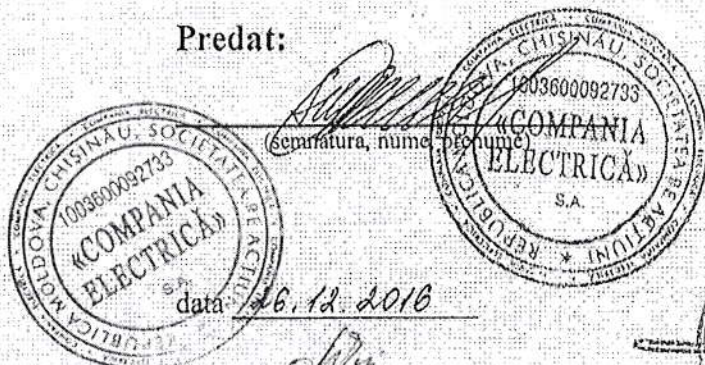

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/16-2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)

a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 7(Nº48 – str. Mt. Bănulescu-Bodoni)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-7 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 85994,84 lei.


CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.


Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:

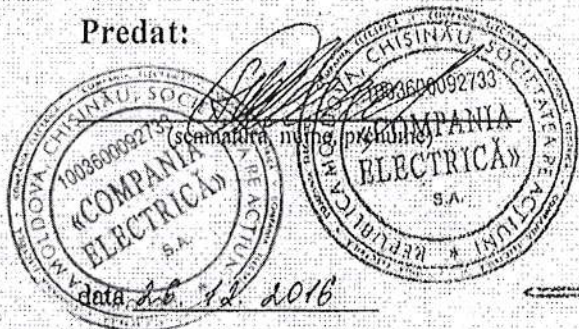

Primit:



Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/8-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 8(Nº46 – str. A. Puskin)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-8 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.


5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1148540,86 lei.

CONCLUZIA COMISIEI


8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:



Primit:



Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/9-2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)

a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 9(Nº174 – str. V. Pîrcălab)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-9 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНИП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.




5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 558 632,55 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНИП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:


 (semnătura, nume, prenume)

 data 26.12.2016


Primit:


 (semnătura, nume, prenume)

 data _____


Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/10-2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofrontuc M.
 (funcția, nume, prenume)

a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 10(Nº45 – str. M. Eminescu)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-10 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНІП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 998 373,13 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНІП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 20 16.


9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:

(semnătura, nume, prenume)

 data 26.12.2016

Primit:

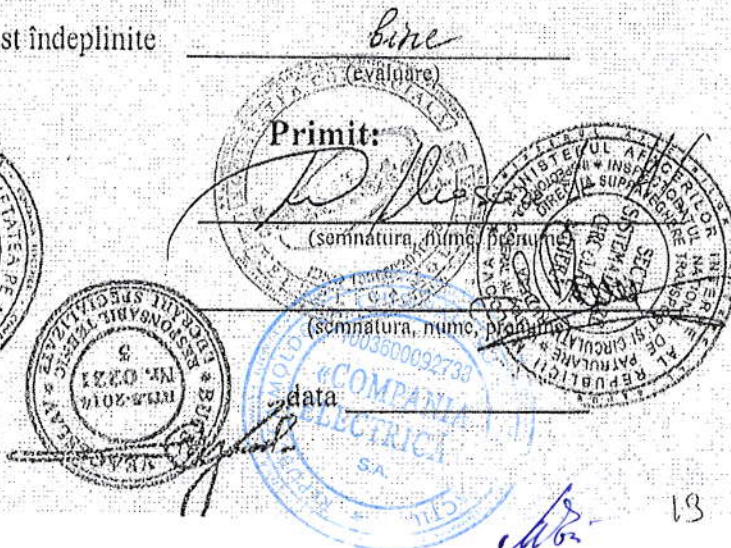(semnătura, nume, prenume)

 data _____

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/11-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)

a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 11(Nº44 – str. V. Alexandri)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-11 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric _____ sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 998 340,26 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____
 (evaluare)

Predat:

[Signature]
 (semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ S.A.
 1003600092733
 data 26.12.2016

Primit:

[Signature]
 (semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ S.A.
 1003600092733
 data _____

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/12-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 12(Nº43 – str. Armeneacă)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-12 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.



5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 987 046,46 lei.

CONCLUZIA COMISIEI



8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:


 (semnatura, nume, prenume)

 data 26.12.2016

Primit:


 (semnatura, nume, prenume)

 data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bil. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/13-2016
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)

a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 13(№173 – str. Bulgară)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-13 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП
 (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare
 sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 589208, 22 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină
 cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.


Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de
 „26” 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

(evaluare)

Predat:

Primit:

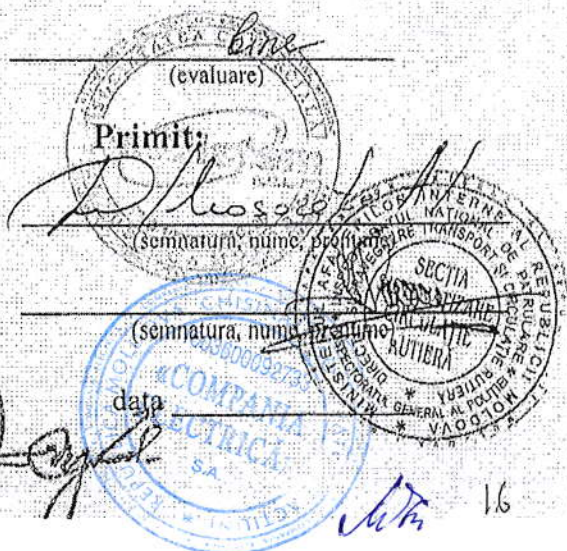

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/14-2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 14(Nº42 – str. Tighina)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-14 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
 a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1054742,41 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.


Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:



Primit:

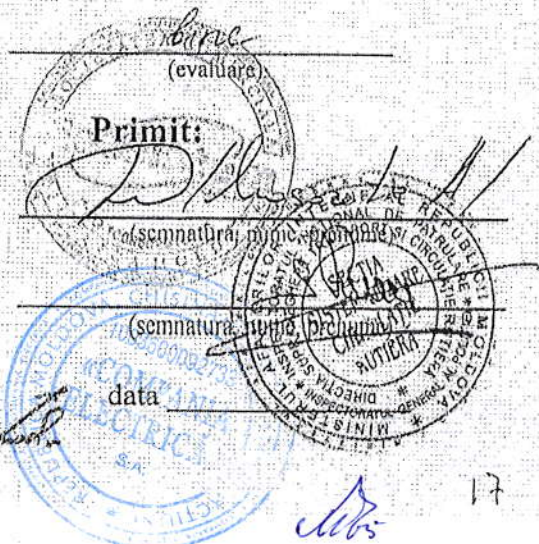

Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/15-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)

a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 15(Nº175 – str. Tricolorului)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-15 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 542.532,05 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:

Primit:

(semnatura) _____
 (seal) **COMPANIA ELECTRICĂ S.A.**
 1003600092733
 data 26.12.2016

(evaluare) _____
 (semnatura) _____
 (seal) **COMPANIA ELECTRICĂ S.A.**
 data _____

REPUBLICA



MOLDOVA

Consiliul municipal Chișinău

**Direcția generală
transport public și căi de comunicație**

Chișinău, MD 2004, str. S. Lazo, 18, Tel 20-46-90, Fax 20-46-66, 20-46-58
E-mail: dirtrans@mail.md

31.10.2016 nr 01-2-548
La nr _____ din _____

ORGANELOR COMPETENTE

Scrisoare de recomandare

S.A. „Compania Electrica” a executat lucrările de reabilitare a utilităților str. V. Alecsandri, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, mun. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințele de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă S.A. „Compania Electrica” beneficiarilor pentru colaborare.

Șef al Direcției



Igor Gamrețki

