

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de montare acoperire din gazon artificial în satul Cotovscoe (Amenajare cu iarbă artificială - 640 m2)**
2. Numărul și data contractului **Contract de subantrepriză nr. 51S din 10.07.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Cotovscoe, mun. Comrat**
4. Adresa beneficiarului **Satul Cotovscoe, mun. Comrat**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 275 200,00 /
b) Final	1. / 275 200,00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Zile
a) contractată	15 zile
b) efectiv realizată	14 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de montare a gazonului artificial la terenul de minifotbal din orașul Călărași.**
2. Numărul și data contractului **Contract de subantrepriză nr. 68S din 22.10.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Călărași**
4. Adresa beneficiarului **Orașul Călărași**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 128 000,00 /
b) Final	1. / 128 000,00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Zile
a) contractată	15 zile
b) efectiv realizată	14 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Constantin Spataru" din or. Leova, Finisări interioare**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020-19/PGC**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
4. Adresa beneficiarului **Str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 4 422 895-00 /
b) Final	1. / 4 422 895-00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	12 luni
b) efectiv realizată	11 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajarea teritoriului la L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020-20/PGC**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Constantin Spătaru" din or. Leova**
4. Adresa beneficiarului **Str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 3 127 810-00 /
b) Final	1. / 3 127 810-00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	12 luni
b) efectiv realizată	5 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca, Finisări interioare**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 2020-24/PGC**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca**
4. Adresa beneficiarului **Str. Octombrie, nr. 54, or. Basarabeasca**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 1 902 630,00 /
b) Final	1. / 1 902 630,00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	12 luni
b) efectiv realizată	7 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca, Rețele ingineresti**
2. Numărul și data contractului **4 Contracte de antrepriză**
3. Denumirea/numele beneficiarului **L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca**
4. Adresa beneficiarului **Str. Octombrie, nr. 54, or. Basarabeasca**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 1 056 955,00 /
b) Final	1. / 1 056 955,00 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	12 luni
b) efectiv realizată	4 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția unei porțiuni de drum în s. Maximovca**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 30 din 23 noiembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Maximovca**
4. Adresa beneficiarului **MD-6525, str. Renasterii, 2, r-nul Anenii Noi**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 330 587,65 /
b) Final	1. / 330 587,65 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	1 lună
b) efectiv realizată	20 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga"**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 20 din 1 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Onițcani, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului **MD-4833, MOLDOVA, r-nul Criuleni, s. Onițcani**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 821 414,05 /
b) Final	1. / 821 414,05 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	1 lună
b) efectiv realizată	20 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Acoperire cu pavaj a unei suprafețe dintre blocurile C și D la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 17 din 8 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina**
4. Adresa beneficiarului **MD-5400, MOLDOVA, r-nul Rezina, or. Rezina, str. 1 Mai**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 448 380,72 /
b) Final	1. / 448 380,72 /
7. Litigii și modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	1 lună
b) efectiv realizată	20 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri și completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația drumurilor locale din s. Caracui, r-nul Hîncești**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 27 din 6 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Caracui, r-nul Hîncești**
4. Adresa beneficiarului **MD-3419, MOLDOVA, r-nul Hîncești, s. Caracui**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 615 661,93 /
b) Final	1. / 615 661,93 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	2 luni
b) efectiv realizată	20 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a strazii "Gheorghe Greco" din satul Cruglic, r-nul Criuleni**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 23 din 12 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Cruglic, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului **MD-4819, MOLDOVA, r-nul Criuleni, s. Cruglic**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 666 533,95 /
b) Final	1. / 666 533,95 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	1 lună
b) efectiv realizată	25 zile
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de drenare în s. Vorniceni, r-nul Strășeni**
2. Numărul și data contractului **Nr.47 din data de 09 august 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria satului Vorniceni, r-nul Strășeni**
4. Adresa beneficiarului **satului Vorniceni, r-nul Strășeni**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	1. / 279 926,53 /
b) Final	1. / 279 926,53 /
7. Litigii si modul lor de soluționare	Litigii nu au fost
8. Durata de execuție a lucrării	Luni
a) contractată	2,0 luni
b) efectiv realizată	1,5 luni
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	Remedieri si completări în procesul verbal nu au fost
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA NUMĂRUL 5
LA CONTRACTUL DE SUBANTREPRIZĂ
Nr.51S

PROCES DE RECEPȚIE FINALĂ

Data: 24/07/2020

Părțile contractante:

Societatea comercială **MVC Prim SRL** reprezentat de **Eni Victoria** în calitate de Antreprenor general ,
și

Societatea comercială **Vig House SRL**, reprezentat de **Gradinari Ivan** în calitate de
subantreprenor,

au întocmit prezentul act pentru a confirma că în baza Contractului de Subantrepriză Nr.51S
din 10/07/2020, au fost executate următoarele lucrările:

Denumirea	U/m	Cantitatea	Pret unitar, lei	Suma totala, lei
Montarea gazonului artificial (incl materiale)	m2	640,00	430,00	275200,00
Total incl TVA				275200,00

1. Calitatea lucrărilor executate a fost verificată de către reprezentantul împuternicit al Antreprenorului general în prezența reprezentantului împuternicit al Subantreprenorului și corespunde cerințelor.
2. Lucrările executate de catre Subantreprenor au fost reflectate documental corespunzător și acceptate deplin.

Semnăturile părților:
Antreprenor /



Subantreprenor /



ANEXA NUMĂRUL 5
LA CONTRACTUL DE SUBANTREPRIZĂ
Nr.68S

PROCES DE RECEPTIE FINALA

Data: 04/11/2020

Părțile contractante:

Societatea comercială **MVC Prim SRL** reprezentat de **Eni Victoria** în calitate de Antreprenor general ,
și

Societatea comercială **Vig House SRL**, reprezentat de **Gradinari Ivan** în calitate de
subantreprenor,
au întocmit prezentul act pentru a confirma că în baza Contractului de Subantrepriză Nr.68S din
22/10/2020, au fost executate următoarele lucrările:

Denumirea	U/m	Cantitatea	Pret unitar, lei	Suma totala, lei
Montarea gazonului artificial (incl incastrarea liniei de marcaj – 210 ml, imprastierea nisipului si cauciucului, perierea suprafetei)	m2	640,00	200,00	128000,00
Total incl TVA				128000,00

1. Calitatea lucrărilor executate a fost verificată de către reprezentantul împuternicit al Antreprenorului general în prezența reprezentantului împuternicit al Subantreprenorului și corespunde cerințelor.
2. Lucrările executate de catre Subantreprenor au fost reflectate documental corespunzător și acceptate deplin.

Semnăturile părților:



Circular stamp of MVC-PRIM SRL, IDNO 10154600016170, with a signature over it.



Circular stamp of VIG-HOUSE SRL, IDNO 10154600016170, with a signature over it.

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 01 decembrie 2021

privind lucrarea Lucrări de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova, executată la obiectul Lucrări de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova, în cadrul contractului nr. 2020-19/PGC, din 27 august 2020 încheiat între SRL Polimer Gaz Conduțe și SRL Vig-House pentru lucrările de construcții pentru anul 2020-2021.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.11.2021 - 29.11.2021, fiind formată din:

Valentin Doglea - (diriginte de șantier SRL Polimer Gaz Conduțe)

Dumbravă Pavel - (diriginte de șantier SRL Vig House)

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan director Vig-House SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

Cocîrlă Serghei director Polimer Gaz Conduțe SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului Lucrări de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finisarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 01 decembrie 2021 la Leova în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membri: Valentin Doglea

(numele, prenumele, semnătura)

Dumbravă Pavel

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea de finisare interioară la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 01 " 12 2021

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " " 2021

L.S.

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 02 din 01 decembrie 2021

privind lucrarea Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova, executată la obiectul Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova, în cadrul contractului nr. 2020-20/PGC; din 27 august 2020 încheiat între SRL Polimer Gaz Conducte și SRL Vig-House pentru lucrările de construcții pentru anul 2020-2021.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.11.2021 - 29.11.2021, fiind formată din:

Valentin Doglea - (diriginte de șantier SRL Polimer Gaz Conducte)
Dumbravă Pavel - (diriginte de șantier SRL Vig House)

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Gradinari Ivan director Vig-House SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

Cocirlă Serghei director Polimer Gaz Conducte SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului Lucrări de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finisarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 01 decembrie 2021 la Leova în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Membri: Valentin Doglea

(numele, prenumele, semnătura)

Dumbravă Pavel

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea de amenajare a teritoriului la obiectul Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"01" "12" 2021

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " " 2021

L.Ș. _____

(semnătura)



Din "04" octombrie 2021

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Instituția Publică Liceul Teoretic "Constantin Spătaru" din str. Stefan cel Mare, nr. 56, or. Leova, ca beneficiar, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții **SRL "VIG HOUSE"** pe care am contractat-o în anul 2020 pentru executarea următoarele lucrări:

1. **Lucrări de Finisarea interioară** a L.T. "Constantin Spătaru" din orașul Leova în valoare de **4 422 898 lei**;
2. **Lucrări de Amenajarea teritoriului** L.T. "Constantin Spătaru" din orașul Leova în valoare de **3 127 810 lei**.

Menționăm receptivitatea conducerii **"VIG HOUSE" SRL** la toate problemele legate de lucrările de construcție și reparații.

Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice.

În concluzie, recomandăm compania **SRL "VIG HOUSE"** pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Cu respect,
Director al L.T. "Constantin Spătaru"



Dorin Marin

Investitor: Primăria satului Maximovca

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 6 din „13” decembrie 2021

Privind lucrările de Construcția unei porțiuni de drum în satul Maximovca executate în cadrul contractului nr. 30 din „23” noiembrie 2021, încheiat între Primăria satului Maximovca și SRL „VIG HOUSE”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din „ ” _____ 2021.

1. Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Ala Bruma, primar s. Maximovca.

Membrii comisiei:

1. Natalia Sprinsean, contabil-sef;
2. Lucia Luceac, specialist;
3. Pavel Sîrbu, consilier;
4. Dimitrii Jelic, locuitor al satului;
5. Mihail Anatii, locuitor al satului.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG HOUSE”;
- Cepoi Sergiu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru recepția finală.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotate, a fost semnat (încheiat) astăzi „ ” decembrie 2021 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Ala Bruma



Membrii comisiei:

Natalia Sprinsean



Lucia Luceac



Pavel Sirbu



Dimitrii Jelic



Mihail Anatii



Participanți la recepție:

• Ivan Gradinari – director SRL „VIG HOUSE”



• Cepoi Sergiu, diriginte de șantier

8. Lucrarea Construcția unei porțiuni de drum în satul Maximovca este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

Ivan Gradinari
Director SRL „VIG HOUSE”

Ala Bruma
Primar s. Maximovca

„ ____ ” decembrie 2021

„ ____ ” decembrie 2021

L.S. 
(semnătura)



(semnătura)



DS-2021
Nr. 1218
1,2a,b

Republica Moldova
Raionul Anenii Noi
Primăria satului Maximovca



Республика Молдова
Район Новые Анены
Примария села Максимовка

c/f 1008601001164
cod IBAN MD31TRPDAV20000001075700
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat
Raionul Anenii Noi s. Maximovca tel. 0-22-359-341, fax 359-340
www.primariamaximovca@mail.ru

Nr. 01/12-22

Din "30" decembrie 2021

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria s. Maximovca, ca beneficiar, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții SRL "VIG HOUSE" pe care am contractat-o în anul 2021 pentru executarea lucrării:

1. Construcția unei porțiuni de drum în s. Maximovca.

Menționăm receptivitatea conducerii "VIG HOUSE" SRL la toate problemele legate de lucrările de construcție și reparații.

Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice.

În concluzie, recomandăm compania SRL "VIG HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Cu respect,
/ Primăria s. Maximovca
Primar



Ala Bruma

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitor: Primăria s. Onițcani, r-nul Criuleni

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. 1 din „08” august 2022

Privind lucrările de Reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" în s. Onițcani, r-nul Criuleni executate în cadrul CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 20 din 01 iunie 2022, încheiat între Primăria s. Onițcani și SRL „VIG - HOUSE”.

1. Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Maria Țîrgola, primarul satului

Membrii comisiei:

1. Irina Duca, secretarul consiliului local;
2. Ludmila Lupașcu, contabil-șef al primăriei;
3. Ion Iacub, consilier local;
4. Stefan Bejan, responsabil tehnic.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”;
- Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru darea în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotate, a fost semnat astăzi „08” august 2022 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Maria Tîrgola



Membrii comisiei:

Irina Duca



Ludmila Lupașcu



Ion Iacub



Ștefan Bejan




Participanți la recepție:

• Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”



• Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier



8. Lucrarea **Reparatie a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" în s. Onițcani, r-nul Criuleni** este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

Ivan Gradinari
Director SRL „VIG - HOUSE”

Maria Tîrgola
primarul satului Onițcani

„ 08 ” august 2022

„ 08 ” august 2022

1.S. 
(semnătura)




(semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRIULENI
PRIMĂRIA ONIȚCANI
MD – 4833 s. Onițcani, r. Criuleni,
tel. 0(248) 79-236, Fax: 0(248) 79-238
e-mail: primariaonitcani@vandex.ru,
C/f 1007601010002



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ ОНИЦКАНЬ
МД - 4833 с. Оницкань, р. Криулень
тел. 0(248) 79-236, факс 0(248) 79-238
e-mail: primariaonitcani@vandex.ru,
Ф/к 1007601010002

Nr. 302

din " 20 " septembrie 2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria satului Onițcani, r. Criuleni, ca beneticiar, își exprimă aprecierea, satisfacerea și plăcerea față de colaborarea cu Compania de construcții SRL "VIG-HOUSE" pe care a contractat-o în anul 2022, în baza Contractului de antrepriză pentru executarea lucrării:

1. Lucrări de reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga".

Menționăm receptivitatea conducerii "VIG-HOUSE" SRL la toate obligațiunile contractuale și operativitatea specialiștilor de execuție a lucrărilor de construcție și reparații.

Lucrările au fost executate calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii.

În concluzie, recomandăm compania SRL "VIG-HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova, drept un colaborator profesionist și credibil.

Primarul s. Onițcani



Maria TÎRGOLA

INVESTITOR: Primaria s. Caracui Raionul Hincesti.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din 19.08.2022

privind lucrarea „Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu „din s. Caracui r-nul. Hincesti, în cadrul contractului nr. 27 din 06.iulie 2022 încheiat între _Primaria s. Caracui Raionul Hincesti_ și SRL „Vig House”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.08.2022 ora 9:00, fiind formată din:

Președintele comisiei

Anatolie Dupceac – primarul s. Caracui;

Membrii comisiei

Chironda Grigore- inginer cadastral

Niculescu Alexandru – cosilier local s.Caracui,

Timus Victor- consilier local s.Caracui;

Tudor Vartolomei– responsabil tehnic.

Invitat

Antreprenor SRL „Vig Hause”.

3. Constatările comisiei de recepție:

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: **Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu, din s. Caracui r-nul. Hincesti.** cu numărul cadastral ___, adresa poștală str. Nicolae Corlateanu, din s. Caracui r-nul. Hincesti.

următoarele _____, destinația _____, compus din construcții

_____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 19.08.2022 la 10:00 în 3 (trei)exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

Anatolie Dupeeac – primarul s. Caracui,

Membrii comisiei

Chironda Grigore- inginer cadastral,

Niculescu Alexandru – cosilier local s.Caracui,

Timus Victor- consilier local s.Caracui,

Tudor Vartolomei – responsabil tehnic.

8. Lucrarea: **Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu, din s. Caracui r-nul. Hincești.**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL "Vig House "

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primaria s. Caracui Raionul Hincesti

" " 2022



REPUBLICA MOLDOVA

Raionul Hîncești

Primăria Caracui

Tel: (0269) 31-236, 31-036

Fax: (0269) 31-259

e-mail: primaria-s.caracui@inbox.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Хынчештский район

Примэрия Каракуй

Тел: (0269) 31-236, 31-036

Факс: (0269) 31-259

Nr. 136

Din "20" septembrie 2022

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria satului Caracui, r-nul Hîncești, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu SRL "VIG-HOUSE" în baza contractului de antrepriză pentru lucrarea „Reparația drumurilor locale din satul Caracui, r-nul Hîncești”.

Menționăm că toate lucrările au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor. Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiilor contractuale reprezintă criteriile determinabile de caracterizare satisfăcătoare ceia ce ne motivează să recomandăm compania SRL "VIG-HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

În concluzie, pentru orice companie – autoritate cu care va relaționa, recomandăm SRL "VIG-HOUSE" drept un colaborator profesionist și credibil, compania distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, fapt care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitori.

Primarul satului Caracui



Anatolie Dubceac

Investitor: Primăria s. Cruglic, r-nul Criuleni

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din „30” septembrie 2022**

Privind lucrările de reparație a străzii Gheorghe Grecu din satul Cruglic, r-nul Criuleni executate în cadrul CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 23 din 12 iulie 2022, încheiat între Primăria s. Cruglic și SRL „VIG-HOUSE”.

Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Iurie Neculai, primarul satului

Membrii comisiei:

1. Dumitru Roșca, secretarul consiliului local;
2. Gheorghe Druță, specialist în aparatul primăriei;
3. Ion Popa, președinte al comisiei Buget, Economie și Finanțe;
4. Victor Ciorba, președinte al comisiei Agricultură, dezvoltarea Socială, protecția Mediului și amenajarea Teritoriului;
5. Ștefan Bejan, responsabil tehnic.

Membrii supleanți:

1. Ghenadii Jorneac, consilier local;
2. Lidia Chetorean, contabil-șef al primăriei.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG-HOUSE”;
- Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru darea în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotată, a fost semnat astăzi „30” septembrie 2022 în 4 exemplare.


Comisia de recepție:

Președintele: Iurie Neculai



Membrii comisiei:

Dumitru Roșca



Gheorghe Druță



Ion Popa



Victor Ciorba



~~Stenadie~~
Dan Jorneac



Lidia Chetrean



Stefan Bejan



Participanți la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”
- Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier







8. Lucrarea Reparația străzii Gheorghe Grecu din satul Cruglic, r-nul Criuleni este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Ivan Gradinari
Director SRL „VIG - HOUSE”

PRIMITĂ:

BENEFICIARUL:

Iurie Neculai
primarul satului Cruglic

„30” septembrie 2022




(semnătura)

„30” septembrie 2022




(semnătura)



"VIG HOUSE" SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții

MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Timișoara 25, C/f 1018600024334, c/TVA 0610932

Tel. +373 76009742, cel. +373 79003842. E-mail: vighouse@mail.ru





Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)














Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)

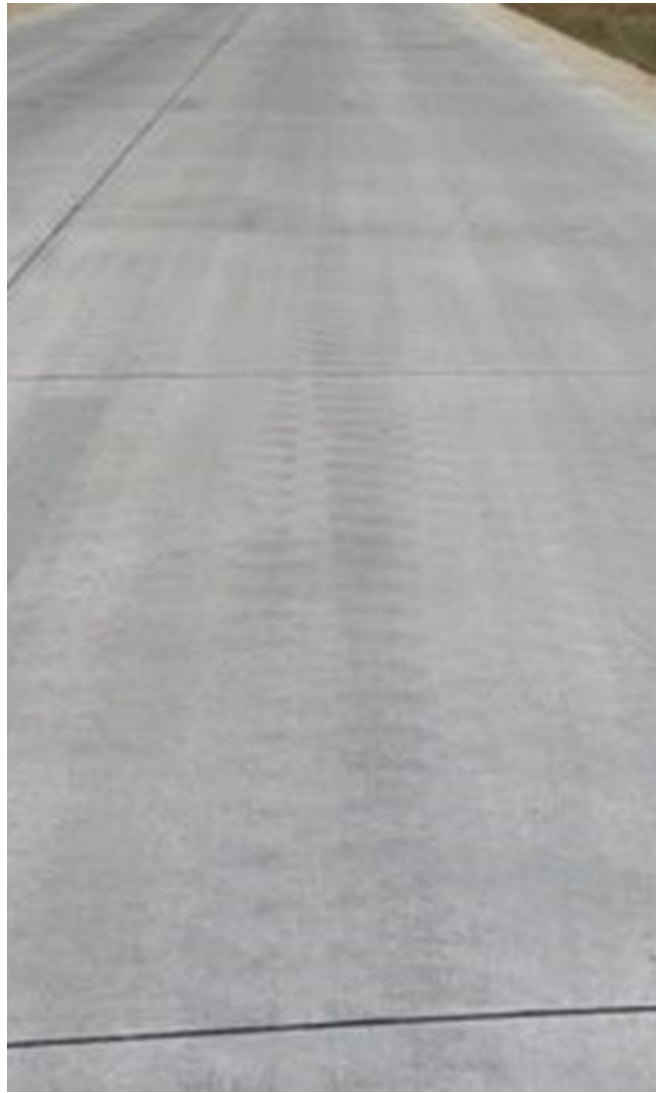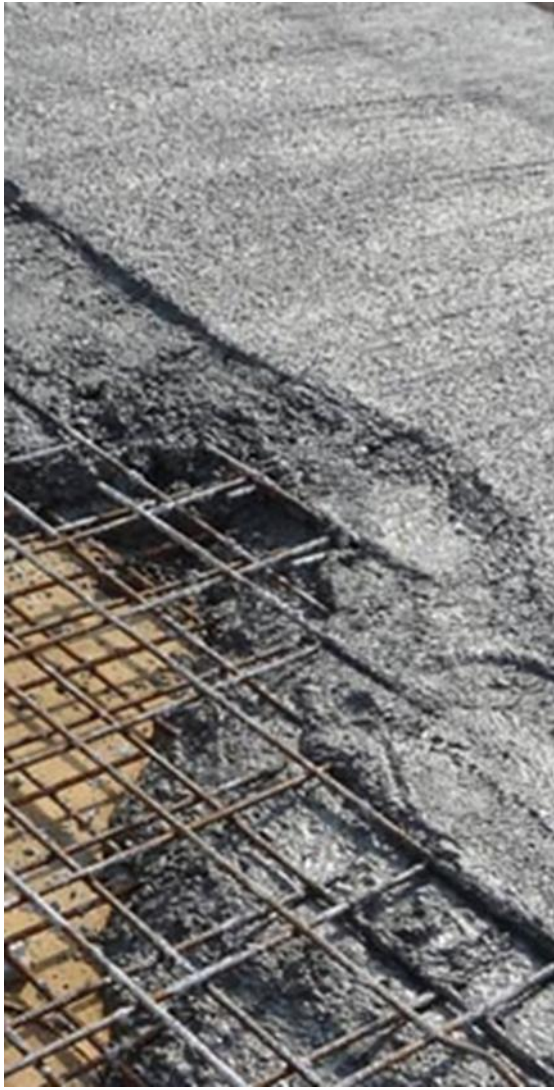






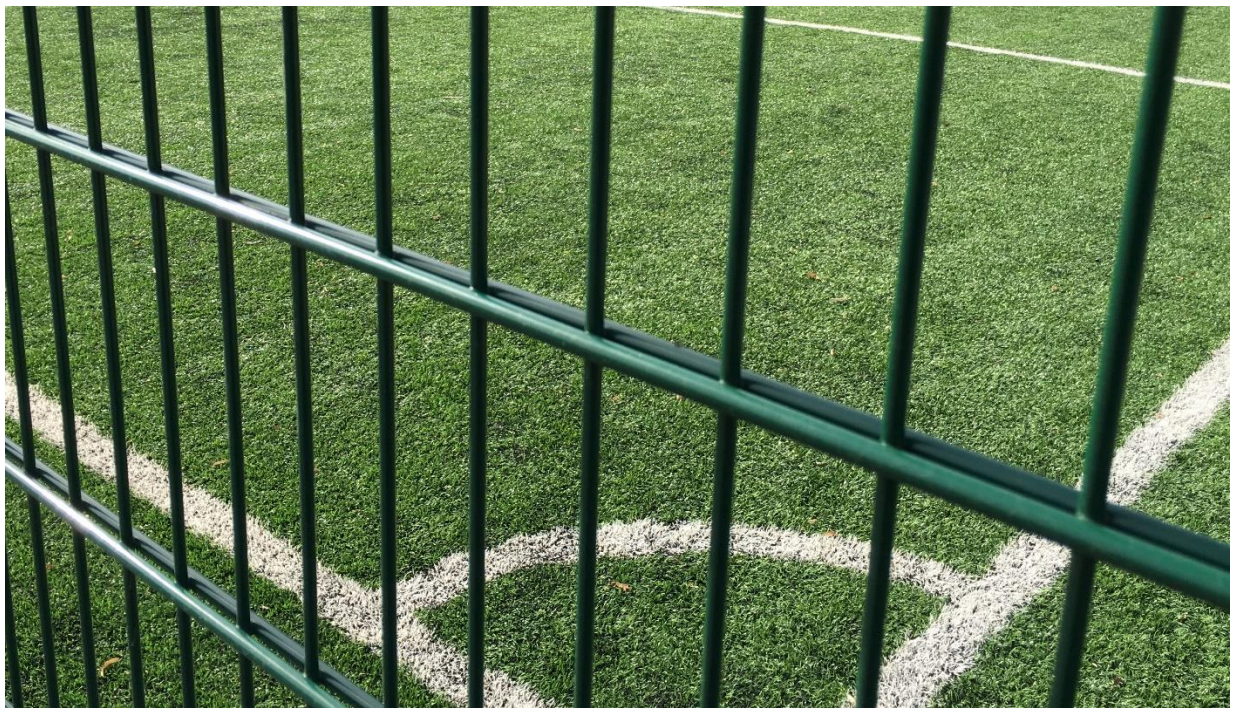


Teren de tenis





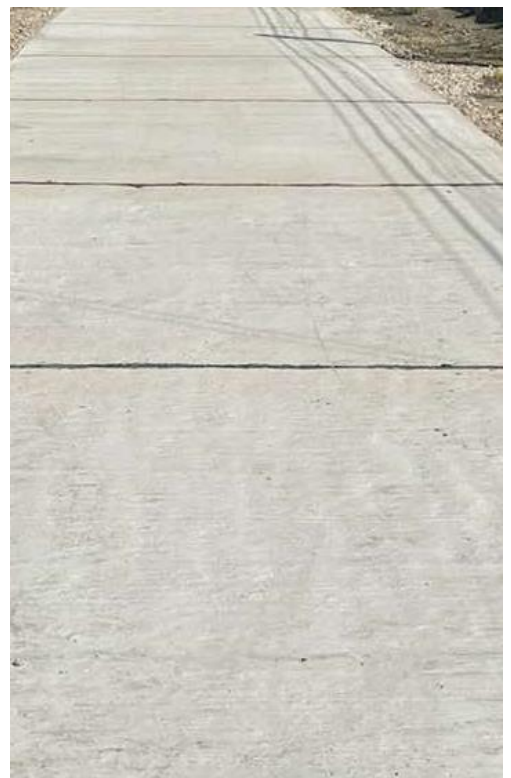



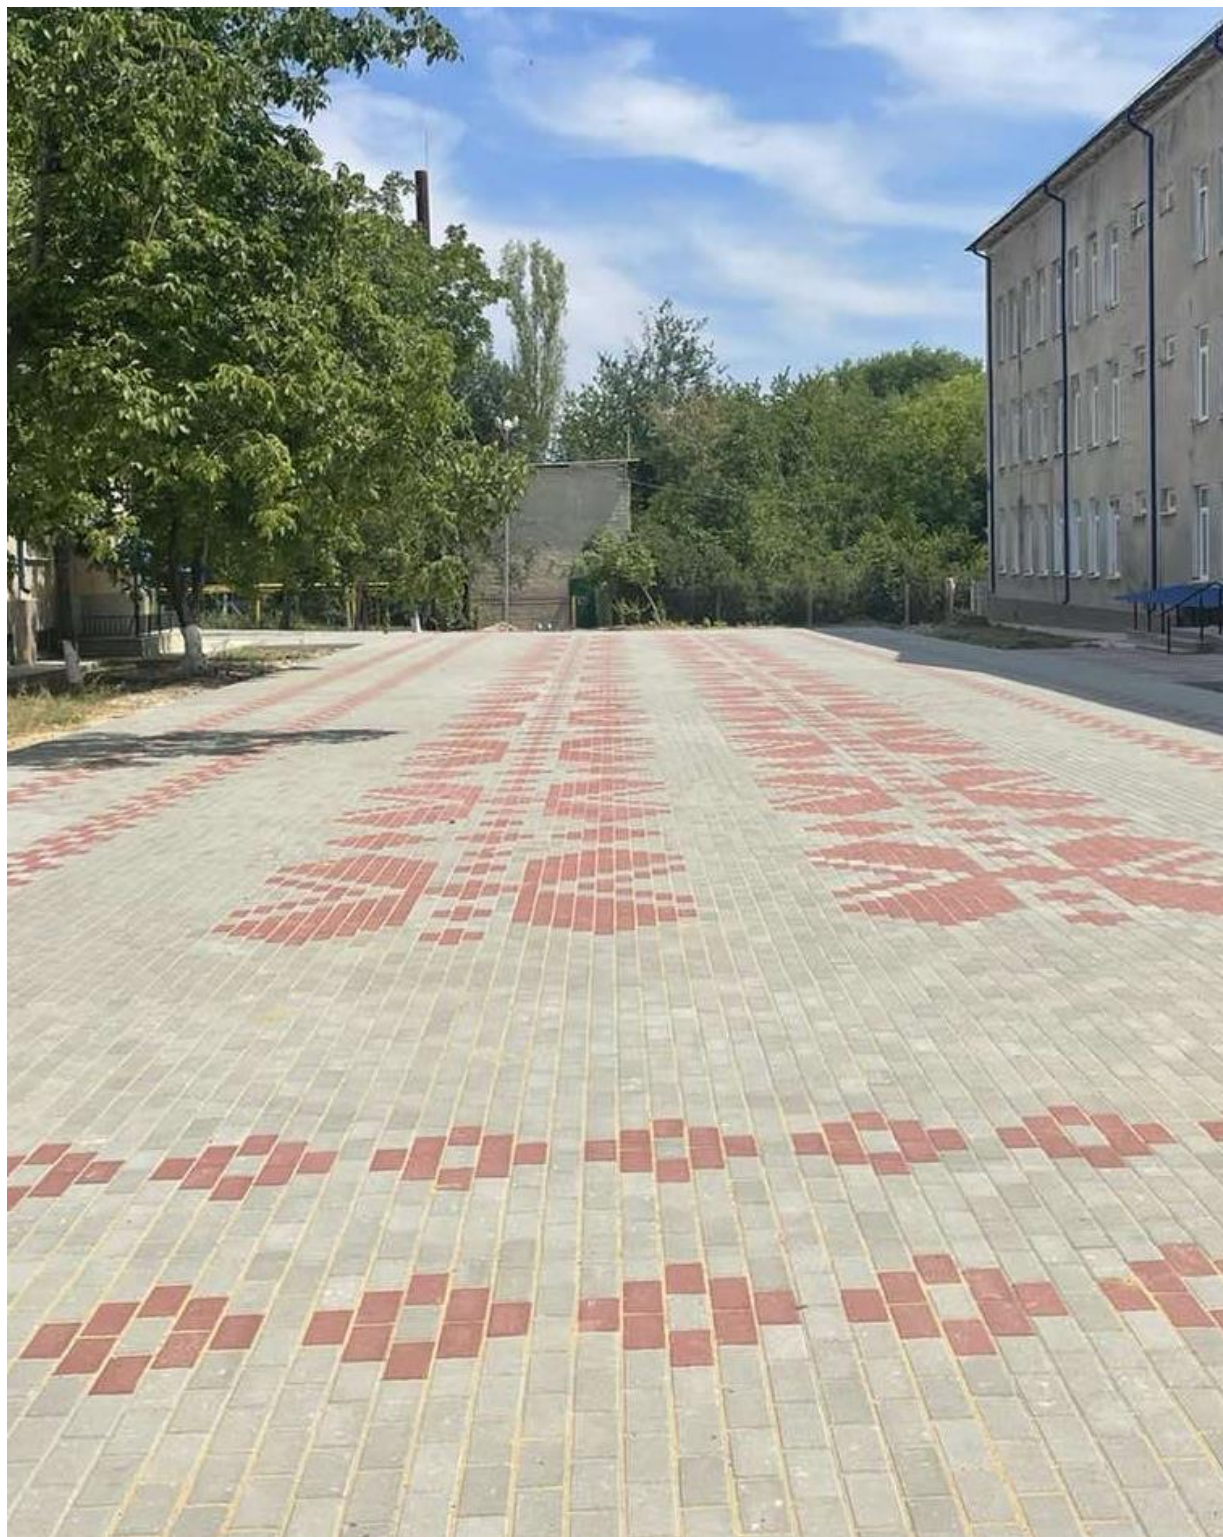

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)
