

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice nationale, locale, amplasate teritorial in raionul Nisporeni.**
2. Numărul și data contractului: **nr. 11-18/194 din 04.05.2018 si acordurile aditionale nr.1 din 28.05.2018, nr.2 din 07.11.2018, (încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar si SRL „Dromas-Cons” antreprenor), or.Chisinau.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului: **mun Chișinău, str.Bucuriei 12 a**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: - **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului :

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială: (la data semnării contractului)	70,909 mln. lei	<u>3,962 mln.</u>
b) finală: (la data finalizării contractului)	72,001 mln. lei	<u>4,000 mln.</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu e cazul**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) **4,0 luni** - contractată
 - b) **4,0 luni** - realizată
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu a avut loc**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: - **21 din 20.11.2018.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu e cazul**

Data completării: **04.07.2019**

Semnat: _____

Nume: **P. Dacin**Funcția în cadrul firmei: **Director general**Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/194
privind achiziția prin Licitație Publică

"04" mai 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01308 din 25.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va asigura executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră



necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **70 909 088,38 (șaptezeci milioane nouă sute nouă mii optzeci și opt lei 38 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Cyfr

Real



14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDM2X334
c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților

Director general
Gheorghe Curmei



Director general
Piotr Dacin

"Antreprenor general"





PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21 din 20 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/194 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018, nr.2 din 07.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-20 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
S.Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
Ș.Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T.Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P.Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
A.Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor septembrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - 73,02 mln. lei, inclusiv LCM - 71,04 mln. lei.

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - 72 001 468,62 lei, inclusiv LCM - 70 855 007,01 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi 20 Noiembrie 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

S. Tipa

Ș. Caunov

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21 din 20 Noiembrie 2018, r-ul Nisporeni

Primar or.Nisporeni – G.Robu

Primar s.Grozești – S.Crișmaru

Primar s.Bălănești inclusiv
s.Găureni – G.Pîrțac

Primar s.Iurcenii inclusiv
s.Mîrzoaia – I.Bocan

Primar s.Bălăurești – I.Carp

Primar s.Mărinici – S.Echim

Primar s.Bărboieni – S.Croitoru

Primar s.Milești – R.Viridan

Primar s.Boldurești inclusiv
s.Băsceni – V.Miron

Primar s.Seliste inclusiv
s.Păruceni – R.Ivanov

Primar s.Bolton – V.Ciobanu

Primar s.Soltănești – N.Vasilachi

Primar s.Brătuleni inclusiv
s.Cîrnești – N.Cherchea

Primar s.Șișcani inclusiv
s.Odaia – V.Bocanu

Primar s.Bursuc – V.Rusu

Primar s.Valca Treștieni inclusiv
s.Săceni – M.Chircu

Primar s.Călimănești – S.Cornescu

Primar s.Varzărești – C.Ungureanu

Primar s.Vinători – V.Guțu

Primar s.Vinători – E.Lazăr

Primar s.Ciutești inclusiv
s.Valea Nirnovei – Iu.Stamati

Primar Zberoaia – D.Gurzufui

Primar s.Crîstești – A.Secieru

cușu

Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Nisporeni

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Dromas-Cons" Contract nr.11-18/194 din 04.05.18 2018	70 855 007,01 70 855 007,01
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	1 084 081,61 1 084 081,61
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	62 380,00 62 380,00
	TOTAL:	72 001 468,62

Deviz: 73,02 mln.lei
incl. LCM 71,04 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
septembrie 2018

Șef serviciul




S. Petrușanco





SITUAȚIA

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	fără obiecții 

Președinte V.Cotruță

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

S.Tipa

S. Caunov

T.Vasilachii

P.Dacin

A.Dodon





PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21/1 din 20 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr. 11-18/354 din 05.09.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-20 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh. Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- G. Parvan* - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
- S. Tipa* - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
- Ș. Caunov* - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
- T. Vasilachii* - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
- P. Dacin* - director SRL „Dromas - Cons”
- A. Dodon* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”
- b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2018 sfârșitul lucrărilor septembrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - 2021714,91 lei, inclusiv LCM - 1991248,80 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *Marti* 20 Noiembrie 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

S. Tipa

Ș. Caunov

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon



Ceșu

Ceșu

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 211 din 20 Noiembrie 2018,
r-ul Nisporeni

Primar s. Seliste – V.Ivanov



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Lista cheltuielilor

Lucrările suplimentare de reparație a imbrăcămintei rutiere pe drumul
L402 Păruceni - Seliște - Vinători, km 0,0 - 0,7 (prin s.Seliște)
 amplasat teritorial în raionul Nisporeni

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Dromas-Cons" Contract nr. 11-18/354 din 05.09.18 2018.	1 991 248,80 1 991 248,80
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	30 466,11 30 466,11
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	0,00 0,00
	TOTAL:	2 021 714,91

Începutul lucrărilor
 Finalizarea lucrărilor

septembrie 2018
 septembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco






PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr 21/2 din 20 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr. 11-18/379 din 25.09.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-20 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V. Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh. Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G. Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
S. Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
Ș. Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T. Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P. Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
A. Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”
- b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2018 sfârșitul lucrărilor octombrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - 2632339, 04 lei, inclusiv LCM - 2572653, 48 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *Marți* 20 Noiembrie 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


S. Tipa

S. Caunov

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon



Signature

Signature

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21/2 din 20 Noiembrie 2018,
r-ul Nisporeni

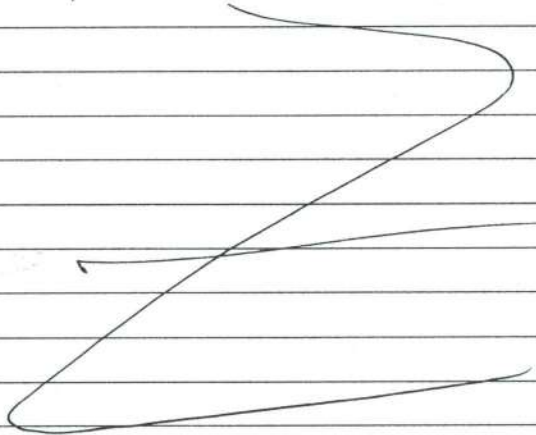
Primar or.Nisporeni – G.Robu



Primar s.Bălănești – G.Pîrțac



neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Raionul Nisporeni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	fără obiecții 

V. Cotruță

Gh.Tonu

G.Parvan

S.Tipa

S. Caunov

T. Vasilachii

P.Dacin

A. Dodon



Lista cheltuielilor

Lucrările suplimentare de reparație a unor străzi din localitate or. Nisporeni, drumul de
access pre microsectorul Ciurleasa și reparația unor străzi din localitate s. Bălănești,
km 0,0 – 0,5 amplasat teritorial în raionul Nisporeni

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Dromas-Cons" Contract nr.11-18/379 din 25.09.18 2018	2 572 653,48 2 572 653,48
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	59 685,56 59 685,56
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	0,00 0,00
	TOTAL:	2 632 339,04

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

septembrie 2018
octombrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco






CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/194
privind achiziția prin Licitație Publică

"04" mai 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01308 din 25.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L. "Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va asista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră



necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **70 909 088,38 (șaptezeci milioane nouă sute nouă mii optzeci și opt lei 38 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Cyfr

Real



14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDM2X334
c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților

Director general
Gheorghe Curmei



Director general
Piotr Dacin

"Antreprenor general"





PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21 din 20 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/194 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018, nr.2 din 07.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-20 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
S.Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
Ș.Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T.Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P.Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
A.Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor septembrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - 73,02 mln. lei, inclusiv LCM - 71,04 mln. lei.

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - 72 001 468,62 lei, inclusiv LCM - 70 855 007,01 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi 20 Noiembrie 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

S. Tipa

Ș. Caunov

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21 din 20 Noiembrie 2018, r-ul Nisporeni

Primar or.Nisporeni – G.Robu

Primar s.Grozești – S.Crișmaru

Primar s.Bălănești inclusiv
s.Găureni – G.Pîrțac

Primar s.Iurcenii inclusiv
s.Mîrzoaia – I.Bocan

Primar s.Bălăușeni – I.Carp

Primar s.Mărinici – S.Echim

Primar s.Bărboieni – S.Croitoru

Primar s.Milești – R.Viridan

Primar s.Boldurești inclusiv
s.Băsceni – V.Miron

Primar s.Seliste inclusiv
s.Păruceni – R.Ivanov

Primar s.Boltoni – V.Ciobanu

Primar s.Soltănești – N.Vasilachi

Primar s.Brătuleni inclusiv
s.Cîrnești – N.Cherchea

Primar s.Șișcani inclusiv
s.Odaia – V.Bocanu

Primar s.Bursuc – V.Rusu

Primar s.Valca Treștieni inclusiv
s.Săceni – M.Chircu

Primar s.Călimănești – S.Cornescu

Primar s.Varzărești – C.Ungureanu

Primar s.Vinători – V.Guțu

Primar s.Vinători – E.Lazăr

Primar s.Ciutești inclusiv
s.Valea Nirnovei – Iu.Stamati

Primar Zberoaia – D.Gurzufui

Primar s.Crîstești – A.Secieru

ceyh

Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Nisporeni

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Dromas-Cons" Contract nr.11-18/194 din 04.05.18 2018	70 855 007,01 70 855 007,01
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	1 084 081,61 1 084 081,61
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	62 380,00 62 380,00
	TOTAL:	72 001 468,62

Deviz: 73,02 mln.lei
incl. LCM 71,04 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
septembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco







PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21/1 din 20 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr. 11-18/354 din 05.09.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-20 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V. Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh. Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G. Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
S. Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
Ș. Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T. Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P. Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
A. Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”
- b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2018 sfârșitul lucrărilor septembrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - 2021714,91 lei, inclusiv LCM - 1991248,80 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *Marti* 20 Noiembrie 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

S. Tipa

Ș. Caunov

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon



Ceșu

Ceșu

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 211 din 20 Noiembrie 2018,
r-ul Nisporeni

Primar s. Seliste – V.Ivanov



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Lista cheltuielilor

Lucrările suplimentare de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul
L402 Păruceni - Seliște - Vinători, km 0,0 - 0,7 (prin s.Seliște)
 amplasat teritorial în raionul Nisporeni

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Dromas-Cons" Contract nr. 11-18/354 din 05.09.18 2018.	1 991 248,80 1 991 248,80
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	30 466,11 30 466,11
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	0,00 0,00
	TOTAL:	2 021 714,91

Începutul lucrărilor
 Finalizarea lucrărilor

septembrie 2018
 septembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco






PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21/2 din 20 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr. 11-18/379 din 25.09.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-20 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V. Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh. Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G. Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
S. Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
Ș. Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T. Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P. Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
A. Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”
- b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2018 sfârșitul lucrărilor octombrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - 2632339, 04 lei, inclusiv LCM - 2572653, 48 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *Marți* 20 Noiembrie 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


S. Tipa

S. Caunov

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon



Signature

Signature

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21/2 din 20 Noiembrie 2018,
r-ul Nisporeni


Primar or.Nisporeni – G.Robu



Primar s.Bălănești – G.Pîrțac



neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Raionul Nisporeni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	fără obiecții 

V. Cotruță

Gh.Tonu

G.Parvan

S.Tipa

S. Caunov

T. Vasilachii

P.Dacin

A. Dodon



Cyfr

CHINA
MAS-CONS
SOCIETÀ
N. 104/60010/1005

Lista cheltuielilor

Lucrările suplimentare de reparație a unor străzi din localitate or. Nisporeni, drumul de
access pre microsectorul Ciurleasa și reparația unor străzi din localitate s. Bălănești,
km 0,0 – 0,5 amplasat teritorial în raionul Nisporeni

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Dromas-Cons" Contract nr. 11-18/379 din 25.09.18 2018	2 572 653,48 2 572 653,48
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	59 685,56 59 685,56
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	0,00 0,00
	TOTAL:	2 632 339,04

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

septembrie 2018
octombrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco

