



”Magistrala -Nistru”S.R.L.

3001. Republica Moldova
or. Soroca, str. Ocolirii 2b
tel. (373-30) 2-30-37,

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr.69
din “07” mai 2021

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Soroca	SRL„Dromascons”	subantreprenor	37 046 059,08/ 22 375 562,40	5 luni	Nr.1 din 11.01.2021
2	Lucrări demarcaj rutier pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord a republicii	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A	antreprenor	13 515 743,64 lei	5 luni	2020
3	Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci	Consiliul Raional Ocnița	antreprenor	691 439,82 lei	1lună	2020
4	Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci	Consiliul Raional Ocnița	antreprenor	1 773 299,97 lei	3luni	2020
5	Reconstrucția drumului L118 acces în or.Drochia	Consiliul Raional Drochia	antreprenor	1 370 860,92 lei	3 luni	2020
6	Reparația drumurilor locale din raionul Dondușeni	Consiliul raional Dondușeni”	antreprenor	3 816 866,08 lei	2 luni	Nr.1 din 21 iulie 2020
7	Lucrări de reparație curentă a porțiunelor de drum de pe str. Maria Cebotari, Carpenco, D.Cantemir(trotuar) căile de acces la blocurile locative str. Independenței81,79A ,și Șt. cel Mare 26,28A din m. Soroca	Primăria mun.Soroca	antreprenor	3 485 938,15 lei	3 luni	Nr.1 din 10.12.2020
8						

	Total			47 029 710,98 lei		

Data completării: **05.08.2021**

Semnat:

Nume/prenume: **Mircea Moldovan**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. « Magistrala-Nistru »**

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

nr. 1084
din 14.07.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16 /2020

privind achiziția prin licitație publică
ocds-b3wdp1-MD-1589208694353

2 ex.

„ 13 ” 07 2020

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)
mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. _____ din “ ” 20____, reprezentat prin primarul municipiului Lilia Pilipetchi
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Soroca
(localitatea)

str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,
e-mail: magistrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.

MD0001541

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015, eliberată de
Camera licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: de reparație a porțiunii de drum str. Din str.M. Cebotari, Carpenco, D. Cantemir (trotuare) cailor de acces la blocurile locative str. Independenței 81,79A, str. Șt. Cel Mare 26,28A.m. Soroca.

(descrierea succintă).

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este Pînă la 1.X.2020 de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren. Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3485938,15 (Tei mil patru sute optzeci cinci mii nouă sute treizeci și opt lei,15 bani) lei MD.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale prin transfer bancar.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 13.07 2020.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria mun. Soroca

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5**
Tel./Fax: **023023463, 023022800**
Denumirea Băncii: **Trezoreria teritorială**
Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
Cont de decontare: **MD15TRPDAI222500D10981AB**
Cod fiscal: **1007601001514**

“ANTREPRENOR”: SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b**
Tel./Fax: **92940**
Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbank**
Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
Cod Bancar: **AGRNMD2X771**
Cont de decontare: **MD52AG000000002251833791**
Cod fiscal: **1003607000038**

“BENEFICIAR”:

L.Ș.



16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:



Republica Moldova
Primăria Municipiului Soroca

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 10.12 2020

Privind Repetat-Lucrări de reparație curentă a porțiunii de drum din str. M. Cebotari, Carpenco, D. Cantemir (trotuare), Căilor de acces la blocurile locative str. Independenței, 81,79A, Ștr. cel Mare, 26,28A din m. Soroca în cadrul contractului nr. 16/2020 din 13.07.2020 și încheiat între Primăria mun. Soroca și antreprenorul „Magistrala-Nistru” SRL pentru efectuarea lucrărilor „Lucrări de reparație curentă a porțiunii de drum din str. M. Cebotari, Carpenco, D. Cantemir (trotuare), Căilor de acces la blocurile locative str. Independenței, 81,79A, Ștr. cel Mare, 26,28A din m. Soroca.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la „___” _____ 2020

2 Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Lilia Pilipețchi - Primarul mun. Soroca

Membrii Comisiei:

Valeriu Ghimpi	- Viceprimar
Alexei Patrașcu	- Sef Serviciu de Amenajare și Înverzire
Zinaida Captari	- Specialist în problemele de construcție, gospodărie comunală și drumuri
Serghei Nastas	- Responsabil tehnic atestat
Maxim Sanalatii	- Specialist în problemele de construcție, gospodărie comunală și drumuri

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Magistrala-Nistru” SRL - Mircea Moldovan
- Andrian Budei

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5). Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepție la terminarea lucrărilor

6). Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările au fost terminate

7). Comisia de recepție recomandă următoarele:

8). Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la „___” _____ 2020 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Lilia Pilipețchi

Membrii comisiei


Valeriu Ghimpu



Alexei Patrașcu

Zinaida Captari

Serghei Nastas

Maxim Sanalatii

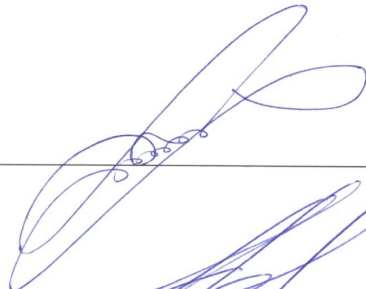



(nume, prenume, semnatura)

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

« 1 » 10. 12 2020

S.R.L. „Magistrala-Nistru”



Mircea Moldovan

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

« 1 » 10. 12 2020

Primăria mun. Soroca



Primar

Lilia Pilipețchi

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „10” decembrie 2020

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Primarul

Responsabil tehnic atestat



Lilia Pilipetchi

Serghei Nastas

Anexa nr.2
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „10” decembrie 2020

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Nu sunt.

Primarul

Responsabil tehnic atestat



Lilia Pilipetchi

Serghei Nastas

Anexa nr.3
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „10” decembrie 2020

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Nu au fost depistate.

Primarul

Responsabil tehnic atestat



Lilia Pilipetchi

Serghei Nastas

CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ № 04-04/20

13.04. 2020

mun. Soroca

„Dromas-Cons” SRL, cu sediul social în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ghidighici 15/1, cod IBAN MD84ML000000002251034166, cod bancar MOLDMD2X334, cod fiscal 1003600107905, reprezentată de directorul dl **P. Dacin**, care activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” pe de o parte, și

„Magistrala-Nistru” SRL cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG 000000002251833791, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Soroca, cod fiscal 1003607000038 reprezentată de directorul dl **M. Moldovan**, care activează în baza statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au convenit:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, **lucrări de reparație periodic/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Soroca**, iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli și aprobat de părți și constituie **37 046 059,08 inclusiv TVA**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin accord adițional semnat de ambele părți.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;

4. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

4.1. Lucrările sunt executate în conformitate cu graficul stabilit de părți și anume: durata desfășurării lucrărilor _____ zile calendaristice, începând _____ 2020.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Presentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Presentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2020.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenor- General”

SRL „Dromas- Cons”

mun. Chișinău, or. Vatra

str. Ghidighici, 15/1

c/f 1003600107905

c/IBAN MD84ML000000002251034166

BC „Moldindconbank” SA

MOLDMD2X334,

c/TVA 0604780

Director

Piotr Dacin



„Subantreprenor”

SRL „Magistrala-Nistru”

MD3001 or. Soroca, str. Ocolirii, 2B

c/f 1003607000038

c/IBANMD52AG 000000002251833791

BC„Modova-Agroindbank”SA fil.Soroca

AGRNMD2X

c/TVA 8400353

Director

Mircea M



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.01/21 din 11 ianuarie 2021

Privind " *Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca* " executate în cadrul contractului nr. 04-07/20 din 13 iulie 2020, încheiat între "DROMAS-CONS"SRL în calitate de Antreprenor general și "MAGISTRALA-NISTRU"SRL în calitate de Subantreprenor.

1. Comisia desemnată de "DROMAS-CONS"SRL și "MAGISTRALA-NISTRU"SRL 1-a desfășurat activitatea astăzi, 11 ianuarie 2021 fiind formată din:

- P.Dacin director "DROMAS-CONS"SRL
- E.Filipescu diriginte de șantier "DROMAS-CONS"SRL
- A.Guzun șef-birou în construcții "DROMAS-CONS"SRL
- M.Moldovan director "MAGISTRALA-NISTRU"SRL
- A.Budei director tehnic "MAGISTRALA-NISTRU"SRL
- D.Naclițchi inginer secția tehnică "MAGISTRALA-NISTRU"SRL

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoare, în conformitate cu devizul și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație rutieră.

- a) lucrările de reparație a drumurilor au fost realizate de către "MAGISTRALA-NISTRU"SRL
- b) devizul a fost elaborat de "DROMAS-CONS"SRL
- c) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iulie 2020 – sfârșitul lucrărilor noiembrie 2020

3. Costul lucrărilor conform contractului constituie – **37 046 059,08 lei, inclusiv TVA.**

4. Costul lucrărilor de facto constituie **22 375 562,40 lei inclusive TVA.**

5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi **marți 11.01.2021** în 2 exemplare.

COMISIA:

P.Dacin

A.Guzun

E.Filipescu

M.Moldovan

A.Budei

D.Naclițchi



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 55

privind achiziția prin Licitație deschisă

10. 06 2020

or. Dondușeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1588579563859 din 26.05.2020 (licitația electronică 27.05.2020, ora 15:00), publicat în RSAP, între Consiliul raional Dondușeni cu sediul în or. Dondușeni, str. Independenței, 47, telefon 0-251-22058, fax 0-215-22058 reprezentat prin Valentin CEBOTARI, președintele raionului Dondușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Magistrala Nistru" IDNO 1003607000038 cu sediul în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, telefon 2-30-37, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0001541 din MD 0001541, din 18. 12. 2004 înregistrat 01. 06. 2000 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația 049708 din 07 septembrie 2010 eliberată de Camera de licențiere al ME RM pe un termen de __ani, prelungit până la __ 20__, pentru genurile de activitate: Terasamente și lucrări de teren - Executarea construcțiilor - Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor - Lucrări de finisare a construcțiilor, reprezentat prin Mircea Moldovan, director, administrator SRL „Magistrala Nistru” în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Reparația drumurilor locale din raionul Dondușeni, Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

• Perioada de execuție

- 2.1. Durata de execuție a serviciilor contractate este până la **31.12.2020** din ziua semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini,
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor

sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea serviciilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 816 866,08** lei (inclusiv TVA).
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că serviciile au fost executate conform contractului. Termen de valabilitate pînă la **31.12.2020**
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

5. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate



- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări

- limbă de circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.


14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„ANTREPRENOR”: <u>SRL „Magistrala-Nistru”</u>	„BENEFICIAR”: Consiliul raional Dondușeni
Adresa: or. Soroca, str. Ocolirii 2b	Adresa: Dondușeni, str. Independenței, 47
Tel./Fax: 0230-2-30-37; 9-29-40	Tel./Fax: 0-251-2-20-57, 0-251-2-52-00
E-mail: magistrala.nistru@gmail.com	
Denumirea Băncii: BC Moldova-Agroindbank	Denumirea Băncii: MF Trezorăria de stat
Adresa Băncii: or. Soroca	Adresa Băncii: Or. Bălți, str. Ștefan cel Mare 14/1
Cod Bancar: TREZMD2X	Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD52AG000000002251833791	Cod IBAN: MD82TRPDAW222500D11607AB
TVA: 8400353	
Cod fiscal: 1002607000038	MD95TRPDAW312120D11607AB
	Cod fiscal: 1007601010138
	Cont de decontare: 226634

15. Semnăturile părților

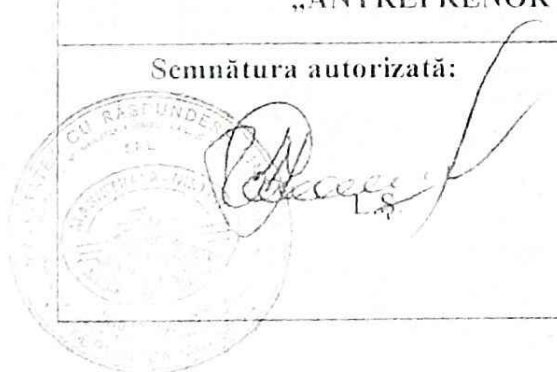„ANTREPRENOR”:	„BENEFICIAR”:
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

APROBAT



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 21 iulie 2020

Privind lucrările de reparație a drumurilor locale din raionul Dondușeni executate în cadrul contractului nr.55 din 10 iulie 2020 încheiate între Consiliul raional Dondușeni (beneficiar) și SRL „Magistrala-Nistru” (antreprenor).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.
2. Comisia de recepție instituită prin Dispoziția prezidentului raionului Dondușeni nr. 110-d din 26 iunie 2020 și-a desfășurat activitatea astăzi 21 iulie 2020 fiind formată din:
Președintele comisiei Banari Veaceslav – vicepreședintele raionului;
Vicepreședintele comisiei Rotaru Svetlana – vicepreședintele raionului;
Membri: Covali Oleg – șef secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri;
Bunescu Vasile – inginer- constructor;
Betivu Oleg – șef inspectia ecologică Dondușeni;
Curarari Valeriu – șef SP a SSE Dondușeni, maior s/i;
Luca Ala – inspector CSE Edinet sector Dondușeni;
3. La recepție au participat în calitate de invitați:
 - Mircea Moldovan – director SRL „Magistrala-Nistru”, executant,
 - Andrei Budei – director tehnic SRL „Magistrala-Nistru”,
 - Birnaz Victor – diriginte de șantier SRL „Autovertrans”, subcontractant,
 - Alexandru Fortuna – diriginte de șantier SRL „Magistrala –Nord” subcontractant;
4. Comisia de recepție a constatat – ca lucrările sunt finalizate cu/fără rezerve și poate fi data în folosință.

- Lucrările de reparație au fost executate de către SRL „Magistrala-Nistru”;
- Lucrările de construcție-montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **iunie 2020** sfîrșitul lucrărilor **iulie 2020**;
- 5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
 - situația lucrărilor existente și constatările comisiei de recepție;
 - 6. Drumurile supuse reparației au următorii indici de bază:
L75 R14 – drum de acces pre ș. Arionesti:
 - lucrări de terasament 100 m³
 - Amenajarea stratului din piatră spartă h= 15 cm
 - Amenajarea imbracamintei din beton asfaltic cu agregate mari, h= 4 cm
 - Amenajarea imbracamintei din beton asfaltic cu agregate mici, h= 4 cm
 - Lungimea drumurilor L – 440 m, latimea – b= 5m
 - Costul lucrărilor 727 026,04 lei, inclusiv TVA.

L73 R14- Criscauti:

- Lucrări de reparație a drumului impietruit cu adaos de material 15 000 m²
- Amenajarea podetului – 1 buc.
- Costul lucrărilor 498 948,58 lei, inclusiv TVA.
- L72 Horodiste -Sudarca:**
 - Lucrări de terasament 1728 m³
 - Amenajarea stratului din piatră spartă h= 18 cm
 - Amenajarea imbracamintei din beton asfaltic cu agregate mari, h= 4 cm
 - Amenajarea imbracamintei din beton asfaltic cu agregate mici, h= 4 cm
 - Lungimea drumurilor L – 800 m, latimea – b = 6 m

- Costul lucrarilor 1 756 651,44 lei, inclusiv TVA.

L63 Donduseni-Scaieni-Tirnova:

-Reparatia drumului impietruit prin amenajarea unui strat din piatra sparta 900 m³

-Amenajarea podetului – 1 buc.

-Drum din piatra sparta cu lungimea de L= 640 m si latimea de b = 4,5 m , h= 15 cm – 432 m³;

-Reparatia drumului din piatra sparta cu adaos de material, lungimea L=647 m si latimea

b= 4,5 m

-Costul lucrarilor 834 239,99 lei, inclusiv TVA.

7. Costul total al lucrarilor conform devizului-oferta si actelor de receptie a lucrarilor executate constituie – 3 816 866,08 lei

8. Costul fondurilor fixe primite in exploatare a tronsoanelor de drumuri locale mentionate vor fi directionate la majorarea costurilor drumurilor respective.

9. In urma examinarii vizuale pe teren a calitatii executiei lucrarilor, documentatiei prezentate si a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la receptia drumului, comisia de receptie a constatat ca lucrarea este indeplinita complet si calitativ, conform cerintelor caietului de sarcini si a normativelor in vigoare. Reparatia data a contribuit la imbunatatirea conditiilor de circulatie la trafic si asigurarea sigurantei circulatiei rutiere.

10. Comisia de receptie recomanda urmatoarele – admiterea cu/fără obiectii a receptiei.

11. Prezentul process-verbal, conținind 2 file si 1 anexa, a fost incheiat astazi 21 iulie 2020 in 5 exemplare.

Comisia de receptie:


Presedinte  V. Banari

Vicepresedinte  S. Rotaru

Membri:  O. Covali

 V. Bunescu

 O. Betivu

 V. Curarari

 A. Luca

Invitati :

 M. Moldovan

 A. Budei

 V. Birnaz

 Al. Furtuna

12. Lucrarea Reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni este receptionata.


TRANSMISA:

PRIMITA:


EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL „Magistrala –Nistru”



Consiliul Raional Donduseni



SITUATIA

constatarilor comisiei de receptie la terminarea lucrarilor

privind reparatia drumurilor publice locale din raionul Donduseni

A hand-drawn graph on lined paper showing two intersecting curves. The first curve starts at the origin (0,0), rises to a peak, then falls, crossing the x-axis, reaching a trough, and finally rising again. The second curve starts at a positive y-intercept, falls to a minimum, and then rises, intersecting the first curve twice.

Presedintele comisiei  **V. Banari**

Vicepresedinte  **S. Rotaru**

Membri: *V. Harpaz*, O. Covali

Gravito, V. Bunescu

O. Betivu

~~_____~~
V. Curarari

A. Luca

Invitati :

M. Moldovan

A. Budei

V. Birnaz

Al. Furtuna



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37 privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preț

14.05.2020



PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **Cerere a ofertelor de preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1586765416506** din data 29.04.2020, între **Consiliul raional Drochia** cu sediul în orașul Drochia, str. Independenței 15, telefon/fax: 0252 2 20 58, reprezentat prin Președintele raionului Drochia, **Alexei VASILEAN**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „Magistrala Nistru”** cu sediul în or. Soroca, str. Ocolirii, 2/B, MD-3001, tel.: 0230 2 30 37; fax: 0230 9 29 40, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003607000038 conform Certificatului de înregistrare nr. MD 0001541 din 08.12.2004 înregistrat de Camera înregistrării de stat, autorizat pentru activitatea în construcții: prin Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 522 din 17.12.2019 pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, reprezentat prin Administratorul, **Mircea MOLDOVAN**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările **Reconstrucția drumului L118-acces în orașul Drochia (14-2018-DA) repetat** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni (iunie-iulie)** și după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 370 860,92 (un milion treisute șaptezeci mii optsute șasezeci lei MD, 92 bani) inclusiv TVA.**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

- contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Lista cantitatilor de lucrari;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun. Soroca, str. Ocolirii 2b
Tel/fax (230)-2-30-37; 9-29-40
Cod fiscal: 1003607000038
Banca: BC Moldova-Agroindbank Soroca
Cod TVA: 8400353
IBAN: MD52AG000000002251833791

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Drochia, str. Independenței 15
Telefon/fax: 0252 2 20 58
Cod fiscal: 1007601011445
Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDBE222500B11899AB

15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Mircea MOLDOVAN

Contrasemnează:

Ion DASCAL

Vicepreședinte al raionului Drochia

Simion OJOVAN

Specialist principal al Secției juridice

Ana PASCARU

Șef – adjunct Direcție, Șef al Secției

construcții și gospodăria drumurilor

Cristina DOBREA

Specialist principal al Direcției economie,
construcții și politici investiționale

BENEFICIAR

Alexei VASILEAN





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/294 privind achiziția prin licitație deschisă

"16" iulie 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1591346186297 din 01.07.2020, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., "Magistrala Nistru" cu sediul în or. Soroca, str. Ocolirii 2B, tel. 023023037, fax. 023092940, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003607000038, reprezentată de directorul general dl Mircea Moldovan în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii, Lotul I, Lotul II**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți

Orgha

din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract pentru **Lotul I** este de **6 234 320,82 (șase milioane două sute treizeci și patru mii trei sute douăzeci lei 82 bani) inclusiv TVA** și pentru **Lotul II** este de **7 281 422,82 (șapte milioane două sute optzeci și una mii patru sute douăzeci și doi lei 82 bani) inclusiv TVA**.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

22/02/2020

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău - Biroul de Stat

c/TVA 050330

Director general interimar
Veaceslav POȘTOP



"Antreprenor general"

S.R.L. "Magistrala Nistru"

MD 3001, or. Soroca, str. Ocolirii 2B
c/f 1003607000038

c/ IBAN MD52AG000000002251833791

B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A.,
Sucursala Soroca, c/b AGRNMD2X771
c/TVA 8400353

Director general
Mircea MOLDOVAN



29 dec



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.27

privind achiziția prin Licitatie publică cu publicarea anunțului în BAP

25.06.2020

or.Ocnița (r-l Ocnița)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie publică cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1589433233228 din data 05.06.2020 , între Instituție publică Consiliul Raional Ocnița 1007601009738 , cu sediul în MD-7101 Moldova, Republic of or.Ocnița (r-l Ocnița) str. str. Independentei, 51 , telefon: 0271 21504 , fax: 0271 21504 , e-mail: iuriicataraga@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23184 din 21.08.2016 , reprezentat prin Plopa Iurie Președinte al Raionului , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată „Magistrala Nistru” 1003607000038 , cu sediul în or. Soroca, str. Ocolirii 2b , telefon: 230 23037 , fax:230 92940 , e-mail: magistrala.nistru@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0001541 din

18.12.2004 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2010 , eliberată de camera de licențiere , prelungită până la 06.09.2020, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti , reprezentat prin Mircea Moldovan Administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. Lucrările efectuate cu asfalt bitominoși de executat în perioada lunilor mai-septembrie .

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

furnizor al Antreprenorului general;

c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 773 299,97** (un milion șapte sute șaptezeci și trei mii două sute nouăzeci și nouă lei 97 bani) (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Prin transfer în termen de 15 zile după prezentarea facturii fiscale

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, la îndeplinirea integrală a lucrărilor pe fiecare sector a obiectului, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 25.06.2020 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.


15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Consiliul Raional Ocnița	"ANTREPRENOR": SRL „Magistrala Nistru”
Adresa: Moldova, Republic of MD-7101 or. Ocnița (r-l Ocnița) str. Independentei, 51 Tel./Fax: 0271 21504 / 0271 21504 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor TR-Nord Adresa Băncii: or. Bălți, str. Ș. cel Mare, 14/1 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226636 Cod IBAN: MD73TRPDAY222500F11609AB Cod fiscal: 1007601009738	Adresa: Moldova, Republic or. Soroca, str. Ocolirii 2b Tel./Fax: 230 23037 / 230 92940 Denumirea Băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA Adresa Băncii: mun Soroca, filiala Soroca Cod Bancar: AGRN MD 2X771 Cont de decontare: MD52 AG 00000000 2251833791 Cod IBAN: MD52 AG 00000000 2251833791 Cod fiscal: 1003607000038

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR": Consiliul Raional Ocnița

Președinte al raionului
Iurie Plopa



"ANTREPRENOR": SRL „Magistrala Nistru”

Administrator
Mircea Moldovan



Înregistrat: nr. _____
Trezoreria _____
" " _____ 200 _____

specificația de preț a obiectului de achiziție

numărul licitației: Licitație publică cu publicarea anunțului în BAP 10061334 din 05.06.2020	Data: 25.06.2020
numirea licitației: Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/ executare
2		3	4	5	6	7		9
	Lotul 1							
200000-9	Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci	unitate	1	1477749,98	1773299,97	1477749,98	1773299,97	01.10.2019
				1477749,98	1773299,97	1477749,98	1773299,97	
	Total Lot 1			1477749,98	1773299,97	1477749,98	1773299,97	
	TOTAL			1477749,98	1773299,97	1477749,98	1773299,97	

“BENEFICIAR”: Consiliul Raional Ocnița

Președinte al raionului
Plopa

“ANTREPRENOR”: SRL „Magistrala Nistru”

Administrator
Mircea Moldovan





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.37

privind achiziția prin Licitatie publică cu publicarea anunțului în BAP

10.09.2020

or.Ocnița (r-l Ocnița)

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1597389960628 din data 01.09.2020 , între Instituție publică Consiliul Raional Ocnița 1007601009738 , cu sediul în MD-7101 Moldova, Republic of or.Ocnița (r-l Ocnița) str. str. Independentei, 51 , telefon: 0271 21504 , fax: 0271 21504 , e-mail: iuriicataraga@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 23184 din 21.08.2016 , reprezentat prin Plopa Iurie Președinte al Raionului , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată „Magistrala Nistru” 1003607000038 , cu sediul în or. Soroca, str. Ocolirii 2b , telefon: 230 23037 , fax:230 92940 , e-mail: magistrala.nistru@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0001541 din 18.12.2004 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2010 , eliberată de camera de licențiere , prelungită până la 06.09.2020, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti , reprezentat prin Mircea Moldovan Administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 45 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. Lucrările efectuate cu asfalt bituminos de executat în perioada lunilor mai-septembrie .

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

furnizor al Antreprenorului general;

c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **691439,82** (șase sute nouăzeci și unu mii patru sute treizeci și nouă lei 82 bani) (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: Prin transfer în termen de 15 zile după prezentarea facturii fiscale

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, la îndeplinirea integrală a lucrărilor pe fiecare sector a obiectului, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 10.09.2020 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Consiliul Raional Ocnîța	"ANTREPRENOR": SRL „Magistrala Nistru”
Adresa: Moldova, Republic of MD-7101 or. Ocnîța (r-l Ocnîța) str. Independentei, 51 Tel./Fax: 0271 21504 / 0271 21504 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor TR-Nord Adresa Băncii: or. Bălți, str. Ș. cel Mare, 14/1 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: 226636 Cod IBAN: MD73TRPDAY222500F11609AB Cod fiscal: 1007601009738	Adresa: Moldova, Republic or. Soroca, str. Ocolirii 2b Tel./Fax: 230 23037 / 230 92940 Denumirea Băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA Adresa Băncii: mun Soroca, filiala Soroca Cod Bancar: AGRN MD 2X771 Cont de decontare: MD52 AG 00000000 2251833791 Cod IBAN: MD52 AG 00000000 2251833791 Cod fiscal: 1003607000038

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR": Consiliul Raional Ocnîța



Președintele raionului
Iurie Popa

"ANTREPRENOR": SRL „Magistrala Nistru”

Administrator
Mircea Moldovan



Înregistrat: nr. _____
Trezoreria _____
" " _____ 200__


Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitatie publică cu publicarea anunțului in BAP din 01.09.2020	ocds-b3wdp1-MD-1597389960628	Data: 01.09.2020
Denumirea COP: Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci		

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/ executare
1	2	3	4	5	6	7	9	
	Lotul 1							
45200000-9	Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci	unitate	1	576199,85	691439,82	576199,85	691439,82	31.10.2020
	Total Lot 1			576199,85	691439,82	576199,85	691439,82	
	TOTAL			576199,85	691439,82	576199,85	691439,82	


 Președintele Consiliului Raional Ocnita
 Iurie Popa

“ANTREPRENOR”: SRL „Magistrala Nistru”
 Administrator
 Mircea Moldovan






ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/284 privind achiziția prin licitație deschisă

"14" iulie 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591251087247** din **26.06.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., **Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **80 716 654,30 (optzeci milioane șapte sute șaisprezece mii șase sute cincizeci și patru lei, 30 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.
- 3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
 - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.

- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona

respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi

necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru

achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



„Antreprenor general”

S.R.L. „Dromas-Cons”

MD-2069 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100

B.C. ”Mobiasbanca-OTP Group” S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN





ACHIZIȚII PUBLICE

licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591251087247

Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul nr. 06-14/284 din 14.07.2020.

“ 31 ” decembrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și S.R.L.”Dromas-Cons”, în persoana directorului general dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării prevederilor contractului nr. 06-14/284 din 14.07.2020 în vederea executării lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale conform deciziei nr. 71 din 31.12.2020 a ședinței grupului de lucru pentru achiziții. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

Punctul III. “Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 325 142,40 (trei sute douăzeci și cinci mii una sută patruzeci și doi lei, 40 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”

S.R.L.”Dromas-Cons”

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

MD 2069 mun.Chișinău,
Or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100
B.C. “Mobiasbanca-OTP Group” S.A.
c/b MOBBMD22
Cod TVA 604780

Director general interimar
Veaceslav POTOP

Director general
Piotr DACIN

Antreprenor



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 87 din 04 februarie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca și Florești conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca și Florești, executate în cadrul contractului nr.06-14/284 din 14.07.2020 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” Beneficiar și S.R.L. „Dromas - Cons” Antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 01-04 februarie 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Drucec* - director tehnic, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *I.Alexa* - șef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
V.Beresteanu - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
E.Mîțu - șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca
V.Cegorean - șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Soroca
V.Moraru - director S.A. „Drumuri Soroca”
I.Zuza - S.A. „Drumuri Soroca”, sector Soroca
F.Țurcanu - S.A. „Drumuri Soroca”, sector Florești
P.Dacin - director S.R.L. „Dromas - Cons” - antreprenor
A.Iazinschi - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Soroca
S.Nastas - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Florești
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor decembrie 2020

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- Tip I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.
- Tip II: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).
- Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg - II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm
- Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg- II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm(50% din material decapat).
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – ~~82 382 833,66 lei~~
~~inclusiv LCM – 80 621 005,20 lei~~, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective. ~~80 946 147,60 lei~~

6. Prezentul proces - verbal, conținând 6 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi Joi
04 februarie 2021 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz două file, inclusiv localitățile:

s. Hristici, com. Nemereuca sat. Cerlina

Comisia:

Președinte I. Druceș

Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

E. Mișu

V. Cegorean

V. Moraru

I. Zuza

F. Turcanu

P. Dacin

S. Vasile

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Soroca

Primar mun. Soroca – L. Pilipețchi

Primar s. Racovăț – O. Fedco

Primar s. Bădiceni – M. Avornicița

Primar s. Redi-Cereșnovăț – L. Gîncu

Primar s. Baxani – Gh. Pereteatcu

Primar s. Regina Maria – O. Năstas

Primar s. Bulboci – F. Crîșmari

Primar s. Rublenița – V. Muntean

Primar s. Cainarii Vechi – V. Terentii

Primar s. Rudi – Iu. Marian

Primar s. Cosăuți – M. Gîrlan

Primar s. Schineni – S. Leșan

Primar s. Cremenciug – A. Pînzaru

Primar s. Stoicani inclusiv
s. Soloneț – S. Bric

Primar s. Darcăuți inclusiv s. Malcăuți
– O. Rozimovschi

Primar s. Șeptelici – V. Andruța

Primar s. Dubna – V. Prutean

Primar s. Șolcani – B. Rotaru

Primar s. Egoreni – V. Mutruc

Primar s. Tătărauca Veche – L. Guțu

Primar com. Holoșnița, s. Curesnița Veche – R. Pădure

Primar s. Trifăuți – Gh. Todirean

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Soroca

Primar s.Hristici – I.Alexei

Primar s.Vasilcău – F.Golub

Primar s.Iarova – I.Chiriac

Primar com.Vărăncău, s.Slobozia Cremene
– P.Botoc

Primar s.Nimereuca inclusiv
s.Cerlina – A.Zubco

Primar s.Vădeni – V.Dobrovolschi

Primar s.Oclanda – L.Vacari

Primar s.Visoca – G.Pleşca

Primar s.Ocolina inclusiv
s.Țepilovca – V.Ceban

Primar s.Volovița inclusiv
s.Alexandru cel Bun – Ia.Colesnic

Primar s.Parcani inclusiv
s.Voloave – S.Cetulean

Primar s.Zastînca – P.Covalciuc

Primar s.Pîrlița inclusiv
s.Vanțina – Gh.Buzurniuc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Florești

Primar or.Florești – Iu.Gangan

Primar com.Japca – L.Pascari

Primar or.Ghindești – M.Bulat

Primar s.Lunga – G.Burduja

Primar or.Mărculești – I.Vîrlan

Primar s.Mărculești – S.Chetraru

Primar s.Alexeevca inclusiv
s.Chirilovca,
s.Dumitrești – P.Mîța

Primar s.Napadovca – S.Ceban

Primar s.Băhrinești – V.Covalenco

Primar s.Nicolaevca – S.Malai

Primar s.Cășunca – R.Bilenco

Primar s.Prajila – P.Cobîlas

Primar s.Cernița – Iu.Cheles

Primar s.Prodănești – S.Hineu

Primar s.Ciripcău – M.Donos

Primar s.Puțințești – Gh.Chefu

Primar com.Cihulești – I.Burca

Primar s.Rădulenii Vechi – Iu.Radu

Primar s.Coșernița – S.Ghilețchi

Primar s.Roșietici inclusiv
s.Roșietici Vechi,
s.Cenușa – P.Odajiu

Primar com.Cuhureștii de Jos inclusiv
s.Tipordei – Iu.Potorac

Primar s.Sănătăuca – T.Chibitoc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Florești

Primar s. Cuhureștii de Sus – V. Lupan

Primar s. Sevirova inclusiv
s. Ivanovca – E. Moroșan

Primar s. Cunicoia – T. Corniencova

Primar s. Ștefănești – L. Zdraguș

Primar s. Domulgeni – V. Tiltu

Primar s. Temeleuți – S. Terteia

Primar s. Frumusea – V. Boicu

Primar s. Țîrgul Vertiujeni – F. Franțuz

Primar com. Ghindești, s. Ghindeștii Noi
– Gh. Falcă

Primar s. Trifănești – V. Boico

Primar s. Gura Camencii, s. Bobulești
– V. Țuguș

Primar s. Vărvăreuca – O. Zabica

Primar com. Gura Căinarului – A. Cojocaru

Primar s. Văseăuți – O. Podborschi

Primar s. Ilcioanca – V. Tataciuc

Primar s. Vertiujeni – I. Istratuc

Primar s. Izvoare,
s. Scăieni – V. Zgavordei

Primar s. Zălucent – S. Prisacari

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 87 din 04 februarie 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Soroca, s. Hristici

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<u>L. 95 G35 - Drum de acces spre satul Hristici km 7+040 ÷ 7+370 (Tip W)</u> <u>(Ambrăcăminte rețineră din beton asfaltic)</u>
	<u>1. Pe partea carosabilă au apărut mici fisuri</u> <u>și debredări structurale ale betonului</u> <u>asfaltic la suprafață km 7+20 pe partea</u> <u>stângă și 7+220 și 7+260 pe partea dreaptă.</u>

Președinte I.Druce



Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

P.Dacin



A.Iazinschi

E.Motcu

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 87 din 04 februarie 2021**SITUAȚIA**neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Soroca Comuna Nimerceanca
sat. Cezline

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Teren adiacent la Gimnaziu (91x12) Tip IV (Îmbrăcăminte entiere din Beton asfaltic)
	1. Pe partea carosabilă au apărut mici fisuri și dezgedări structurale ale betonului asfaltic la suprafață 1) P _c 0+05 ÷ P _c 0+07

Președinte I.Druce

Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

P.Dacin

A.Iazinschi

A.Zubco

Costul lucrărilor executate conform programului

(Pentru procesul-verbal de recepție)

Lucrări de întreținere periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești.

a.2020

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Dromas-Cons" Contract nr.06-14/284 din 14.07.2020	80 946 147,60
	r-l Soroca	37 046 065,20
	r-l Florești	43 900 082,40
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	1 238 476,06
	r-l Soroca	566 804,80
	r-l Florești	671 671,26
3	Întocmirea devizului ASD august 2020	198 210,00
	r-l Soroca	73 940,00
	r-l Florești	124 270,00
	TOTAL:	82 382 833,66
	r-l Soroca	37 686 810,00
	r-l Florești	44 696 023,66

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iulie 2020
decembrie 2020

Șef serviciul monitorizare proiecte



S. Petrușanco

