

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1917274

din
от 15.04.2019

1. Destinatar / Получатель

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
PROIECT GABION S.R.L.	1010600016641
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Sadoveanu M. nr.16 of.4	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existentei restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 30.04.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Sef. Serv. RI. CAN
Funcția/Dолжность



Alex. Stoica
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/M.П.

Executor: *Stefan C.*
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 15.04.2019 ora 11:39:16
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Proiect Gabion SRL
(Denumirea completă)

40698252 1010600016641
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2044 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CIOCANA 140
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Sadoveanu M., 16., of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr. bl. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale F4120
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322608860 e-mail gavrilita.v@mail.ru
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Gavrilita Vasile Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369050667

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.471.393	6.152.089
Alte venituri din activitatea operațională	020	234.332	55.286
Venituri din alte activități	030	37	226
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8.705.762	6.207.601
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	3.235.403	3.010.811
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	241.883	646.092
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	66.518	165.558
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	32.508	30.877
Alte cheltuieli	110	4.697.157	1.778.402
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.273.469	5.631.740
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	432.293	575.861
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	50.976	69.399
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	381.317	506.462

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		3.542
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	510.445	480.276
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	510.445	483.818
2.	Active circulante			
	Materiale	140	30.011	112.180
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1.630	49.179
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	534.457	1.121.150
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	9.787	1.429
	Creanțe ale bugetului	220	86	697
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	420.157	116.859
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.118.288	1.177.331
	Alte elemente de numerar	260	74.200	430.977
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.135	9.005
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	3.189.751	3.018.807
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3.700.196	3.502.625

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.571.653	2.356.653
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	506.462
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	2.577.053	2.868.515
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	871.215	584.203
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	31.710	4.799
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	220.025	45.108
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	193	
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1.123.143	634.110
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3.700.196	3.502.625

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.471.393	6.152.089
Costul vânzărilor	020	7.431.435	4.791.740
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.039.958	1.360.349
Alte venituri din activitatea operațională	040	234.332	55.286
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	629.029	806.707
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	213.005	33.293
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	432.256	575.635
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	37	226
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	432.293	575.861
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	50.976	69.399
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	381.317	506.462

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.571.653		215.000	2.356.653
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	506.462		506.462
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.571.653	506.462	215.000	2.863.115
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	2.577.053	506.462	215.000	2.868.515

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10106000166 Data înregistrării 07.05.2010 Seria MD Număr 0102541
41

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 07.05.2010, suma 5.400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% 5.400 lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune _____ 16 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 4 persoane,

2) muncitori _____ 12 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 _____ 17 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune _____ 646.092 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul I

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor* nerezidenți

Indicatori	Cod rd/ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
I	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
I	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Depozite, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	060					
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	110					

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director *[Signature]* Secretar *[Signature]*

* conform art.36 din Legea contabilității

Contabil *[Signature]* *[Signature]* Gurdlița Vasile



Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	472886
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40698252
Codul fiscal al organizației	1010600016641
IDNO organizației	1010600016641
Denumirea organizației	Proiect Gabion SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	21.03.2019 15:00:56
Data expedierii raportului	23.03.2019 15:04:35
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.

**“PROIECT GABION” SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ****Lista obiectelor executate 2012-2017**

№	Datele proiectului	Denumirea obiectelor
1.	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. A.Iulia, 85 mun. Chișinău</i>	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
2	<i>Lucrări(Complex de lucrări) de reparații interioare la Hotelul “FLOWERS” mun.Chișinău str.Anestiade,7</i>	SC”Domax-con Prim”SRL Hotelul “FLOWERS” dir.Donciu Stepan
3	<i>Lucrări de reparații interioare la Dormitorul N1 a Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești</i>	Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești director Țenu Tudor
4	<i>Lucrări de reparații a acoperișului stației de pompare a apei IMSP Spitalul rational Cimișlia</i>	IMSP Spitalul Cimișlia str,Alexandru cel Bun,135 dir.Florea MarianaTel.0241/2-21-93
5	<i>Lucrări de reparații a acoperișului la stația de alimentare N73 PETROM mun.Chișinău str.Petricani</i>	SC”LUMINTODE” SRL Dir. Mogîdea Galina
6	<i>Lucrări de reparative a fasadei Liceului theoretic P.Stefănuță r-ul Ialoveni</i>	Liceul theoretic P.Stefănuță
7.	<i>Lucrari de finisare a Garajelor din mun. Chișinău str. Pietrarilor 10 SA “Ago-Dacia”</i>	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
8	<i>Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/4 SA Ago-Dacia</i>	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
9	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. Pietrarilor 10/2 mun. Chișinău</i>	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
10	<i>Lucrari de replanificare a școlii nefuncționale în grădiniță de copii din s.Micleușeni r-ul Strășeni</i>	Consiliul Raional Strășeni
11	<i>Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1</i>	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110
12	<i>Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/3 SA Ago-Dacia</i>	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
13	<i>Lucrări de finisare a Parcării subterane din str.Pietrarilor,10/4 SA Ago-Dacia</i>	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 dir.Rușesco Mihail
14	<i>Reparația acoperișului căminului și cazangeriei LT Vătămanu or.Strășeni</i>	Aparatul președintelui rational Strășeni
15	<i>Lucrări de finisare interioare si exterioare a Casei de Locuit Blocul N3 din mun. Chișinău str. Pietrarilor</i>	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
16	<i>Lucrari de reparație a trotuarelor” din com.Micauti r-ul Straseni</i>	Primăria Micăuți Strășeni
17	<i>Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit N4 din str. Pietrarilor 10 mun. Chișinău</i>	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
18	<i>Lucrări de reparație la sala festivă” a gimnaziului din com.Micăuți r-ul Strășeni(pardosele,tavane,peretii)</i>	Primăria Micăuți Strășeni
19	<i>Lucrari de reparație interioară și exterioare a grădiniții de copii din s.Țigănești r-ul Strășeni (încălzire,iluminat,canalizare,apă,finisări,ventilare)</i>	Primăria s.Țigănești r-ul Strășeni

20	<i>Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gimnaziul din s.Micauti r-ul Straseni</i>	Aparatul președintelui raional Strășeni
21	<i>Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Ha r-ul Causeni(fasada uși ,ferestre,termoizolare,finisari toclu)</i>	Gimnaziului "Ioan Voda" Hagimus
22	<i>Lucrari de reparație a trotuarelor din fața Grădiniței com.Micauti r-ul Straseni)(pavaj,finisarea fatadei,finisar interioare)</i>	Primăria Micăuți Strășeni
23	<i>"Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la postul de transformatoare" la Tabara de odihna pentru copii "Codru"</i>	Direcția Învățământ Strășeni
24	<i>"CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE" din s.Măgdăcești r-ul Criuleni(lucrari interioare si exterioare) (încălzire,iluminat,apeduct și canalizare,finisări,utilaje,pavaje,)</i>	Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni
25	<i>Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri" la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1</i>	Direcția Învățământ Strășeni
26	<i>„Lucrari de reparatie curenta a blocului "B " la Centrul de odihna si agrement pentru tineret si copii "Divertis" din or.Straseni</i>	Direcția Învățământ Strășeni din cadrul Consiliului raional Strășeni
27	<i>Construcția si montarea unei scene pentru festivități în satul Micăuți r-ul Strășeni</i>	Primăria Micăuți Strășeni
28	<i>Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău</i>	Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău- <i>IMSP SCM de Copii nr.1</i>
29	<i>“Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chișinău</i>	INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI
30	<i>Lucrări de reparație la sala sportivă si vestiar la Liceul Teoretic "M.Eminescu" din or. Strășeni</i>	Consiliul raional Strășeni <i>Președinte Popa Mihail</i>
31	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gimnaziului din st. Decebal 3, s.Cojusna, r-nul Straseni"</i>	Direcția Învățământ Strășeni
32	<i>„Lucrări de pavare,reparația partiala a scărilor interioare si exterioare la Grădinița din s.Măgdaceșt”</i>	Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni
33	<i>Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1-2017</i>	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile <i>Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110</i>
34	<i>“Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grățiești ”</i>	G.T „Cojocarul Gheorghe Nicolae”
35	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si blocurilor sanitare la LT "Aleo Russo" din s.Cojusna r-ul Straseni"</i>	Consiliul raional Strășeni
36	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT"Zubresti" din satul Zubresti r-ul Straseni</i>	Consiliul raional Strășeni
37	<i>Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3</i>	IP USMF "Nicolae Testemitanu"
38	<i>Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alec Russo,11 mun.Chisinau</i>	IMSP SCM SfintaTreime
39	<i>Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hîncești</i>	Direcția Scolii tip Internat Carpineni
40	<i>Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau</i>	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
41	<i>Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Straseni</i>	Primaria s.Tiganesti r-ul Straseni
42	<i>"Lucrari de amenajare a teritoriului "la gradinita din satul Micauti"</i>	Primaria comunei Micauti r-ul Straseni

Data completării: 15.04.2019

Semnat:

Nume: Ion SECRIERU / _____ /

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4
 MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106
 tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.14 08.04.2014 11.05.2015	Construcția cantinei sociale și anexa Primăria s.Magdacești r.Criuleni	antreprenor	2 708 528,17	8	nr.2 din 22.01.2016
2	Nr. 56/84 28.11.2014	Construcția Pavilionului nr.2 cu 112locuri tabara CODRU s.Capriana Direcția învățământ Strășeni	antreprenor	4 703 817,18	10	nr.16 din 20.06.2016
3	Nr.10/54 11.07.2014	Eficientizarea energetică a gimnaziului "Ioan Vodă" din s.Hagimus r-ul Causeni Gimnaziul Ioan Vodă s.Hagimus	antreprenor	2 070 155,42	8	nr.67 din 22.10.2016
4	Nr.25/8 06.08.2016	Lucrări de pavare, reparația parțială a scărilor interioare la Grădinița de copii Măgdăcești	antreprenor	718 931,34	3	11.2016
5	Nr.37/16-48 03.05.2016	Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău	antreprenor	1 390 497,48 237169,26	4	nr.21 din 17.11.2016
6	Nr.48/85 04.10.2016	Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chișinău	antreprenor	2 531 667,35	10.10.2016 21.12.2016	Nr.1 din 23.12.2016
7	Nr.21G Din 18.05.2015	Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești 2016-2017	antreprenor	10870537,32	20	Nr.1 din 21.02.17 Nr.07/33 din 23.02.17
8	Nr.17/02822/01 din 16.10.2017	Schimbarea acoperisului blocude studii la LT "Alecu Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii	antreprenor	1104899,02	2	28.12.2017
9	Nr.17/02822/03 din 16.10.2017	Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare la LT "Alecu Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii	antreprenor	345469,15	2	28.12.2017
10	Nr.28/11/17 din 28.11.2017	Lucrări de amenajare a teritoriului la grădinița din s.Micăuți	antreprenor	199827,85	1	25.12.2017
11	Nr.17/03079/01 din 13.11.2017	Lucrări de reparație capitală a acoperisului LT "Zubrestii" din satul Zubrestii r-ul Strasenii	antreprenor	945372,51	2	27.12.2017

12	Nr.70 din 06.06.2017	Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3	antreprenor	2 591 866,10	4	Nr.61T din 21.10.2017
13	Nr.171 AAP 17/00354/004 din 18.04.2017	Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime" str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau	antreprenor	1773464,20 263050,57	3,5	30RT din 10.10.2017
14	Nr.60 din 10.05.2017	Lucrari de reparatie la acoperisul transformatorului la Centrul de odihna si agrement pentru copii si tineret "Divertis din or.Straseni	antreprenor	76422,58	1	20.06.2017
15	Nr.1/32 din 21.06.2017	Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Carpineni r-ul Hincesti	antreprenor	1158560,77 237926,94	3.5	Nr.1 din 20.10.17
16	Nr.45 din 09.11.2017	Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau	antreprenor	237169,26	5	Nr.21 din 17.10.2017
17	Nr.17/01786/001 din 25.07.2016	Lucrari de reparatie a salii sportive la LT "M.Eminescu" din or.Straseni		1 592 533,49	3,5	30RT din 10.10.2017
18	Nr.18 din 18.02.2017	Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Straseni	antreprenor	231388,73	1	24.03.2017

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **15.04.2019**

Semnat: _____ / _____ /

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chisinau**

OFERTANT



“PROIECT GABION” SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

Lista obiectelor executate 2012-2017

Nº	Datele proiectului	Denumirea obiectelor
1.	” Lucrări de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Căminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu 26/3”	IP USMF Nicolaie Testimițanu
2.	” Construcția Cantinei Sociale ”	Primăria s.Măgdăcești r.Criuleni
3.	” Eficiența energetică a Gimnaziului ”Ioan Vodă” din s.Hagimus r-nul Căușeni”	Gimnaziul ”Ioan Vodă” Hagimus, Căușeni

Data completării: **15.04.2019**

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU** / _____ /

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului "**Lucrările de reparație a fațadei și sistemului de încălzire a Căminului nr.16 din str.M.Sadoveanu 26/3**

2. Numărul și data contractului Nr.70 din 06 iunie 2017 și contractul nr.38 din 30.01.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP USMF "Nicolaie Testemițanu**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfnt,165**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :

antreprenor

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială contractul nr.70 2517753,24

(la data semnării contractului)

aa) inițială contractul nr.38 74112,86

b) finală 2 591 866,10

152462,71

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 90 zile-lucrătoare

b) efectiv realizată 78 zile-lucrătoare

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.61T din 21.10.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor proiect, graficul executării lucrărilor în termenele stabilite.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Termoizolare fatada, timplarii PVC, Lucrari tehnico sanitare, sistemul de încălzire Acoperis, Amenajare

Data completării

Cu stimă, "PROIECT GABION" S.R.L.

directorul Ion SECRIERU / _____

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 70/59 privind achiziția prin Licitație Publică

“06” Umare 2017

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 17/01239 din data 16.05.2017, între Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, telefon: 022 20-52-65, fax: 022 20-52-65, e-mail: achizitii@usmf.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, reprezentată prin Ion Ababii, Rector, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL ”Proiect Gabion”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 12/1, of. 106, telefon: 022 60-88-60, fax: 022 60-60-77, e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1010600016641 din “07” mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 042606 din “03” iunie 2015, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentată prin Ion Secieru, director, în calitate, de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. Mihai Sadoveanu 26/3, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 68 zile lucrătoare de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. Mihai Sadoveanu 26/3, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 517 753,24 (două milioane cinci sute șaptesprezece mii șapte sute cincizeci și trei,24) lei, inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate: 10% prealabil, 90% în baza proceselor-verbale și a facturilor fiscale în termen de 20 zile.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "06" ianuarie 2017.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

Tel./Fax: 022 20-52-65; 20-52-67

Denumirea BC "MoldovaAgroindbank" SA,

Băncii: fil. Chișinău Centru

Adresa Băncii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 182

Cod Bancar: AGRNMD2X723

Cont de decontare: MD19AG000000022512015544

Cod fiscal: 1007600000794

"ANTREPRENOR":

SRL "Proiect Gabion"

Adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 12/1, of. 106

Tel./Fax: 022 60-60-77; 60-88-60

Denumirea BC "Energbank" SA

Băncii:

Adresa Băncii: str. Tighina 23/3

Cod Bancar: ENEGMD22

Cont de decontare: MD90EN000000222435308845

Cod fiscal: 1010600016641

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

IP USMF "Nicolae Testemițanu"

Ion Ababii


L.Ș.



"ANTREPRENOR":

SRL "Proiect Gabion"

Ion Secieru





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT 38/3

de achiziționare a lucrărilor de valoare mică

“ 30 ” ianuarie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică de valoare mică, în corespundere cu planul de achiziții aprobat pentru an.2018

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 165, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1007600000794 din 31.01.2007, fax 20-52-65, reprezentată prin **Ion Ababii**, Rector, care acționează în baza Cartei Universitare, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și

„Proiect Gabion” S.R.L, reprezentată prin Director, **Ion Secrieru**, care activează în baza statutului, denumit în continuare Antreprenor,.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparașia acoperișurilor intrărilor Căm. 16 din str. M.Sadoveanu 16/3, Cod CPV: _____, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 (nouăzeci) zile din momentul semnării contractului.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 74112,86 (șaptezeci și patru mii una sută doisprezece,86 lei MD). Achitarea lucrărilor se va efectua 100% în baza procesului verbal de recepție și a facturii fiscale în termen de 20 zile.
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

“ BENEFICIAR ”:

IP USMF “Nicolae Testemițanu”

c/f 1007600000794

c/d MD19AG000000022512015544

BC “MoldovaAgroindbank” SA

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

tel: 20-52-65

Ion Ababii

L.Ș.



“ ANTREPRENOR ”:

SC “Proiect Gabion” SRL

c/f1010600016641

cod bancar: ENEGMD22

BC Energ Bank” SA

c/d:MD90EN000000222435308845

Ion Secieru



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 61-T din 26.10.2017

privind „**Lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**” executate la Căminul nr. 16 în cadrul contractului nr. 70 din 06.06.2017 încheiat între IP USMF „Nicolae Testemițanu” și „Proiect Gabion” SRL pentru „**Lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24-25. 10. 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Marcel Abraș, prorector pentru educație și probleme sociale,

Membrii comisiei:

Valentina Șpac, șef Departament Administrarea Patrimoniului,
Svetlana Lupașco, șef Departament Economie, Buget și Finanțe,
Rodica Harabagiu, șef-adjunct Departament Evidență și Gestiune Contabilă,
Ion Șișianu, șef Secție construcții capitale și reparații curente,
Victor Șchiopu, director Campusul studentesc,
Valentin Babin, șef Secție de asistență tehnică,
Victor Covalciuc, tehnician Secția de asistență tehnică,
Sergiu Panțîri, intendent căminul nr. 16.

2. Au mai participat la recepție:

Ion Secrieru – director „Proiect Găbion” SRL.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă este prezentată complet;
- 2) toate lucrările de reparație au fost executate;
- 3) obiecțiile comisiei de recepție – nu sunt.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea „**Lucrărilor de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3**” să fie admisă.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea tuturor lucrărilor de reparație.

Lipsa obiecțiilor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările au fost executate la imobilului cu numărul cadastral – 0100312237.01, adresa poștală – str. M. Sadoveanu, 26/3, destinația – locativă.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 26.10. 2017 la sediul beneficiarului în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Marcel Abraș

Membrii comisiei:

Valentina Șpac

Svetlana Lupașco

Rodica Harabagiu

Ion Șișianu

Victor Șchiopu


Valentin Babin

Victor Covalciuc

Sergiu Panțîri

Specialiști:

Ion Secieru

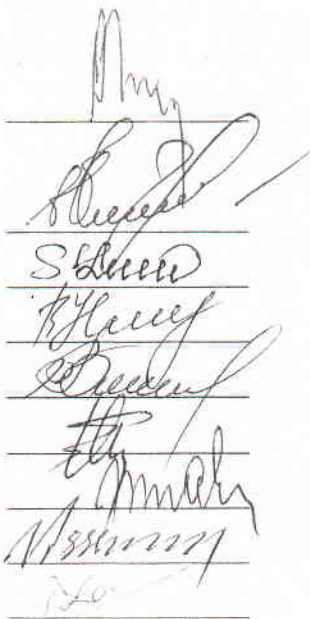

8. „Lucrările de reparație a fațadei și sistemii de încălzire a Căminului nr. 16 din str. M. Sadoveanu, 26/3” sînt:

TRANSMISE:

„Proiect Gabion” SRL



2017

(semnătura)

PRIMITE:

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”



2017

(semnătura)

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 80-T din 14.09.2018

privind „**Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16**” executate la **Căminul nr.16** în cadrul contractului nr. 38 din 30.01.2018 încheiat între IP USMF „Nicolae Testemițanu” și „Proiect Gabion” SRL pentru „**Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16**”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11-13.09 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Victoria Cravet, prorector pentru activitate financiară și administrativă,

Membrii comisiei:

Valentina Șpac, șef Departament Administrarea Patrimoniului,
Svetlana Lupașco, șef Departament Economie, Buget și Finanțe,
Rodica Harabagiu, șef-adjunct Departament Evidență și Gestiune Contabilă,
Ion Șișianu, șef Secție construcții capitale și reparații curente,
Victor Șișchiopu, director Campusul studentesc,
Serghei Stegarescu, Director-adjunct Campusul studentesc,
Sergiu Panțîri, intendent Căminul nr. 16.

2. Au mai participat la recepție:

Ion Secrieru – director „Proiect Gabion” SRL.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația scrisă este prezentată complet;
- 2) toate lucrările de amenajare și reparație au fost executate;
- 3) obiecțiile comisiei de recepție – nu sunt.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea „**Lucrărilor de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16**” să fie admisă.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea tuturor lucrărilor de reparație.

Lipsa obiecțiilor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările au fost executate la imobilului cu numărul cadastral – 0100312237.01, adresa poștală – str. M. Sadoveanu, 26/3, destinația – locativă.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 14.09 2018 la sediul beneficiarului în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Victoria Craveț

Membrii comisiei:

Valentina Șpac

Svetlana Lupașco

Rodica Harabagiu

Ion Șișianu


Victor Șchiopu

Serghei Stegarescu

Sergiu Panțiri

Specialiști:

Ion Secieru

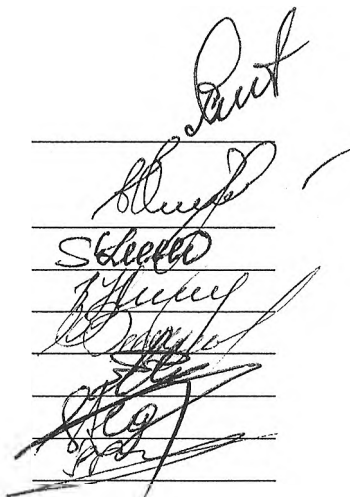



8. „Lucrările de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor și intrărilor Căminului nr. 16 ” sînt:

TRANSMISE:

PRIMITE:

„Proiect Gabion” SRL

IP Universitatea de Stat de Medicină
și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

” ” 2018

” ” 2018


_____ (semnătura)


_____ (semnătura)



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL
c/f 1010600016641
MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4
MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106
tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60
e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului "**CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE**"
2. Numărul și data contractului **Nr.14 din 8 aprilie 2014**(Construcția cantinei sociale) și contractul **nr.46/21 din 11 mai 2015** (Construcția Anexei Cantinei sociale) și Acordul adițional nr.47 din 11 noiembrie 2015 la contractul nr 46/21
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Măgdăcești r-ul Crîuleni**
4. Adresa beneficiarului **s.Măgdăcești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr.14 (la data semnării contractului)	1 420 900,45	125 743,40
aa) Anexa contractul nr.46/21	707 030,59	62 569,08
aaa) Acord adițional nr.47	212 012,75	18 762,19
b) finală (la data finalizării contractului)	2 339 943,79	207 074,67

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 11 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 22.01.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise -*Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat in terminile stabilite*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

(*Reparatii interioare,exterioare,amenajare teritoriului .Lucrări tehnico sanitare,Lucrări electrice,Încălzire și ventilare,Utilaj,Rețele electice,sanitare exterioare*)

Data completării


Cu stimă, "**PROIECT GABION**" S.R.L.

directorul **Ion SECRIERU** / _____ /

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achiziția prin Licitație Publică

"8" aprilie 2014

s. Magdacesti
(municipiul, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 565 din data 27 aprilie 2014, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)
s. Magdacesti

(localitatea)

str. M. Eminescu, telefon: 0248-34-236, fax: 0248-34-236,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din "___" _____ 20___, reprezentat prin Cojocaru Liuba primar,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. Proiect Gabion,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisinau,

(localitatea)

str. M. Sadoveanu, telefon: 022-60-60-77, fax: _____,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0102541

din "07" mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606

din "13" august 2013, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de ___ ani, pentru genurile de activitate construcții clădiri,

reprezentat prin Ion Secieru director, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare a cantinei sociale (descrierea succintă),

Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție (distincte fizic și funcțional).

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1420900.45 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor șame datorate Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majora sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respecta prevederilor legale.
- 13.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrișoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă,
 - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în și limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acest vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract, data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plății integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Primăria s. Magdacești

Adresa: s. Magdacești

Tel./Fax: 0248-34-236

Denumirea Băncii: Min. Fin. Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: Criuleni

Cod Bancar: 226629

Cont de decontare: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601009934

" ANTREPRENOR": S.R.L. Proiect Gabion

Adresa: Or. Chisinau

Tel./Fax: 022-60-60-77

Denumirea Băncii: Energbank

Adresa Băncii: Chisinau

Cod Bancar: 222435308

Cont de decontare: ENEGMD22

Cod fiscal: 1010600016641/0404155

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

" ANTREPRENOR":



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



ACORD ADITIONAL Nr.15

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "14" iulie 2014, în s.Magdacesti, între Primăria s.Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui Ion Secieru, în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-3351/14 din "22" mai 2014

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții AAP s.Magdacesti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.10 din "14" iulie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2 al Contractului de antrepriză nr.14 din 8 aprilie 2014 se modifică obiectul contractului care este: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare și cantinei sociale care se va citi în denumirea nouă: CONSTRUCTIA CANTINEI SOCIALE.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice


" OPERATOR ECONOMIC "

" AUTORITATE CONTRACTANTA "





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.16

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "9" septembrie 2014, în s.Magdacești,
(localitatea)
între Primăria s.Magdacești, în persoana dlui Cojocaru Lăduș
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)
și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui Ion Secieru
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)
în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract),
înregistrat de către AAP cu Nr. 3351/14 din "22" mai 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei
s.Magdacești, Cod CPV: 45215200-9, Nr.2 din "9" septembrie 2014

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:


1. Majorarea sumei contractului cu suma de 368584.38 lei în baza devizului de
cheltuieli Nr.2LP 565/14

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC "



" AUTORITATE CONTRACTANTĂ "





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 46 / 2 / privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"11" mai 2015

s. Magdacesti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1457-op15 din 08 mai 2015 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 32/15 din 28 aprilie 2015, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în s. Magdacesti str. Mihai Eminescu __, telefon: 0248-34236, fax: 0248-34236, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. __, reprezentat prin Cojocaru Liuba-+ primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. PROIECT GABION, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisnau, str. M. Sadoveanu, telefon: 022606077, fax: 022606077, e-mail: proiectgabion@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. __ MD 0102541 din "07 mai 2010 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606 din "03 iunie 2010 eliberată de pe un termen de ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri reprezentat prin Ion Secrieru - director, în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a anexei la Cantina socială (descrierea succintă), Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului și de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar, în ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de...

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 707030.59 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărui s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13 din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și unelaje, devizete-offertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primaria Magdacesti
Adresa: Rnul Criuleni s. Magdacesti
Tel./Fax: 0248-34236
Denumirea
Băncii: Min. Fin Trezoreria de Stat
Adresa
Băncii: Criuleni
Cod
Bancar: 226629
Cont de
decontare: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009934
230100000002034


“ ANTREPRENOR ”: S.R.L. PROIECT
GABION
Adresa: Chisinau
Tel./Fax: 022-606077
Denumirea
Băncii: Energbank
Adresa
Băncii: Chisinau
Cod
Bancar: 222435308
Cont de
decontare: FNEGMD22
Cod fiscal: 1010600016641

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:





ACHIZITIILE PUBLICE



ACORD ADITIONAL Nr.47

la contractul Nr.46 din "11" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "04" noiembrie 2015, în s. Magdăcesti, între Primăria s. Magdăcesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.A. "Proiect Gabion", în persoana dlui [redacted] în scopul modificării Contractului Nr. 46 din "11" mai 2015 (numit în continuare Contract) înregistrat de către AAP cu Nr.201509132 din "11" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al lucrării de construcție a anexei la cantina socială Primărie s. Magdăcesti, Cod CPV 45215200-9, din "03" noiembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
1. Majorarea contractului inițial cu suma de 212012,75 lei în baza devizului de execuție lucrări adaugatoare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC "

" AUTORITATE CONTRACTANT "



[Handwritten signature]



Investitor
APL sat. Măgd

REGISTRAR
nr. 203/106 din 31/01/16/338-9
nr. cont. 12122220201303
Comisia de recepție
Registrator

Anexa Nr. 2
Regulamentului de recepție
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din "22" 01 2016

Obiectul „„Cantina sodala (parter) ” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni este executat de APL sat. Măgdăcești.

I. Lucrările au fost executate în baza autorizației de schimbare-ajustamentului nr. din liberată de către primăria sat. Măgdăcești.

Comisia de recepție finală a lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul ianuarie 2016 fiind formată din:

- Cojocaru Liuba - primarul sat. Măgdăcești
- Solotchi Feodosie - specialist în reglementarea regimului funciar
- Strulea Gheorghe - arhitect șef r-nul Criuleni
- Gherman Mircea - centru de sănătate publică r-nul Criuleni
- Rusu Dumitru - inspectia teritoriala ecologica Criuleni
- Manoli Ștefan - unitatea de pompieri și salvatori Criuleni
- Tverdohleb Mihail - biroul de proiectari SRL "SimrProiect"
- Secieru Ion - antreprenorul general "Proiect Gabion" SRL

2. Au mai participat la recepție -

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de " _____ " _____ 2016
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și întreținere a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de " _____ " _____ până în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni.

7) valoarea obiectului este de _____ lei conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepție
construcția și de permis exploatarea.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor
de construcție-montaj și comportarea lor corespunzător în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de recepționat final de
recepționat lucrările de construcții Obiectul cu numărul cadastral 31292202013 adresă:
poștală sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni destinația - socială, compus din următoarele
construcții: cu numărul de etaje parter, Construcția de bază Cămină socială cu
suprafața - 416.4m.p. conform certificat din 23.11.2015 privind parametrii de bază a
construcției pentru darea în exploatare bonului imobil anexat la prezentul proces -
verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ fișe și _____ anexe numerotate, cu _____
total de _____ fișe, a fost încheiat astăzi _____ la _____
_____ exemplare.

Comisia de recepție

Cojocaru Liub

Solotehi Feodosie

Strulea Gheorghe

Gherman Mireea

Rusu Dumitru


Manoli Ștefan

Tverdohleb Mihail

Secieru Ion

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea „Cămină socială (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni Lucrările
de construcție — montaj sunt executate în volumul prevăzut de documentația de
proiect.




(semnătura)


Inspector de Stat în Construcții

(funcția, numele)

„ 08 ” 02 2015



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CRIULENI
PRIMĂRIA MĂGDĂCEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ МЭГДЭЧЕШТЬ

MD -4829 , s. Măgdăcești str., M.Eminescu

MD-4829, с. Мэгдэчешть, ул. М. Еминеску

tel. 24834236, fax 24834236

тел. 24834236, факс 24834236

№.20 05.02.2016

Prin prezenta,Primaria s.Magdacesti confirma faptul ca Firma S.R.L.
“Proiect Gabion ” c/f 1010600016641 a efectuat lucrari de constructie a Cantinei
Sociale din s.Magdăcești.

Clauzele contractuale s-au respectat cu strictete.Lucrarile sau efectuat calitativ,
fapt demonstrat in timp.

Recomandam autoritatilor contractate , cointeresate in reparatia (constructia)
imobililor sa selcteze acest agent economic pentru asigurarea calitatii lucrarilor si
indeplinirii in termenii contractuali a acestora.

Primar



Cojocarui Liuba



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

c/f 1010600016641
MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4
MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106
tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60
e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ*)

1. Denumirea și obiectul contractului *Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Hagimus r-ul Causeni*
2. Numărul și data contractului **Nr.10/54 din 11 iulie 2014 și Acordul adițional nr.07 din 10.09.2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziului Ioan Voda Hagimus Causeni**
4. Adresa beneficiarului **s.Hagimus str.M.Eminescu,9**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**
antreprenor asociat
subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr.10/54 (la data semnării contractului)	1 592 443,70	140924,22
aa) Acord adițional nr.07	477711,72	42275,38
b) finală (la data finalizării contractului)	2 070 155,42	183 199,60

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **8 luni**

b) efectiv realizată **8 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 27.10.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor, conform proiectului de execuție, neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în **(Termoiolare fațadă,împlării Uși ferestre,Țoclu finisări,finisări glafuri interioare)**

Data completării

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU** / _____

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10

"11" iulie 2014



s.Hagimus,r-l Căuşeni

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 1206/14 din 07 iulie 2014, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 50/14 din 27 iunie 2014, între ÎI "Gimnaziul Ioan Vodă" s.Hagimus, cu sediul în s.Hagimus,r-l Căuşeni RM str.M.Eminescu 09, telefon 024358236, fax 024358255, e-mail: mandeaaurel@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1012608001793 din 30.10. 2012, reprezentat prin

Mandea Aurel,directorul gimnaziului , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi „Proiect Gabion” SRL, cu sediul în mun.Chişinău str. M.Sadoveanu 12/1 of 106, telefon 022606077, fax 022608860, e-mail proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat. cu nr. 1010600016641 din 07.05.2010 , autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de licenţiere, pe un termen de 5ani, pentru genurile de activitate:Construcţiunile de clădiri,instalaţii şi reţele tehnico-edilitare,reconstrucţiuni, reprezentat prin Secieru Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările "Eficientizarea energetică a Gimnaziului "Ioan Vodă" din s.Hagimus,r-l Căuşeni"/schimbarea timplăriei,termoizolarea pereţilor/, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

adresa poștală
MD 4319 s.Hagimus,r-l Căușeni
str.M.Eminescu 9
tel.069266255

cont de decontare/trezoreria
Nr. 220524303736802

banca
Trexoreria Teritorială Căușeni
denumirea

adresa poștală a băncii

cod

Nr. TREZMD2X

cod fiscal 1012608001793

(semnătura autorizată)

L.Ș.

act. 243.03



ANTREPRENOR-

adresa poștală
MD 2044 mun.Chișinău.
str.M.Sadoveanu,12/1 of.106
tel 068709490

cont de decontare
Nr. 222435308/0404155

banca
BC Energbank SA

denumirea
adresa poștală a băncii

cod

Nr. ENEGMD22

cod fiscal 1010600016641


(semnătura autorizată)

L.Ș.





ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr. 07

la contractul Nr.10 din "11" iulie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "10" septembrie 2015, în s.Hagimus,r.Căușeni, între ÎI „Gimnaziul „Ioan Vodă” s.Hagimus,r.Căușeni”, în persoana dlui Manda Aurel și „Proiect Gabion” SRL, în persoana dlui Secieru Ion ,în scopul modificării Contractului Nr. 10 din "11" iulie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-5529/14 din "11" august 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al obiectului „Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, rl Căușeni”

, Cod CPV: 45453000-7, Nr.03 din "18" noiembrie 2014.


Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Majorarea cheltuielilor la Contractului de Antrepriză nr.10 din 11 iulie 2014 în sumă de 477711,72 lei.

2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



Anexa 12: Proces-verbal privind finalizarea lucrărilor

Fondul pentru Eficiență Energetică

PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Data: 27 octombrie 2016

Acord de finanțare nr.: 67 din 22 septembrie 2014

Denumirea agentului economic: SRL „ALUSAR-PLAST”

Tipul contractului de antrepriză: Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (Schimbarea ferestrelor)

Data inițierii lucrărilor: 29 octombrie 2013

Denumirea agentului economic: SRL „PROIECT GABION”

Tipul contractului de antrepriză: Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (schimbarea tâmplăriei, termoizolarea pereților)

Data inițierii lucrărilor: 06 octombrie 2014


Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este „27” octombrie 2016. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani și începe pe data de „27” octombrie 2016.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în care o anumită lucrare neesențială care necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista atașată, Agentul economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Contractului și documentația de proiect.

Agenții economici vor efectua remediile, reflectate în atașament până la data de „11” noiembrie 2016.

Beneficiarul va executa lucrările reflectate în pct 1-2 din recomandări cât de curând posibil.

<u>Proiect Gabion SRL</u> Agent economic SRL „ALUSAR PLAST” nu a fost prezent Agent economic	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>27.10.2016</u> Data
<u>Gimnaziul „Ioan Vodă”</u> Beneficiar s. Hagimus	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>27.10.2016</u> Data
<u>Petru Tivăș</u> Proiectant (după caz) Responsabil tehnic	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>27.10.2016</u> Data
<u>Ion Schimbător</u> Consultant tehnic	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>27.10.2016</u> Data
<u>Suzana Nicolae</u> Expert proiect Fond	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>27.10.2016</u> Data
<u>Director executiv Fond</u>	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>27.10.2016</u> Data



(Autorizate prin ștampila tuturor entităților responsabile)

Anexa 13: Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări

LISTA LUCRĂRILOR CARE NECESITĂ REMEDIERI SAU CORECTĂRI

Data: 27 octombrie 2016

Contract de antrepriză nr.: 11 din „15” octombrie 2013, înregistrat la Trezoreria Teritorială Căușeni cu nr. 248 din 28 octombrie 2013

Tipul contractului de antrepriză: Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (Schimbarea ferestrelor)

Contract de antrepriză nr.: 10 din „11” iulie 2014, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-5529/14 din 11.08. 2014

Tipul contractului de antrepriză: Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r-nul Căușeni (schimbarea împărțirii, termoizolarea pereților)

Următoarele lucrări necesită remedieri sau corectări:

1. De executat reparația porțiunilor sistemului termoizolant la care au fost constatate desprinderi ale stratului de tencuieli decorative;
2. Fixarea corespunzătoare a scurgerilor exterioare;
3. Etanșarea rosturilor dintre scurgerile exterioare cu intradosul și ramele blocurilor de ferestre;
4. Înlăturarea peliculei de protecție de pe profilele PVC;
5. Etanșarea rosturilor de montaj din spumă poliuretanică ale ușilor;
6. Etanșarea rosturilor dintre placajul soclului și perete.

Recomandări:

1. De prevăzut montarea sistemelor de jgheaburi și burlane pentru a proteja izolația termică de umiditate;
2. De prevăzut protecția părții superioare a pilastrului din curtea clădirii și a pilaștrilor de la blocul sălii sportive.

Consultant tehnic:

Ion Ștefan
(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant Beneficiar:


Gheorghe (Gheorghe) Clăduș
(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant agent economic:

Ion Ștefan
(Semnătură, Nume, Prenume)

Reprezentant agent economic:

nu a fost prezent
(Semnătură, Nume, Prenume)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 27.10.2016

privind lucrarea de înlocuire a tîmplăriei și termoizolarea fațadei clădirii gimnaziului executată la obiectul « Eficientizarea energetică a gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, raionul Căușeni” în cadrul contractului nr.10 din 11 iulie 2014 încheiat între Gimnaziul « Ioan Vodă » și SRL « Proiect Gabion » pentru lucrările de « Eficientizare energetică a gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, raionul Căușeni”/schimbarea tîmplăriei, termoizolarea pereților/

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.10.2016-27.10.2016, fiind formată din:

1. Măndea Aurel, președinte, directorul gimnaziului ;
2. Jernovaia Iulia, membru, contabil șef a gimnaziului ;
3. Popușoi Ludmila, membru, director adjunct ;
4. Iepure Anatolie, membru, primarul satului ;
5. Plămădeală Iurie, membru, șef de gospodărie.
6. Țigaie Petru, membru, responsabil tehnic ;

3. Au mai participat la recepție:

Secieru Ion antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona lucrările executate în cadrul obiectului « Eficientizarea energetică a gimnaziului „Ioan Vodă” din s.Hagimus, raionul Căușeni” cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

1. Lucrările prevăzute de Contractul Nr.10 din 11.07.2014 au fost îndeplinite.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


Exploatarea obiectului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 2 din 27 octombrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Proiect Gabion^u S.R.L.
(Nume, Prenume)

[Signature]
(Semnatura)

Director
(Funcția)

Liviu Claudiu
(Nume, Prenume)

[Signature]
(Semnatura)

director general
(Funcția)



P. T. Iyay
(Nume, Prenume)

[Signature]
(Semnatura)

Responsabil Tehnic
(Funcția)

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. De executat reparația porțiunilor sistemului termoizolant la care au fost constatate desprinderi ale stratului de tencuieți decorative;
2. Fixarea corespunzătoare a scurgerilor exterioare;
3. Etanșarea rosturilor dintre scurgerile exterioare cu intradosul și ramele blocurilor de ferestre;
4. Înlăturarea peliculei de protecție de pe profilele PVC;
5. Etanșarea rosturilor de montaj din spumă poliuretanică ale ușilor;
6. Etanșarea rosturilor dintre placajul soclului și perete.



Proiect Gabion SRL
(Nume, Prenume)

Andrei Mandrea
(Nume, Prenume)

P. Tigău
(Nume, Prenume)

[Signature]
(Semnătura)

[Signature]
(Semnătura)

[Signature]
(Semnătura)

Director Ion Sorocan
(Funcția)

Director financiar
(Funcția)

Responsabil Tehnic
(Funcția)



REPUBLICA MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT CĂUȘENI
GIMNAZIUL „IOAN VODĂ” s. HAGIMUS

Str. M. Eminescu 9, Satul Hagimus, Raionul Căușeni, Republica Moldova, Tel/fax 24358255, mandea@urel@mail.ru

nr.35

din 04 martie 2016

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, gimnaziul „Ioan Vodă”, din s. Hagimus, r. Căușeni, reprezentată prin Aurel Manda în calitate de director, aducem la cunoștință, că compania de construcție “PROIECT GABION” SRL a efectuat lucrări la obiectul “Eficientizarea energetică a Gimnaziului „Ioan Vodă” din s. Hagimus, r. Căușeni” pe parcursul anului 2014-2015.

Pe întreaga durată contractuală, “PROIECT GABION” SRL a avut de îndeplinit conform proiectelor de execuție o serie de lucrări, remarcându-se prin calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție și obligațiile contractuale.

În timpul derulării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care să ducă la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului, nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Recomandăm “PROIECT GABION” SRL ca o companie responsabilă și aptă de a îndeplini lucrări de eficientizare energetică, izolare termică a edificiilor.



/Aurel MANDEA /



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație în Secția proctologie în cadrul IMSP SCM Sfânta Treime mun.Chișinău"**
2. Numărul și data contractului **Nr.171 AAP 17/00354; din 18 aprilie 2017 și nr.306 AAP 201712979 din 06.12.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCM Sfânta Treime**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău str.Alecu Russo,11**
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor**
 antreprenor asociat **antreprenor general**
 subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	---

a) inițială nr.171 (la data semnării contractului)	1 773 464,20	
--	---------------------	--

aa) inițială nr.306 (la data semnării contractului)	263 050,57	
---	-------------------	--

b) finală (la data finalizării contractului)	2 036 514,77	119 794,99
---	---------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **nr.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect,graficul executării executat in terminile stabilite mai bine.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lucrari finisări,împlării,Lucrări electrice,Lucrări tehnico sanitare,Ventilare si conditionare,Incalzire

completării

Semnat: Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chisinau**



HAP nr. 17/00354/009
18. sep. 17

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.171 /38 privind achiziția prin Licitatie Publică

18 aprilie 2017

or. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr.17/00354 din data 28.02.2017, între **IMSP SCM Sfînta Treime**, cu sediul în or. Chişinău, str. A. Russo 11, telefon/fax: 022-44-11-85, e-mail: scm_sf.treime@ms, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152592 din 19 decembrie 2003, reprezentat prin **director Oleg Crudu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "**PROIECT GABION**" SRL, cu sediul în or. Chişinău, MD2044, str. **M.Sadoveanu 16**, telefon /022-60-60-77; 022-60-88-60 fax: 022-60-60-77; 022-60-88-60.

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515 din data de 11.07.2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606, seria A MMII din 03 iunie 2010 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **director Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrările de reparație în Secția proctologie**” în cadrul **IMSP SCM Sfînta Treime, str. Alecu Ruşso 11, mun. Chisinau.**

Cod CPV: 45300000-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. - Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 4 (patru) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va asista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 773 464,20 lei (un milion șapte sute șaptezeci și trei mii patru sute șasezeci și patru lei 20 bani inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale - 50% în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14 aprilie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: IMSP SCM Sfânta Treime

Adresa: Str. A. Russo 11
 Tel./Fax: 022-44-11-85 *44 3047 cont*
 Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA
 Adresa Băncii: Str. A. Russo 11
 Cod Bancar: *TREI MDLP*
 IBAN: *MD62TRPCBW518430B00362AA*
 Cod fiscal: 1003600152592

“ ANTREPRENOR ”: “ PROIECT GABION ” SRL

Adresa: Str. M. Sadoveanu, 16 of. 4
 Tel./Fax: 022-60-60-77/60-88-60
 Denumirea Băncii: BC “ ENERGBANK ” SA
 Adresa Băncii: Str. Tighina, 23/3
 Cod Bancar: ENEGMD22
 IBAN: MD90EN000000222435308845
 Cod fiscal: 1010600016641

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

L.Ș.



“ ANTREPRENOR ”:

L.Ș.





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

A#P nr. 2017/2979
din 06.12.17

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.306/119

05 decembrie 2017

or. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere nr. 4 din data 30.11.2017, între **IMSP SCM Sfinta Treime**, cu sediul în or. Chişinău, str. A. Russo 11, telefon/fax: 022-44-11-85, e-mail: scm_sf.treime@ms, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152592 din 19 decembrie 2003, reprezentat prin **director Oleg Crudu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **"PROIECT GABION" SRL**, cu sediul în or. Chişinău, MD2044, str. M.Sadoveanu 16, telefon /022-60-60-77; 022-60-88-60 fax: 022-60-60-77; 022-60-88-60,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515 din data de 11.07.2016, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 042606, seria A MMII din 03 iunie 2010 eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcţii de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, reprezentat prin **director Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrările de reparaţie în Secţia proctologie**” în cadrul **IMSP SCM Sfinta Treime, str. Alecu Russol 1, mun. Chisinau.**

Cod CPV: 45300000-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 zile** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **263 050,57 lei** (două sute șasezeci și trei mii cincizeci lei 57 bani inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale - 10% avans, 90 % în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 05 decembrie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: IMSP SCM Sfânta Treime

Adresa: Str. A.Russo 11
 Tel./Fax: 022-44-11-85
 Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA
 Adresa Băncii: Str. A.Russo 11
 Cod Bancar: MOLDM02X366
 IBAN: MD21ML00000000022519664
 Cod fiscal: 1003600152592

“ ANTREPRENOR ”: “ PROIECT GABION ” SRL

Adresa: Str. M.Sadoveanu, 16 of.4
 Tel./Fax: 022-60-60-77/60-88-60
 Denumirea Băncii: BC “ ENERGBANK ” SA
 Adresa Băncii: Str. Tighina, 23/3
 Cod Bancar: ENEGMD22
 IBAN: MD90EN000000222435308845
 Cod fiscal: 1010600016641



[Handwritten signature]

16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR ”:

L.Ș. *[Handwritten signature]*




PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr / 1 / din / 30 octombrie /2017

privind lucrarea „**Lucrări de reparație în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"** executată în cadrul contractului nr.171 din 18 aprilie 2017., încheiat între IMSP SCM Sfânta Treime cu sediul în mun. Chișinău str. Alecu Russo, 11 și "PROIECT GABION" SRL cu sediul în mun. Chișinău str. M. Sadoveanu, 16 of. 4 pentru lucrările de **Reparație în secția de proctologie**

1. Lucrările au fost executate în baza „**Contractului de antrepriză nr.171 au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract.** eliberată de la cu valabilitate , până la


2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.10.17 - 30.10.17**

fiind formată din :

Anatolie FORTUNĂ  - vice director administrație președintele comisiei

Membrii Comisiei

<u>Elena TOMA</u>	- economist șef
<u>Mihail IURCU</u>	- inginer superior
<u>Mihail ERLIH</u>	- șeful secției proctologie
<u>Ion SECRIERU</u>	-directorul „PROIECT GABION” SRL



4. Constatările comisiei de recepție :

- 1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
- 2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
- 3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De receptionat lucrările în cadrul obiectului Reparația în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"** cu condiția de a executa lucrările din anexă.


6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

1. Executarea lucrărilor de reparație au fost executate conform contractului de antrepriză nr.171 din 18 aprilie 2017 cu respectarea normativelor în vigoare.


7. Comisia de recepție recomandă următoarele : **Exploatarea obiectului conform destinației**


8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file,și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi **30 octombrie 2017** în **5(cinci)** exemplare.

Comisia de recepție

Anatolie FORTUNĂ /  - vice director administrație președintele comisiei

Elena TOMA /  - economist șef

Mihail IURCU /  - inginer superior

Mihail ERLIH /  - șeful secției proctologie

Ion SECRIERU /  -directorul „PROIECT GABION” SRL



10.Lurarea „**Lucrări de reparație. in secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"**

TRANSMISĂ


PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

“_30_” _octombrie_/2017

“_30_” _octombrie_/2017



Anexa nr.1

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 30 octombrie /2017

***Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau întocmite***

E



"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Ion Secrieru

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ

Anatolie Fortuna

Anexa nr.2

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017

Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate

Lucrările au fost executate în cadrul contractului **nr.171 din 18 aprilie 2017** încheiat între **IMSP SCM Sfânta Treime cu sediul în mun. Chișinău str. Alecu Russo, 11** și **"PROIECT GABION" SRL cu sediul în mun. Chișinău str. M. Sadoveanu, 16 of.4** pentru lucrările de **reparație în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"**

Lucrările au fost executate conform contractului

Valoarea lucrărilor de construcție a obiectului este de **1 773 464,20 lei**


Valoarea lucrărilor adăugătoare este de **-266 005,40 lei**

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



Ion Secrieru

Anatolie Fortuna

Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



Ion Secrieru

Anatolie Fortuna

Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



Ion Secrieru

Anatolie Fortuna

**“PROIECT GABION” SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

Către: Aparatul președintelui raionului Strășeni

La obiectul: Cererea ofertei de preț ocds-b3wdp1-MD-1554365716996 în 09.04.2019**” Schimbarea geamurilor la gimnaziul ”Micăuți,, din s.Micăuți, r-nul Strășeni””.****DECLARAȚIE****privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari-2018**

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale lei
1.	IGP Basarabeasca	Contractul Nr.93	1 551 179,68
2.	IGP Cimișlia	Contractul Nr.94	529 174,56
3.	IGP Dondușeni	Contractul Nr.95	2 489 538,57
4.	IGP Șoldănești	Contractul Nr.96	2 129 656,17
5.	CR Strășeni Cojușna	Contractul Nr.32	2 448 822,94
6.	Aparatul Președintelui raionului Strășeni	Contractul Nr.11/10	214 714,47

Data completării: 15.04.2019

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU** /Funcția în cadrul firmei: **director**Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**

IP USMF Nicolae Testemițanu

OFERTANT



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

“PROIECT GABION” SRL

c/f 1010600016641

MD2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap.4

MD2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

E-mail: proiectgabion@mail.ru

Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1554365716996 din 15.04.2019
**”Schimbarea geamurilor la gimnaziul ”Micăuți” din s.Micăuți,
r-nul Strășeni ”.**

Lichiditatea generală / 2018

Total: active circulante (rîndul 300 cal.5-situația financiară bilanțul contabil) **3018807.00** lei **x 100%** = **476,00%**


Total: datorii circulante (rîndul 580 cal.5-situația financiară bilanțul contabil) **634110.00** lei

Data completării: **15.04.2019**

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**



PROIECT GABION
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

Nr.54 din 15.04.2019
mun.Chișinău

B.C. "ENERGBANC" S.A


CERERE

Prin prezență, compania de construcție „**PROIECT GABION**” SRL, roagă să eliberați un certificat cu soldul conturilor în lei, MD la data de 15.04.2019, pentru a fi prezentat:

DESTINATAR Agenția achizițiilor publice și DESTINAȚIA Autoritățile anunțurilor SIA "RSAP"

1. Cont curent
2. Conturi speciale 2256
3. Cont de depozit

Mulțumim anticipat.

Director /  / Ion Secieru

15.04.2019





Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB00000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 73 / 01 - 08 / 849
din « 16 » aprilie 2019

„PROIECT GABION” S.R.L.
MD-2044, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4

Prin prezenta B.C. „ENERGBANK” S.A. (codul băncii ENEGMD22), confirmă că „PROIECT GABION” S.R.L., cod fiscal 1010600016641 deține contul IBAN MD90EN000000222435308845 în MDL, USD și EUR.

Totodată, Vă informăm că soldul conturilor în MDL la data de 15.04.2019 constituie:

Nr.contului(IBAN)	Descrierea contului	Soldul
MD90EN000000222435308845	curent	502 134.21
MD85EN000000002256660845	special	38 358.95
MD23EN000000002256154845	special	78 499.82
MD40EN000000023813385845	depozit	48 900.00
MD26EN000000023823171845	depozit	106 482.81
MD13EN000000023822170845	depozit	124 476.93
MD47EN000000023822169845	depozit	26 458.73
MD34EN000000023821168845	depozit	77 558.98
MD53EN000000023814386845	depozit	6 800.00
MD79EN000000023816388845	depozit	14 000.00
MD62EN000000023819347845	depozit	27 000.00
MD58EN000000023817390845	depozit	45 350.00
MD28EN000000023811394845	depozit	7 400.00
MD76EN000000023819358845	depozit	17 000.00
MD07EN000000023810359845	depozit	19 000.00
MD70EN000000023810360845	depozit	14 000.00
MD83EN000000023811361845	depozit	13 500.00
MD97EN000000023811372845	depozit	38 500.00
MD91EN000000023818379845	depozit	44 500.00
MD57EN000000023818380845	depozit	36 000.00
MD78EN000000023817378845	depozit	9 000.00
TOTAL:		1 294 920.43

Prezentul certificat este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Șef Direcției Operațiuni Bancare



Ex: Costina Irina

Tel: (22)858-020
