

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/299**
privind achiziția prin Licitatie Publică

"17" iunie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/02284 din 14.06.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.A. "Lusmecon" cu sediul în mun. Chişinău, str. Uzinelor 205/1, MD-2023, tel. 022455554, fax. 022473922, înregistrat Registrul de Stat al persoanelor juridice sub nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul general dl Alexandru Ghilaş în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Telenesti**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

D. Popescu

- necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **59 699 044,74 (cincizeci și nouă milioane șase sute nouăzeci și nouă mii patruzeci și patru lei 74 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "24" ianie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.A. "Lusmecon"

MD 2023 mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842

c/ IBAN MD53AG000022517010131321

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

16. Semnăturile părților

Director general
Gheorghe Guznei



"Antreprenor general"
Director general
Alexandru Ghilaș





PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 5 din 29 Mai 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Telenești, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Telenești, executate în cadrul contractului nr.11-18/299 din 27.06.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 02.07.2018, nr.2 din 25.10.2018, nr.3 din 03.12.2018, nr.4 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SA. „Lusmecon” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 27 - 29 Mai 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
I.Stegărescu - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Telenești
V.Macari - director S.A. „Drumuri Orhei”
I.Zgardan - S.A. „Drumuri Orhei” sector Telenești
A.Ghilaș - director SA. „Lusmecon”
V.Morgoci - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SA. „Lusmecon”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor 1 iunie 2018 sfârșitul lucrărilor aprilie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - 57,12 mln. lei, inclusiv LCM - 55,54 mln. lei.

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - 60639410,29 lei, inclusiv LCM - 59650507,52 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *Miercuri 29 Mai* 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

I. Stegărescu

I. Zgarden

A. Ghilaș

V. Morgoci



Primar or. Telenesti, inclusiv s. Mihălașa
- V. Lelie

Primar s. Bănești, inclusiv Băneștii Vechi
- V. Popovici

Primar s. Buda - V. Drăgan

Primar s. Ciulucani - A. Cîmărașu

Primar s. Hirîșeni - I. Petica

Primar s. Leușeni - A. Pașat

Primar s. Mîndrești, inclusiv s. Codru
- V. Sochovschi

Primar s. Ordașeni - V. Moldovan

Primar s. Pîșirueni - M. Mihalcenco

Primar s. Brînzanii Noi, inclusiv Brînzanii Vechi - V. Teacă

Primar s. Bogzești - V. Ozun

Primar s. Căzănești, inclusiv Vadul - Ieca
Vadul - Ieca Nou - V. Sîrbu

Primar s. Chiștelnița - C. Ciobanu

Primar s. Chițcani Vechi, inclusiv Chițcanii Vechi
- A. Taburceanu

Primar s. Vășieni - Gh. Mărgoci

Primar s. Codărești - Golovataia

Primar s. Coroboceni - I. Bălan

Primar s. Cășla - I. Bălan

Primar s. Inești - L. Manol

Primar s. Ghiliceni, inclusiv Căpâlneni
- M. Vleju

Primar s. Negureni - G. Munteanu

Primar s. Nucăreni - M. Ombun

Primar s. Ratus, inclusiv s. Mîndrești
- T. Țurcanu

Primar s. Sărăteni - I. Țigăra

Primar s. Scorțeni - T. Verejan

Primar s. Suhuluceni, inclusiv
s. Ghermănești - M. Căp

Primar s. Sîndrești - S. Stoica

Primar s. Tîrșitești - I. Țibure

Primar s. Verejani - S. Birca

Primar s. Zgărdești - S. Roșca

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-ul Telenesti

Preşedinte *V. Cotruţă*

Membru: *Gh.Tonu*

G. Parvan


I. Stegărescu

V. Macari

I. Zgardan

A. Ghilaş

V. Morgoci



Lista cheltuielilor
Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice
amplasate teritorial în raionul Telenеști

a.2019

TOTAL

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Lusmecon" Contract nr. 11-18/299 din 27.06.18 2018	59 650 507,52 59 650 507,52
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	912 652,77 912 652,77
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	76 250,00 76 250,00
	TOTAL:	60 639 410,29

Deviz: 57,12 mln.lei
incl. LCM 55,54 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iunie 2018
aprilie 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/220 privind achiziția prin licitație deschisă

"14" iunie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1556008050583-EV-1557748508528** din **04.06.2019**, între **Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.A. „Lusmecon”** cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, tel. 022473382, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaș în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Telenești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **64 661 853,14 (șaizeci și patru milioane șase sute șaizeci și una mii opt sute cincizeci și trei lei, 14 bani) cu TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans pînă la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general" S.A. "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842

c/ IBAN MD53AG000022517010131321

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAS



Dezideriu



Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”
IDNO 1003600023559

Rep Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
internet: <http://www.asd.md>, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

06. 08 2019 Nr. 08. 04/2662

Către: **S.A. „Lusmecon”**
În atenția: Domnului Alexandru GHILAȘ, Director,
Subiect: Instrucțiuni pentru începerea lucrărilor
Referință: Contract nr. 06-14/220 din 14 iunie 2019

Lucrări de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzilor, amplasate teritorial în raionul Telenești.

Stimate Domnule Director,

În conformitate cu sub - clauza 1.1 a Contractului 06-14/220 din 14 iunie 2019, **Lucrări de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzilor, amplasate teritorial în raionul Telenești**, prin prezenta sunteți instruiți să **începeți** lucrările în cuantumul realocat, conform scrisorii MEI nr. 11-4991 din 02.08.2019 (*se anexează*).

Urmează să conlucrați cu Autoritățile Publice Locale, în vederea stabilirii de comun acord a segmentului de drum din cadrul sectorului solicitat inițial, cu executarea integrală a constructivului sistemului rutier, stabilit în caietul de sarcini, în limitele financiare conform anexei (*se anexează*).

Data de începere a lucrărilor menționate este **”06” august 2019.**

Termenul de execuție a contractului este de **4 luni**, calculat de la data începerii lucrărilor.

Director adjunct

Iurie PAȘA

Limitele
alocațiilor pentru reparația periodică a drumurilor naționale (în limitele localităților),
locale, comunale și străzi pe anul 2019

Nr. crt	Denumirea drumurilor	Localitatea	Volumul alocatiilor, (mii lei)	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5
Raionul Telenești				
1	Reparația unor străzi în localitate	or. Telenești	2 035,92	BS/MEI
2	Reparația unor străzi în localitate	s. Bănești	703,39 ✓	BS/MEI
3	Reparația unor străzi în localitate	s. Bogzești	0,00 ✓	BS/MEI
4	Reparația unor străzi în localitate	s. Brînzanii Noi	0,00 ✓	BS/MEI
5	Reparația unor străzi în localitate	s. Budăi	542,19 ✓	BS/MEI
6	Reparația unor străzi în localitate	s. Căzănești	527,47 ✓	BS/MEI
7	Reparația unor străzi în localitate	s. Chiștelnița	922,63 ✓	BS/MEI
8	Reparația unor străzi în localitate	s. Chițcanii Vechi	610,95 ✓	BS/MEI
9	Reparația unor străzi în localitate	s. Ciulucani	417,98 ✓	BS/MEI
10	Reparația unor străzi în localitate	s. Cișla	0,00	BS/MEI
11	Reparația unor străzi în localitate	s. Codrul Nou	0,00 ✓	BS/MEI
12	Reparația unor străzi în localitate	s. Coropcenii	391,70 ✓	BS/MEI
13	Reparația unor străzi în localitate	s. Crăsnășeni	314,28 ✓	BS/MEI
14	Reparația unor străzi în localitate	s. Ghiliceni	473,16 ✓	BS/MEI
15	Reparația unor străzi în localitate	s. Hirîșeni	442,25 ✓	BS/MEI
16	Reparația unor străzi în localitate	s. Inești	644,46 ✓	BS/MEI
17	Reparația unor străzi în localitate	s. Leușeni	514,18	BS/MEI
18	Reparația unor străzi în localitate	s. Mîndrești	1 101,44	BS/MEI
19	Reparația unor străzi în localitate	s. Codru, com. Mîndrești	0,00	BS/MEI
20	Reparația unor străzi în localitate	s. Negureni	777,91 ✓	BS/MEI
21	Reparația unor străzi în localitate	s. Nucăreni	0,00 ✓	BS/MEI
22	Reparația unor străzi în localitate	s. Ordășei	0,00	BS/MEI
23	Reparația unor străzi în localitate	s. Pistruieni	0,00	BS/MEI
24	Reparația unor străzi în localitate	s. Ratuș	0,00	BS/MEI
25	Reparația unor străzi în localitate	s. Sărătenii Vechi	698,76 ✓	BS/MEI
26	Reparația unor străzi în localitate	s. Scorțeni	677,39	BS/MEI
27	Reparația unor străzi în localitate	s. Suhuluceni	371,19	BS/MEI
28	Reparația unor străzi în localitate	s. Ghermănești, com. Suhuluceni	0,00 ✓	BS/MEI
29	Reparația unor străzi în localitate	s. Tîrșiței	411,92	BS/MEI
30	Reparația unor străzi în localitate	s. Țîntăreni	493,67	BS/MEI
31	Reparația unor străzi în localitate	s. Văsieni	370,61 ✓	BS/MEI
32	Reparația unor străzi în localitate	s. Verejeni	849,27 ✓	BS/MEI
33	Reparația unor străzi în localitate	s. Zgărdești	0,00 ✓	BS/MEI
Total pe raionul Telenești:		33	14 292,72	

[Signature]



PROCES - VERB
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21 din 29 ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Telenеști, conform Programului anului 2019 (zona centru)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Telenеști, executate în cadrul contractului nr. 06-14/220 din 14.06.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 23-29 ianuarie 2020 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|------------|---|---|
| a.) Președinte | V. Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | Gh. Tonu | - | consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | S. Godiac | - | consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD” |
| | V. Ciobanu | - | șef intermediar, secția construcții, arhitectură, gospodărie comună și drumuri al Consiliului Raional Telenеști |
| | V. Macari | - | director S.A. „Drumuri Orhei” |
| | I. Zgardan | - | S.A. „Drumuri Orhei” sector Telenеști |
| | A. Ghilay | - | director S.A. „Lusmecon” - antreprenor |
| | V. Morgoci | - | responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |
| | Primar | - | localitatea respectivă |

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu fără rezerve și poate fi dată în folosință

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Lusmecon”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor 1 Iunie 2019 sfârșitul lucrărilor decembrie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminții rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II 2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decupat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II 2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **16 944 119,77 lei**, inclusiv LCM - **16 604 392,56 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **19.01.2020** în 6 exemplare

Anexe: 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente lucrării de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz **0 (zero)** file, inclusiv localitățile:

Fără obiectii

Comisia:

Președinte

Membri: Gh. Tomu

I. Zgurdan

S. Godiac

A. Ghilăș - antreprenor

V. Ciobanu

V. Morgoci

V. Macari



Primar or. Telenеști - V. Lehic

Primar s. Bănești - V. Popovici

Primar s. Bogzești - V. Ozun

Primar s. Brînzanii Noi - V. Teaciuc

Primar s. Buda - V. Drăgan

Primar s. Căzănești - V. Sirbu

Primar s. Chiștelnița - C. Ciobanu

Primar s. Chișcanii Vechi

Primar s. Ciulocani - L. Corman

Primar s. Cișla - I. Bora

Primar s. Codrul Nou - I. Albu

Primar s. Coropeeni - N. Bădan

Primar s. Crănașeni - V. Cazacu

Primar s. Ghiliceni - N. Rotaru

Primar s. Hirșeni - I. Pelica

Primar s. Inești - Gh. Buncescu

Primar s. Leuseni - V. Lazarencu

Primar s. Mîndrești
Inești s. Codral - O. Ciuzun

Primar s. Nucăreni - M. Ombun

Primar s. Negureni - I. Popa

Primar s. Pistruieni - M. Mihalțenco


Primar s. Opâșeni - A. Moldovanu

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21 din 29 ianuarie 2020.
r-ul Telenești

Primar s. Sărătenii Vechi – V. Cupcea



Primar com. Suhuliceni, incluziv
s. Ghermănești – I. Stegărescu



Primar s. Tîrșitei – N. Sirbu



Primar s. Văsieni – I. Memec




Primar s. Zgărdești – S. Roșca



Primar s. Ratuș – I. Turcan



Primar s. Scorțeni – I. Turcan



Primar s. Țințăreni – D. Smol



Primar s. Verejeni – S. Popa





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/221 privind achiziția prin licitație deschisă

"14" iunie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1557748732963-EV-1557749756159 din 04.06.2019, între Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.A. "Lusmecon" cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, tel. 022473382, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaș în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **83 621 309,35 (optzeci și trei milioane șase sute douăzeci și una mii trei sute nouă lei, 35 bani) cu TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

- b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

S.A. "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1

c/f 1002600050842

c/ IBAN MD53AG000022517010131321

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.

BIC AGRNMD2X

c/TVA 7800083

Director

Alexandru GHILAS





Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”
IDNO 1003600023559

Rep Moldova, Chisinau, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
internet: <http://www.asd.md>, e-mail: serviciu@asd.md, telegram: ASD trafic

06. 08. 2019 Nr. 08-04/2661

Către: **S.A. „Lusmecon”**
În atenția: Domnului Alexandru GHILAȘ, Director,
Subiect: Instrucțiuni pentru începerea lucrărilor
Referință: Contract nr. 06-14/221 din 14 iunie 2019

Lucrări de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzilor, amplasate teritorial în raionul Orhei.

Stimate Domnule Director,

În conformitate cu sub - clauza 1.1 a Contractului 06-14/221 din 14 iunie 2019,
Lucrări de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzilor, amplasate teritorial în raionul Orhei, prin prezenta sunteți instruiți să începeți lucrările în cuantumul realocat, conform scrisorii MEI nr. 11-4991 din 02.08.2019 (*se anexează*).

Urmează să conlucrați cu Autoritățile Publice Locale, în vederea stabilirii de comun acord a segmentului de drum din cadrul sectorului solicitat inițial, cu executarea integrală a constructivului sistemului rutier, stabilit în caietul de sarcini, în limitele financiare conform anexei (*se anexează*).

Data de începere a lucrărilor menționate este **”06” august 2019.**

Termenul de execuție a contractului este de **4 luni**, calculat de la data începerii lucrărilor.

Director adjunct

Iurie PAȘA

Limitele
alocațiilor pentru reparația periodică a drumurilor naționale (în limitele localităților),
locale, comunale și străzi pe anul 2019

Nr. crt	Denumirea drumurilor	Localitatea	Volumul alocatiilor, (mii lei)	Sursa de finanțare
1	2	3	4	5
Raionul Orhei				
1	Reparația unor străzi în localitate	s. Berezlogi	391,41	BS/MEI
2	Reparația unor străzi în localitate	s. Biești	366,86	BS/MEI
3	Reparația unor străzi în localitate	s. Bolohan	423,47	BS/MEI
4	Reparația unor străzi în localitate	s. Brăviceni	560,40	BS/MEI
5	Reparația unor străzi în localitate	s. Bulăiești	404,41	BS/MEI
6	Reparația unor străzi în localitate	s. Chiperceni	614,42	BS/MEI
7	Reparația unor străzi în localitate	s. Ciocîlteni	635,50	BS/MEI
8	Reparația unor străzi în localitate	s. Clișova	312,55	BS/MEI
9	Reparația unor străzi în localitate	s. Crihana	0,00	BS/MEI
10	Reparația unor străzi în localitate	s. Cucuruzeni	461,03	BS/MEI
11	Reparația unor străzi în localitate	s. Donici	0,00	BS/MEI
12	Reparația unor străzi în localitate	s. Isacova	494,53	BS/MEI
13	Reparația unor străzi în localitate	s. Mălăiești	317,46	BS/MEI
14	Reparația unor străzi în localitate	s. Mitoc	795,53	BS/MEI
15	Reparația unor străzi în localitate	s. Morozeni	374,37	BS/MEI
16	Reparația unor străzi în localitate	s. Neculăieuca	383,33	BS/MEI
17	Reparația unor străzi în localitate	s. Peresecina	2 329,70	BS/MEI
18	Reparația unor străzi în localitate	s. Piatra	551,44	BS/MEI
19	Reparația unor străzi în localitate	s. Podgoreni	305,33	BS/MEI
20	Reparația unor străzi în localitate	s. Pohorniceni	0,00	BS/MEI
21	Reparația unor străzi în localitate	s. Pohrebeni	576,86	BS/MEI
22	Reparația unor străzi în localitate	s. Puținței	0,00	BS/MEI
23	Reparația unor străzi în localitate	s. Sămănanca	0,00	BS/MEI
4	Reparația unor străzi în localitate	s. Seliște	596,50	BS/MEI
25	Reparația unor străzi în localitate	s. Step-Soci	551,44	BS/MEI
26	Reparația unor străzi în localitate	s. Susleni	1 277,65	BS/MEI
27	Reparația unor străzi în localitate	s. Teleșeu	349,82	BS/MEI
28	Reparația unor străzi în localitate	s. Trebujeni	378,99	BS/MEI
29	Reparația unor străzi în localitate	s. Vișcăuți	414,52	BS/MEI
30	Reparația unor străzi în localitate	s. Zahoreni	422,03	BS/MEI
Total pe raionul Orhei:		30	14 289,55	

[Signature] T. Prucec

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 9 din 22 ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Orhei, conform Programului anului 2019 (zona centru)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Orhei, executate în cadrul contractului nr. 06-14/221 din 14.06.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 17-22 ianuarie 2020 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|---------------|---|--|
| a.) Președinte | V. Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | Gh. Tonu | - | consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | S. Godiac | - | consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD” |
| | P. Cucuruzean | - | șef, secția construcții, gospodărie comună, drumuri al Consiliului Raional Orhei |
| | V. Macari | - | director S.A. „Drumuri Orhei” |
| | V. Brăilă | - | S.A. „Drumuri Orhei” sector Orhei |
| | A. Ghilaș | - | director S.A. „Lusmecon” - antreprenor |
| | N. Severin | - | responsabil tehnic, Î.S. „ASD” |
| | Primar | - | localitatea respectivă |

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Lusmecon”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iunie 2019 sfârșitul lucrărilor decembrie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **14498477,99 lei, inclusiv LCM – 14207266,80 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **miercuri 22 ianuarie** 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
 2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz **6 (zece) file**, inclusiv localitățile:

Fără obiect

Comisia:

Președinte

V. Gornușă

Membri:

Gh. Tomu

V. Brăilă


S. Godiac

A. Ghilaș - antreprenor

P. Cucuruzean

N. Severin

V. Macari

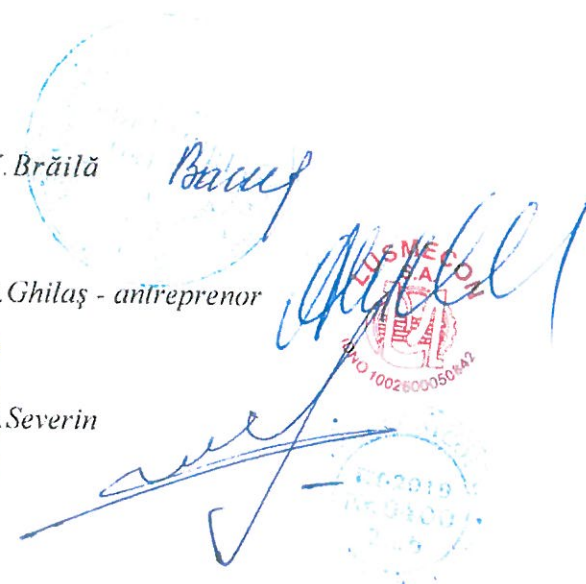

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 9 din 22 ianuarie 2020,
r-ul Orhei

Primar s. Berezloci – P. Uștecelă

Primar com. Biești – G. Șteclă

Primar s. Bolohan – T. Plăcuța

Primar s. Brăvițeni – A. Cociorov

Primar s. Bulaiești – M. Măruș

Primar com. Chiperceni – G. Șteclă

Primar s. Ciocirteni – M. Dăbârlă

Primar s. Clășova – V. Clonț

~~Primar Crihana – I. Străluțat~~

Primar s. Căpușeni – I. Pranețchi

~~Primar com. Donici – S. Guzun~~

Primar s. Isacova – S. Cvasnii

Primar s. Mălăiești – V. Coban

Primar s. Mitoc – A. Cojocari

Primar s. Morozeni – I. Turcan

Primar s. Neculăieuca – V. Bîscali

Primar s. Pereseșcina – V. Buzu

Primar s. Piatra – M. Tugui

Primar s. Podgoreni – A. Bernovec

Primar s. Pohorniceni – I. Corobciuc

Primar s. Pohrebeni – R. Sărcaliuc

~~Primar s. Puținței – E. Iaco~~

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 9 din 22 ian 2020,
r-ul Orhei

~~Primar s.Sămănanca~~ ~~A.Zbirnea~~

Primar com.Seliste - A. Gheorghe

Primar s.Step Soc - S. Josan

Primar s.Susleni - S. Socor

Primar s.Teleșeu - I. Dediu

Primar s.Trebujeni - V. Gandrabur

Primar s.Vișcăuți - V. Nită

Primar s.Zahareni - V. Cojocari



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/434
privind achiziția prin licitație deschisă

"12" noiembrie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024-EV-1570088340589 din 27.10.2019, între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.A. „Lusmecon” cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, tel. 022473382, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul dl Alexandru Ghilaș în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de reparație a drumului M1 Frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 71,00-81,00 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **octombrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

01.10.2019

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 46 542 461,74 (patruzeci și șase milioane cinci sute patruzeci și două mii patru sute șaiszeci și unu lei, 74 bani) inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocățiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general

Gheorghe CUPREI



"Antreprenor general"

S.A. "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1

c/f 1002600050842

c/ IBAN MD53AG000022517010131321

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.

BIC AGRNMD2X

c/TVA 7800083

Director

Alexandru CHILAS



1003600023559



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr.06-14/437 din 12.11.2019.

"15" mai 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și S.A., „Lusmecon”, în persoana directorului dl. Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/437 din 12.11.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km71,00-81,00".

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale, cu acordul ambelor părți, ca rezultat al faptului că în procesul de execuție a lucrărilor de frezare s-a depistat că adâncimea casetelor este mai mare decât cea prevăzută în proiect, în mediu cu 3 cm. Astfel pentru suplinirea casetelor este necesară majorarea volumului de beton asfaltic pentru toată suprafața. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. "Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată" subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 3 397 161,50 (trei milioane trei sute nouăzeci și șapte mii una sută șaiszeci și unu lei, 50 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la mărirea valorii contractului.

"Beneficiar"

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP

"Antreprenor general"

S.A., „Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/ IBAN MD53AG000022517010131321
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr.06-14/437 din 12.11.2019.

"16" iulie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și S.A., "Lusmecon", în persoana directorul dl. Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/437 din 12.11.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km71,00-81,00".

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. 12 din 16.07.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor". Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:
1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse constituie 2 331 041,11 (două milioane trei sute treizeci și una mii patruzeci și unu lei, 11 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

"Beneficiar"

Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTO



"Antreprenor general"
S.A., "Lusmecon"

or. Chișinău, str. Uzinilor 205/1
c/f 1002600050842
c/IBAN MD53AG000022517010131321
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1570086675024
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3 la contractul nr.06-14/437 din 12.11.2019.

“12” octombrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl. Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și S.A., „Lusmecon”, în persoana directorului dl. Alexandru Ghilaș, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/437 din 12.11.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km71,00-81,00”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.27 din 09.10.2020 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:


- Valoarea lucrărilor excluse constituie 1 506 841,00 (un milion cinci sute șase mii opt sute patruzeci și unu lei) cu TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

”Beneficiar”

Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău – bugetul de stat
c/TVA 056


Director general interimar
Veaceslav POTOP



”Antreprenor general” S.A., „Lusmecon”

or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1
c/f 1002600050842
c/IBAN MD53AG000022517010131321
B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.
BIC AGRNMD2X
c/TVA 7800083

Director
Alexandru GHILAȘ



Aprob.

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 48 din 16 Octombrie 2020

Privind lucrările de reparație a drumului „M1 frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 71,00 - 81,00”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/437 din 12 noiembrie 2019 și acordurilor adiționale AA nr.1 din 25.05.2020, AA nr.2 din 16.07.2020, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 239 din 6 octombrie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 12 - 16 Octombrie 2020 fiind formată din:

Președinte:	Iu. Pașa	- director adjunct, Î.S. „ASD”
membri:	R. Rogovei	- șef, direcția infrastructură de transport a MEI
	V. Cotruță	- șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
	P. Triboi	- șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD”
	I. Grosu	- șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD”
	I. Alexa	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
	P. Spînu	- șef, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
	Ș. Caunov	- director S.A. „Drumuri Ialoveni”
	V. Corabieru	- S.A. „Drumuri Ialoveni”, sector Ialoveni

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant A. Ghilaș - director, S.A. „Lusmecon”
- b) proiectant V. Lujanschi - inginer șef proiect, S.A. „Intexnauca”
- c) responsabil tehnic T. Vartolomei - specialist principal, Î.S. „ASD”

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista - anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cufără rezerve și poate fi dată în folosință

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezența neconformităților la obiect
(anexa nr. 3)

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

- a.) Lucrarea a fost executată de către S.A. „Lusmecon”
b.) Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de către S.A. „Intexnauca”
c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *noiembrie 2019* sfârșitul lucrărilor *septembrie 2020*

7. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

Lungimea tronsonului - 10 000 m.l., a) lățimea platformei drumului b - 11.0 m.l., b) lățimea părții carosabile b - 7.0 m.l., c) lățimea acostamentelor consolidate cu piatră spartă b - 1,5 m, h - 0,15 m.

Construcția sistemului rutier :

- a) Frezarea casetelor a părții carosabile din ambele părți cu h med - 8 cm și o lățime de 1,2 m - 2,2 m, L - 9244 m.l., strat de beton asfaltic SKBg - II, h med - 8 cm, S - 30444 m²;
b) Strat de bază din beton asfaltic SKPg I, h - 6 cm, S - 73560 m²;
c) Strat de uzură din beton asfaltic SMBg - II, h - 4 cm, S - 73560 m²;
d) Reparația podețelor tubulare D - 1 m - 5 bucăți.

8. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 59,46 mln. lei, inclusiv LCM - 57,13 mln. lei.

9. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 52 319 008,42 lei, inclusiv LCM - 50 763 808,07 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

10. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

11. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi 16 octombrie 2020 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

membri:

V. Cătruță

P. Triboi

I. Grosu

I. Alexa

SECTIA SISTEMATIZARE CIRCULATIE
P. Spina

S. Cărbob
IALOVENI
"DRUMURI IALOVENI"
V. Corabieru

A. Găbă
ITN
INTEXNAUCA

I. Vartolomei

12. Reparația drumului „Al frontiera cu România Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina km 71,00 - 81,00”, în baza recomandărilor comisiei este

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.A. „Lusmecon”

Octombrie 2020





PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Octombrie 2020




V. Cotruță

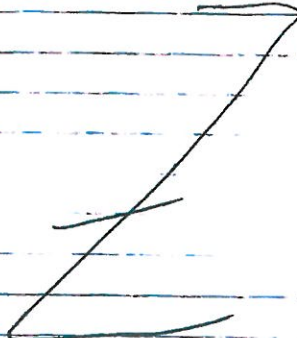Nr. d'o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	Documentația scrisă și desenată a proiectului este completă. 

P. Spînu



Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Preşedinte *Iu. Paşa*

Membri: *R. Rogovei*

V. Coltruță

P. Triboi

I. Grosu

I. Alexa

P. Spînu



L. Corabiet

A. Ghilasy

V. Lujansc

T. Varfolomei

