

DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 1)

1. Denumirea și obiectul contractului Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, rețele electrice 0,4/6/10kV, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Negruzi, str. V. Alecsandri mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului _____ Nr. 15/01408/001 din 31.07.2015, înregistrat Agenția Achiziții Publice
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Direcția generală transport public și cai de comunicație
4. Adresa beneficiarului _____ mun. Chișinău str. Lazo, 18
5. Țara _____ Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	_____ 63170766.50 lei	_____ 3367563.00 dol SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	_____ 55782609.55 lei	_____ 2973709.00 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 22 luni
 - b) efectiv realizată _____ 22 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ se anexează Acordul adițional Nr. 1
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 14.12.18
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: _____ 24.03.2022

Semnat: _____

Nume: _____ ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director

Denumirea întreprinderii: _____ "COMPANIA ELECTRICA" SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr. 1.

la Contractul nr. 26/15 din 08 iulie 2015.

22 decembrie 2016.

mun. Chișinău

Prezentul Acord este semnat astăzi 22 decembrie 2016, între Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a Consiliului municipal Chișinău, cu sediul în mun. Chișinău str. S. Lazo 18, reprezentată de Directorul Igor Gamrețki și

ICS „Compania Electrica” SA, cu sediu în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, reprezentată de Administrator Maria Eni, în scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 26/15 din 08 iulie 2015 privind executarea lucrărilor de reabilitare a utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfint din mun. Chișinău, (obiect 3069 DV2), bd. Negruzii din mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri din mun. Chișinău (obiect 3073 DV2).

Prin prezentul Acord părțile contractante convin asupra următoarelor modificări ale punctelor 4.2. și 14.5. din Contractul de antrepriză nr. 26/15 din 08 iulie 2015, în baza demersului, notei informative, procesului-verbal al grupului de lucru cu privire la prelungirea termenului contractului:

- *Se prelungește termenul de executare și valabilitate a contractului până la 31.05.2017.*

Prezentul Acord se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLATĂ ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

ICS „Compania Electrica” SA

DGTPCC

IDNO 1003600092733

IDNO 1007601009657

MOLDMD2X309.

TREZMD2X

BC „Moldindconbank” SA.

MF Trezoreria de Stat

IBAN MD20ML000000222492500705

IBAN MD50TRPDAK222500B09746A6

Director M. Eni M. Eni


Director I. GAMREȚKI

Șef interimar DEF





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26/15.

privind achiziția prin Licitație Publică

08 iulie 2015

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 15/01408, procesul-verbal al grupului de lucru cu privire la evaluarea ofertelor nr. 15/01408/001 din data de 03.07.2015, între:

Direcția generală transport public și căi de comunicație, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Igor Gamrețki, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SA "Compania Electrică", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022-50-50-47, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații inginerești și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria Eni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. V. Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2).

Cod CPV: 45222000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de organizații sau asociații de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție de personalul Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare de asigurare la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general.



- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.


4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 63 170 766, 50 lei (șaizeci și trei milioane o sută șapezece mii șapte sute șapezece și șase lei, 50 bani). (inclusiv TVA).
- 4.2. Lucrările se vor executa în II etape:
I. Etapă – 30 000 000 lei pînă la 31.12.2015.
II. Etapă – 33 170 766, 50 lei pînă la 31.12.2016.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate



- din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) Extrasul eliberată de Camera Înregistrării de Stat;
 - c) Licența eliberată de Camera de Licențiere;
 - d) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - e) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - f) caietele de sarcini (specificatiile tehnice).
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

DGTPCC

Adresa: Mun. Chișinău, str. S.Lazo 18.
Tel./Fax: 022-20-46-90,
fax: 022-20-46-58,
Denumirea: Trezorăria de stat
Băncii:
Adresa:
Băncii:
Cod: TREZMD2X
Bancar:
Cont de: 220114071670184 art. 132.11
decontare:
Cod fiscal: 10076001009657 *€ 30000000 lei*

“ ANTREPRENOR”:

SA “Compania Electrica”

Adresa: Mun. Chișinău, str. Plaiului 2.
Tel./Fax: 022-50-50-47,
fax: 022-52-15-94
Denumirea: BC “Moldindconbank” SA
Băncii:
Adresa:
Băncii:
Cod: MOLDMD2X309
Bancar:
Cont de: 222492500705
decontare:
Cod fiscal: 1003600092733

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Director  Igor GAMREȚKI

Șef-interimar DEF D. Popescu

“ ANTREPRENOR”:

Director  Maria ENI

Contabil 



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.12.2018

Obiectul „Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd. Ștefan cel Mare și Sfin mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd. Negruzzi mun. Chișinău (obiect 3071 DV2), str. Vasile Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2)” este executat în cadrul contractului nr. 26/15 din "08" iulie 2015.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 161-C/14 din 23.07.14, de către S.A. „Compania Electrica”

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.12.2018, fiind formată din:

Președinte

Nistor Grozavu – viceprimarul municipiului Chișinău

Membri:

Vitalie Butucel – șef al Direcției generale transport public și căi de comunicație

Oleg Caraman – șef adjunct al DGTP și CC

Veaceslav Buț – director al Î.M. „Lumteh”

Anatolii Aparatu – director adjunct al Î.M. „Lumteh”

Dorin Ciornîi – director al Î.M. „RTEC”

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Sofroniuc Mihail – reprezentant S.A. „Compania Electrica”

Cebanu Viorel – diriginte de șantier S.A. „Compania Electrica”

Ion Paciu – director adjunct I.M.P. „Chișinăuproiect”

Anatolie Brusnic – proiectant I.M.P. „Chișinăuproiect”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

a) lucrările pe specialități au fost executate, recepționate puse în funcțiune. Anexă 18 file;

b) lucrările au fost complet terminate la data de 05 aprilie 2017;

c) observațiile comisiei de recepție finală sânt prezentate în lista-anexă nr. 1;

d) documentația tehnică de execuție a obiectului au fost completate;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului sânt în posesia utilizatorului;



f) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de terminarea ei până în prezent;

g) valoarea obiectului este de 55 782 609,55 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

admiterea recepției finale.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

lucrările corespund din punct de vedere tehnic și calitativ cerințelor caietului de sarcini și proiectului tehnic.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de primit în recepție finală.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 21 file, a fost încheiat astăzi 14. 12. 18 la în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Nistor Grozavu

Membri: Vitalie Butucel

Oleg Caraman

Veaceslav Buț

Anatolii Aparatu

Dorin Ciornii

Sofroniuc Mihail

Cebanu Viorel

Ion Paciu

Anatolie Brusnic

(numele, prenumele, semnătura)

" 14 " 12 2018

L.Ș.



Anexa nr.1
la proces verbal de recepție
finală nr.1 din 14.12.2018

„Reabilitarea utilităților (obiective de semafoare, rețeaua de contact, etc) a bd.
Ștefan cel Mare și Sfîn mun. Chișinău (obiect 3069 DV2), bd .Negruzzi mun. Chișinău
(obiect 3071 DV2), str. Vasile Alecsandri mun. Chișinău (obiect 3073 DV2)“

Observațiile comisiei de recepție finală

NU SUNT

Comisia de recepție finală:

Președinte: Nistor Grozavu

Membri: Vitalie Butucel

Oleg Caraman

Veaceslav But

Anatolii Aparatu

Dorin Ciornii

Sofroniuc Mihail

Cebanu Viorel

Ion Paciu

Anatolie Brusnic

(numele, prenumele, semnătura)



Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Reconstrucția rețelelor de contact pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 05.04.2017

ACT Nr. 05/04-2017
 de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc Veaceslav
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Melnic Anatolie
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc Mihail
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Reconstrucția rețelelor de contact pe bd. Ștefan cel Mare, RC.
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-RC elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect nu-s.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.1).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală nu-s.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.1.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 22 164 416, 95 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „05” „04” anul 20 17.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)



[Signature]
 (semnatura, nume, prenume)

Primit:

[Signature]
 (semnatura, nume, prenume)

data 05.04.2017



data

Oraşul ChişinăuBeneficiar DGTPCC mun. ChişinăuObiectivul Reconstrucţia reţelei electrice REE pe str. V. AlexandriData 02.06.2016ACT Nr. 02/06-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar

Butuc Veaceslav

(funcţia, nume, prenume)

întreprinderea de exploatare

Novîsotchi Alexandru, Puscîn Ion

(funcţia, nume, prenume)

organizaţia de electromontaj

Sofroniuc Mihail

(funcţia, nume, prenume)

a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Reconstrucţia reţelei electrice REE pe str. V. Alexandri :

(lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)

La PT-25: reţele de alimentare în cablu a CC-11910, CC-11911, CC-11912, la PT-263: reţele de alimentare în cablu a CC-11907, CC-11906, CC-11908, CC-11909, la PT-61: reţele de alimentare în cablu a CC-11967, CC-251A, CC-11969, CC-11970, la PT-46: reţele de alimentare în cablu a CC-11962, CC-11963, CC-11964, CC-11965, CC-11966, CC-11960, CC-11960/1, CC-11961, CC-11959, la PT-430: reţele de alimentare în cablu a CC-11955, CC-11954, CC-11953, CC-11956, CC-11957, CC-11958, la PT-787: reţele de alimentare în cablu a CC-11952, CC-11951, CC-11947, CC-11948, CC-11950, CC-11944, CC-11945, CC-11946, CC-11943, CC-11942, la PT-134: reţele de alimentare în cablu a CC-11938, CC-11937, CC-11936, CC-11935, CC-11934, CC-11939, CC-11940, CC-11941,

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3073-REE elaborat deÎMP "CHIŞINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric

sub tensiune

(sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 6782 120, 39 lei.**CONCLUZIA COMISIEI**

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de

„02” 06 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

bine

(evaluare)

Primit:

(semnatura, nume, prenume)



(semnatura, nume, prenume)

(semnatura, nume, prenume)

data

data

7

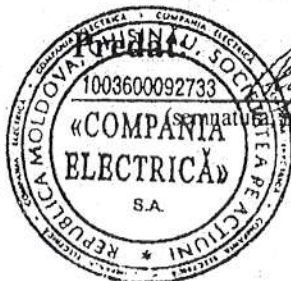

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe str. V. Alexandri
 Data 22.04.2016

ACT Nr. 22/04-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc Veaceslav
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Crihan Vasile
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc Mihail
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 2(Nº118), DCR-3(Nº37), DCR-4(Nº28), DCR-5(Nº54), DCR-6(Nº149).
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3073-DCR elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric _____ sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
 6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
 7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 4 245 642,68 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „04” 06, anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Bine
 (evaluare)



data _____

22-05-2016

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/1-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 1(Nº52 – str. M. Viteazul)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-1 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1181240,36 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite Bine
 (evaluare)

Predat:

(semnatura, nume, prenume)


data 26.12.2016

Primit:

(semnatura, nume, prenume)

 (semnatura, nume, prenume)


data

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 2(Nº176 – str. T. Ciorba)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-2 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1038 603,95 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:

[Signature]
 (semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 data 26.12.2016

Primit:

[Signature]
 (semnatura, nume, prenume)
SECȚIA SISTEMATIZARE
 (semnatura, nume, prenume)
 data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/3-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 3(Nº51 – str. Mt. P. Movilă)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-3 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 983 012,24 lei.


CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” „12” anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:


 (semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.

data 26.12.2016

Primit:


 (semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.R.L.
 IDNO 1003600092733

data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/14-2016
 de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 4(Nº50 – str. S. Lazo)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-4 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
 6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
 7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1040549,24 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” „12” anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:


[semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)

data 26.12.2016

Primit:

[semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)

data _____



Oraşul Chişinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chişinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ştefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/5-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componenţă: de la beneficiar Butuc V.
 (funcţia, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcţia, nume, prenume)
 organizaţia de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcţia, nume, prenume)
 a efectuat inspecţia echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 5(Nº152 – str. Sf. Tării)
 (lista, caracteristica tehnică generală şi volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-5 elaborat de _____

ÎMP "CHIŞINĂU PROIECT"

(organizaţia de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentaţia tehnică, prezentată conform cerinţelor ПУЭ şi СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, şi termenii lor de înlăturare sînt indicaţi în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1159414,68 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП şi conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” „12” anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:

[Semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.
 data 26.12.2016

Primit:

[Semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)
 data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/6-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 6(Nº49 – str. M. Cibotari)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-6 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1100 003, 66 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

Predat:

[Semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)
[Stampa Compania Electrica]

data 26.12.2016

Primit:

[Semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)
[Stampa Beneficiar]
[Stampa Comisia]
 data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/7-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 7(Nº48 – str. Mt. Bănulescu-Bodoni)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-7 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂUPROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 85994,84 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:

(semnatura, nume, prenume)

Primit:

(semnatura, nume, prenume)

(semnatura, nume, prenume)

data 26.12.2016

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/8-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 8(Nº46 – str. A. Pușkin)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-8 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1146540,86 lei.


CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.


Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:


 (semnătura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.
 IDNO 1003600092733

Primit:


 (semnătura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.R.L.
 IDNO 1003600092733

data 26.12.2016

data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/9-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 9(Nº174 – str. V. Pîrcălab)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-9 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 558 632,55 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:

[Semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.

Primit:

[Semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.R.L.

data 26.12.2016

data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/10-2016

de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR-10(Nº45 – str. M. Eminescu)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-10 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 998 343,13 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” „12” anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:

[Semnătură]
 (semnătură, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.
 1003600092733

data 26.12.2016

Primit:

[Semnătură]
 (semnătură, nume, prenume)
[Semnătură]
 (semnătură, nume, prenume)

data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/11-2016

de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 11(№44 – str. V. Alexandri)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-11 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 998 340,26 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” „12” anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

(evaluare)

Predat:

[Semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.

data 26.12.2016

Primit:

[Semnatura]
 (semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.

data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/12-2016
de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 12(Nº43 – str. Armeneacă)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-12 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 987 046,46 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.
 Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de "26" 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:

[Signature]
 (semnătura, nume, prenume)




Primit:

[Signature]
 (semnătura, nume, prenume)

(semnătura, nume, prenume)

data 26.12.2016

data _____



Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/13-2016

de predare–primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 13(№173 – str. Bulgară)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-13 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 529208,22 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite bine
 (evaluare)

Predat:

(semnatura, nume, prenume)


data 26.12.2016

Primit:

(semnatura, nume, prenume)


data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Ștefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/14-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 14(Nº42 – str. Tighina)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)

2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-14 elaborat de _____

ÎMP "CHIȘINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).

4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)

a durat 72 ore.

5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.

6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.

7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 1054742,41 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” 12 anul 2016 .

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite

Predat:

(semnatura, nume, prenume)
[Semnatura]
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.
 1003600092733

data 26.12.2016

Primit:

(semnatura, nume, prenume)
[Semnatura]
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.
 1003600092733

data _____

Orașul Chișinău
 Beneficiar DGTPCC mun. Chișinău
 Obiectivul Obiective de semafoare pe bd. Stefan cel Mare
 Data 26.12.2016

ACT Nr. 26/12/15-2016
de predare-primire a lucrărilor de montare a echipamentului electric

Comisia în componență: de la beneficiar Butuc V.
 (funcția, nume, prenume)
 întreprinderea de exploatare Mosorete A.
 (funcția, nume, prenume)
 organizația de electromontaj Sofroniuc M.
 (funcția, nume, prenume)
 a efectuat inspecția echipamentului electric montat.

1. La predare a fost înaintat Obiective de semafoare: DCR- 15(Nº175 – str. Tricolorului)
 (lista, caracteristica tehnică generală și volumul)
2. Obiectivul a fost montat în corespundere cu proiectul 3069-DCR-15 elaborat de _____

ÎMP "CHISINĂU PROIECT"

(organizația de proiectare)

Devierile de la proiect sînt enumerate în anexa Nr.1.

3. Comisia a verificat documentația tehnică, prezentată conform cerințelor ПУЭ și СНиП (anexa Nr.2).
 4. Testarea echipamentului electric sub tensiune
 (sub tensiune, sub sarcină)
- a durat 72 ore.
5. Neajunsurile depistate, ce nu împiedică exploatarea normală, și termenii lor de înlăturare sînt indicați în anexa Nr.3.
 6. Borderoul echipamentului electric montat este prezentat în anexa Nr.4.
 7. Costul lucrărilor înaintate la predare constituie 542 532,05 lei.

CONCLUZIA COMISIEI

8. Lucrările de montare a echipamentului electric au fost îndeplinite în corespundere deplină cu ПУЭ, СНиП și conform proiectului.

Obiectivul indicat în p.1. al acestui act este acceptat pentru exploatare începînd cu data de „26” „12” anul 20 16.

9. Lucrările de electromontaj au fost îndeplinite _____

(evaluare)

Predat:

(semnatura, nume, prenume)
COMPANIA ELECTRICĂ
 S.A.


data 26.12.2016

Primit:

(semnatura, nume, prenume)
 (semnatura, nume, prenume)

data _____

REPUBLICA



MOLDOVA

Consiliul municipal Chișinău

**Direcția generală
transport public și căi de comunicație**

Chișinău, MD 2004, str. S. Lazo, 18, Tel 20-46-90, Fax 20-46-66, 20-46-58
E-mail: dirtrans@mail.md

31.10.2016 nr 01-2-548
La nr _____ din _____

ORGANELOR COMPETENTE

Scrisoare de recomandare

S.A. „Compania Electrica” a executat lucrările de reabilitare a utilităților str. V. Alecsandri, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințele de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă S.A. „Compania Electrica” beneficiarilor pentru colaborare.

Șef al Direcției



Igor Gamrețki



DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 2)

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети, сети наружного освещения, светофорных объектов мун. Бэлць (Lucrari la reconstructia rețelelor de contact la linia de troleibuz, rețelelor de iluminat exterior, rețelelor obiective semafoare, or Balti)
2. Numărul și data contractului _____ Nr.GrCF_BTP03 din 25.06.2021 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ ÎM "Direcția de troleibuze din or. Bălți" (МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць»)
4. Adresa beneficiarului _____ or. Bălți, str. Decebal, 132
5. Tara _____ Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ **antreprenor** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 403972,97 euro _____ 482523 dol SUA
- b) finală (la data finalizării contractului) _____ 403972,97 euro _____ 482523 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată _____ 8 luni _____
- b) efectiv realizată _____ 7 luni _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr1 din 21.02.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu se aplica _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____ 24.03.2022 _____

Semnat: _____

Nume: _____ ENI Maria _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _____ "COMPANIA ELECTRICA" SRL _____



ПРОГРАММА ЗЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ, ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА МУН.БЭЛЦЬ

Контракт №GrCF_VTR03 Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети

КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено «25» июня 2021г. МЕЖДУ

(1) МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць», юридический адрес: 132, ул. Дечембал, 3121, г.Бэлць, Молдова (далее именуемое "Заказчик"), и

(2) ООО «Компания Электрикс»¹, юридический адрес: 2, ул. Плаялуй, MD2002, Кишинев, Молдова (далее именуемое "Подрядчик").

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел конкурс на выполнение **Работ по реконструкции троллейбусной контактной сети** и принял заявку Подрядчика на выполнение и завершение указанных работ и устранение любых выявленных в них дефектов, а также согласить выплатить Подрядчику цену контракта **EUR 403,972.97 (четыреста три тысячи девятьсот семьдесят два и 97/100) без НДС и таможенных пошлин**, или иную сумму, которая может причитаться ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Заказчик и Подрядчик договорились о нижеследующем:

1. В настоящем контрактном соглашении слова и выражения имеют те же значения, что и в документах, входящих в состав Контракта, на которые делаются ссылки.

2. Ниже приведены документы в порядке приоритета, входящие в состав настоящего Контракта и являющиеся его неотъемлемой частью. Настоящее контрактное соглашение имеет преимущественную силу по отношению ко всем другим документам, входящим в состав Контракта.

(a) Извещение о принятии конкурсной заявки; (b) Конкурсная заявка Подрядчика; (c) Дополнения №№ к конкурсной документации (*Не применяется*); (d) Особые Условия Контракта; (e) Общие условия Контракта; (f) Формы обеспечения; (g) Требования.

3. С учетом согласия Заказчика на осуществление выплат Подрядчику в соответствии с настоящим Контрактом, Подрядчик настоящим обязуется перед Заказчиком выполнить указанные работы с последующим устранением всех выявленных в них дефектов согласно положениям Контракта.

4. Все платежи, причитающиеся Подрядчику по настоящему Контракту, будут производиться только на следующие банковские счета:

Compania Electrica S.R.L.
MD29ML00000002251409964
BC Moldindconbank S.A.
mun. Chisinau, Moldova
MOLDMD2X309

Название счета получателя:
Номер счета получателя (IBAN):
Название банка получателя:
Адрес банка получателя:
БИК

5. Заказчик настоящим обязуется заплатить Подрядчику за выполнение и завершение указанных работ с устранением всех выявленных в них дефектов цену Контракта или иную сумму, причитающуюся ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Контракт заключается в соответствии с законодательством **Республики Молдова** в день, месяц и год, указанные выше.



Подписано от имени и по поручению Заказчика
в присутствии

С.В.Абрамов, Директор

Подписано от имени и по поручению Подрядчика
в присутствии

М. Ени, Администратор

В.М. Капюхный, Главный Инженер

Июнь, 2021г., мун. Бэлць, Республика Молдова

¹ Является правопреемником АО «Компания Электрикс» согласно «Решению о регистрации юридического лица в результате реорганизации путем преобразования» от 27.05.2021 №1003600092733 Службы регистрации юридических лиц г.Кишинев Департамента регистрации и лицензирования юридических лиц Агентства Государственных Услуг Республики Молдова

1

ЗАКАЗЧИК: МП «Троллейбусное Управление м.п. Бель»

Акт приемки объекта по окончанию работ

№ 1 от 21.02.2022

Объект «Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети» выполнен в соответствии с контрактом № GrCF_VTR03 от «25» июня 2021 года.

Работы были выполнены на основании авторизации № 27 от 10.03.2021г.

«Компания Электрик» О.О.О.

1. Комиссия по приемке объекта по окончанию работ, работала в период 21.02.2022г.

в составе:

Председатель

Брагарь А. – начальник УКСА единого заказчика

Члены:

Максимчук Е. – директору М.П. «Троллейбусное Управление м.п. Бель»

Капкожный В. – главный инженер

Бутук В. – технический надзор

Жилималай Ю. – начальник эксплуатации

2. А также на комиссии присутствовали:

Софронок М. – представитель «Компания Электрик» О.О.О.

Чобану В. – главный инженер «Компания Электрик» О.О.О.

Артени В. – проектировщик SC "Intorproject" SRL

3. Приемочная комиссия по приемке объекта по окончанию работ в результате изучения и анализа выполненным работ и документов, содержащихся в Технической книге, установила следующее:

а) работы по специальностям выполнены и получены согласно приложению № 1;

б) работы были полностью завершены 21.02.2022.

с) замечания комиссии по приемке объекта по окончанию работ, представленные в приложении № 2;

д) исполнительная техническая документация объекта укомплектована;

е) подрядчик провел инструктаж оперативного и технического персонала Заказчика по всем вопросам эксплуатации и обслуживания опор, контактной сети и подвески;

ж) сооружение вело себя надлежащим образом в период с момента его завершения с 21.01.2022г. по настоящее время, соответственно в течение _____;

з) стоимость объекта составляет 403.972.97 €.

4. На основании сделанных выводов комиссия по приемке объекта по окончанию работ предлагает:

Принять объект в эксплуатацию

5. Комиссия по приемке объекта по окончанию работ обосновывает предложение следующим образом:

работы соответствуют с технической и качественной точки зрения требованиям технического задания и технического проекта

6. Приемочная комиссия по приемке объекта по окончанию работ рекомендует следующее:

принять объект в эксплуатацию с 22.02.2022г.

7. Настоящий акт, содержащий 2 листа и 2 пронумерованных приложений, общим объемом 19 страниц, составлен сегодня _____ в _____ экземплярах.

8. Заключение Комиссии:

Председатель: Брагарь А.

Члены: Максимчук Е.

Капкожный В.

Бутук В.

Жилималай Ю.


Софронок М.

Чобану В.

Артени В.

"21" 02 2022

М.П.



Приложение №2
к акту приемки объекта по
окончанию работ
№ 1 от 21.02.2022 г.

Объект « Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети» мун.
Бэлць

Замечания Комиссии по приемки объекта по окончанию работ

НЕТ

Комиссия по приемки объекта по окончанию работ:

Председатель:

Члены:

Бутук В.
Житималай Ю.
Софронюк М.
Чобану В.
Афтея В.



Republica Moldova
Primăria municipiului Bălți
Î.M. „Direcția troleibuze”
3100 mun. Bălți, str. Decebal, 132
Contul de decontare Nr.2251921392
la B.C. «Moldindconbank» S.A. or. Bălți
filiala Bălți, MOLDMD2X321
Tel. Șeful direcției 7-49-82
Aprovizionare 7-49-76
Contabilitatea 7-13-60



Республика Молдова
Примэрия муниципия Бэлць
М.П. „Троллейбусное управление”
3100 г.Бэлць, ул. Дечебал, 132
Расчетный счет № 2251921392
в А.К.Б. „Moldindconbank” м.Бэлць
Филил Бэлць MOLDMD2X321
Тел. Директор 7-49-82
Служба МТС 7-49-76
Бухгалтерия 7-13-60

№ 91 от 08 февраля 2022 г.
На _____ от _____ 2022 г.

“COMPANIA ELECTRICĂ” S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
IDNO 1003600092733

Nr. 13 11 februarie 2022

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

„Компания Электрикз” О.О.О. осуществила работы по реконструкции троллейбусной контактной сети в мун. Бельцы. Работы были произведены качественно, согласно установленных сроков. Соблюдение техники безопасности, а также условия договора-подряда были первоочередными для специалистов компании. Работники фирмы показали себя квалифицированными, грамотными специалистами. МП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць» удовлетворено предоставленными услугами „Компания Электрикз” О.О.О. и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

Директор
МП «Троллейбусное
Управление мун. Бэлць»



Е.Максимчук

